

제142회 영등포구의회 2008년도 제2차 정례회
'08. 11. 21 ~ 11. 25



주요 업무 보고

-2008년도 추진실적 및 2009년도 계획-

2008. 11



도로과

보 고 순 서


- 일 반 현 황 1
- 2008 주요업무 추진실적 4
- 2009 주요업무 계획 22
- 특 수 사 업 25

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일반직					기능직				
		5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정 원	35	1	4	4	6	4		1	4	7	4
현 원	32	1	4	7	2	5	1	3	6	3	
과부족	-3			+3	-4	+1	+1	+2	+2	-4	-4

2 조 직

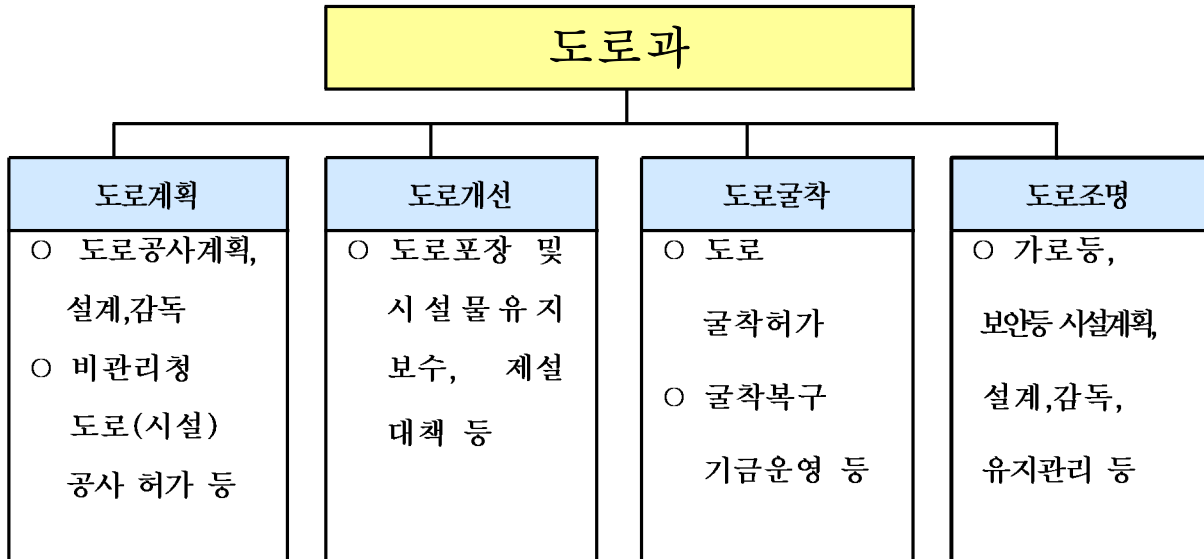

3 주요시설 및 장비

- 도로 : 387Km [도로율 23.16% (서울시:21.68%),포장율100%]
- 간 선 도로 : 75.66Km (경인로 외 27개소)
- 교 량 : 12개소 (양화교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 신정교, 양평교, 염창교, 여의교, 구로교)

- 고 가 차 도 : 6개소 (문래, 선유, 도림, 도림천, 신길, 영등포역)
- 보 도 육 교 : 11개소 (우신초교앞 보도육교 외 10개소)
- 지 하 차 도 : 10개소 (국회앞, 영등포, 대방, 신길, 여의2교, 여의교,
목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측)
- 지 하 보 도 : 3 개소 (여의초교앞, 원효대교앞, KBS별관앞)
- 입체교차로 : 5개소 (영등포R, 여의하류, 목동교 동측IC, 염창IC, 여의상류)
- 공 동 구 : 6.18 Km (전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관)
- 가 로 등 : 8,294 등
- 보 안 등 : 9,423 등

□ 유관기구 현황

명 칭	구성인원(명)		목 적	비 고
	내 부	외 부		
기술자문위원회	부구청장외1인	13	공사설계 등 전문기술 자문	15인이내
도로관리심의회	부구청장외5인	10	도로굴착관련 전반적 사전심의	10 ~ 20인
도로굴착복구 기금운용심의위원회	건설교통국장 외5인	3	도로굴착복구기금 운영 심의	

□ 장 비 현 황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 럭	대	1	도로보수 작업용	
다목적도로관리차	대	3	제설작업등	

4

예산 현황

예산 현액

(단위 : 천원)

단위사업명	①예산현액	②집행액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집행액	집행예정액		
합 계	10,098,801	6,394,963	2,920,294	68,720	714,824
도로개설 및 확장	3,982,292	2,530,550	1,354,777	68,720	28,215
도로개설 지원	26,963	9,505	4,000	0	13,458
도로정비	3,432,126	2,102,932	932,325	0	396,869
도로관리	370,441	202,866	142,905	0	24,670
도로조명시 설 정비	630,661	299,479	232,021	0	99,161
도로조명 관리	1,169,444	881,150	180,570	0	107,724
행정운영 경비	486,874	368,481	73,696	0	44,697

II. 주요업무 추진실적

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

1 신길로~도림로간 도로확장공사(시비)

신길로와 도림로를 연계하는 도로개설로 교통량 분산 및 지역발전을 도모하고 상습 침수지역 해소.

□ 사업개요

- 위치 : 영등포구 신길동 347-40 ~ 254-1간
- 규모 : 도로개설 B=15 → 30m, L=780m
 - 기개설 : 420m('97년 ~ '03년), - 미개설 : 360m
- 사업기간 : '97년 ~'09년 4월
- 총사업비 : 53,200백만원(보상비 45,700 공사비 7,420 설계비 80)


□ 추진실적

- 공사 : 공정 47%
 - '08. 3. 10 : 계약 및 착공 (2단계)
 - '08. 7월 : 건물 130동 철거 완료
 - '08. 11월 현재 : 하수암거 350m중 200m 완료
- 보상
 - '08. 4. 4 : 토지 1건(사려가) 수용재결 신청
 - '08. 10월 : 토지 보상금 공탁

□ 향후 추진계획

- '08. 11 : 한전 지중화 및 하수암거 매설완료
- '08. 12 : 교통규제 심의
- '09. 1 ~ '09. 3 : 수목식재 및 포장 완료

위 치 도

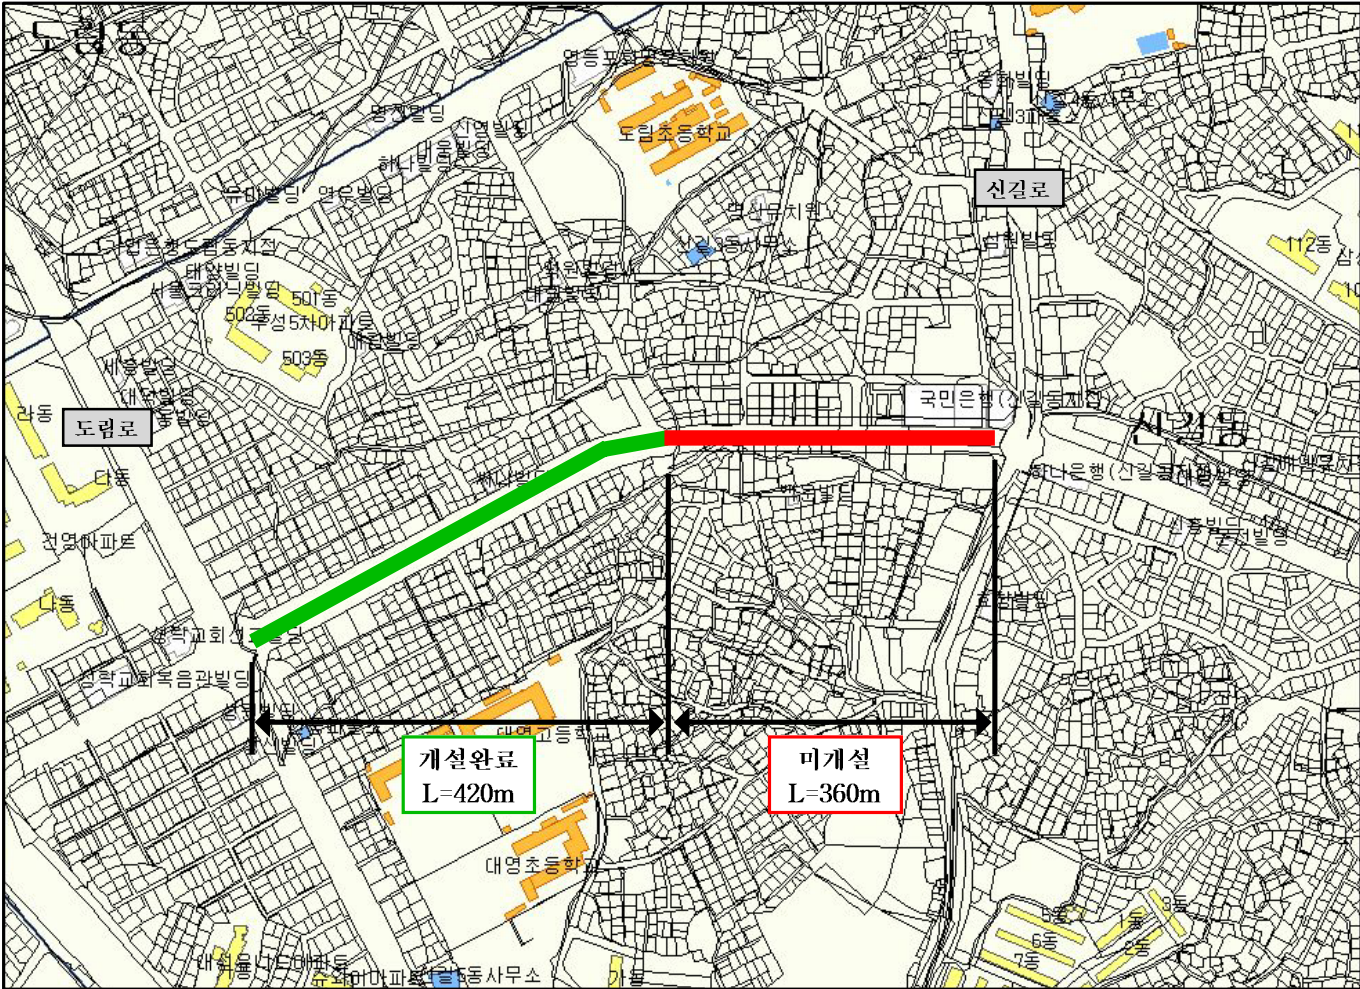

2 영진시장~대신시장간 도로개설공사

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 연계하여
교통량 분산효과 도모 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m
 - 기개설 : 820m('94년 ~ '00년) - 미개설 : 450m
- 사업기간 : '94년 ~ '10년 이후
- 총사업비 : 23,910백만원(보상비 20,139, 공사비 3,656, 설계비 115)


□ 추진실적

- 공사 : 공정율 76%
 - 건물 철거완료(7동)
 - 옹벽설치 완료(345m)
 - 보차도경계석 700m중 400m 설치
- 보상
 - 총 14건중 13건 완료
 - ※ 1건 : 수용재결중(신길동1795-42 149.4m²중 94.4m²)

□ 향후추진계획

- 공사
 - '08. 11월 : 기층재 포설, 규제심의, 수목식재
 - '08. 12월 : 포장완료 예정
- 보상
 - '08. 11월 : 토지보상금 공탁 (149.4m²중 94.4m² 지분)
 - ※ 미보상부분(149.4m²중 55m²)은 '09예산(184백만원) 확보

위 치 도

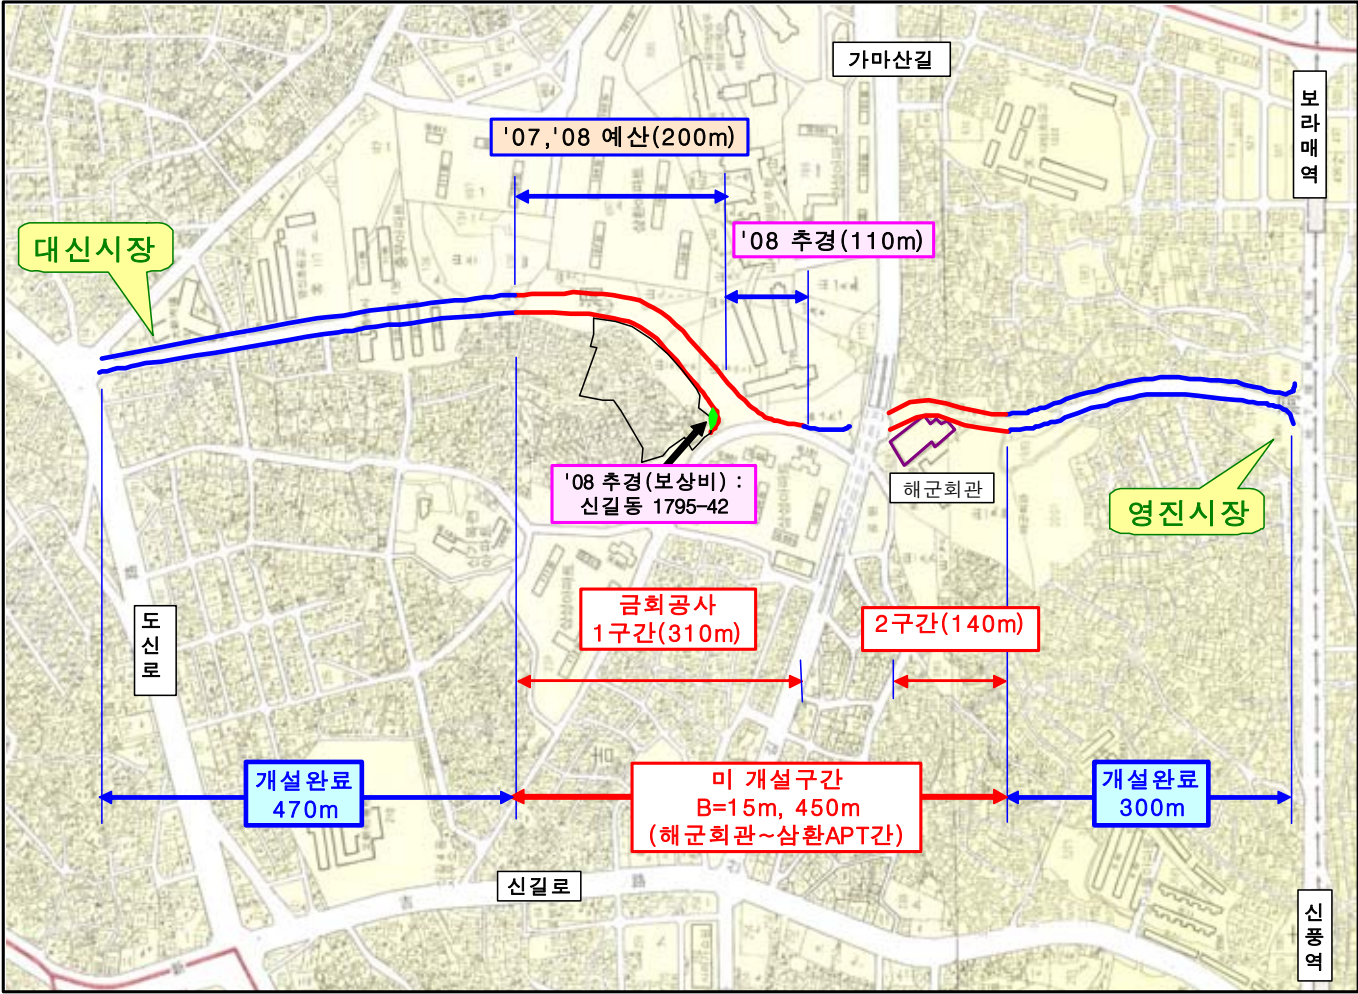

3 대림동 1051-9 ~ 810-56간 도로개설공사 (시비+구비)

대림2생활권 지구단위계획구역내 개발활성화 및 도로연계기능 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림동 1051-9 ~ 대림동 810-56간
- 규 모 : 도로개설 B=6m, L=158m
- 사업기간 : '06년 ~ '09년 7월
- 총사업비 : 3,152백만원(보상비 2,782 공사비 355 설계 15)


□ 세부 추진계획

- 보 상 : 43건 완료(토지 11건, 물건 24건, 영업권 8권)
 - '08. 6 : 6건 협의 완료 (토지 2건, 지장물 4건)
 - '08. 10. : 수용재결에 따른 보상금 지급 및 공탁(토지9, 물건20, 영업권8)

□ 향후 추진계획

- 공 사
 - '08. 11월 : 공사계약
 - '09. 2월 : 건물철거 및 공사착수
- 보 상
 - '09. 1월 : 수용재결 결과 건물확대보상에 따른 주거 이전비 지급

위 치 도

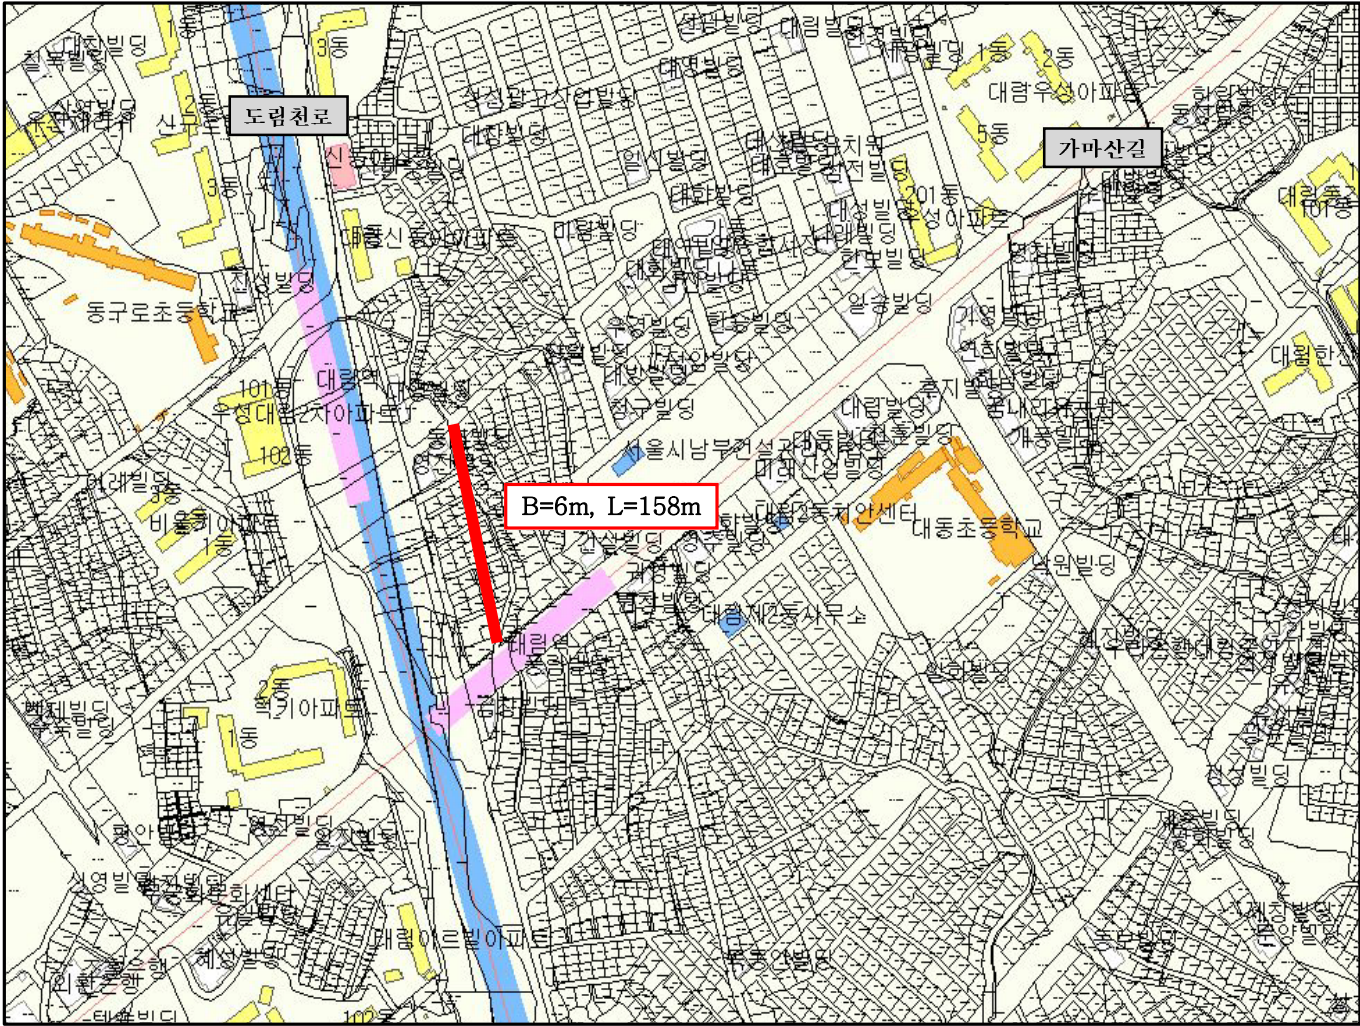

4 도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 지급

10년이상 장기 미집행 도시계획시설(도로) 매수청구 및 소송 판결에 대한 토지를 매수(임료)하여 장기민원 해소

□ 사업개요

- 위치 : 영등포구 관내
- 규모 :
 - 도시계획시설(도로) 매수청구 현황(23건, 3,547m²)
 - ▷ '08년 매입대상 : 2건(115m²)
 - 소송판결(부당이득금) 현황(10건 2,650m²)
 - ▷ '08년 패소 토지매입 : 1건(179m²)
- 총사업비 : 5,000백만원
 - '07년까지 : 1,800백만원
 - '08년 : 450백만원
 - '09년이후 : 2,750백만원

□ 추진실적

- 보상
 - 매수청구 토지매입(박갑성, 82m²) : 1건(89,380천원)
 - 소송패소 토지매입(김홍준, 179m²) : 1건(68,984천원)
 - 소송임료 지급 : 민혜영외 2명(2,804천원)
 - 기타(측량수수료 등) : 2건(97,278천원)
- ※ 지출금액 : 258,446천원

□ 향후 추진계획

- '08년 집행잔액(191,554천원) 범위내에서 매수청구 및 소송패소 토지 임료를 지급할 계획임.

5 지하철 5호선(신길역) 동선개선사업

신길동 및 영등포동 지역이 경부선(국철)과 지하철 1호선에 의해 단절되어 5호선 신길역 이용시 영등포 지하차도 또는 국철 신길역으로 우회 통행하는 불편을 해소하기 위하여 횡단보도(지하)를 설치하기 위함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신길2동 ~ 지하철5호선 신길역
- 규 모 : 횡단보도(지하)(■ 6.6×5.5m) L=130.7m
 - 출입구 : N= 3개소
 - 공원조성(3개소) : A= 1,247.8㎡

- 사업비 : 20,920백만원

(보상비 6,500 공사비 12,780 감리비 1,000 설계비 640)

□ 추진실적

- '07. 10. 8 : 타당성 조사 및 기본계획용역 착공
- '08. 1.31 : 설계용역 완료
- '08. 2.29 : 투·융자심사 요청(구→시 교통정책담당관)
- '08. 4.10 : 의견검토 통보(도시철도공사→시 도로행정담당관)
- '08. 5.15 : 투·융자심사 재요청(구→시 교통정책담당관)
- '08. 7.31 : 투자심사 요청(촉구)
 - 사업의 시급성이 없어 '09년 예산 미반영(교통정책담당관)

□ 향후 추진계획

- 서울시 교통정책담당관에서는 예산확보의 어려움으로 중기재정계획에 반영할 수 없어 투·융자심사에 어려움이 있으며, 우리 구에서는 지속적으로 건의하고 있는 상태임.

위 치 도



밝고 쾌적한 거리조성

6 노후 조명시설(가로등) 개선추진(시비)

설치 된 지 15년 이상 경과되어 노후 된 시도구간 가로등 개량공사를 시행하여 주민 편의제공 및 전기안전사고 예방을 도모하고자 하는 것으로 금년도 대상 사업 중 선유로, 도림로, 대방천길은 11월18일 공사 완료 되었으며 양평로 구간은 지하철공사 연계되어 추진 중으로 공정상 내년으로 이월 예정임.

□ 사업개요

노 선 명	구간	연장(m)	공사기간	사업규모	총사업비 (백만원)
계		8,154		280본	1,260
선 유 로	양평사거리~경인고속입구	1,764	7.21~11.18	68본	327
도 립 로	도림사거리~신길광장	1,570	7.14~11.11	58본	336
대방천길	신 풍 역~동작세무서	1,020	7.16~11.13	35본	189
양 평 로	양평교동단~영동초교육교	3,800	9.22~12.21	119본	408

□ 추진실적

○ 선유로, 도림로, 대방천길 가로등 개량공사

- '08.10월말 : 배관 배선 및 가로등 전주 완료
- '08.11. 7 : 한국전력공사 전기 수전 및 가로등 점등완료
- 공사준공
 - 선유로(11.18), 도림로(11.11), 대방천길(11.13)

□ 향후계획

- 양평로 가로등 개량공사는 지하철9호선 복구 작업과 연계추진으로
'09.3월 준공예정

7 골목길 밝은거리 조명환경 조성

어두운 골목길 보안등 추가 설치와 노후시설을 정비하여 시설물의 수준 향상을 도모하고 밝은 거리 조명 환경을 조성하고자 함.

□ 시설 현황

시설 등수	광 원 별			보 안 등 종 류 별		
	50W이하	70W	100W이상	전용주	한전주	건축물
9,323	5,433	311	3,579	2,575	4,814	1,695

□ 사업개요

- 사업규모 : 376백만원(3,400등)
 - 보안등 신설·개량 : 290등
 - 보안등 유지보수 : 3,110등

□ 추진실적(10월말 기준)

- 보안등 신설·개량 : 222등
 - 한전주 신설 : 28등
 - 전용주 신설 : 15등
 - 건축물 신설 : 26등
 - 기타 개량 : 153등
- 보안등 유지보수(민원접수 : 2,582건)
 - 램프 교체 : 1,176건
 - 안정기 교체 : 890건
 - 등기구 교체 : 209건
 - 기타 : 4,100건

8

에너지절약을 위한 가로등 격등제 추진

고유가 극복을 위한 에너지절약대책의 일환으로 '08년 6.25일부터 가로등 격등제를 시행하고 있으며, 현재 유가가 많이 내렸으나 국제유가가 유동적이고 정부의 해제 지침이 없으므로 정부의 정책에 맞추어 격등제를 계속 유지코자 함.

□ 국제유가 동향

(단위: US달러/B)

油 種	'06평균	'07평균	'08.1.4	'08.7.15	'08.11.10
Dubai	61.55	68.34	91.3	140.22	55.78

□ 우리 구 가로등 현황

- 가로등 : 69개 노선 8,294등

□ 추진실적

- '08.6.25 ~ 7.17일
 - 전체 가로등수의 23%인 1,882등 소등
- '08.6.25 ~ 현재까지
 - 가로등 격등제 확대추진에 따라 가로등수의 38%인 3,112등 소등
 - 30룩스이상 전노선(56개노선) 가로등 격등(1,970등 소등)
 - 보행등 1,142등 소등
 - 안양천변 보행육교 3개소 경관조명 소등
- 학교·학원가·우범지역 등은 소등지역에서 제외
- 에너지 절감효과 : 년평균 3,449천Kwh, 190,729천원 예상

□ 향후계획

- 범국가적인 에너지절약에 동참하기 위하여 당분간 가로등 격등제 유지

안전한 도로 유지 관리

9 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선

사업개요

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 68,720m
- 사업기간 : '08.3~12월
- 사업규모
 - 보도정비 : A= 70a
 - 아스팔트정비 : A= 170a
 - 콘크리트포장 : A= 30a
- 총사업비 : 1,907백만원

추진실적

- 공사착공 : '08. 3.13
- 공사실적(공정 95%)
 - 영등포1동 645-38~645-46외 110건 정비완료

향후 추진계획

- '08.12월 준공예정

10 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리

사업개요

- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업기간 : '08.3~12월
- 사업규모
 - 지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
 - 난간 · 과속 방지턱 및 블라드 설치 등 도로부속물
- 총사업비 : 1,230백만원

추진실적

- 공사착공 : '08. 3.19
- 공사실적(공정 95%)
 - 과속방지턱 설치 및 보수 225m, 과속방지턱 도색 900m²
 - 디자인웬스 설치 및 보수 678m
 - 보도육교 세척 7개소, 지하보도 세척 및 도색 3개소
 - 장애인편의시설 설치 및 보수 54개소 11a

향후 추진계획

- '08.12월 준공예정

11 사회적약자를 위한 도시환경개선사업

우리구와 (사)주거복지연대와 파트너십을 위한 협약에 의해 추진하고 있는 『사회적 약자를 위한 도시환경 개선사업』의 도로분야 기초조사가 완료됨에 따라 단·중·장기 계획을 수립 장애인편의시설 등을 개선하여 사회적 약자를 위한 복지서비스를 제공하고자 함

□ 추진근거

- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 추진 협정체결('06.10.13)
 - 주민생활지원과
- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 실태조사 보고(구청장방침,'07.4.10)
 - 실태조사 총 1,228건 중 도로분야 530건(43%)

□ 정비대상

구 분	계	정비대상	비예산 사업 (기동반 보수 등)	타기관 이첩
건 수	530건	243건	92건	195건

※금년도 정비대상 44건 정비완료(2008.10.31일 기준)

□ 중점정비사항

- 점자블럭 미설치구간 및 잘못 시공된 구간
- 보도턱 발생 및 보차도 미구분 지역
- 보도 요철 및 보행자 방호시설 등

□ 향후 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'07	'08	'09	'10 이후
건 수	243건	24건	44건	30건	145건
금 액	3,000	50	430	200	2,320
사업내용	보도정비 및 보도신설	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비 및 신설

12 도로굴착복구 효율적 추진

도로굴착으로 인한 공사장의 관리실태가 부실하여 이에 따른 시민 불편을 가중 시키고 있어 신속하고 책임 있는 도로복구로 시민편의 위주의 공사장 관리로 개선하고자함.

□ 굴착복구 포장도로의 체계적인 사후관리

- 도로굴착복구기금 가용범위 내에서 매년 정기적으로 노후 불량도로 사업추진
- 재원조달 : 도로굴착복구기금 사용

□ 시민편의 위주의 공사장 관리

- 중복굴착 방지를 위한 사전 심의 · 심의 조정
 - 사업 시행시기, 굴착방법 등을 심의 · 조정하여 도로굴착 최소화
- 교통소통대책을 사전 심의하여 시민 생활불편 최소화
 - 간선도로에서는 야간(22:00 ~익일06:00)또는 휴일에 공사 시행
- 도로 공사장에 대한 순찰강화와 정기 · 수시 점검 실시
 - 허가조건 및 교통대책 이행여부 확인 및 재해대비 안전지도

□ 도로 굴착복구시 GIS지도 활용

- 굴착허가신청시 GIS지도 첨부
 - 효율적이고 안전한 도로굴착사업계획 수립 유도
- 굴착공사시 GIS지도를 활용하여 공사계획 및 시설물 보호
 - 도로굴착중 GIS지도를 활용함으로써 지하시설물 손상사고 방지

□ 도로 굴착 허가 현황('08. 10.31현재)

- 금년도 실적 : 1,207건 L=39,258m A=40,189m²
- 내년도 계획 : 920건 L=28,600m A=34,320m²

13 초동제설 기간 중 출동체제 유지

24시간 비상근무체제 운영

- 기 간 : '08.11.15.~'09. 3.15.(4개월간)

제설장비 및 자재비축

- 제설장비 : 38대
 - 다목적제설차 : 3대
 - 염화칼슘살포기 : 32대 (대형 3대, 중형 4대, 소형 25대)
 - ※ 노후된 대형염화칼슘살포기 2대 교체완료
- 제설자재 : 염화칼슘 및 소금 35,000포 확보
 - 염화칼슘 30,000포 (전년도 이월량 22,400포)
 - 소 금 5,000포 (전년도 이월량 1,200포)

14 주민과 함께하는 제설문화 전개

구민과 함께하는 내집 내점포앞 눈치우기 제설문화 정착

- 내집 내점포앞 눈치우기 문화 정착으로 제설참여율 향상
- 직장 및 직능단체, 각종 보도매체를 통한 대시민 홍보강화 및 참여유도
- 취약지역 주민 및 반단위 책임제설 담당자에게 기상상황 및 제설작업 시행 통보 등 문자메시지 전송 확대 시행
- 노약자·장애인·독거노인 등 눈을 치울 수 없는 주민들에 대한 지원
 - ▷ 직능단체 등을 활용 제설자율봉사단 구성 확대

누구나 쉽게 운반 및 살포할 수 있도록 소포장 염화칼슘 시범배치

- 10kg - 500포 제작 동별(25포) 취약지역 시범배치

학교주변 제설용 염화칼슘 배치(25개소, 125포)

제설유공자 표창수여

- 제설참여 유도를 위해 제설작업에 공로가 큰 공무원, 환경미화원, 학생, 시민, 단체 등에 표창 수여

2008년 도로사업별 세부추진 현황

(단위 : 백만원)

연번	사업명	2008 예산				집행액	추진사항
		계	구비	시비	국비		
계		16,085	7,198	8,887		5,804	
1	신길로~도림로간 도로확장공사	6,623		6,623		714	7월 : 건물철거 완료 공사중(47%)
2	영진시장~대신시장간 도로개설공사	1,506	1,506			774	7월 : 보상협의 통지 공사중(76%)
3	대림동 1051-9~810-56간 도로개설공사	1,375	690	685		972	9월 : 수용재결 완료 11월 : 공사계약
4	도시계획시설(도로) 매수청구등 보상비 지급	450	450			259	보상 : 소송진행중
5	신길동 4300-37~4326-2간 도로개설공사	240	240			171	2필지중 1필지 보상완료
6	관내포장도로정비등 소파보수공사	1,907	1,907			1,285	공사중(95%) (추경 100백만원 포함)
7	관내 도로시설물 보수 공사 및 장애인 편의 시설 설치 공사	1,230	1,230			719	공사중(95%) (추경 100백만원 포함)
8	사회적약자를 위한 도시환경 개선사업	430	430			278	공사완료(100%) (사회복지과 180백만원 포함)
9	여의도 지하보도 개선사업	45	45			42	용역완료(100%)
10	신길7동 1288육군아파트앞 방음벽 설치공사	280		280			공사중(50%)

연번	사 업 명	2008 예산				집행액	추진사항
		계	구비	시비	국비		
11	신길동4482 대길초교앞 방음벽 교체공사 실시설계용역	13		13			용역중(50%)
12	08제설작업용역	95	70	25			10월 계약 11.15 부터 용역 시행
13	가로등시설물정비공사 (연간단가)	112	112			59	공사중(80%) (추경 30백만원 포함)
14	보안등 설치개량 및 유지보수공사(연간단가)	378	378			144	공사중(80%) (추경 27백만원 포함)
15	여의도 아파트(주거)지역 광원교체 공사	140	140			97	공사완료
16	대방천길 가로등 개량공사	189		189		3	11월 13일 준공
17	양평로 가로등 개량공사	408		408			공사중(5%) 지하철9호선복구 연계
18	선유로 가로등 개량공사	327		327		154	11월 18일준공
19	도림로 가로등 개량공사	337		337		133	11월 11일 준공

Ⅲ. 2009 주요업무 계획

1 도림로 도로확장공사(시비)

□ 추진방향

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→ 35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비촉진지구내)
 - 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : '09년 ~ '13년
- 총사업비 : 61,070백만원(보상비 56,720 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,590백만원(보상비 21,440 공사비 1,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,480백만원(보상비 35,280 공사비 3,200)

□ 세부 추진계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	사업인가고시	1 식	경계현황측량	보상물건조사	사업인가고시	
	보상추진	300㎡	-	-	-	300㎡
사업비: 2,000백만원		보상 2,000	-	-	-	보상 2,000

2 영진시장 ~ 대신시장간 도로개설공사

□ 추진방향

- 위치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(기개설 820m, 미개설 450m)
- 사업기간 : '94 ~ '10년 이후
- 총사업비 : 23,910백만원(보상비20,139 공사비 3,656 설계비 115)

□ 세부 추진계획 (2차구간)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	사업인가고시	1 식	경계현황측량	보상물건조사	사업인가고시	
	보상추진	-	-	-		987㎡
사업비: 3,700백만원		보상 3,700	보상	보상	보상	보상 3,700

3 대방천변 도로개설공사

□ 추진방향

- 위치 : 신길동 381-9 ~ 신길동 455-19간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - 기개설 : 660m('98년 ~ '01년)
 - 미개설 : 420m
- 사업기간 : '98년 ~ '12년
- 총사업비 : 9,150백만원(보상비 7,700 공사비 1,400 설계비 50)

□ 세부 추진계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	기본 및 실시 설계용역	1식	착공	자문 및 심의	성과품 완료	
사업비: 50백만원		실시설계 50			실시설계 50	

4 도시계획시설(도로)매수청구 등 보상비 지급

□ 추진방향

- 규모
 - 도시계획시설(도로) 매수청구 현황 : 총 23건, 3,547㎡
 - '09년 매수청구 토지매입 : 3건 83㎡
 - 소송판결(부당이득금) : 총 10건 2,650㎡
 - 소송패소 토지 : 2건 287㎡
 - 부당이득금 소송비용 : 3건 987㎡
- 총사업비 : 6,620백만원

□ 세부 추진계획

(단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	매수청구	83㎡	-	40㎡	43㎡	-
	소송판결 (부당이득금)	1,274㎡	200㎡	400㎡	400㎡	274㎡
사업비:752백만원		공보 752	공보 125	공보 250	공보 250	공보 127

5 관내 포장도로정비 등 소파보수공사

- 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선
 - 정비대상 : 이면도로(구도로): 35,720m
 - 사업기간 : '09. 1 ~ 12
 - 사업비 : 1,800백만원

6 관내 도로시설물 보수 및 장애인편의시설 설치공사

- 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 및 장애인편의시설 설치
 - 정비대상 : 관내 시설물
(지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소, 난간·과속방지턱 등 도로부속물)
 - 사업기간 : '09. 1 ~ 12
 - 사업비 : 1,100백만원

7 여의도 지하보도 환경개선사업

- 이용이 불편한 지하보도 폐쇄후 횡단보도 설치로 보행편의 제공
 - 사업내용 : 여의도 원효대교앞 지하보도 폐쇄후 지상 횡단보도 설치
 - 사업기간 : '09. 1 ~ 09
 - 사업비 : 400백만원

8 노후 조명시설 연차적 개선추진

- 추진계획
 - 사업규모 : 1,560백만원(시비 1,500백만원, 구비 60백만원)
 - 가로등 개량 350등(시도 250등, 구도 100등)
 - 용호로, 여의동로, 도림천로 : 250등 개량
 - 여의도 주거지역 광원교체 : 100등 개량
 - 사업기간 : '09. 3 ~ 12월

9 골목길 밝은 거리 조명환경 개선

- 추진계획
 - 사업규모 : 450백만원
 - 보안등 신설·개량 : 300등 - 보안등 유지보수 : 4,200등
 - 사업기간 : '09. 3 ~ 12월

IV. 특수사업

1 용호로 및 여의동로 보행환경 개선사업 (시비+구비)

서울거리 르네상스 및 매년 5월 개최되는 서울시의 Hi Seoul 페스티벌과 연계하여 여의도 봄꽃축제는 물론 가을철 세계불꽃축제를 즐기는 국내·외 관광객에게 쾌적한 보행환경을 제공코자 함

□ 위치 : 용호로(원효대교남단~여의교북단) 및 여의동로(여의교북단~여의상류IC)

□ 사업개요

- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1.7km, A=120a
- 사업기간 : '09. 1. ~ '09. 11.
- 총사업비 : 1,785백만원(시비 892백만원, 구비 893백만원)

□ 향후추진계획

- 설계용역
 - '09. 1월 : 정비물량 현장조사 및 검토
 - '09. 2월 : 서울시 보도디자인 심의 및 주민설명회
 - '09. 3월 : 설계도서 작성
- 공사
 - '09. 4월 : 공사착공
 - '09. 11월 : 공사준공

□ 기대효과

- 여의교 앞 지하철 9호선 복구 및 개통과 함께 보도환경개선으로 주민편익 극대화
- 여의도 관광특구 및 배후도시 지역개발(뉴타운, 벤처벨리, 여의도금융센터)과 연계한 여의도의 국제관광 명소화에 기여
- 여의도샛강생태공원, 양카라공원, 인도네시아대사관 및 한강시민공원을 잇는 주요간선도로로서 각종 축제를 즐기는 국내·외 관광객에게 수준 높은 보행환경 제공
