

2007. 제132회 임시회

2007. 11. 2 ~ 11. 12



2007년도

주요사업 추진실적



2007. 11.

도 로 과

순서

- 일반현황 1
- 사업추진 개요 4
- 2007 사업추진 실적 5

I. 일반 현황


1

인 력

구 분	계	일 반 직						기능직(기타)			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	10급
정 원	40		1	5	7	7	4	1	4	7	4
현 원	37		1	4	12	3	4	2	8	3	0
과부족	-3			-1	5	-4		1	4	-4	-4

2

조 직

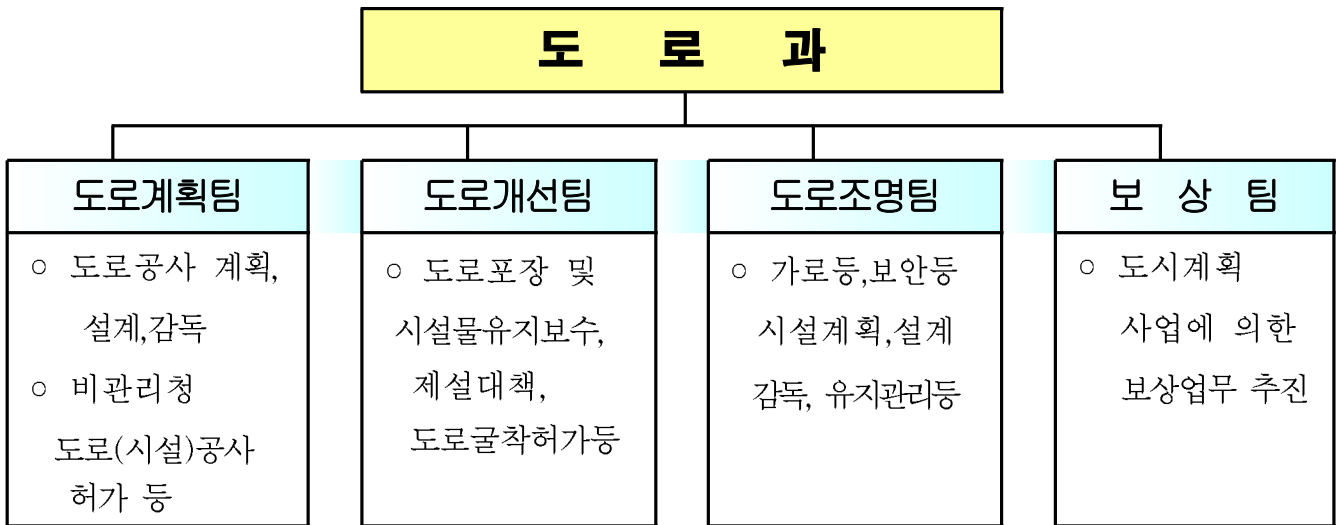

3

주요시설 및 장비 등

(2007. 10 . 15현재)

- 도 로 : 387Km [도로율 23.16% (서울시:21.68%),포장율100%]
- 간 선 도 로 : 75.66Km (경인로 외 27개소)
- 교 량 : 12개소 (양화교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 신정교, 양평교, 염창교, 여의교, 구로교)

- 고 가 차 도 : 6개소 (문래, 선유, 도림, 도림천, 신길, 영등포역)
- 보 도 육 교 : 11개소 (우신초교앞 보도육교 외 10개소)
- 지 하 차 도 : 10개소 (국회앞, 영등포, 대방, 신길, 여의2교, 여의교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측)
- 지 하 보 도 : 3 개소 (여의초교앞, 원효대교앞, KBS별관앞)
- 입체교차로 : 8개소 (영등포R, 여의하류, 목동교 동측IC, 성산대교남단, 염창IC 여의상류, 원효대교 남단IC, 양화대교 남단IC)
- 공 동 구 : 6.18 Km (전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관)
- 가 로 등 : 7,436 등
- 보 안 등 : 8,980 등

□ 유관기구 현황

명 칭	구 성 인 원 (명)		목 적	비 고
	내 부	외 부		
기술자문위원회	부구청장외1인	13	공사설계 등 전문기술 자문	15인이내
도로관리심의회	부구청장외5인	10	도로굴착관련 전반적 사전심의	10 ~ 20인
도로굴착복구 기금운용심의위원회	건설교통국장 외5인	3	도로굴착복구기금 운영 심의	
보 상 협 의 회	부구청장외7인	2	보상업무와 관련 전반적 자문	

□ 장 비 현 황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 럭	대	1	도로보수 작업용	
다목적도로관리차	대	3	제설작업등	

4 예산 현황

예산 현액

(단위 : 천원)

구분	예산현액 (①+②)	①예산액		②이월액		비고
		당초예산	추경등	명시	사고	
계	19,103,267	13,569,805	2,238,911	300,000	2,994,551	
일반회계	16,490,799	10,957,337	2,238,911	300,000	2,994,551	
특별회계						
기금	2,612,468	2,612,468				

※ 간주처리, 이체 등으로 증감된 예산액은 “추경 등”란에 기재

집행 예상액

(단위 : 천원)

구분	①예산현액	②집행액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집행액	집행예정액		
계	19,103,267	9,428,666	8,918,194	0	756,407
일반회계	16,490,799	8,456,998	7,277,394	0	756,407
특별회계					
기금	2,612,468	971,668	1,640,800		

II. 사업추진 개요

미션 안정적인 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도로환경 조성

전략 목표	성과 목표	주요 사업
1. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1-1 도로개설 및 확장사업 지속 추진	1. 미개설 도시계획시설(도로) 연차적 추진 2. 신길로 ~도림로간 도로확장공사 3. 영진시장 ~대신시장간 도로개설공사 4. 영등포역(남측)~대우아파트간 도로확장공사 5. 대림2동 1051-9*810-56간 도로개설공사
2. 밝고 안전한 도시를 위한 도로조명관리	2-1 밝고 쾌적한 거리조성	6. 노후 조명시설 연차적 개선추진 7. 도로조명 종합관리시스템 구축
3. 안전한 도로유지관리	3-1 안전하고 체계적인 도로관리 3-2 주민과 함께하는 제설체계 유지	8. 도로포장 수준 향상으로 주민생활 환경개선 9. 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 10. 도로굴착복구 효율적 추진 11. 초동 제설기간 중 출동체제 유지 12. 주민과 함께하는 제설문화 전개

주요사업 추진 총괄

(단위 : 건)

구분	대상사업			추진 실적					
	당초 사업	2006년 이월사업	2007년 추가사업	계	완료 사업	추진중 사업	2008년 이월사업	취소 및 불가사업	기타
34	28	3	3	34	10	24			

Ⅲ. 2007 사업추진 실적

추진 현황

(단위 : 건)

구분	계	완료사업	추진중인 사업	2008년 이월대상	취소(불가) 사업
계	34	10	24	-	-
도로계획팀	11	-	11	-	-
도로개선팀	12	7	5	-	-
도로조명팀	11	3	8	-	-

완료사업 : 10건

연번	팀별	사업명	예산액	집행액	비고
1	도로개선	06/07제설작업용역	82,472	65,230	구비 (사고)
2	"	장애인편의시설공사	150,000	127,500	구비 (당초)
3	"	대림3동 681~679-9칸 도로정비공사	140,000	128,709	구비 (당초)
4	"	대림3동 754-7~754-26칸 도로정비공사	120,000	100,000	구비 (당초)
5	"	신길동 120-46~121칸 보도정비공사	120,000	113,708	구비 (당초)
6	"	신길동 970~123-7칸 보도정비공사	180,000	170,562	구비 (당초)
7	"	양평1동 38-1 오목교진입 도로변 방음벽개량공사	350,000	324,772	시비 (당초)
8	도로조명	신길문래길가로등개량	534,000	482,977	시비 (당초)
9	"	가마산길가로등개량	390,000	335,651	시비
10		대신시장주변가로등설치	80,000	66,942	구비 (당초)

완료사업 내역

1. 06/07제설작업용역

제설기간내 강설시 관내 간선도로 및 취약지역 이면도로등의 초동제설 작업을 위한 용역시행으로 강설로 인한 주민불편사항 사전 해소

사업개요

- 위 치 : 영등포구 관내 주요간선도로 및 보조간선도로, 취약지역 등
- 규 모 : 여의도광장로등 17개노선 48.22km, 관내 고갯길등 취약 지역 18개소 제설
- 사업기간 : '06.11.15 ~ '07.3.15
- 사 업 비 : 82,471천원

추진경위

- 공사발주 : '06. 9. 29
- 공사계약 : '06. 10. 24
- 공사착공 : '06. 10. 25
- 공사준공 : '07. 3. 20

추진실적

- 상시대기 97일, 예보대기 17.5일, 제설작업 5.5일

예산액 및 집행액

- 예산액 : 82,471천원
- 집행액 : 65,230천원

2. 장애인편의시설 설치공사

교통약자의 이동편의증진법 제10조에 의거 횡단보도 신설 및 이전, 보도진·출입부에 장애인편의시설을 설치하여 편익증진에 기여

사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 규 모 : 보도턱낮추기 50개소,
보도정비 및 점자블록설치 A=8.9a
- 사업기간 : '07. 3. 9~ 9. 14
- 총사업비 : 150,000천원

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 5
- 공사계약 : '07. 3. 8
- 공사착공 : '07. 3. 9
- 공사준공 : '07. 9.14

추진실적

- 보도턱낮추기 50개소, 보도정비 및 점자블록설치 A=8.9a

예산액 및 집행액

- 예산액 : 150,000천원
- 집행액 : 127,500천원

3. 대림3동 681~679-9간 도로정비공사

주민생활에 불편을 주는 주택가 이면도로상 노후된 도로를 정비하여
안전사고 예방 및 주거환경 개선에 기여

사업개요

- 위 치 : 대림3동 681~679-9번지
- 규 모 : 아스팔트포장 B=8~10m, L=295m, A=24.22a
- 사업기간 : '07. 3. 16 ~ 5. 28
- 사 업 비 : 140,000천원

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 9
- 공사계약 : '07. 3. 16
- 공사착공 : '07. 3. 16
- 공사준공 : '07. 5. 28

추진실적

- 아스팔트포장 A=24.22a, L형측구 설치 : L=503m
도로경계석 설치 L=468m

예산액 및 집행액

- 예 산 액 : 140,000천원
- 집 행 액 : 128,709천원

4. 대림3동 754-7 ~ 754-26간 도로정비공사

주민생활에 불편을 주는 주택가 이면도로상 노후된 도로를 정비하여
안전사고 예방 및 주거환경 개선에 기여

사업개요

- 위 치 : 대림3동 754-7 ~ 754-26번지
- 규 모 : 아스팔트포장 B=3~5m, L=275m, A=8.6a
- 사업기간 : '07. 3. 16 ~ 5. 28
- 사 업 비 : 120,000천원

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 9
- 공사계약 : '07. 3. 16
- 공사착공 : '07. 3. 16
- 공사준공 : '07. 5. 28

추진실적

- 아스팔트포장 A=8.6a, L형측구 설치 : L=507m
도로경계블록 설치 L=516m

예산액 및 집행액

- 예 산 액 : 120,000천원
- 집 행 액 : 100,000천원

5. 신길동120-46~1212간 보도정비공사

주택가 이면도로상 노후 및 훼손된 보도를 정비하여 보행자의 안전사고 예방 및 통행불편을 해소하고 쾌적한 거리환경을 조성코자 함

사업개요

- 위 치 : 신길동 120-46~1212
- 규 모 : 보도포장 B=2.6~3.0m, L=350m, A=9.1@
- 사업기간 : '07. 3. 21 ~ 7. 5
- 사 업 비 : 120,000천원

추진경위

- '07. 2. 12 : 공사발주
- '07. 3. 21 : 공사계약 및 착공
- '07. 7. 5 : 공사준공

추진실적

- 소형고압블럭 포장 : 9.1 @
- 보차도경계석 설치 : 507 m
- 도로경계블럭 설치 : 467 m

예산액 및 집행액

- 예 산 액 : 120,000천원
- 집 행 액 : 113,708천원

6. 신길동970~123-7간 보도정비공사

주택가 이면도로상 노후 및 훼손된 보도를 정비하여 보행자의 안전사고 예방 및 통행불편을 해소하고 쾌적한 거리환경을 조성코자 함

사업개요

- 위 치 : 신길동970 ~ 123-7
- 규 모 : 보도포장 B=1.8~2.4m, L=815m, A=13.63@
- 사업기간 : '07. 3. 21 ~ 7. 5
- 사 업 비 : 180,000천원

추진경위

- '07. 2. 12 : 공사발주
- '07. 3. 21 : 공사계약 및 착공
- '07. 7. 5 : 공사준공

추진실적

- 소형고압블럭 포장 : 13.63 @
- 보차도경계석 설치 : 761 m
- 도로경계블럭 설치 : 702 m

예산액 및 집행액

- 예 산 액 : 180,000천원
- 집 행 액 : 170,562천원

7. 양평1동 38-1 오목교 진입도로변 방음벽개량공사(시비사업)

구간 경계도로인 주요간선도로상 노후된 기존 방음벽을 도시미관과 주위 환경에 어울리는 방음벽으로 정비하여 구민에게 더 많은 편익을 제공하고 비교우위를 통해 새롭게 변화하는 우리구의 면모를 나타냄

사업개요

- 위 치 : 양평동2가 27-2~39-1호간
- 규 모 : 방음벽개량 H=4.5~6.0m, L=244m
- 사업기간 : '07. 4.16~ 8. 8
- 총사업비 : 350,000천원

추진경위

- 공사발주 : '07. 2.28
- 공사계약 : '07. 4.11
- 공사착공 : '07. 4.16
- 공사준공 : '07. 8. 8

추진실적

- 방음벽교체(알루미늄흡음형→투명형+흡음형)
- H=2.0~5.5→4.5~6.0m, L=244m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 350,000천원
- 집행액 : 324,772천원

8. 신길문래길 가로등 개량(시비사업)

우리구 현대아파트 ~ 신길로구간 노후 가로등 시설에 대한 개량을 실시하여 도로이용 차량 및 보행자의 안전사고예방을 위함

사업개요

- 공사구간 : 현대아파트 ~ 신길로
- 공사기간 : '07. 4. 11 ~ 10. 7
- 공사내용
 - 가로등 설치 1등용 74본 · 2등용 13본, 보행등설치 74등
 - 분전반 철거 3면 · 설치5면
 - 기타 배관 및 배선 2,981m개량

추진경위

- 공사발주 : '07. 3. 15
- 공사계약 : '07. 4. 11
- 공사착공 : '07. 4. 11
- 공사준공 : '07. 9. 14

추진실적

- 가로등 1등용 74본 · 2등용 13본, 보행등 74등 설치완료
- 분전반 철거 3면 · 설치 5면 완료
- 배관 · 배선 2,981m 개량완료
- 기준조도 30룩스로 개량 완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 534,000천원
- 집행액 : 482,977천원

9. 가마산길 가로등 개량(시비사업)

우리구 도림천 ~ 도림로구간의 노후 가로등시설에 대한 개량을 실시하여 도로이용 차량 및 보행자의 안전사고예방을 위함

사업개요

- 공사구간 : 도림천 ~ 도림로
- 공사기간 : '07. 4. 16 ~ 10. 12
- 공사내용
 - 가로등 설치 1등용 54분 · 2등용 4분, 보행등설치 54등
 - 분전반 철거 3면 · 설치4면
 - 기타 배관 및 배선 1,922m개량

추진경위

- 공사발주 : '07. 3. 15
- 공사계약 : '07. 4. 16
- 공사착공 : '07. 4. 16
- 공사준공 : '07. 8. 27

추진실적

- 가로등 1등용 54분 · 2등용 4분, 보행등 54등 설치완료
- 분전반 철거 3면 · 설치 4면 완료
- 배관 · 배선 1,922m 개량완료
- 기준조도 30룩스로 개량 완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 390,000천원
- 집행액 : 335,651천원

10. 대신시장주변 가로등 개량

우리구 대신시장길 가로등 미설치구간에 가로등 신설하여 도로이용 차량 및 보행자의 안전 사고예방 및 도심 도로환경개선을 위함

사업개요

- 공사구간 : 신길1동 115-1 ~ 136(대신시장길)
- 공사기간 : '07. 7. 4 ~ 9. 15
- 공사내용
 - 가로등 설치 9본 · 개량 2본, 벽부등설치 4등, 보행등설치 9등
 - 분전반 설치 1면
 - 기타 배관 및 배선 250m개량

추진경위

- 공사발주 : '07. 6. 19
- 공사계약 : '07. 7. 4
- 공사착공 : '07. 7. 4
- 공사준공 : '07. 9. 18

추진실적

- 가로등 1등용 9본 · 벽부등 4등 · 보행등 9등 설치완료, 가로등개량 2본
- 분전반 설치 1면 완료
- 배관 · 배선 250m 개량완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 80,000천원
- 집행액 : 66,942천원

추진중인 사업 : 24번

연번	팀별	사업명	예산액	집행액	비고
1	도로계획	도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 지급	872,502	773,104	구비 (사고+당초)
2	"	대림동 1022-4~1025-13간 도로개설공사	21,545	1,701	구비 (사고)
3	"	도림동 170-3~226간 디자인웬스 구매설치	88,000	-	구비 (추가)
4	"	영등포역(남측)~대우아파트간 도로확장공사	1,111,867	26,965	구비 (사고+당초)
5	"	5호선 신길역 동선개선사 업 타당성조사 및 기본계획 용역	40,000	-	구비 (추가)
6	"	대림2동 705-8 ~1057-64 간 도로개설공사	760,000	722,649	구비 (사고+당초)
7	"	신길동 263-37 ~ 321-1 간 도로개설공사	1,000,000	-	구비 (사고+당초)
8	"	영진시장~대신시장간 도로개설공사	3,830,676	2,231,160	구비+시비 (사고+추가)
9	"	대림동1051-9~810-56간 도로개설공사	1,595,490	55,002	구비+시비 (사고+당초)
10	"	신도림역~영등포역간 도로확장공사(3차)	400,545	239,896	시비 (사고)
11	"	신길로~도림로간 도로확장공사	12,563,750	6,001,712	시비 (사고+당초)

연번	팀별	사업명	예산액	집행액	비고
12	도로개선	2007관내포장도로정비등 소파보수공사	1,800,000	1,344,221	구비 (당초)
13	"	2007관내포장도로정비등 소파보수공사(추경)	300,000	-	구비 (추가)
14	"	2007관내도로시설물 보수공사	1,200,000	775,866	구비 (당초+추가)
15	"	2007제설작업용역	105,000	-	구비+시비 (당초+추가)
16	"	도로굴착복구	2,612,468	971,668	기금
17	도로조명	가로등 시설물 정비	210,000	81,856	구비 (당초+추가)
18	"	문래중앙길 가로등개량	90,000	40,675	구비 (당초)
19	"	여의도KBS별관 가로등개량	180,000	-	구비 (당초)
20	"	대신시장주변 가로등 개량	50,000	-	구비 (추가)
21	"	도로조명종합관리시스템 구축	174,000	-	시비 (당초)
22	"	가로등 지중케이블정비	50,000	31,240	시비 (당초)
23	"	보안등 설치 개량 1구역	232,000	131,746	구비 (당초+추가)
24	"	보안등 설치 개량 2구역	260,000	148,577	구비 (당초+추가)

추진중인 사업 내역

1. 도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 지급

10년 이상 장기미집행 도시계획시설(도로) 매수청구 부지 및 소송 토지 매입으로 주민들의 장기민원을 해소코자 함.

사업개요

- 신길동 및 대림동 매수청구부지 매입
- 부당이득금소송 패소건 임료 지급
- 연차별 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'06년	'07년	'08년	장 래 투자
계	5,000	500	500	800	2,200	1,000
공 사 비	0					
보 상 비	5,000	500	500	800	2,200	1,000

추진경위

- '07. 4. 3 : 보상액 결정 및 통지
- '07. 5. ~ 9 : 매수청구 보상비 지급 및 임료지급

추진실적

- 김필신외 1인 3필지 93m² 매수완료
- 이성철외 8인외 1건 임료 지급
- 임의준 1인 2필지 980.8m² 매수완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 872,502천원(사고 72,502 본예산 800,000)
- 집행액 : 773,104천원(매수청구 : 770,717천원, 소송임료 : 2,387천원)

향후 추진계획 등

- 예산부족으로 미매수된 매수청구 잔여토지 '08년 예산확보하여 매수 완료 및 소송토지 매입.
- 집행잔액은 '04년 매수청구부지인 대림동942-7(787.2m²) '08년 매수시 포함하여 집행예정

2. 대림동 1022-4~1025-13간 도로개설공사

이면도로간 도로개설로 인한 연계도로 확보로 도로순환가능 유지

사업개요

- 위 치 : 대림동 1022-4 ~ 1025-13간
- 규 모 : B=6m, L=150m
- 연차별 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'06년	장 래 투자	비고
계	150	0	150		
공 사 비	0				
보 상 비	150		150		

추진경위

- '07. 3. 19 : 감정평가 수수료 지급

추진실적

- '07. 3. 28 : 이해형 토지매수 완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 21,545천원(사고이월)
- 집행액 : 1,701천원
 - 매수청구 : 975천원
 - 소송임료 : 726천원

향후 추진계획

- 매수완료 토지에 대한 보상금 증액 소송 진행중(1심 패소, 2심 진행)

3. 도림동 170-3~226간 디자인웬스 구매설치

영등포초등학교 등·하교 학생들과 인근 주민들의 안전사고 사전예방과 보행환경개선 및 미관증진에 기여코자 함.

사업개요

- 디자인웬스(GR-1) 550m 설치.

추진경위

- '07. 6. 4 : 영등포초등학교 학생들의 안전사고 사전예방을 위한 웬스 설치 요청.(도림제2동-3334호)
- '07. 5. 28 : 안전웬스 설치요청(민원 및 구의원 요구사항)
- '07. 8. 16 ~ : 디자인웬스구매설치 발주 및 설치

추진실적

- 총550m중 480m 설치완료
- 잔여구간 70m 설치중

예산액 및 집행액

- 예산액 : 88,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획 등

- 잔여구간 70m 설치 완료후 비용지급

4. 영등포역(남측)~대우아파트간 도로확장공사

지역주민의 통행불편 해소 및 보행환경을 개선하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 영등포1동 618-209~618-265간 외 1개소
- 규 모 : B = 4.5~8m → 8m, L = 170m
 - 하수관부설(Φ1,000~450mm), L = 179m
 - 아스팔트포장 A = 9.22a
- 총사업비 : 1,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'06년	'07년	비 고
계	1,120	0	50	1,070	
공 사 비	272			272	
보 상 비	798			798	
실시설계비	50		50		

추진경위

- 계약일 : '07. 8. 31
- 착공일 : '07. 8. 31

추진실적

- 보상계획 수립 및 공고 : '07. 6. 26
- 감정평가 의뢰 : '07. 7. 31
- 실시계획 인가 : '07. 5. 3
- 보상 협의중

예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,111,867천원(사고 41,867, 본예산 1,070,000)
- 집행액 : 26,965천원

향후 추진계획

- 보상 완료후 '08년 도로확장 예정

5. 지하철 5호선(신길역) 동선개선사업 기본계획 및 타당성용역

지하철 1호선 및 국철(경부선)에 의해 단절된 신길동 이남지역 주민의 지하철 이용 동선이 매우 불편하여 신길2동에서 국철을 횡단하는 지하보도를 설치하여 지하철 5호선(신길역)으로 바로 탑승토록 하여 우회통행 불편을 해소하고자 함

사업개요

- 위 치 : 신길2동 ~신길역 (지하철 5호선)
- 규 모 : 연장 104.7m(특수구간 32m, 개착구간 72.7m,
지하보도 ■6.6×5.5m)
- 용역비 : 40백만원
- 도급자 : (주)삼보기술단 대표 오세준

추진경위

- 계약일 : '07. 10. 4
- 착공일 : '07. 10. 8

예산액 및 집행액

- 예산액 : 40,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획

- 타당성조사용역 과업수행에 따른 기술자문 실시

6. 대림2동 705-8~1057-64간 도로개설공사

미집행 도시계획시설(도로)사업을 시행함으로써 화재등 긴급상황 발생 시 대처하고 주민의 통행 불편을 해소하기 위함.

사업개요

- 위치 : 대림동 705-8 ~ 1057-64간
- 규모 : B=12m, L=37m(기개설 26m, 미개설 11m)
- 사업비 : 1,660백만원

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	'05년	'06년	'07년	비고
계	1,660	900	0	760	
공사비	100	100			
보상비	1,560	800	0	760	

추진경위

- 계약일 : '07. 8. 31
- 착공일 : '07. 8. 31

추진실적

- '07. 6월 : 보상완료
- '07. 10월 : 건물철거(1동) 완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 760,000천원
- 집행액 : 722,649천원

향후 추진계획 등

- '07. 11월까지 도로개설 완료

7. 신길동 263-37~321-1간 도로개설공사

『신길지구중심』의 종합계획에 의한 도로개설로 중심지 기능 수행을 위한 이면도로간 연결로 확보

사업개요

- 위 치 : 신길3동 263-37~321-1
- 규 모 : 도로개설 B=8m, L=103m
- 사업기간 : '07. ~
- 사 업 비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	'06년	'07년	장래계획	비 고
계	6,200	300	700	5,200	
공 사 비	250			250	
보 상 비	5,900	300	700	4,900	
실시설계비	50			50	

추진경위

- '07. 3. 5 : 2007년 상반기 재정 투·융자심사 요청(구→시)
- '07. 3. 7 : 재정투·융자심사 요청서 회신(시→구)
- '07. 7. 16 : 2007년 하반기 재정투융자심사 요청서 회신(시→시)
- '07. 8. 8 : 2007년 하반기 재정 투·융자심사 요청(구→시)
- '07. 9. 28 : 긴급 사업비 반영 요청(구 →시)
- '07. 9. 28 : 2007년 하반기 정기 실무투자심사 결과 통보(시→구)
- '07.10. 12 : 2007년 투자심사 관련 사업비 반영요청서 회신(시→구)

추진실적

- 서울시 시비예산 반영 불가 통보

예산액 및 집행액

- 예산액 : 100,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획 등

- 사업비 집행계획 재검토 후 도로개설 여부 결정

8. 영진시장~대신시장간 도로개설공사

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 도로연계구축 및 주민 통행불편 해소

사업개요

- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장)~신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m
- 기개설 : 820m('94~'00년), - 미개설 : 450m
- 사업기간 : '94~'10년이후
- 총사업비 : 20,820백만원(시교부금: 17,120 구비:3,700)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자 ('94~'06)	'07년	'08년 소요예산	장래 투자예산
계	20,820	10,590	3,830	1,500	4,900
보 상 비	17,055	9,225	3,330 (사고2,580+당해750)		4,500
공 사 비	3,650	1,250	500	1,500	400
설 계 비	115	115			

추진경위

- '36.12.26 : 도시계획시설(도로) 결정(조선총독부고시 제722호)
- '94 ~ '00 : 일부구간 도로개설(L=820m)
- '06. 9.29 : 실시설계용역 완료(미개설 구간)
- '07. 8.16 : 공사발주(1구간)
- '07. 9. 6 : 공사계약
- '07.10.10 : 공사착공

추진실적

- 보 상 : 토지보상 1필지
- 공 사 : 가설울타리 L=150m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 3,830,676천원(사고이월:2,580,676 '07예산:1,250,000)
- 집행액 : 2,231,160천원(사고이월:2,129,160 '07예산:102,000)
- 집행잔액 : 1,599,516천원(추진중인 토지보상비 및 공사비 집행예정)

향후 추진계획

- 토지보상 2필지, 지장물 및 건물 2건(1구간)
- 가시설 및 옹벽 설치공사

9. 대림동 1051-9~810-56간 도로개설공사

대림2생활권 지구단위계획구역 개발활성화 및 주민불편해소

사업개요

- 위 치 : 대림동1051-9~810-56간
- 규 모 : B=6m, L=158m
- 총사업비 : 2,970백만원(시비:1,485, 구비:1,485)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	'05년	'06년	'07년	'08년	비 고
계	2,970	0	200	1,400	1,370	
공 사 비	237				237	구비 50% 시비 50%
보 상 비	2,683		150	1400	1,133	
실시설계비	50		50			

추진경위

- '07. 1. 8 : 측량의뢰
- '07. 6. 13 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 열람공고
- '07. 7. 18 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가·고시
- '07. 10. 5 : 무허가건축물 판독의뢰

추진실적

- 보상계획수립 준비중

예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,595,490천원(당초 1,400,000 + 사고 195,490)
- 집행액 : 55,002천원

향후 추진계획 등

- 10월중 보상계획 수립 후 감정평가 및 보상시행
- '08년 공사발주 및 착공

10. 신도림역~영등포역간 도로확장공사 3차 (시비사업)

경인로 교통량 증대에 따른 지역간 연결도로 확보 및 교통량을 분산하여 교통소통 원활 및 지역발전에 기여코자 함.

사업개요

- 위 치 : 도림동 265-6~162-70간
- 규 모 : B=12→20m, L=575m
- 공사기간 : '01 ~ '07년
- 총사업비 : 17,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자 ('05년 이전)	'06년	비 고
계	17,900	17,300	600	
공 사 비	2,600	2,000	600	
보 상 비	15,200	15,200		
실시설계비	100	100		

추진경위

- '00. 10. 12 : 도시계획시설(도로)결정(서고시 제283호)
- '04. 8. 20 : 1차공사 완료(L=135m)
- '07. 4. 20 : 2차공사 완료(L=300m)
- '06. 5. 17 : 3차공사 시행(L=140m)

추진실적

- 건물철거 7개동
- 아스팔트포장 23a 점토브릭포장 2.7a 흙관부설 100m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 400,545천원 (사고이월)
- 집행액 : 239,896천원

향후 추진계획 등

- 서울지방경찰청 교통규제 심의 완료 후, 차선도색 및 공사 준공예정

11. 신길로~도림로간 도로확장공사 (시비사업)

신길로~도림로간 단절된 도로연계구축 및 하수암거 확대·개량으로 상습 침수지역 해소 및 개발 활성화 기여

사업개요

- 위 치 : 신길동 254-1(신길로)~347-40(도림로)
- 규 모 : 도로확장 B=15m → 30m , L=780m
- 기개설 : 420m, 미개설 : 360m
- 기 간 : '97년 ~ '09년
- 총사업비 : 52,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'06년	'07년	'08년	비 고
계	52,800	32,630	8,000	6,000	6,170	
공 사 비	7,020	3,650	1,000		2,370	
보 상 비	45,700	28,900	7,000	6,000	3,800	
설 계 비	80	80				

추진경위

- '78. 12. 17 : 도시계획시설(도로)결정(건고시 제393호)
- '02. 4. 28 : 1단계 공사완료(L=420m)
- '04. 4. 21 : 5차 실시계획인가(서고시 제2005-100호)
- '06. 11. 6 : 공사착공

추진실적

- 보상 : 토지보상 3건, 건물(무허가) 87동, 영업권보상 142건
- 공사 : 건물철거 34동, 흙관부설 : L = 374m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 12,563,748천원('07예산 6,000,000천원+사고6,563,748천원)
- 집행액 : 6,001,712천원(보상비 5,593,641천원, 공사 408,070)
- 집행잔액 : 6,562,036천원(보상비 6,023,191천원, 공사 538,845)

향후 추진계획

- '07년 12월까지 토지 3필지(785㎡, 5,397,018천원) 보상완료
- 보도조성 완료 후 공사준공

12. 2007관내포장도로정비 등 소파보수공사

동시 다발적이며 불특정하게 발생되어 주민생활에 불편을 주는 노후·불량 도로를 연간단가계약 사업으로 신속히 정비하여 보행 및 차량통행에 원활을 기하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 :
 - 아스팔트정비 : A=181a 콘크리트정비 A = 19a 보도정비 : A = 79a
- 사업기간 : '07. 3.14 ~ 12. 31
- 총사업비 : 1,800,000천원

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 6
- 공사계약 : '07. 3.13
- 공사착공 : '07. 3.14

추진실적

- 아스팔트정비 : A=180a 콘크리트정비 A = 18a 보도정비 : A = 79a

예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,800,000천원
- 집행액 : 1,344,221천원

향후 추진계획 등

- '07.10월중 공사완료 예정

13. 2007관내포장도로정비 등 소파보수공사(추경)

동시 다발적이며 불특정하게 발생되어 주민생활에 불편을 주는 노후·불량 도로를 연간단가계약 사업으로 신속히 정비하여 보행 및 차량통행에 원활을 기하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 :
 - 아스팔트정비 : $A=42a$ 콘크리트정비 $A = 5a$ 보도정비 : $A = 12a$
- 사업기간 : '07. 10. 4 ~ 12. 31
- 총사업비 : 300,000천원

추진경위

- 공사발주 : '07. 9. 5
- 공사계약 : '07. 10. 4
- 공사착공 : '07. 10. 14

추진실적

- 아스팔트정비 : $A=5a$ 콘크리트정비 $A = 2a$ 보도정비 : $A = 7a$

예산액 및 집행액

- 예산액 : 300,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획 등

- '07.11월중 공사완료 예정

14. 2007관내 도로시설물 보수공사

관내 도로시설물의 노후, 훼손 및 파손된 개소에 대한 신속한 보수로 시설물 이용 주민들의 안전사고 미연방지 및 도시미관 증진에 기여

사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 규 모 : 지하보도세척 및 보수 N=3개소, 보도육교 보수 N=8개소, 과속방지턱 도색 $A=2,000m^2$, 과속방지턱 신설 및 보수 $L=350m$, 난간보수 및 설치 $L=400$ 경간 등
- 사업기간 : '07. 3. 9~'08. 2. 28
- 총사업비 : 1,200,000천원

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 5
- 공사계약 : '07. 3. 8
- 공사착공 : '07. 3. 9

추진실적

- 지하보도세척 및 보수 N=3개소, 보도육교 보수 N=8개소, 과속방지턱 도색 $A=1,890m^2$, 과속방지턱 신설 및 보수 $L=300m$, 난간보수 및 설치 $L=357$ 경간 등

예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,200,000천원
- 집행액 : 775,866천원

향후 추진계획 등

- '07.12월중 공사완료 예정

15. 07/08제설작업용역

제설기간내 강설시 관내 간선도로 및 취약지역 이면도로등의 초동 제설 작업을 위한 용역시행으로 강설로 인한 주민불편사항 사전 해소

사업개요

- 위 치 : 영등포구 관내 주요간선도로 및 보조간선도로, 취약지역 등
- 규 모 : 여의도광장로등 17개노선 48.22km, 관내 고갯길등 취약지역 18개소 제설
- 사업기간 : '07. 11. 15 ~ '08. 3. 15
- 사 업 비 : 105,000천원(시비보조금 25,000천원포함)

추진경위

- 공사발주 : '07. 9. 5
- 공사계약 : '07. 10. 4

추진실적

- '07. 11. 15부터 제설근무로 실적없음

예산액 및 집행액

- 예산액 : 105,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획 등

- '07. 11. 15부터 제설근무

16. 도로굴착복구

영등포구청장이 관리하는 도로에 대한 원활한 복구공사 및 사후관리

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 :
 - 아스팔트포장복구 A=250a
 - 콘크리트포장복구 A= 24a
 - 보도블럭포장복구 A=114a
- 사업기간 : '07. 3. 8 ~ 12. 31

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 9
- 공사계약 : '07. 3. 6
- 공사착공 : '07. 3. 8

추진실적

- 아스팔트포장 A=318.38a, 콘크리트포장 A=0.12a, 보도블럭포장 A=12.93a

예산액 및 집행액

- 예산액 : 2,612,468천원
- 집행액 : 971,668천원
 - 고유목적사업비 : 943,623천원
 - 인 건 비 : 27,845천원
 - 물 건 비 : 200천원

향후 추진계획 등

- '07. 12. 31이전 사업완료

17. 가로등 시설물 정비공사

사고 가로등주 복구, 지장 가로등이설, 주기적인 시설물 관리 및 환경 정비를 통한 안전사고 예방 및 깨끗한 도로환경을 유지하기 위함

사업개요

- 가로등 현황 : 용호로의 61개노선 7,436등2개, 분전함 230면
- 기 간 : '07. 3. 21 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 사고 가로등주의 신속한 복구, 지장 가로등 이설 및 주기적인 시설물 관리

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 13
- 공사계약 : '07. 3. 21
- 공사착공 : '07. 3. 21

추진실적

- 가로등 클러브 세척 및 교체 : 1,968개
- 가로등 시설 정비 37개소

예산액 및 집행액

- 예산액 : 210,000천원
- 집행액 : 81,856천원

향후 추진계획 등

- 사고 가로등주 · 지장 가로등의 신속한 처리 및 주기적 관리를 통한 안전사고 예방, 주민불편 해소를 위해 지속적으로 추진예정

18. 문래중앙길 가로등 개량

우리구 문래동 대림아파트~도림천로구간의 노후 가로등시설에 대한 개량을 실시하여 도로이용 차량 및 보행자의 안전사고예방을 위함

사업개요

- 공사구간 : 문래4가 대림아파트 ~ 도림천로
- 공사기간 : '07. 6. 5 ~ 12. 2
- 공사내용
 - 가로등 설치 1등용 10본(암교체 11) · 2등용 1본, 보행등설치 21등
 - 분전반 철거 2면 · 설치 2면
 - 기타 배관 및 배선 314m개량

추진경위

- 공사발주 : '07. 5. 18
- 공사계약 : '07. 6. 5
- 공사착공 : '07. 6. 5

추진실적

- 가로등 1등용 10본(암교체 11) · 2등용 1본, 보행등 21등 설치완료
- 분전반 철거 2면 · 설치 2면 완료
- 배관 · 배선 314m 개량완료
- 기준조도 30룩스로 개량 완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 90,000천원
- 집행액 : 40,675천원

19. 여의도 KBS별관주변 가로등 설치

우리구 여의도 KBS별관~신한은행구간 노후 가로등 시설에 대한 개량 및 추가설치로 도로이용 차량 및 보행자의 안전사고예방을 위함

사업개요

- 공사구간 : KBS별관 ~ 신한은행
- 공사기간 : '07. 9. 20 ~ 12. 28
- 공사내용
 - 가로등 개량 설치 4본 · 개량 11본, 보행등 설치 15등
 - 분전반 설치 1면
 - 기타 배관 및 배선 600m개량

추진경위

- 공사발주 : '07. 8. 13
- 공사계약 : '07. 9. 14
- 공사착공 : '07. 9. 20

추진실적

- 공사착공 및 관급자재 구매 실시

예산액 및 집행액

- 예산액 : 180,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획 등

- 공사 완료후 준공 처리 및 결산

20. 대신시장주변 가로등 개량

우리구 오거리길(신길동 116-1 ~ 120-92) 구간의 노후 가로등 시설에 대한 개량을 실시하여 도로이용 차량 및 보행자의 안전사고예방을 위함

사업개요

- 공사구간 : 신길1동 116-1 ~ 120-92(오거리길)
- 공사기간 : '07. 9. 20 ~ 12. 8
- 공사내용
 - 가로등 개량 설치 8본, 보행등 설치 8등
 - 분전반 설치 1면
 - 기타 배관 및 배선 240m개량

추진경위

- 공사발주 : '07. 9. 4
- 공사계약 : '07. 9. 20
- 공사착공 : '07. 9. 20

추진실적

- 공사착공 및 관급자재 구매 실시

예산액 및 집행액

- 예산액 : 50,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획 등

- 공사 완료후 준공 처리 및 결산

21. 도로조명 종합관리 시스템 구축(시비사업)

가로등의 선로이상, 점·소등, 고장여부의 원격감시로 가로등 관리의 효율화를 추진하기 위함

사업개요

- 사업기간 : '07. 10. 11 ~ 12. 20
- 사업내용 : 가로등 무선원격 감시 시스템 구매 설치 74개

추진경위

- 구매발주 : '07. 10. 11

추진실적

- 가로등 무선원격 감시제어시스템 74개 구매 설치 발주

예산액 및 집행액

- 예산액 : 174,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획 등

- '07. 12. 20한 가로등 무선원격 감시 제어시스템 74개 설치 완료

22. 가로등 지중 케이블 정비

절연불량 케이블을 정비하여 누전 등으로 인한 감전사고 등을 예방하고자 함

사업개요

- 기 간 : '07. 3. 12 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 절연불량 지중케이블 정비

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 15
- 공사계약 : '07. 3. 12
- 공사착공 : '07. 3. 12

추진실적

- 절연불량 지중케이블 정비 : 6건 320m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 50,000천원
- 집행액 : 31,240천원

향후 추진계획 등

- 감전 등 안전사고 예방을 위한 노후로 인한 절연불량케이블 정비 지속 실시

23. 보안등 설치 개량 및 유지보수(연간단가 1구역)

노폭 12m이하의 공공도로와 보안등 미설치로 어두운 골목길에 보안등 신설 및 개량을 통한 도로이용자의 생활불편 해소를 위함

사업개요

- 보안등 시설 현황 : 12개동 4,026등
- 기 간 : 2007. 3. 9 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 주민 야간 생활 불편 민원발생 지역 보안등 신설 또는 개량실시

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 15
- 공사계약 : '07. 3. 9
- 공사착공 : '07. 3. 9

추진실적

- 보안등 유지보수 : 1,267건
- 보안등 신설 및 개량 : 165건

예산액 및 집행액

- 예산액 : 232,000천원
- 집행액 : 131,746천원

향후 추진계획 등

- 지속적으로 노폭 12m이하 공공도로와 골목길 주민 생활불편 지역에 대한 보안등 개량 및 신설을 추진

24. 보안등 설치 개량 및 유지보수(연간단가 2구역)

노폭 12m이하의 공공도로와 보안등 미설치로 어두운 골목길에 보안등 신설 및 개량을 통한 도로이용자의 생활불편 해소를 위함

사업개요

- 보안등 시설 현황 : 10개동 5,045등
- 기 간 : '07. 3. 12 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 주민 야간 생활 불편 민원발생 지역 보안등 신설 또는 개량실시

추진경위

- 공사발주 : '07. 2. 15
- 공사계약 : '07. 3. 12
- 공사착공 : '07. 3. 12

추진실적

- 보안등 유지보수 : 1,917건
- 보안등 신설 및 개량 : 224건

예산액 및 집행액

- 예산액 : 260,000천원
- 집행액 : 148,577천원

향후 추진계획 등

- 지속적으로 노폭 12m이하 공공도로와 골목길 주민 생활불편 지역에 대한 보안등 개량 및 신설을 추진
