

제155회 영등포구의회

제1차 정례회



『교육 복지 사람중심 새 영등포』 실현을 위한

2010년 주요업무 보고



도 로 과

순 서

- 일반 현황 1
- 정책목표와 방향 4
- 주요업무 추진실적 및 계획 5
- 유관기관 우리구 추진사업 19

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직					기 능 직				
		5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정 원	35	1	4	4	7	3	1	3	6	4	2
현 원	30	1	4	5	3	6	1	2	7	1	
과부족	-5			1	-4	3		-1	1	-3	-2

2 조 직



3 주요시설 및 장비

□ 도로

- 주요간선도로 : 경인로 외 27개 노선
- 도로현황

연장 387.179km		도로율
시도 76.02km	구도 311.159km	23.31% (서울시 : 21.96%)

□ **교량 및 고가차도**

교 량(12개소)	고가차도(6개소)
양화교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 신정교, 양평교, 염창교, 여의교, 구로교	선유, 도림, 도림천, 신길, 영등포역 ※ 문래 : 철거공사 중

□ **지하차도 및 지하보도**

지하차도(10개소)	지하보도(1개소)
국회앞, 영등포, 대방, 신길, 여의2교, 여의교, 목동교 동측, 오목교동측, 성산, 신정교 동측	여의초교앞

□ **보도육교 및 입체교차로**

보도육교(9개소)	입체교차로(5개소)
우신초교, 신길마을금고, 영동초교, 영등포 수원지, 당중초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포역 횡단	영등포R, 여의하류, 목동교 동측 IC, 염창 IC, 여의상류

□ **조명시설**

가 로 등	보 안 등
8,583 등	9,516 등

4

예산 현황

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%) (집행잔액)
총 계	24,853,088	11,649,211	46.9% (13,203,876)
도로개설 및 확장	16,691,100	5,985,350	35.9% (10,705,750)
도로개설 지원	17,903	5,832	32.6% (12,071)
도로정비	3,844,664	2,618,989	68.1% (1,225,675)
도로관리	749,989	717,822	95.7% (32,167)
도로조명 시설정비	1,290,900	960,501	74.4% (330,399)
도로조명 관리	1,616,711	885,445	54.8% (731,266)
도로인력운영비	469,433	385,472	82.1% (83,961)
기본경비	172,388	89,800	52.1% (82,588)

II. 정책목표와 방향

목 표

고객 행복을 위한
쾌적한 도로환경 조성



방 향

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

안전한 도로유지 관리

밝고 안전한 도시를 위한 도로조명 관리

IV. 주요업무 추진실적 및 계획

도로개설 및 확장

1 도림로 도로확장공사(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 363-3(도림사거리) ~ 신길동 421-16(신길광장)간
- 규 모 : 도로확장 B=25-35m, L=1,150m(기확장 350m, 미확장 800m)
- 사업기간 : '09년 ~ '13년
- 총사업비 : 62,170백만원(보상비 56,720 공사비 5,300 설계비 150)
 - 특별회계 : 23,590백만원(보상비 21,440 공사비 2,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,580백만원(보상비 35,280 공사비 3,300)

※ '10년 사업비(시비) : 10,150백만원 【특별 8,150(보상 8,000 설계비 150), 일반(보상) 2,000】

※ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비 고
추진 내용	특별 회계	보상비	21,440			8,000	9,000	4,440
		공사비	2,000				1,000	1,000
		설계비	150			150		
		소 계	23,590			8,150	10,000	5,440
	일반 회계	보상비	35,280	7,000	2,000	2,000	10,000	14,280
		공사비	3,300	1,300			700	1,300
		소 계	38,580	8,300	2,000	2,000	10,700	15,580
총 사업비		62,170	8,300	2,000	10,150	20,700	21,020	



□ 추진실적

- '78. 12. 07 : 도시계획시설(도로)결정(건설부고시 제39호)
- '97 ~ '99 : 일부구간 확장완료(도림고가 남단 ~ 도림사거리, L=350m)
- '09. 03. ~ '10. 02 : 실시계획인가(일반구간 L = 433m)
- '10. 03. 22 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '10. 05. 27 : 실시계획인가(특별구간 L=220m)
- '10. 08 ~ : 토지등 보상협의

□ 향후 추진계획

- '10. 10 : 실시설계 용역완료
- '10. ~ '12. : 토지 등 보상협의 완료
- '13. 03 ~ '13. 12 : 공사착공 및 준공

위 치 도

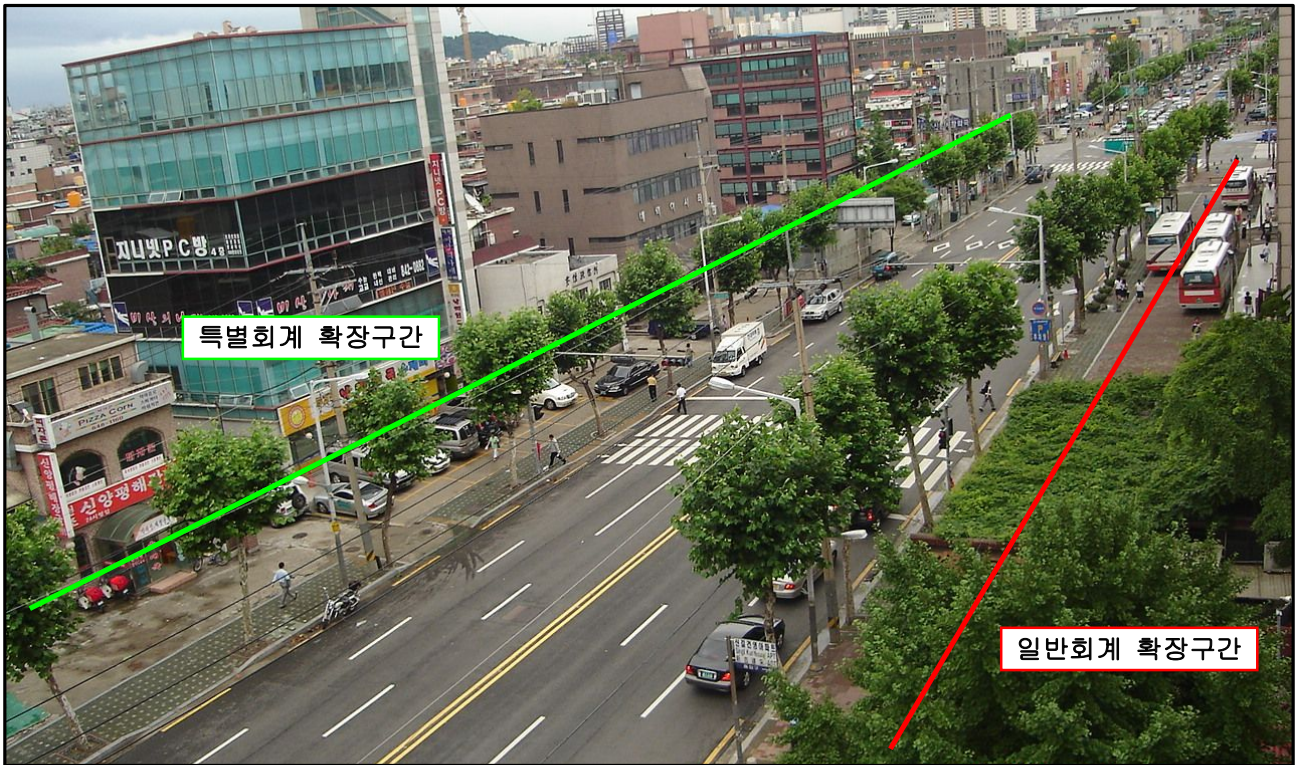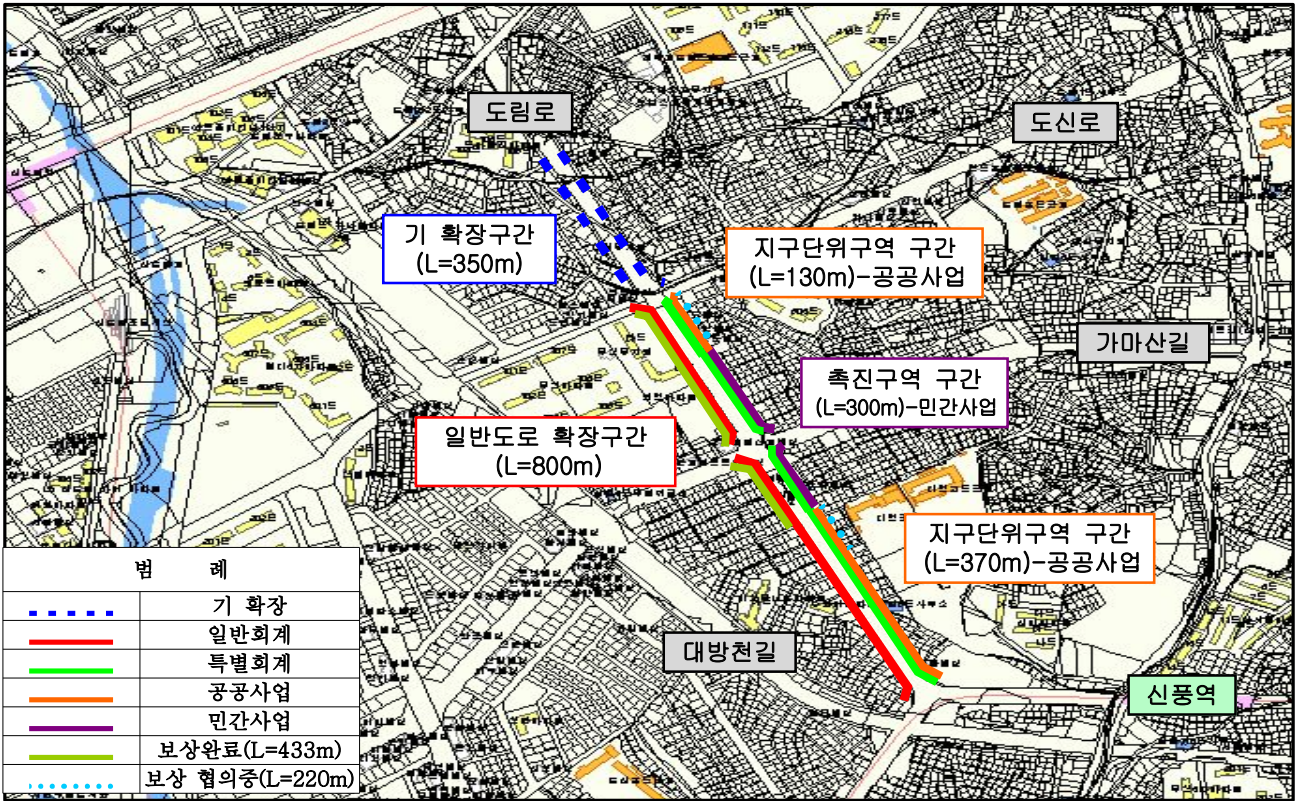

2 영진시장~대신시장간 도로개설공사

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(기개설 1,130m, 미개설 140m)
- 사업기간 : '94년 ~ '10년
- 총사업비 : 24,210백만원(보상비 20,439 공사비 3,656 설계비 115)
- ※ '10년 사업비 : 4,400백만원(보상비 4,000 공사비 400 - 시 교부금)

□ 추진실적

- '36. 12. 26 : 도시계획시설(도로) 결정(조선총독부고시제722호)
- '62. 12. 08 : 지적고시(건설교통부고시제117호)
- '94 ~ '00 : 일부구간 도로개설(B=15m, L=830m) 완료
- '06. 09. 29 : 실시설계 용역시행(미개설 구간)
- '07. 09. 08 ~ '09. 06. 26 : 일부구간 도로개설완료(B=15m, L=300m) - 1구간
- '09. 03. 09 : 실시계획인가(잔여구간 L=140m) - 2구간
- '10. 06. 29 : 수용재결 토지보상금 법원공탁 [신길동 2001-15번지(843/1148㎡)]
- '10. 07. 20 : 공사착공
- '10. 08. ~ 현재 : 하수관 부설 완료


□ 향후 추진계획

- '10. 09 : 공사준공
- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	장 래	비고
추진 내용	설계비	115	115				
	보상비	20,439 (20,255)	12,555 (12,555)	3,884 (3,700)	4,000 (4,000)		
	공사비	3,656 (400)	3,256		400 (400)		
총사업비		24,210 (20,655)	15,926 (12,555)	3,884 (3,700)	4,400 (4,400)		

()내 금액은 시비

위 치 도

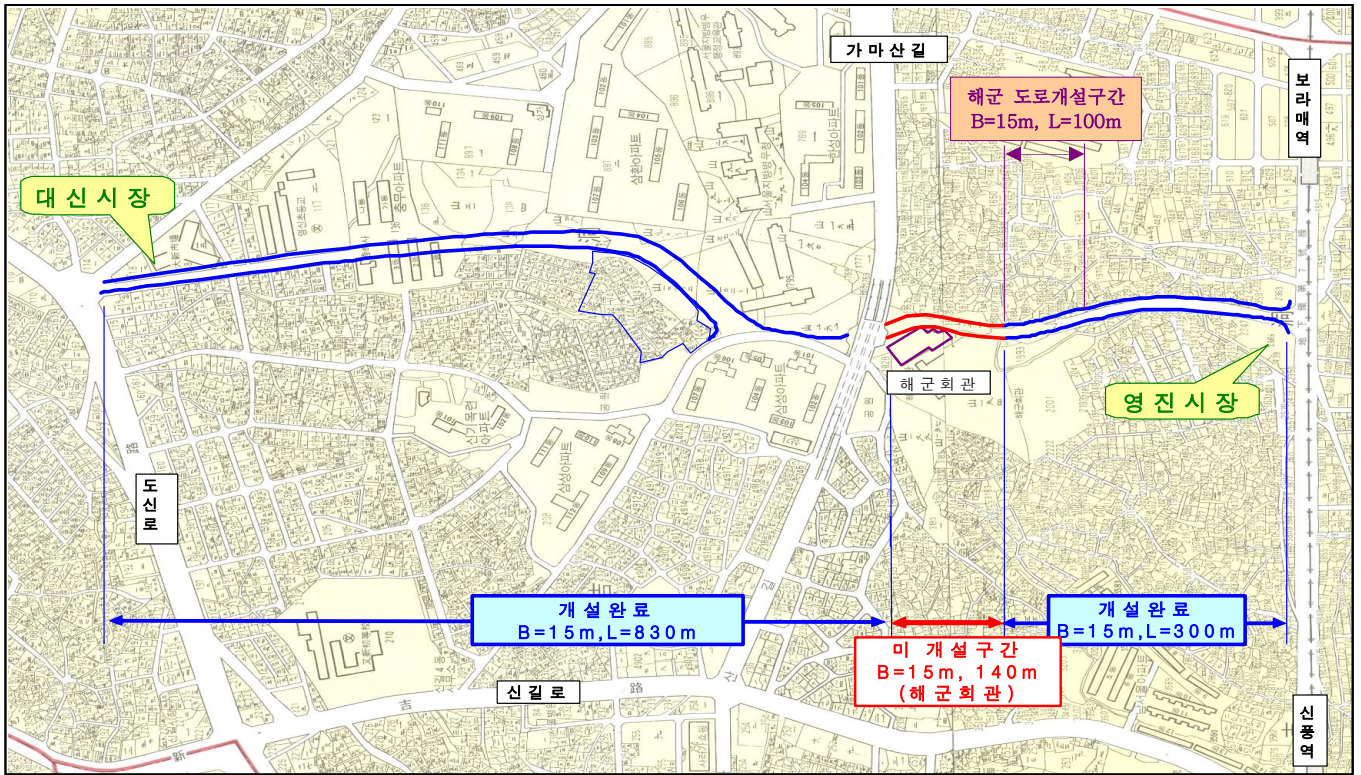

3 대방천변 도로개설공사

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 670-2 ~ 445-21간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - 기개설 : 660m('98 ~ '01) - 미개설 : 420m
- 사업기간 : '98년 ~ '11년
- 총사업비 : 13,050백만원(보상비 10,600 공사비 2,400 설계비 50)
- ※ '10년 사업비 : 2,500백만원(보상비 - 시 교부금)

□ 추진실적

- '70. 08. 31 : 도시계획시설(도로) 결정(서울시고시제36호)
- '99 ~ '01 : 일부구간 도로개설완료(L=660m)
- '09. 01. 30 ~ 05. 29 : 실시설계 용역
- '09. 12. 24 : 실시계획인가(L=130m) - 1구간
- '10. 06. 10 : 실시계획인가(L=62m) - 2구간
- '10. 08 ~ : 토지 및 건물 등 보상 협의중

□ 향후 추진계획

- '10. 08 ~ '10. 12 : 토지 등 보상협의 완료
- '11. 03 ~ '11. 11 : 공사착공 및 준공


○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2010 추경	2011	비고
추진 내용	설계비	50		50				
	보상비	10,600 (10,100)	3,000 (3,000)	2,500 (2,000)	2,500 (2,500)	2,600 (2,600)		
	공사비	2,400 (200)	400 (200)				2,000	
총사업비		13,050 (10,300)	3,400 (3,200)	2,550 (2,000)	2,500 (2,500)	2,600 (2,600)	2,000	

()내 금액은 서울시 교부금

위치도

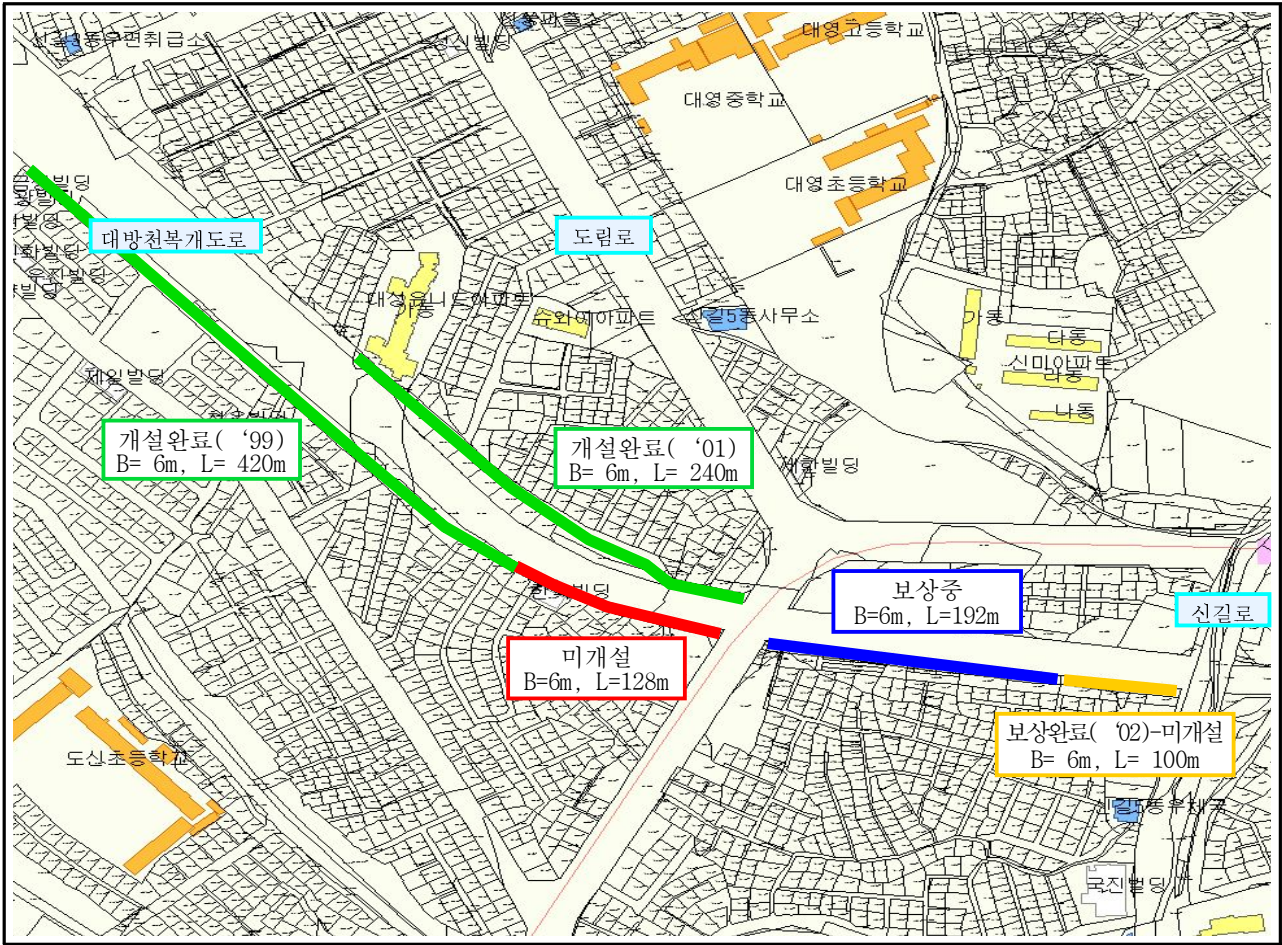

4 도림동 286-11~187-39호간 도로개설공사

□ 사업개요

- 위치 : 도림2동 286-11 ~ 187-39간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=284m
- 사업기간 : '10년 ~ '12년
- 총사업비 : 4,200백만원(보상비 3,350 공사비 800 설계비 50)
- ※ '10년 사업비 : 350백만원(보상비 300 설계비 50)

□ 추진실적

- '68. 01. 28 : 도시계획시설(도로) 결정(서고시제36호)
- '10. 02. 01 : 기본 및 실시설계 용역착수
- '10. 05. 27 : 실시계획 열람공고(L = 10m)
- '10. 08 ~ : 토지등 보상협의

□ 향후 추진계획


- '10. 10 : 기본 및 실시설계 용역완료
- '10. ~ '11. : 토지 등 보상협의 완료
- '12. 03 ~ '12. 11 : 공사착공 및 준공

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장래	비고
추진내용	설계비	50			50			
	보상비	3,350			300	1,700	1,350	
	공사비	800					800	
총사업비		4,200			350	1,700	2,150	

위 치 도

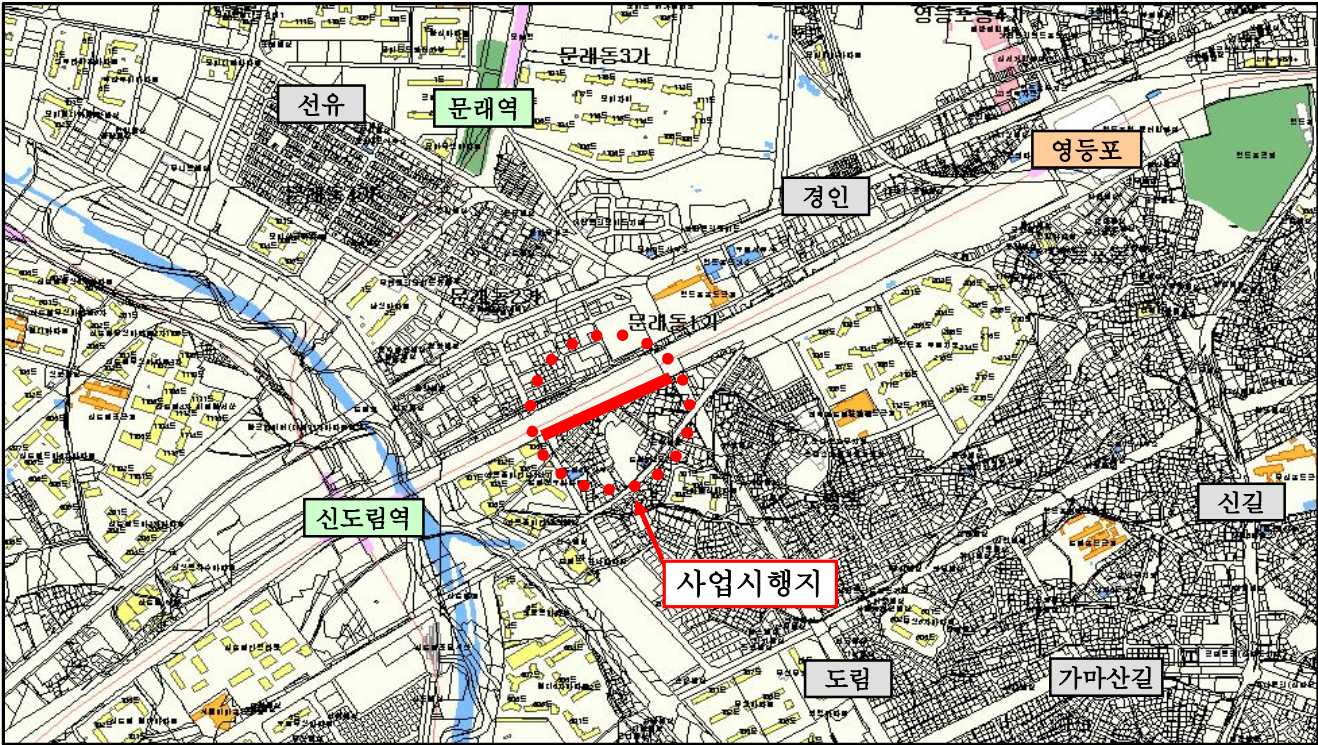

□ 사업개요

- 위 치 : 당산동 삼성3차 APT ~ 여의도 국회 윤중로간
- 규 모 : 보도육교 설치(B = 7.3 ~ 17.0m, L = 278m)
- 사업기간 : '10년 ~ '14년
- 사 업 비 : 총 15,002백만원(시비 14,840, 구비 162)
- 사업추진 방법 : 영등포구청 + 서울시


□ 추진실적

- '10. 02. 17 : 타당성 조사 및 기본계획용역 착수
- '10. 05. 27 : 용역 1차 기술자문회
- '10. 06. 29 : 주민설명회 개최
- '10. 07. 23 : 서울시 투융자 심사요청
- '10. 07. 28 : 구 투융자 심사요청
- '10. 08. ~ : 주민의견 반영 기본설계 중

□ 향후 추진계획

- '10. 09. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 준공
- '11. 03 : 실시설계용역(현상공모 예정)
- '12 ~ '14 : 보도육교 설치 공사시행

위치도

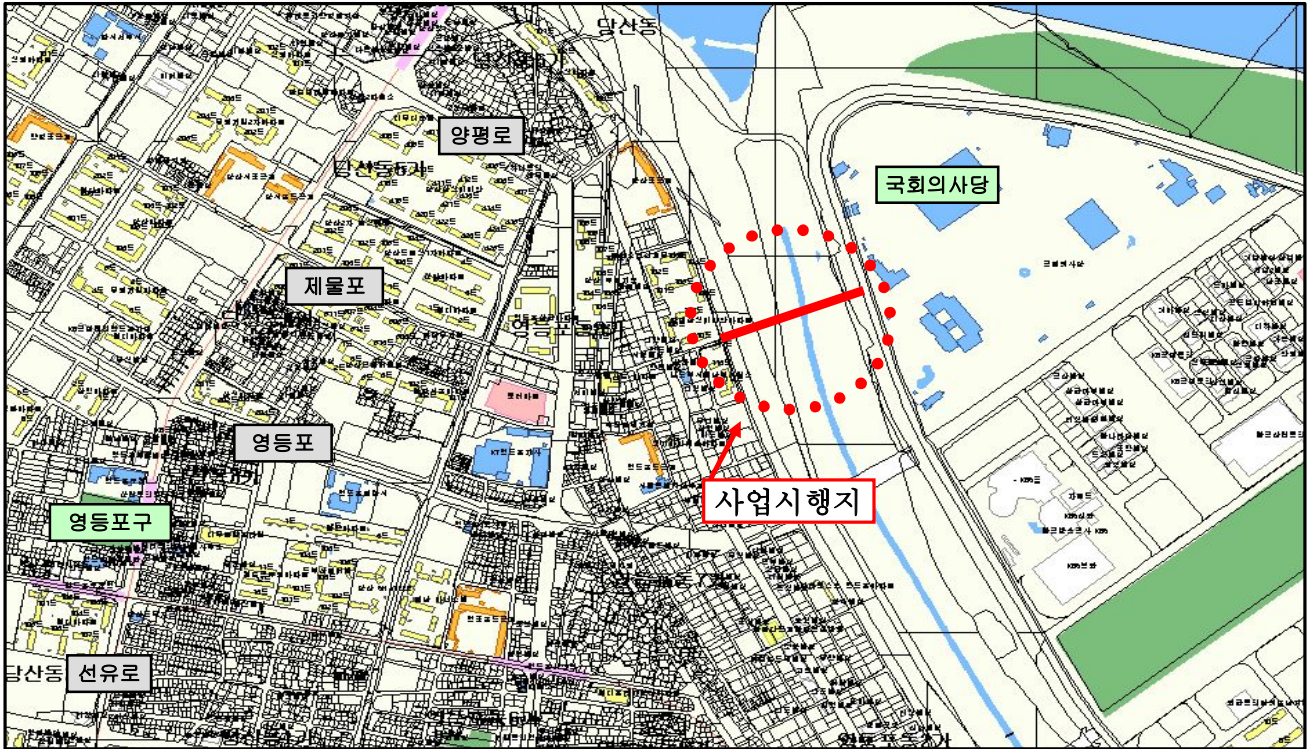

안전한 도로유지관리

6 관내 포장도로 정비공사(연간단가)

□ 사업개요

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 35,720m
- 사업규모 : 포장도로정비 A=369@
(보도포장A=74@, 아스팔트포장A=282@, 콘크리트포장A=13@)
- 사업기간 : '10. 03 ~ '10. 12
- 사업비 : 1,802백만원

□ 추진실적

- '10. 03 : 공사계약 및 착공
- '10. 03 ~ '10. 08 : 포장도로 정비 A=315@
(보도포장 A=47@, 아스팔트포장 A=263@, 콘크리트포장 A=5@)

□ 향후 추진계획

- '10. 08 ~ '10. 12 : 공사시행 및 준공

7 가로등 개량공사

□ 가로등현황

- 가로등 : 69개노선 8,583등(가로등 7,962 육교등 87 교량 하부등 534)

□ 사업개요

- 사업규모 : 가로등 개량 351등
 - 구비사업 : 대림1로 76등, 신길2로 39등(총 115등)
 - 시비사업 : 여의서로 106등, 양평로 53등, 가마산길 51등, 버드나룻길 26등(총 236등)
- 사업기간 : '10. 02 ~ '10. 10
- 사 업 비 : 1,861백만원(시비 1,315 구비 546)

□ 추진실적

- '10. 02 ~ '10. 06 : 대림로, 신길로 가로등 개량공사 준공(총 115등) - 구비
- '10. 04 ~ '10. 08 : 여의서로, 양평로, 가마산길, 버드나룻길 가로등 개량공사 시행중 - 시비

□ 향후 추진계획

- '10. 09 : 시비사업 3건 준공(양평로, 가마산길, 버드나룻길 가로등개량공사)
- '10. 10 : 시비사업 1건 준공(여의서로 가로등개량공사)

8 보안등 설치 및 유지보수공사

□ 보안등현황

- 보안등 : 9,516등

□ 사업개요

- 사업구간 : 관내 전지역(22개동)
- 사업규모 : 보안등 신설개량 320등, 보안등 보수 3,100등
- 사업비 : 400백만원
- 사업기간 : '10. 02 ~ '11. 02

□ 추진실적

- '10. 02. 19 : 공사계약 및 착공
- '10. 07. 31 : 보안등 신설개량 130등, 보안등 보수 2,300등 완료
- '10. 08. ~ : 보안등 신설 및 개량 공사 중

□ 향후 추진계획

- '11. 02 : 공사준공

V. 유관기관 우리구 추진사업

1 여의샛강 문화다리 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동(신길역) ~ 여의도동(광장아파트)
- 규 모 : 보행교(사장교) 폭 4.5m, 연장 354m
- 사업기간 : '04. 11 ~ '11. 03
- 사 업 비 : 18,640백만원
- 시 행 자 : 서울시 도시기반시설본부 시책사업부


□ 추진실적

- '04. 11 ~ '05. 04. 28 : 타당성조사 용역(영등포구)
- '05. 05 ~ '05. 09. 27 : 현상공모 및 당선작 선정(영등포구)
- '07. 12 ~ '08. 07. 04 : 실시설계 용역(도시기반시설본부)
- '08. 09. 19 : 투자심사 완료
- '08. 12. 08 : 공사계약
- '09. 03 : 진입도로 개설, 풍동시험
- '09. 09. 21 : 윤중로 육교설치 관련 대책회의 개최
- '10. 08 : 교량상판 공장제작 및 부대공사 시행중(공정률 64%)

□ 향후 추진계획

- '11. 03 : 공사준공

위 치 도

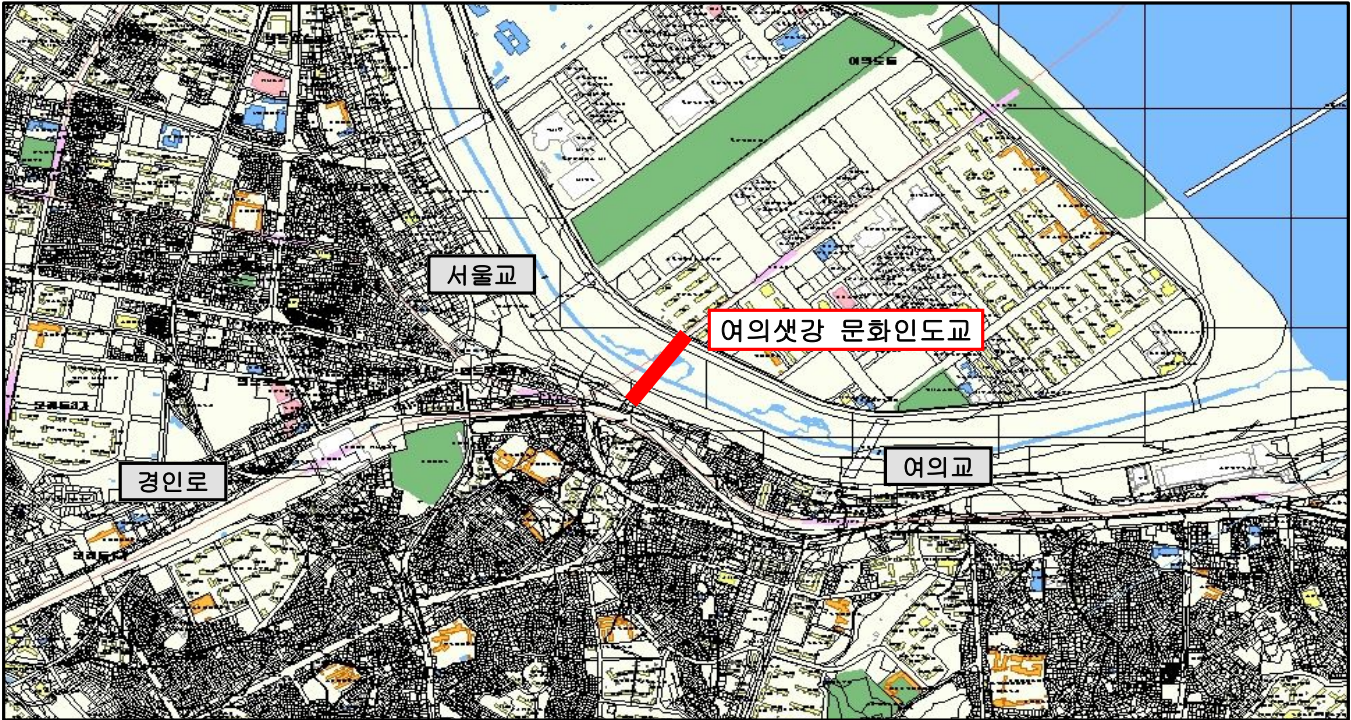

□ 사업개요

- 위 치 : 신한은행(구. 조흥은행)앞 ~ 영등포시장사거리
- 규 모 : B=18.3~91.6m, L=183m, 연면적:9,385.9m²
- 사업기간 : '07. 9 ~ '11. 5
- 민간투자비 : 70,256백만원
- 사업시행자 : (주)영등포구뉴타운지하상가



□ 추진실적

- '03. 08. 11 : 지하공간개발사업 계획수립
- '05. 07. 04 : 민간투자사업 실시협약서 체결
- '06. 07. 20 : 도시계획시설(지하도로)변경 결정고시
- '07. 09. 28 : 도시계획시설(지하도로)사업 실시계획 인가
- '07. 10. 29 : 공사 착공
- '10. 08 : 구조물 공사 중 (공정율 65%)

□ 향후 추진계획

- '11. 02 : 공사완료

위 치 도

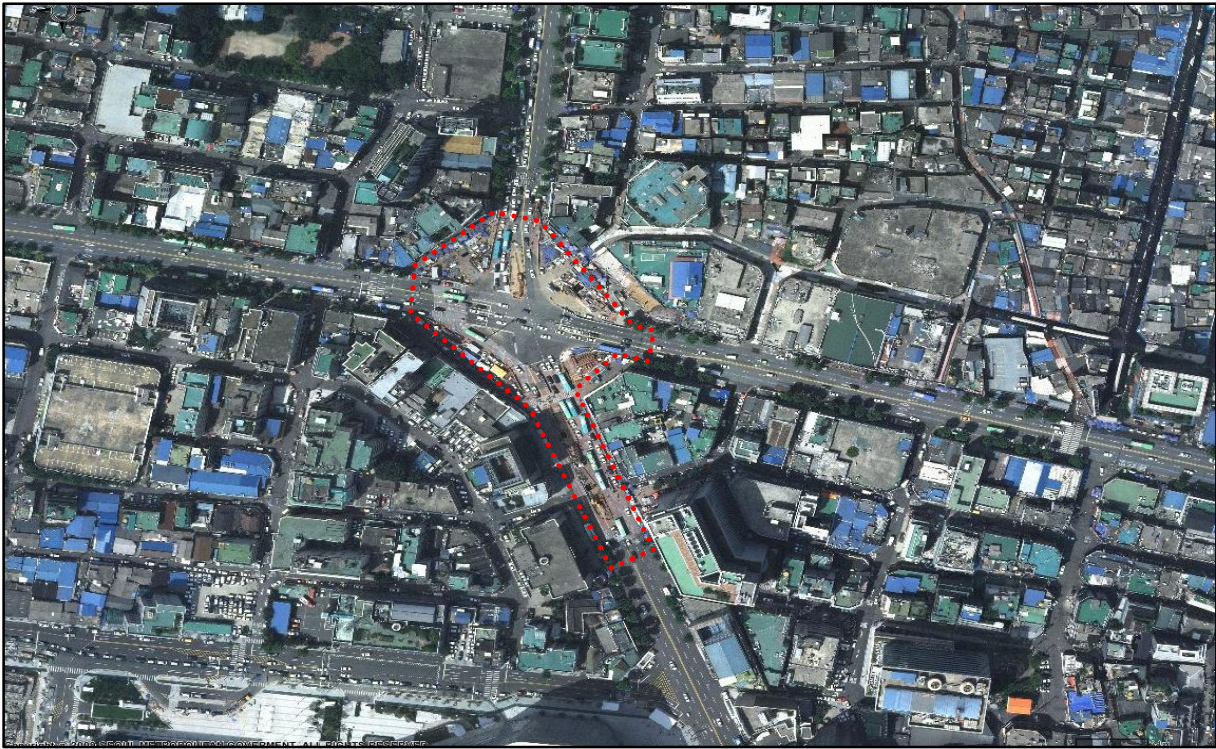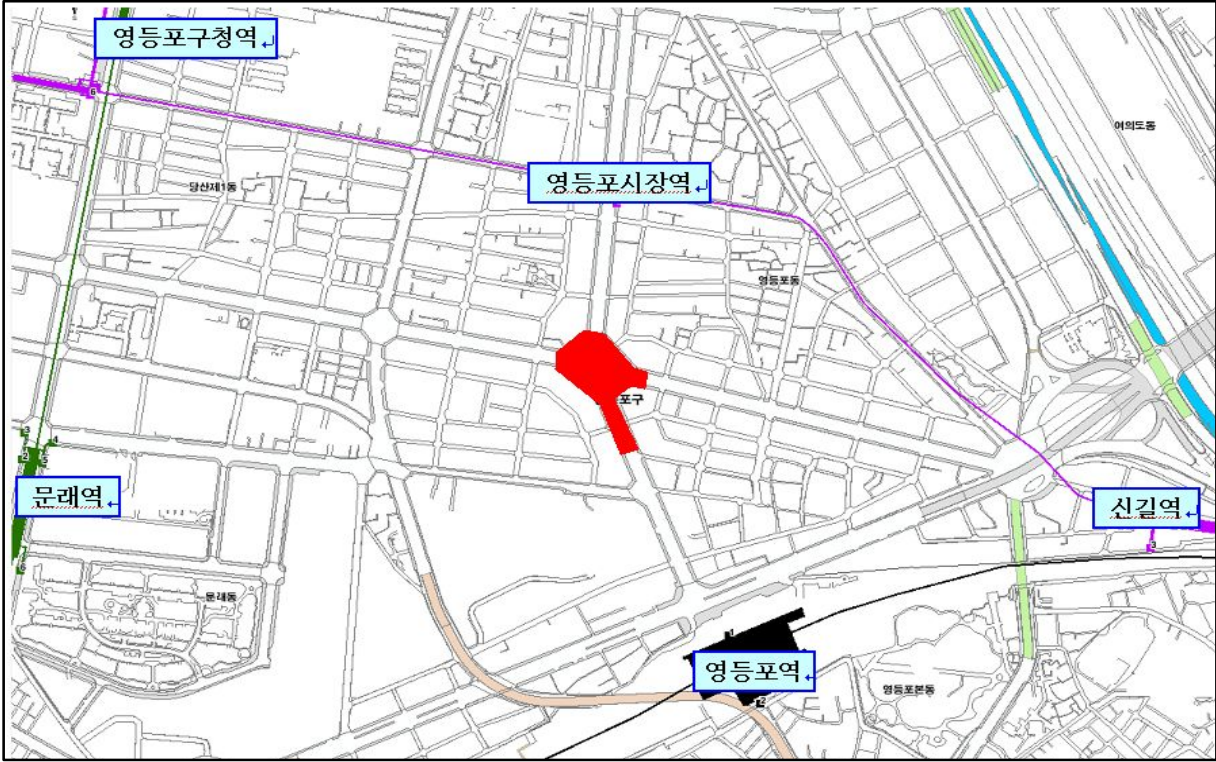

3 문래고가차도 철거공사

□ 사업개요

- 위 치 : 문래고가차도(영등포구 문래동 34 ~58)외 2개소
- 규 모 : 총 B=8~15.4m, L=835m
 - 문래고가차도 B=15.4m L=485m(설치년도 1979년)
- 사업기간 : '10. 03 ~ '10. 12.
- 총사업비 : 1,500백만원
- 시 행 자 : 서울시 도시기반시설본부 교량안전부

□ 추진실적

- '08. 12 ~ '09. 12 : 고가차도 철거에 따른 교통운영개선방안 수립
기본계획용역 완료
- '10. 06. 03 : 고가차도 철거를 위한 교통소통대책 자문
- '10. 08. 13 : 고가차도 철거 공사착공

□ 향후 추진계획

- '10. 09 : 고가차도 철거 완료
- '10. 12 : 공사준공

위치도



□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동 ~ 금천구 독산동
- 규 모 : 왕복4차로, 연장 11.0km
- 사업기간 : '09년 ~ '15년
- 총사업비 : 619,600백만원
- 시 행 자 : 서울시 도로계획담당관

□ 추진실적

- '07. 12. 20 : 민간제안 접수
- '08. 05. 02 : 민간제안사업 타당성 및 적적성 조사의뢰(KDI)
- '09. 03. 06 : 시 재정계획심의위원회 심의완료(원안통과)
- '09. 04 ~ 05 : 사전환경성검토서(초안) 주민공고 및 주민설명회개최
- '09. 06 : 기획재정부 민간투자심의위원회 심의 완료
- '09. 10 : 시의회 동의
- '09. 12. 31 : 제3자 제안공고(서공고제2197호)
- '10. 08 ~ : 제안서 업체 선정 중

□ 향후 추진계획

- '11. 02 : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
- '11 ~ '15년 : 공사 시행

위 치 도



□ 사업개요

- 위 치 : 부천시 오정구(경인고속도로) ~여의도동(여의대로)
- 규 모 : 왕복4차로, 연장 8.9km(터널 7.6km)
- 사업기간 : '10년 ~ '16년 (운영기간 30년)
- 총사업비 : 555,100백만원
- 시 행 자 : 서울시 도로계획담당관

□ 추진실적

- '09. 02 : 민간투자사업 타당성 및 적격성 조사완료
- '09. 04 ~ 12 : 서울시와 국토해양부 협의
- '10. 02. 05 : 제3자 제안공고(안) 검토의뢰(KDI)
- '10. 06. 18 : 사전환경성검토서(초안) 공람 및 주민설명회
- '10. 08. ~ : 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의 준비중

□ 향후 추진계획

- '10. 09 ~ '10. 12 : 서울시 재정계획심의, 기획재정부 민간투자심의 및 우선협상 대상자 지정
- '11. 01 ~ '11. 07 : 실시협약체결 및 실시설계 시행
- '11. 12 ~ '16. 12 : 공사시행

위 치 도

