

제176회 구의회 제1차 정례회



2013년 주요업무 보고



도 로 과

보고 순서


I . 일반 현황	••• 1
II . 주요업무 추진실적	••• 5
III . 신규·주요투자사업 실적	••• 28

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직						기 능 직				
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정 원	32	-	1	4	5	6	3	1	5	5	2	-
현 원	33	-	1	6	5	5	3	-	7	6	-	-
과부족	1	-	-	2	-	△1	-	△1	2	1	△2	-

2 조 직

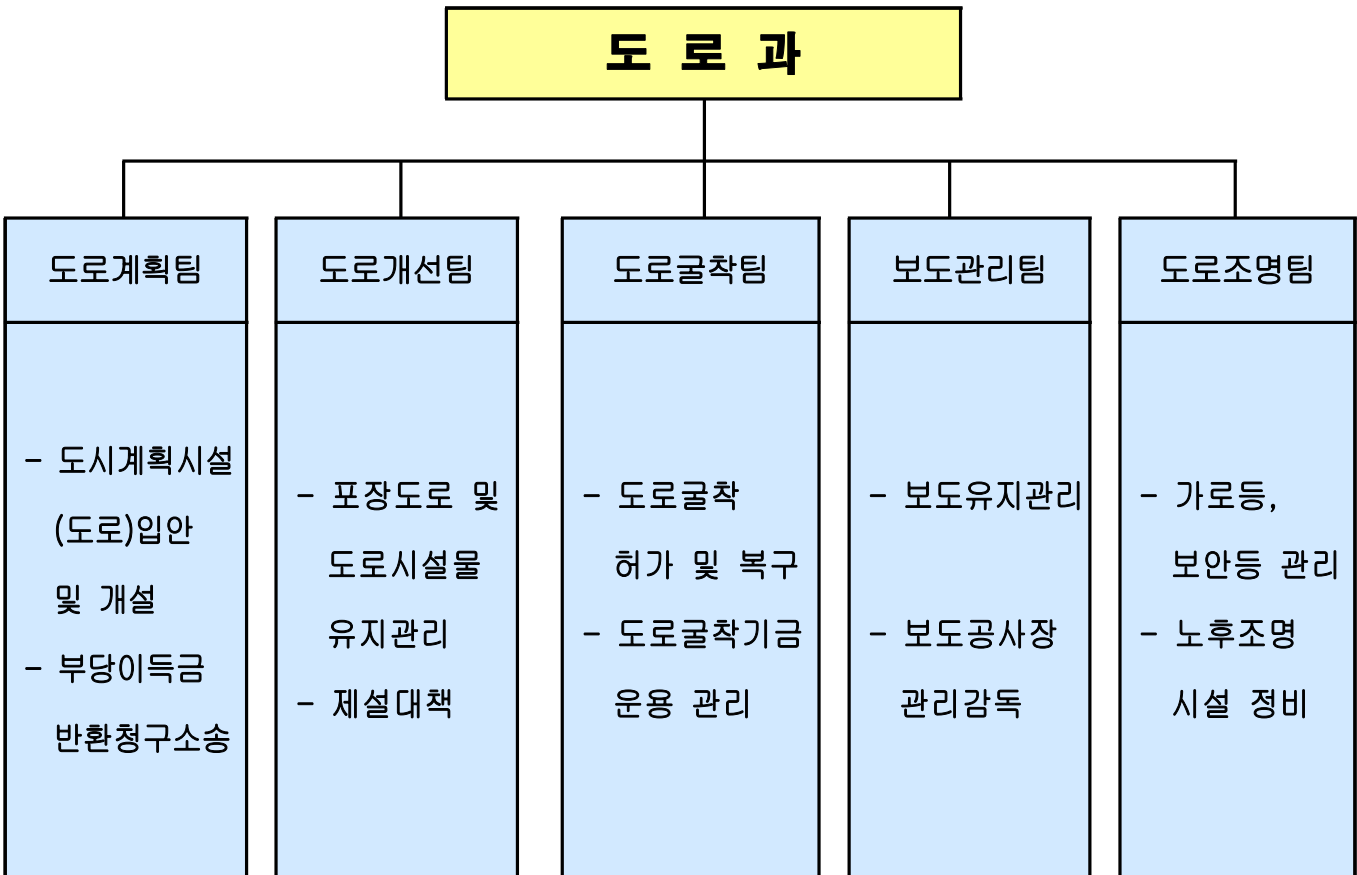

3

주요시설 및 장비

□ 도로

- 주요간선도로 : 경인로 외 27개 노선
- 도로현황

연장 387.794km		도로율
시도 76.02km	구도 311.774km	23.34% (서울시 : 22.24%)

□ 교량 및 고가차도

교 량(14개소)	고가차도(6개소)
양화교, 신정교, 양평교 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교	선유, 도림천, 영등포역, 보라매 도림, 신길

□ 지하차도 및 지하보도

지하차도(12개소)	지하보도(1개소)
국회앞, 여의2교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측, 노들길(서울교북단), 서울교 접속 지하차도, 영등포, 대방, 신길, 여의교	여의초교 앞

□ 보도육교 및 입체교차로

보도육교(6개소)	입체교차로(5개소)
우신초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포 수원지, 영등포역 횡단보도육교	영등포R, 여의하류, 여의상류 목동교 동측 IC, 염창 IC

□ 조명시설

가 로 등	보 안 등
8,781등	9,707등

4

예 산 현 황

□ 사 업 별

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
계	9,135,218	1,931,521	21.1
도로개설 및 확장	1,844,122	168,190	9.1
도로개설 지원	9,222	3,030	32.8
도로정비	2,741,299	239,895	8.7
도로관리	1,173,879	432,959	36.8
도로조명 시설정비	883,200	92,954	10.5
도로조명 관리	1,775,917	654,236	36.8
인력운영비	534,544	269,712	50.4
기본경비	173,035	70,545	40.7

목 차

〈주요업무 추진실적〉

1. 도림로 확장공사	5
2. 대림3동 812번지 도로개설공사	7
3. 금연보도판 설치로 연기 없는 행복한 거리조성	8
4. 포장도로 정비 등 소파보수공사	9
5. 도로시설물 설치 및 보수공사	10
6. 사회적 약자를 위한 도시환경개선	11
7. 영등포본동 육교보수 및 계단추가	12
8. 신길4동 214-8 주변 외 4건 도로정비공사 ...	13
9. 여의도 윤중로 사이 매쉬펜스 등 설치공사	14
10. 여의도 고등학교 방음벽 교체공사	15
11. 양평동3가 서부간선도로 경계옹벽 개선공사 ·	16
12. 영등포본동 602번지 옹벽개선공사	17
13. 도로시설물 안전점검	18
14. 주민과 함께하는 제설대책 추진	19
15. 관내 불량맨홀 정비공사	20
16. 가로등 시설물 정비공사	21
17. 보안등 설치개량 및 유지보수공사	22
18. 주민이 참여하는 야간보안등 순찰	23
19. 여의도 봄꽃축제 경관조명 교체공사	24
20. 여의도 광장APT사이 가로등 설치공사	25
21. 2013년도 주요투자사업 현황	26

〈신규·주요투자사업 실적〉

1. “찾아가는 도로현장 신문고” 실시	28
2. 관내 LED보안등 설치공사	29
3. 신길로 가로등 개량공사	30
4. 양평로 가로등 개량공사	32

II. 주요업무 추진실적

1 도림로 확장공사

신길재정비촉진지구 활성화로 지역균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길5동 421-16
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기 개설 350, 미 개설 800)
 - ┌ 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비촉진지구 내)
 - └ 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2014년
- 총사업비 : 44,550백만원(보상비 39,700 공사비 4,700 설계비 150)
 - 특별회계 : 15,350백만원(보상비 13,700 공사비 1,500 설계비 150)
 - 일반회계 : 29,200백만원(보상비 26,000 공사비 3,200)

□ 추진실적

- 특별회계
 - 4월~5월 : 공사시행(도로확장 폭 12.5→17.5m 연장 500m)
 - ┌ 1차구간 : 130m 경계석 및 측구설치, 보도조성
 - └ 2차구간 : 저층건물 5개동 철거
- 일반회계
 - 3월 28일 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가고시(L=120m)
 - 4월~5월 : 보상계획 열람공고

□ 향후 추진계획



- 특별회계
 - 2014년 4월 : 공사준공 예정
- 일반회계
 - 6월~12월 : 감정평가 실시 후 보상협의

□ 연차별 사업계획(시비)

(단위:백만원)

구분		계	기투자	2012	2013	2014	장래
추진 내용	특별회계	보상	13,700	13,700			
		공사	1,500		660	840	
		용역	150	150			
	일반회계	보상	26,000	13,000	100	2,300	10,600
		공사	3,200	1,200			2,000
총사업비		44,550	28,050	760	3,140	14,600	

□ 위치도

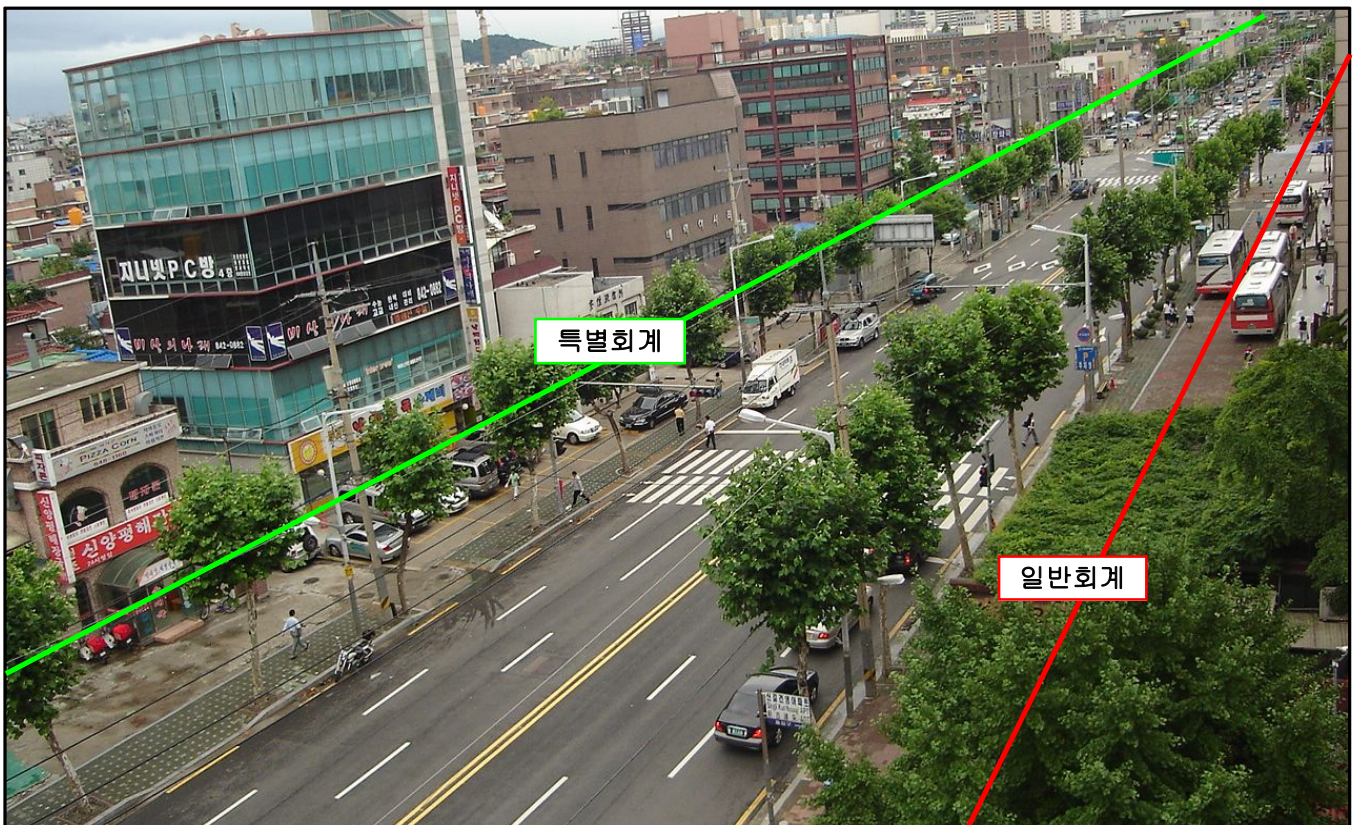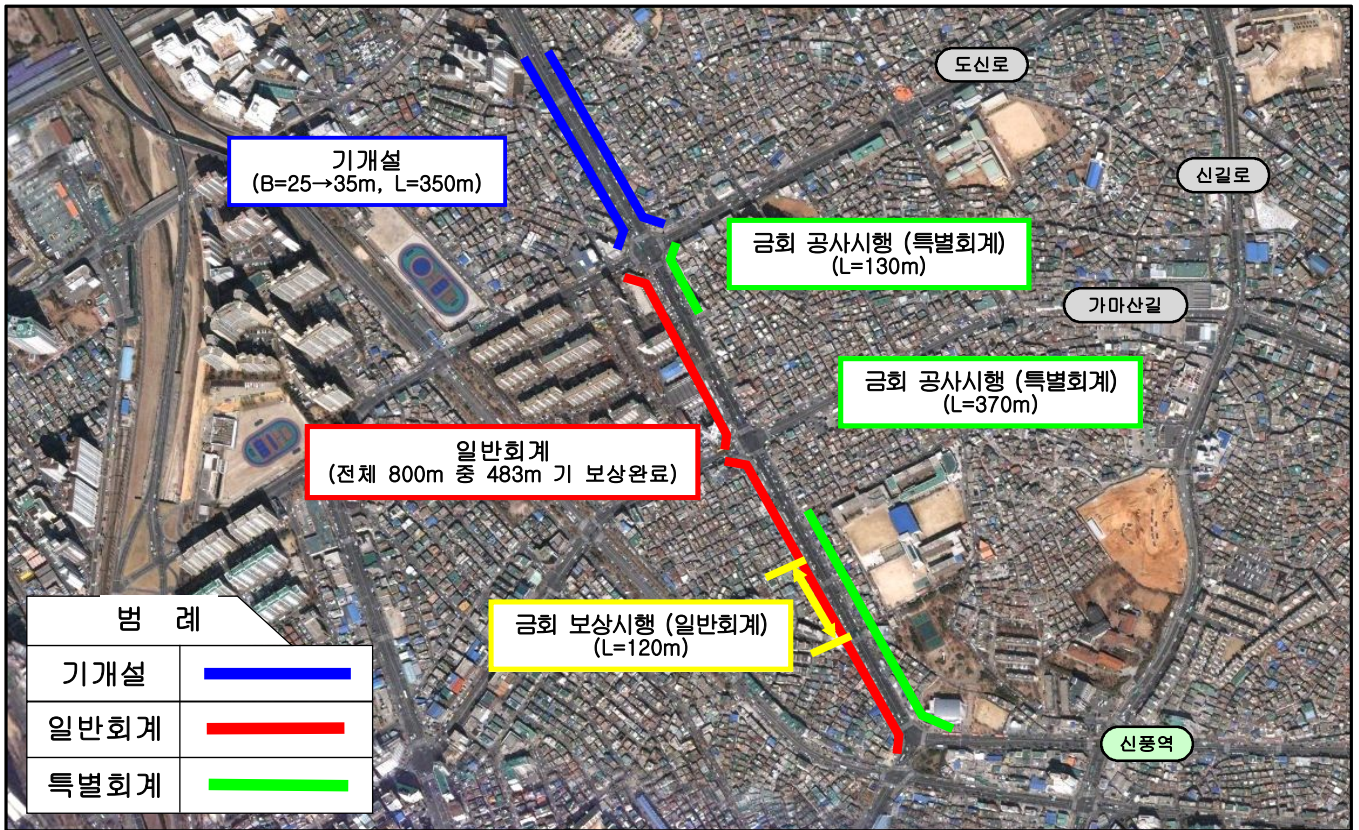

2 대림3동 812-12번지 도로개설공사

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 주민숙원사업 해소 및 주거환경개선

□ 사업개요

- 위치 : 대림동 812-12번지
- 규모 : 도로개설 B=6m, L= 14m
- 사업기간 : 2012년 ~ 2014년
- 총사업비 : 742,000천원(구비)

□ 추진실적

- '13. 5월말 : 대림동 812-48 외1필지 보상진행(수용재결) 중

□ 향후 추진계획


- '13. 9월~12월 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가(예정)
※ 추경예산확보(예정) → 잔여토지 및 건물 보상

□ 연차별 사업계획(구비)

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2012	2013	2014	장래	비고
추진내용	용역						
	보상공사	672	100	100	472		
총사업비	742		100	100	542		

□ 위치도

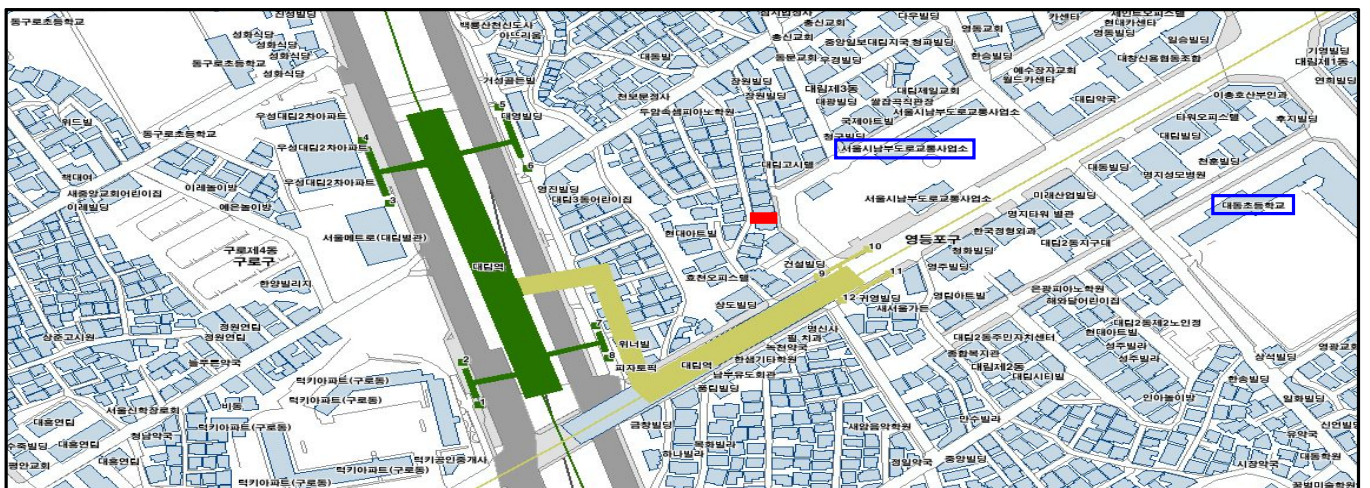

3

금연보도판 설치로 연기 없는 행복한 거리 조성

쾌적한 보도환경 조성의 일환으로 보도상 금연안내판을 설치하여 “담배 연기 없는 거리” “사람중심의 행복한 문화도시” 건설

□ 사업개요

- 대상노선 : 영등포로(영등포유통상가 앞 사거리 ~ 영등포 로터리 간)
- 적용위치 : 가로변 버스정류장 등
- 시설규모 : 10개소 × 9개 = 90개 (개소당 30×30cm 판석 9개씩 부착)

□ 추진방향

- 금연 권장구역 내 동판이 설치되는 건강한 보도조성
- 구민 누구나가 공감하여 금연을 생각하는 공공장소 실현

□ 향후 추진계획

- '13. 6월~7월 : 금연 디자인 보도판 제작
- '13. 8월~9월 : 현장시공
- '13.10월~ : 주민 여론조사 시행 및 확대여부 검토 결정

□ 2012년 추진현황

- 대상노선 : 영등포로(오목교 입구 간 ~ 영등포유통상가 앞 사거리)
- 시설규모 : 10개소 × 9개 = 90개, 석재류, 300×300×T50mm

□ 예산액 : 7,650천원(구비)

4

포장도로 정비 등 소파보수공사

주민생활에 불편을 주는 노후·불량도로를 신속히 정비하여 보행 및 차량통행에 원활을 기하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여

 사업개요

- 추진기간 : 2013. 1월 ~ 12월(연중 계속사업)
- 위 치 : 영등포구 관내
- 사업규모 : 아스팔트정비A=150a, 콘크리트포장 A=20a, 보도정비 A= 35a

 추진실적

- '13. 3. 25 : 공사착공
 - 아스팔트정비A=90a, 콘크리트포장 A=12a, 보도정비 A= 7a

 향후 추진계획

- '13. 6월중 : 1차 변경계약 및 기성검사
- '13. 9월중 : 2차 변경계약 및 기성검사
- '13. 12월중 : 3차 변경계약 및 기성검사
- '14. 2월중 : 4차 변경계약 및 준공예정

 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,670,000천원 (시비150,000 구비 1,520,000)	790,000천원 (구비 790,000)	47%

5

도로시설물 설치 및 보수공사

신속한 도로시설물의 보수로 시설물 이용 주민들의 안전사고 미연방지 및 도시미관 증진에 기여

□ 사업개요

- 추진기간 : 2013. 1월 ~ 12월(연중 계속사업)
- 정비대상 : 관내 도로 시설물
- 사업규모
 - 지하보도 1개소, 보도육교 6개소, 옹벽 및 석축 6개소
 - 난간·과속 방지턱 및 볼라드 설치 등 도로부속시설물

□ 추진실적

- '13. 3. 22 : 공사착공
 - 여의초교 앞 지하보도 외 7개소 세척 2,883 m^2
 - 우신초교 앞 보도육교 외 1개소 도색 72 m^2
 - 대영초교 앞 과속방지턱 설치 및 보수 L=88m
 - 안전헬스설치 232m, 볼라드설치 39개

□ 향후 추진계획

- '13. 6월중 : 1차 변경계약 및 기성검사
- '13. 9월중 : 2차 변경계약 및 기성검사
- '13. 12월중 : 3차 변경계약 및 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
600,000천원 (구비 600,000)	288,000천원 (구비 288,000)	48%

6

사회적 약자를 위한 도시환경 개선

장애인·노인·임산부 등 일상생활에 불편을 겪는 사회적 약자가 공공건물 및 공중이용시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 각종 편의시설을 설치·정비하여 사회적 약자와 일반인 모두의 생활편의 도모

 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 보도블록 정비 12a, 경계석 정비 120m
- 도 급 비 : 59,877천원(구비)
- 공사기간 : 2013. 3월 ~ 12월

 추진실적

- 점자블록 정비 : 7개소
- 보도 턱낮춤 및 측구정비 : 9개소

 향후 추진계획

- 12. 31 : 공사 준공

 소요예산

(단위 : 천원)

예산액	집행액	집행율
95,000천원 (구비 95,000)	18,000천원 (구비 18,000)	19%

7

영등포본동 육교 보수 및 계단 추가

영등포역횡단 보도육교는 주민들이 경인로에서 운행하는 버스를 이용하기 위해 보행하는 주 통로인 보도육교 계단 위치가 사람들 왕래가 적은 길목에 설치되어 있어 육교보수 및 계단을 추가 설치하여 주민안전 및 보행 환경 개선에 기여

 사업개요

- 추진기간 : 2013. 4월 ~ 7월
- 용역대상 : 영등포본동 618-6 영등포역횡단 보도육교
- 규 모 :
 - 육교보수 B= 3.2m, L= 83 m, 엘리베이터설치 2개소
 - 계단추가 설치 및 보수 B= 3.2m, L= 114 m

 추진실적

- '13. 4. 4 : 용역착수
- '13. 4~5 : 기본설계, 측량 및 지반조사

 향후 추진계획

- '13. 6월중 : 설계자문위원회 개최 및 결과 보고
- '13. 7월중 : 용역준공예정

 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
50,000천원 (구비 50,000)	-	0%

8

신길4동 214-8 주변 외 4건 도로정비공사

주민생활에 불편을 주는 신길4동 214-8 주변 외 4건 노후·불량 도로를 정비
안전사고 예방 및 통행 불편 해소에 기여

 사업개요

- 추진기간 : 2013. 5월 ~ 11월
- 위 치 : 신길4동 214-8, 신길4동 4914, 신길4동 4917-9 주변
 영등포동5가 102번지 일대, 신길6동 3923~3946 주변
- 사업규모 : 아스팔트 및 콘크리트 포장 정비
 (B=4~6.8m, L=499m)

 추진실적

- '13. 3~4. : 실시설계 및 발주
- '13. 5. 28. : 공사 계약
- '13. 5. 29 : 공사 착공

 향후 추진계획

- '13. 9월 말 : 공사 준공 예정

 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
307,500천원 (구비 307,500)	-	0%

9 여의도 윤중로 사이 매쉬펜스 등 설치공사

여의도 윤중중학교 앞에 설치된 보도로 통학하는 학생들이 보도에 설치된 난간을 뛰어넘어 통학하므로 학생들의 안전사고 예방 및 면학분위기 조성을 위해 매쉬펜스를 설치코자 함.

□ 사업개요

- 추진기간 : 2013. 2월 ~ 5월
- 위 치 : 여의도동 38-2 윤중중학교 앞
- 사업규모 : 매쉬펜스 설치
 - 정문방향 : H=1.2m, L=20m
 - 보도방향 : H=2.4m, L=150m

□ 추진실적

- '13.2월 : 윤중중학교 앞 매쉬펜스 설치관련 현장방문회의 개최
- '13.3월 : 현장조사 및 자재구매
- '13.4월 : 설치완료

□ 설치사진



□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
20,000천원 (구비 20,000)	19,198천원 (구비 19,198)	96%

영등포구 여의도동 여의도고등학교 앞 주변에 설치된 노후되고 소음저감효과가 떨어진 기존 방음벽을 도시미관과 주위환경에 어울리는 방음효과가 우수한 신제품으로 교체하여 학생들의 면학분위기 조성 및 도시미관 향상에 기여코자 함

사업개요

- 추진기간 : 2013. 3월 ~ 11월
- 위 치 : 여의도동 30-1 여의도고등학교 앞
- 사업규모 : 방음벽 교체(H= 4.5m ⇒ 5m, L= 156m)

추진실적

- '13. 5월 실시설계

향후 추진계획

- '13. 6월 : 공사발주
- '13. 7월 : 공사착공
- '13. 11월 : 공사준공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
429,000천원 (시비 429,000)	-	0%

양평동3가 서부간선도로경계 선유서로35길 주택가 이면도로변 옹벽이 노후되어 안전사고의 위험이 있으며 도시미관을 저해하고 있어 이로인한 주민불편사항을 해소하고 쾌적한 주거환경 및 도시미관 향상에 기여코자 함

사업개요

- 추진기간 : 2012. 12월 ~ 2013. 12월
- 위 치 : 양평동3가 선유서로35길 9~129
- 사업규모 : - 옹벽설치 H=2.6m, L=123m
 - 아스팔트 포장 : A=2.1@

추진실적

- '12. 11월 : 실시설계
- '12. 12월 : 공사발주
- '13. 5월 : 공사착공(공정률 : 60%)

향후 추진계획

- '13. 7월 : 공사준공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
351,000천원 (시비 351,000)	19,118천원 (시비 19,118)	5%

영등포본동 영등포구 영신로 14 ~ 6간 노후옹벽에 대한 안전사고 발생우려 및 도시미관저해로 재보수하여 민원을 해소하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

사업개요

- 추진기간 : 2013. 3월 ~ 9월
- 위 치 : 영등포본동 영신로 14 ~ 6간
- 사업규모 : - 난간 교체 및 신설 L=188m
 - 보도신설 A=210m²
 - 옹벽상부 아스팔트 포장 : A=4@
 - 옹벽외벽 목재루버 설치 A=231 m²

추진실적

- '13. 3월 ~ 5월 : 실시설계 및 공사발주

향후 추진계획

- '13. 6월 : 공사착공
- '13. 9월 : 공사준공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
350,000천원 (시비 350,000)	13,442천원 (시비 13,442)	3%

관내 도로시설물의 노후 훼손 등에 대한 신속한 보수로 시설물 이용 주민들의 안전사고 미연방지 및 도시미관 증진에 기여하고 구조적인 결함을 조기에 발견하고자 안전점검 실시

사업개요

- 추진기간 : 2013. 3월 ~ 12월
- 위 치 : 관내 도로시설물

추진실적

- '13. 3월 : 관내 도로시설물 안전점검 기술자문위원 합동점검 실시

향후 추진계획

- 관내 도로시설물 긴급 복구상황 발생시 추진

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
10,000천원 (구비 10,000)	-	0%

다가오는 겨울철 강설에 대비하여 제설대책 준비에 만전을 기하여 강설시 원활한 교통소통 및 주민생활에 불편이 없도록 최선을 다하고자 함.

□ 추진개요

- 추진기간 : 2012. 11. 15 ~ 2013. 3. 15(4개월)
- 제설구간 : 도로연장 382km
 - 당산로 외 51개 노선(12~20m 이상) L=89km
 - 이면도로(8m이하) 및 고갯길 등 L=293km

□ 추진방향

- 내 집 내 점포 앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상
- 폭설(적설량 10cm 이상)시 각 실과별 담당동 제설작업 지원 및 제설 민간 장비 업체를 동원 제설작업 시행, 민간장비 동원 시 각 실과별 담당지정 노선 책임 제설

□ 추진실적

- 강설대비 비상근무 발령(총 31회)
 - 보강근무(17회), 1단계근무(12회), 2단계근무(2회)
- 인력·장비·자재 투입
 - 인력(3,467명), 장비(다목적제설차 등 634대)
 - 염화칼슘(635ton), 소금(694ton)
- 제설습염 시설 장비설치
 - 교반기 1대, 약품탱크 1대, 전동식체인호이스트 1대
 - 용액살포기(15톤용) 2대, 용액살포기(8톤용) 1대

□ 향후 추진계획

- '13. 10월 : 2013~2014 제설대책 종합계획 수립
- '13. 10월 : 주민홍보 및 제설자재 등 장비확충
- '13. 11월 : 재난상황실 운영 및 제설대책 상시 근무

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
525,387천원 (시 172,586, 구비 352,801)	421,044천원 (시 165,975, 구비 255,069)	80%

도로상 설치되어 있는 맨홀의 포장면에 대한 평탄성을 유지함으로써 안전하고 쾌적한 도로환경 조성에 기여코자 함

사업개요

- 대 상 : 관내 도로상 노후·불량 맨홀
 - 불량맨홀 정비는 우리 구에서 선시공하고 관리기관에 징수하여 세입조치
- 규 모 : 불량맨홀정비 N=100개소
- 기 간 : 2013. 4월 ~ 2014. 2월

추진방향

- 불량맨홀 사고예방을 위한 신속한 정비 및 맨홀정비비 부과 후 징수

추진실적

- '13. 4월 : 공사계약 및 착공
- '13. 5월 : 불량맨홀정비 완료 N=73개소

향후 추진계획

- '14. 2. 28 : 공사준공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,800천원 (구비 100,800)	46,800천원 (구비 46,800)	46%

전기설비 기술기준 및 판단기준에 부적합한 가로등 시설물과 사고주 및 부점등 등 수시 민원이 발생하는 노후 가로등시설물에 대한 유지보수 및 정비를 위한

추진방향

- 부적합 가로등시설물 정비를 통한 전기안전사고 예방
- 사고주 및 부점등 등의 신속한 보수 실시로 민원 예방

추진실적

- 가로등 정비 18본, 노후 및 사고 분전함 정비 3면
- 기타 가로등 클러브세척 등 1식

향후 추진계획

- 한국전기안전공사 정기검사 부적합 시설에 대한 보수실시
- 노후 가로등시설물 정비 및 유지보수 지속 추진

기대효과

- 노후 가로등시설로 인한 전기안전사고 예방
- 부점등 및 사고주 신속한 처리로 도로이용자 편의제공

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
241,500천원 (구비 241,500)	34,000천원 (구비 34,000)	14.1%

야간 취약지역 골목에 보안등 신설 개량 및 부점등 등 유지보수를 실시하여 지역 주민과 도로이용자의 야간 생활 편의 제공하기 위함

추진방향

- 취약지역 골목 보안등 신설 개량 실시
- 부점등 등 고장 보안등의 신속한 보수로 민원 예방

추진실적

- 보안등 설치 개량 : 16개소
- 부점등 등 유지보수 : 3,035개소

향후 추진계획

- 취약지역 보안등 신설 개량 지속 추진
- 고장 보안등 정비 및 유지보수 지속 추진

기대효과

- 전기안전사고 예방 및 야간 지역주민 및 도로이용자 생활 편의 제공

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
301,700천원 (구비 301,700)	80,000천원 (구비 80,000)	26.5%

'12년 주민이 참여하는 야간 보안등 순찰을 실시하여 현장중심의 열린 행정을 구현하고 고장 보안등으로 인한 주민 불편신고 민원이 감소하는 등 구정의 신뢰향상에 기여 '13년도에도 지속 추진코자 함

□ 추진방향

- 고장 보안등의 신속한 적출·정비로 민원예방 및 야간 통행불편 해소
- 주민참여 보안등 순찰 실시로 현장중심의 열린 행정 구현 및 신뢰 향상
- 취약시설 야간순찰로 사고 예방 및 구민의견 수렴

□ 추진실적

- 추진기간 : 2013. 3. 15 ~ 현재
- 순찰실시 : 45회(매주 2회-화·목)
- 적출건수 : 부점등 등 508건

□ 향후 추진계획

- 주민참여 보안등 순찰 2013. 11. 15까지 지속 추진

□ 기대효과

- 취약 지역 순찰실시 고장 보안등 민원 감소 및 열린 행정 실현

□ 소요예산 : 없음

※ 2012년 순찰 실적 및 2011년 대비 민원감소 현황

2012년 순찰실적		2011년 대비 민원발생 건수 및 감소			
순찰횟수	적출건수	2011년	2012년	감소건수	감소율(%)
64회	802	1,852	1,467	385	20.8

한강 여의도 봄꽃축제의 노후 경관조명등을 다양한 칼라연출이 가능한 LED조명등으로 교체하여 야간 축제분위기 조성과 전기안전사고를 사전에 예방하고자 함

□ 추진 방향

- 노후 지중 경관조명등 66등 교체하여 전기 안전사고 예방
- 다양한 칼라 연출이 가능한 LED경관조명등으로 교체하여 축제 분위기 조성

□ 추진실적

- '13. 2월 : 설계 및 발주
- '13. 3월 : 공사계약 및 착공
- '13. 3월 : 공사 준공(MH150W지중등 LED30W등으로 교체완료)

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000천원 (구비 100,000)	87,124천원 (구비 80,000)	87.1%

□ 위치도



가로등이 한쪽배열로만 설치되어 있어 보도가 어두운 여의도 광장아파트 외 1개소에 보행가로등을 설치하여 야간 도로이용자 편의를 제공하기 위함

□ 추진 방향

- 가로등이 한쪽 배열로 설치되어 야간 통행 불편 해소
- 전력소모가 작고 연색성이 우수한 LED 50W 보행등 22등 설치로 에너지 절약실천

□ 추진실적

- '13. 5월 : 공사 설계물량조사 및 설계완료

□ 향후 추진계획

- '13. 6월 : 빛 공해 방지 심의 완료 및 공사 착공 실시
- '13. 10월 : 공사 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
140,000천원 (구비 140,000)	0	0%

□ 위치도



21 2013년도 주요투자사업 현황

(단위:백만원)

연번	사업명	2013 예산				2012 예산(추경포함)				증감
		계	구비	시비	국비	계	구비	시비	국비	
	합 계	6,371	4,083	2,288	0	4,005	3,805	0	200	2,366
1	부당이득금반환 등 보상비지급	300	300	-	-	300	300	-	-	-
2	대림동 812-12번지 도로개설공사	100	100	-	-	100	100	-	-	-
3	포장도로정비 등 소파보수공사	1,670	1,520	150	-	1600	1,600	-	-	70
4	도로시설물설치 및 보수	600	600	-	-	700	700	-	-	△100
5	사회적 약자를 위한 도시환경개선공사	95	95	-	-	150	150	-	-	△55
6	당산로 46길 도로정비 공사	100	100	-	-	-	-	-	-	100
7	영등포동5가 102번지 주변 외 2개소 도로정비공사	75	75	-	-	-	-	-	-	75
8	신길4동 214-8 주변 도로정비공사	69	69	-	-	-	-	-	-	69
9	신길4동 4914 주변 도로정비공사	77	77	-	-	-	-	-	-	77
10	신길4동 4917-9 주변 도로정비공사	37	37	-	-	-	-	-	-	37
11	영등포본동 육교 보수 및 계단추가	50	50	-	-	-	-	-	-	50
12	여의도 윤중로 사이 매쉬 펜스 등 설치공사	20	20	-	-	-	-	-	-	20
13	신길6동 신평로 14길 주변 도로정비공사	50	50	-	-	-	-	-	-	50
14	도로시설물등 안점점검 및 긴급보수공사	10	10	-	-	20	20	-	-	△10
15	여의도 고등학교 방음벽 교체공사	429	-	429	-	-	-	-	-	429

연번	사 업 명	2013 예산				2012 예산(추경포함)				증감
		계	구비	시비	국비	계	구비	시비	국비	
16	양평동3가 서부간선도로 경계옹벽개선공사	351	-	351	-	-	-	-	-	351
17	영등포본동 602번지 옹벽개선공사	350	-	350	-	-	-	-	-	350
18	관내 불량맨홀 정비공사	100	100	-	-	125	125	-	-	△25
19	가로등시설물 정비공사	240	240	-	-	250	250	-	-	△10
20	보안등 설치 개량 및 유지보수 공사	300	300	-	-	360	360	-	-	△60
21	여의도 광장아파트 외 1개소 가로등 설치공시	140	140	-	-	-	-	-	-	140
22	여의도 봄꽃축제 경관조명등 교체공사	100	100	-	-	-	-	-	-	100
23	관내 LED보안등 설치공사	460	100	360	-	400	200	-	200	60
24	신길로 가로등 개량공사	540	-	540	-	-	-	-	-	540
25	양평로 가로등 개량공사	108	-	108	-	-	-	-	-	108

Ⅲ. 신규·주요 투자사업 실적

1 “찾아가는 도로현장 신문고” 실시

각 지역별 현안업무 관련 회의 시 도로 관련 민원을 사전에 파악, 처리하여 구민의 행정 만족도를 향상시키고 고객위주의 능동적인 행정을 추진하고자 함.

사업목표

- 도로관련 현장에서 사전 민원파악 후 신속 처리

추진방향

- 동별 통장회의 개최 시기에 맞춰 현장에서 직접 민원을 접수 신속처리
- 주요공사 진행 전 지역 주민들의 요구사항을 현장에서 의견청취 후 공사 진행시 민원이 발생하지 않도록 사전 반영

추진실적

- 회의참석 : 5개동 실시(당산1·2동, 영등포동, 영등포본동, 여의동)
- 민원접수 : 건의사항 접수 총 32건(조치완료 : 23건, 조치중 : 9건)

향후 추진계획

- '13. 6월 : 도림동, 문래동, 양평1동, 양평2동, 신길1동
- '13. 8월 ~ 10월 : 대림1동 외 7개동

기대효과

- 사후 민원처리 과정에서 발생할 수 있는 주민들의 행정 불만족 감소
- 고객의 의견을 현장에서 직접 청취 후 신속히 처리하여 행정 만족도 향상

소요예산 : 비예산 사업

2 관내 LED보안등 설치공사

국가에서 추진 중인 지역 에너지절약사업 및 빛 공해 방지사업 일환으로 관내 노후 NH 100W보안등을 LED 50W이하 보안등으로 교체 설치하여 전기 에너지 절약에 적극 동참하고 예산 절감에 이바지하고자 함

추진방향

- 노후 보안등 우선하여 LED보안등으로 교체 설치 추진
- 빛 공해 발생 지역 LED보안등 적용 추진
- NH100W를 LED50W이하 보안등으로 교체하여 에너지 절약 및 예산절감

추진실적

- '13. 4월 : 영등포구 LED보안등 보급기준 제정, 계약심사
- '13. 5월 : 공사발주(양평2동-2012년 시비 260,000천원)
- '13. 6월 : 빛 공해 방지 심의, 공사 시행

향후 추진계획

- '13. 6월~12월 : 공사 발주 및 준공(영등포본동, 도림동)
(2013년 시비 100,000천원, 구비 100,000천원)

기대 효과

- 빛 공해 민원 해소 및 에너지절약 공공요금 절감과 원전 하나 줄이기 인센티브사업 기여

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
460,000천원 (시 360,000, 구 100,000)	-	0%

3 신길로 가로등 개량공사

15년 이상 된 신길로 노후 가로등시설물에 대한 개량을 실시하여 전기안전 사고 예방 및 야간 도로이용자에게 편의를 제공하기 위 함

추진 방향

- 노후 가로등 전원선로 교체하여 전기안전사고 예방
- 야간 빛 공해 최소화로 도로이용자 및 지역주민 야간 생활 편의 증진

추진실적

- '13. 3. 28 : 빛 공해 방지 심의 완료(서울시 공공디자인과)
- '13. 4. 03 : 서울시 계약심사 완료(서울시 계약심사과)
- '13. 4. 25 : 공사 발주
- '13. 5. 16 : 공사 계약 및 착공

향후 추진계획

- 가로등기구 교체 69본, 가로등철거/설치 17/18본 및 전원선로 교체
- '13. 11. 30 : 공사준공

기대효과

- 노후 가로등 전원선로 교체에 따른 전기안전사고 예방
- 야간 빛 공해 최소화로 도로이용자 및 지역주민 생활편의 증진

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
540,000 (시 540,000)	152,000 (시 152,000)	28.1%

□ 위치 도



4

양평로 가로등 개량공사

15년 이상 된 양평로 노후 가로등시설물에 대한 개량을 실시하여 전기안전 사고 예방 및 야간 도로이용자에게 편의를 제공하기 위 함

 추진 방향

- 노후 가로등 전원선로 교체하여 전기안전사고 예방
- 야간 빛 공해 최소화로 도로이용자 및 지역주민 야간 생활 편의 증진

 추진실적

- '13. 3. 28 : 빛 공해 방지 심의 완료(서울시 공공디자인과)
- '13. 4. 03 : 서울시 계약심사 완료(서울시 계약심사과)
- '13. 4. 25 : 공사 발주
- '13. 5. 15 : 공사 계약 및 착공

 향후 추진계획

- 가로등 철거 설치 15분 및 전원선로 교체 실시
- '13. 11. 30 : 공사준공

 기대효과

- 노후 가로등 전원선로 교체에 따른 전기안전사고 예방
- 야간 빛 공해 최소화로 도로이용자 및 지역주민 생활편의 증진

 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
108,000천원 (시 108,000)	32,000천원 (시 32,000)	29.6%

□ 위 치 도

