

제197회 구의회 임시회

2016.10.19. ~ 10.26.

청림 명동포구

2016년 주요업무 보고




도 로 과

보고 순서

I . 일반 현황	1
II . 주요업무 추진 실적	4
III . 중점사업 실적	15

I. 일반 현황

1 조직

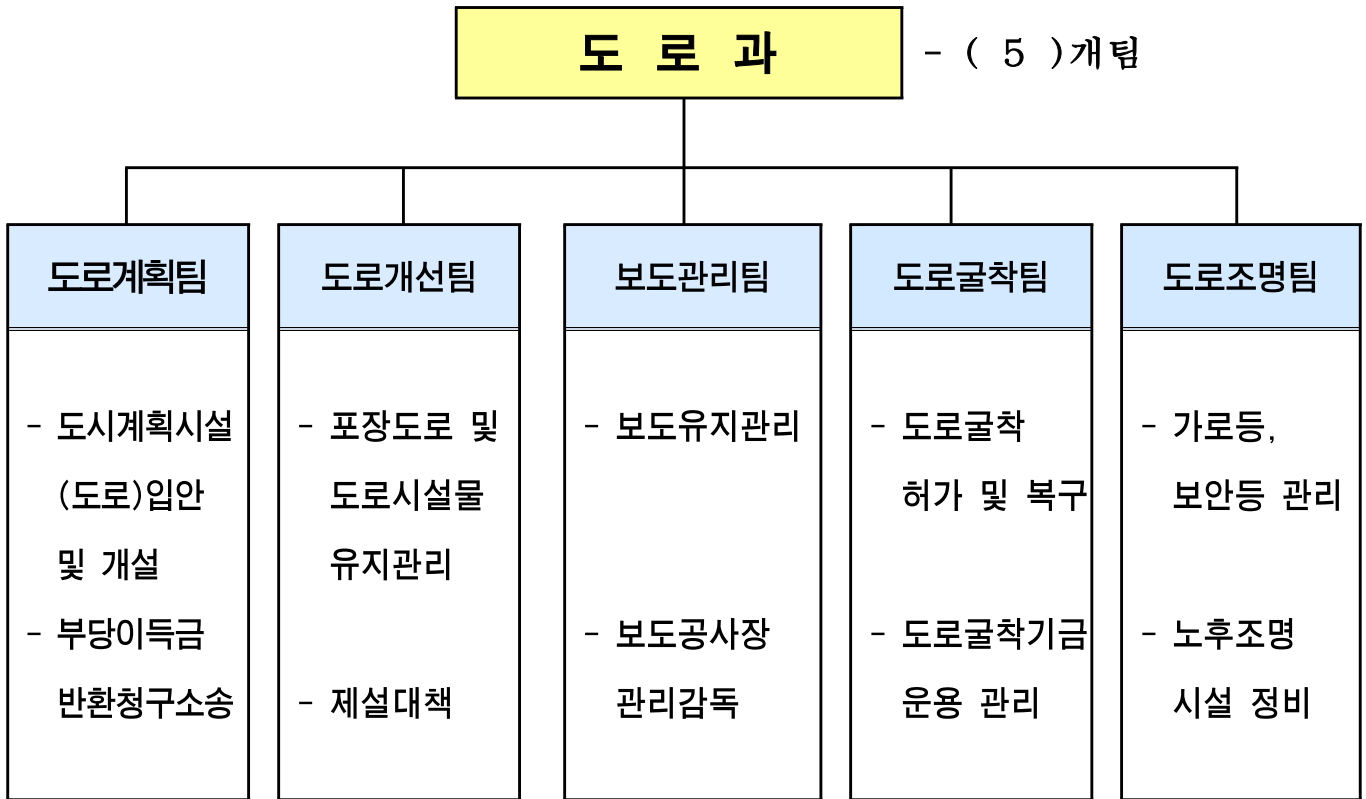

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	-	1	5	11	8	3	-	2	1	1	-	-	-	-
현 원	32	-	1	7	11	3	7	-	3	-	-	-	-	-	-
과부족	-	-	-	2	-	△5	4	-	1	△1	△1	-	-	-	-

3

주요시설 및 장비

□ 도로

- 주요간선도로 : 경인로 외 27개 노선
- 도로현황

연장 390.6km		도로율
시도 76.0km	구도 314.6km	23.4% (서울시 : 22.42%)

□ 교량 및 고가차도

교량(20개소) - 시 관리	고가차도(6개소) - 시 관리
양화교, 신정교, 양평교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교, 샛강다리교, 선유교, 한강교량(6개소 : 성산, 양화, 당산, 서강, 마포, 원효)	선유, 도림천, 영등포역, 보라매, 도림, 신길

□ 지하차도 및 지하보도

지하차도(12개소) - 시 관리	지하보도(1개소) - 구 관리
국회앞, 여의2교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측, 노들길(서울교남단), 신길, 서울교 접속 지하차도, 영등포, 대방, 여의교	여의초교 앞

□ 보도육교 및 입체교차로

보도육교(7개소) - 구 관리	입체교차로(5개소) - 시 관리
우신초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포수원지, 영등포역횡단, 도림	영등포R, 여의하류, 여의상류, 목동교동측IC, 염창IC

□ 조명시설

가로등 - 구 관리	보안등 - 구 관리
9,105등 (LED867등)	9,800등(LED 1,688)

4

예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	8,374,264	5,658,631	67.5
도로건설을통한 기반시설 확충	1,328,676	332,545	25.1
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	3,523,163	2,692,001	76.5
걷기편한 보도환경 조성	190,700	152,537	80
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	2,639,467	1,939,655	73.5
행정운영경비	658,868	508,630	77.2
재무활동	33,390	33,263	99.6

Ⅱ . 주요업무 추진 실적

연번	사 업 명	쪽
①	도림동~신도림역간 보도육교 설치공사	5
②	도림동 286-11~187-39간 도로개설공사	6
③	포장도로정비 등 소파보수공사(연간단가)	7
④	도로시설물 설치 및 보수공사(연간단가)	7
⑤	도신로 89 주변 외 2개소 도로정비공사	8
⑥	도림로102길 주변 외 1개소 도로정비공사	9
⑦	신길지하차도 외 1개소 자동염수살포장치 설치공사	10
⑧	보도정비공사(연간단가)	11
⑨	사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사(연간단가)	11
⑩	포장도로 굴착복구 공사(연간단가)	12
⑪	불량맨홀 정비공사(연간단가)	12
⑫	가로등시설물 정비공사(연간단가)	13
⑬	보안등 설치 개량 및 유지보수공사(연간단가)	13
⑭	LED 보안등 설치공사	14

도림천으로 단절되어 있는 신도림역과 아파트 단지 간의 연결로 설치로 보행로를 확보하여 신도림역의 보행접근 편의성 향상을 도모코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 아파트단지 ~ 신도림역 1호선
- 규 모 : 연결로 폭 2.5m, 연장 104.6m
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 총사업비 : 2,880백만원(시비)

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비 고
총사업비	2,880	50	253	2,577			
설 계 비	180	50	130				
공 사 비	2,700		123	2,577			

□ 주요 추진실적

- '16. 1.~5. : 강교설치 및 부대공사(진입로 설치 등)
- '16. 5. 28. : 공사완료 및 개통

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,673,798 (시비 이월금1,673,798)	1,665,466 (시비 이월금1,665,466)	99.5

□ 위치도 및 현황사진



2 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사

도로계획팀

철도변 이면도로 개설로 신도림역을 이용하는 영등포동, 도림동 구민의 통행불편 해소 및 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 추진으로 민원해소.

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 286-11~187-39간
- 규 모 : 도로개설 폭 6m, 연장 265m
 - ※ 보상 r 기 보 상(2010) - 토지2필지(57m²)
 - L 금회보상(2016) - 토지7필지(260m²)
- 사업기간 : 2010~2018년
- 총사업비 : 4,903백만원(구비: 보상비3,750, 공사비1,103, 설계비 50)
(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2015	2016	2017	장 래	비 고
총사업비	4,903	350		1,000	1,000	2,553	
설 계 비	50	50					
보 상 비	3,750	300		1,000	620	1,830	
공 사 비	1,103				380	723	

□ 추진실적

- '16. 6. ~ 9. : 도시계획시설(도로) 선형변경 및 열람공고

□ 향후계획

- '16.10. ~ 12. : 보상시행(건설관리과)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,000,000 (구비 1,000,000)	61,364 (구비 61,364)	6.1

□ 위 치 도



3 포장도로정비 등 소파보수공사(연간단가)

도로개선팀

□ 사업개요

- 규 모 : 아스팔트포장 A=298a, 콘크리트포장 A=11a, 보도포장 A=19a
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.

□ 주요 추진실적

- 아스팔트 포장 224a, 콘크리트 포장 5A, 보도블록 포장 15a
- 공 정 률 : 80%

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,587,500 (구비 1,587,500)	1,327,107 (구비 1,327,107)	83.6

4 도로시설물 설치 및 보수공사(연간단가)

도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 과속방지턱 신설 및 보수 L=313m, 도색 A=2,100m²
난간 보수 및 설치 L=310m, 비규격 블라드 정비 811개
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.

□ 주요 추진실적

- 과속방지턱 설치 및 보수 303m, 도색 700m², 비규격블라드 정비 757개
- 노후계단 정비 2개소 및 기타시설 정비 1식
- 공 정 률 : 79%

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
800,800 (구비 800,800)	559,695 (구비 559,695)	69.9

5 도신로 89 주변 외 2개소 도로정비공사

도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 도신로 89~도림로 332, 당산로16길 3-10~5-12, 가마산로 386~가마산로48길 30
- 규 모 : 아스팔트포장 A=41.2a, 도로경계석 L=603m, 측구 설치 L=534m
- 사업기간 : '16. 5. 18. ~ 7. 29.

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
182,480 (시비182,480 시주민참여예산)	172,911 (시비 172,911)	95

□ 위치도 및 현황사진

<p>도신로 89~도림로 332 (도림동)</p> 	<p>B=4m, L=105m, A=3.9a 38백만원</p> 
<p>당산로16길 3-10~5-12 (당산1동)</p> 	<p>B=6m, L=50m, A=2.2a 15백만원</p> 
<p>가마산로 386~가마산로48길 30 (대림3동)</p> 	<p>B=8~11m, L=290m, A=35.1a 120백만원</p> 

6

도림로102길 주변 외 1개소 도로정비공사

도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 도림로102길 주변, 신길로13길 주변
- 규 모 : 아스팔트포장 A=9.9a, 도로경계석 L=660m, 측구 설치 L=552m
- 사업기간 : '16. 4. 18. ~ 6. 30

□ 소요예산

(단위:천원)





예 산 액	집 행 액	집행율(%)
200,000 (구비200,000 구주민참여예산)	143,968 (구비 143,968)	71.9

※ 사업계획 변경시행

당초 대상지가 4개소가 선정되었으나, 공사비 증가에 따른 확보예산 부족으로 영신로1길(도림동) 및 영등포로68길 8(영등포본동) 주변 2개소는 2016년 포장도로정비 등 소파보수공사(연간단가)로 정비 시행

※ 신길로13길 주변 하수관 교체 공사로 인한 공사비용 감액

□ 위치도 및 현황사진

<p>도림로102길 주변 (신길3동)</p> 	<p>B=2~4m, L=340m, A=7.5a 118백만원</p> 
<p>신길로13길 주변 (신길5동)</p> 	<p>B=4m, L=60m, A=2.4a 26백만원</p> 

7 신길지하차도 외 1개소 자동염수살포장치 설치공사 도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 신길지하차도 및 도림고가차도 상부도로
- 규 모
 - 신길지하차도 상부 : 노즐 500m, 저장하우스 1동 설치
 - 도림고가차도 상부 : 노즐 500m, 저장하우스 1동 설치
- 사업기간 : '16. 8. ~ 10.

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
348,000 (시비 348,000)	347,650 (시비 347,650)	99.8

□ 위치도 및 현황사진

○ 신길지하차도 상부 : 168,000천원 - 시주민참여예산



○ 도림고가차도 상부 : 180,000천원 - 시비



사업개요

- 규 모 : 보도블록 정비 32a
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.

 주요 추진실적

- 보도블록 정비 26a(대방천로14길외 20개소)
- 공 정 률 : 80%

 향후계획

- '16. 10. ~ 12. : 노후 불량 및 파손된 보도정비 추진

 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
130,700 (구비 130,700)	98,537 (구비 98,537)	75.4

 사업개요

- 규 모 : 보도 턱낮춤 100개소, 점자블록 1a
- 사업기간 : '16. 1. ~12.

 주요 추진실적

- 보도 턱낮춤 43개소 (선유로11길12외 42개소) 등
- 공 정 률 : 90%

 향후계획

- '16. 10. ~12. : 보도 턱낮춤 및 파손된 점자블록 정비

 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
60,000 (구비 60,000)	54,000 (구비 54,000)	90

10 포장도로 굴착복구공사(연간단가)

도로굴착팀

사업개요

- 규 모 : 아스팔트포장 180a, 콘크리트 포장8a, 보도블록포장 40a
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.

주요 추진실적

- 아스팔트포장 123a, 콘크리트포장 3a, 보도블록포장 20a
- 공 정 률 : 70%

향후계획

- '16. 10. ~ 11. : 노후불량도로 정비 시행

소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,436,041 (도로굴착복구기금 1,436,041)	1,309,497 (도로굴착복구기금 1,309,497)	91

11 불량맨홀 정비공사(연간단가)

도로굴착팀

사업개요

- 규 모 : 불량맨홀 정비 230개소
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.

주요 추진실적

- 불량맨홀 정비 : 도림로47길 1외 131개소
- 상수도(18), 통신(68), 전기(3), 가스(3), 소화전(40)
- 공 정 률 : 72%

향후계획

- '16. 10 ~ 11 : 정비물량 조사 후 맨홀관리 기관 협의 후 지속적으로 사업추진

소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
150,000 (도로굴착복구기금 150, 000)	130,758 (도로굴착복구기금 130,758)	87

12 가로등시설물 정비공사(연간단가)

도로조명팀

□ 시설현황 : 가로등 9,105등

(내구년한 15년경과 가로등 2,752등-전체가로등의 30.2%)

□ 사업개요

- 규 모 : 가로등정비 106등, 기타 정비 1식
- 기 간 : '16. 1. ~ 12.

□ 주요 추진실적

- 가로등정비 95등, 클러브세척 801등, 분전함 정비 2면, 기타 정비 1식
- 공 정 률 : 70%

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
188,800 (구비 188,800)	149,802 (구비 149,802)	79.3

13 보안등 설치 개량 및 유지보수 공사(연간단가)

도로조명팀

□ 시설현황 : 18개동 9,800등

- ※ 빛 공해 방지형 등기구 2,237등, 확산대형등기구 7,563등
- ※ 빛 공해 방지법령에 의거 확산대형등기구 7,563등 개량 대상임(87.1%)

□ 사업개요

- 규 모 : 보안등신설·개량 90등, 기타 고장등 보수 1식.
- 사업기간 : '16. 1.~ 12.

□ 주요 추진실적

- 보안등 설치 개량 46등, 고장 보안등 보수 2,200등
- 공 정 률 : 80%

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
290,200 (구비 290,200)	214,305 (구비 214,305)	73.8

국가에서 추진중인 지역 에너지절약사업 및 빛 공해 방지사업 일환으로 관내 노후 NH 100W보안등을 LED 50W이하 보안등으로 교체 설치하여 전기에너지 절약을 통한 예산 절감 및 빛 공해를 해소하여 주민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 대림1동
- 규 모
 - 노후 확산대형보안등 NH100W 93등 철거
 - LED50W보안등 93등 설치
- 사업기간 : '16. 6.~ 10.

□ 주요 추진실적

- '16. 5. 20. : 빛 공해 심의 완료(서울시 도시빛정책과)
- '16. 5. 27. : 계약심사 완료(재무과)
- '16. 5. 30. : 공사 발주
- '16. 6. 13. : 공사 착공
- 공 정 율 : 95%

□ 향후계획

- '16. 10. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
114,000 (시 44,000, 구비 70,000)	107,641 (시 43,260 구비 64,381)	94.4

Ⅲ . 중점사업 실적

1 도림로 확장공사

도로계획팀

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 추진개요

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~신길동421-16간(신길광장)
 - ※ 금회 ㄱ 공사 - 신길동355-662~신길동420-192
 - ㄴ 보상 - 신길동 420-193~신길동 421-29
- 규 모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m
 - ㄱ 신길5동사무소측 : 기확장 850m, 미확장 300m(신길재정비촉진지구 내)
 - ㄴ 성 락 교 회 측 : 기확장 870m, 미확장 280m
 - ※ 금회 ㄱ 공사 - 도로확장 폭 30→35m, 연장 173m(성락교회측)
 - ㄴ 보상 - 토지 2필지(145㎡), 연장 37m
- 사업기간 : 1997년 ~ 2018년
- 총사업비 : 50,150백만원(시비, 보상비 44,100, 공사비 5,900, 설계비150)
- 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기투자	2015	2016	2017	2018	비고
계	50,150	36,550	1,000	2,000	2,600	8,000	
보 상 비	44,100	32,600	500	1,400	2,200	7,400	
공 사 비	5,900	3,800	500	600	400	600	
설 계 비	150	150	-	-	-	-	

□ 주요 추진실적

- '16. 3.23. : 공사 착공
- '16. 4. ~ 8. : 건축물 철거, 상수도관 및 하수도관 이설
- '16. 8. ~ 9. : 전주 및 통신주 등 이설, 도로경계석 설치

□ 향후계획


- '16. 10. 1 ~ 10. 15 : 아스팔트 및 보도블록 포장
- '16. 10. 16 ~ 10. 25 : 노면표시 및 교통신호기 설치 공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,000,000 (시비 2,000,000)	330,160 (시비 330,160)	16.6

□ 위치도

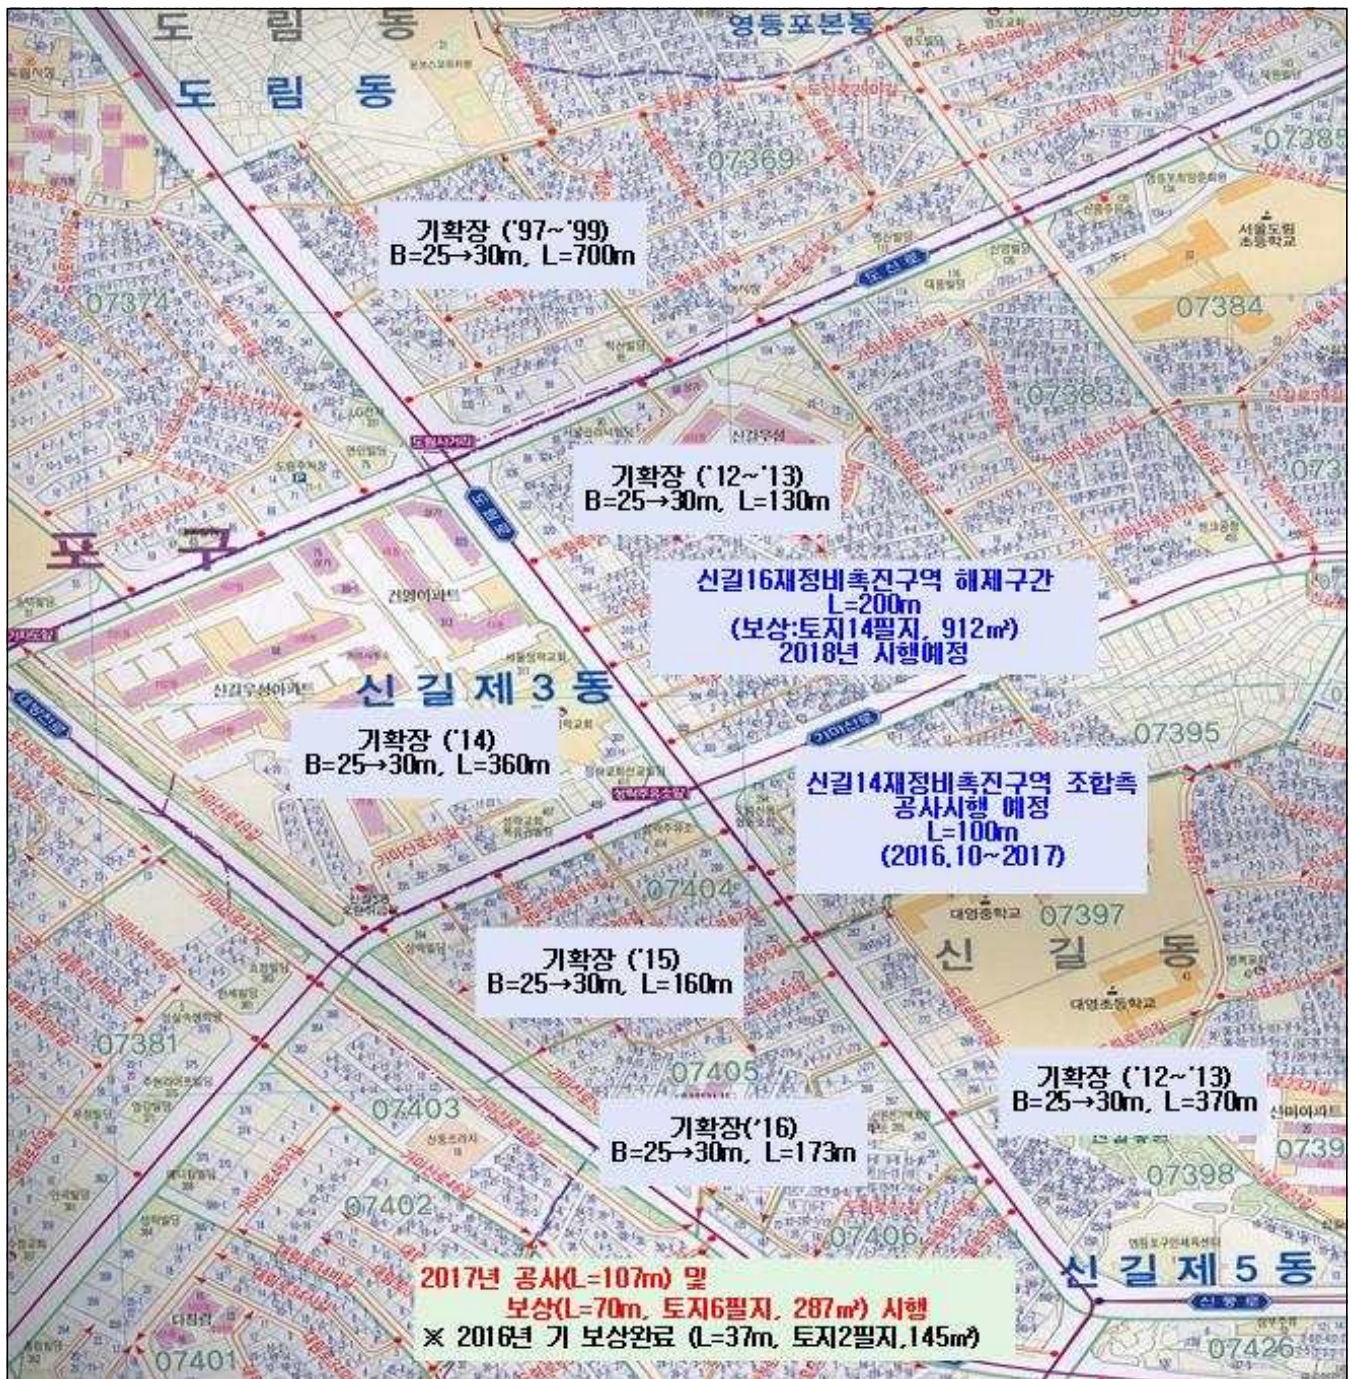

외국인 밀집지역인 대림3동 노후 확산대형 NH100W보안등을 LED50W등으로 개량 및 신설하여 야간 범죄 예방하고 빛 공해 해소를 통한 주민 삶의 질 향상 및 에너지절약을 통한 예산절감

□ 사업개요

- 위 치 : 대림3동
- 규 모
 - 노후 확산대형보안등 NH100W 철거 194등, LED50W보안등 설치 194등
- 사업기간 : '16. 6. ~ 10.

□ 주요 추진실적

- '16. 5.20. : 빛 공해 심의 완료(서울시 도시빛정책과)
- '16. 5.27. : 계약심사 완료(재무과)
- '16. 5.30. : 공사 발주
- '16. 6.13. : 공사 착공
- 공 정 율 : 95%

□ 향후계획

- '16. 10. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
213,360 (시비 213,360시주민참여예산)	191,897 (시비 191,897)	89.9

□ 위치도



3 가로등 개량공사(신풍로 외 2개소)

도로조명팀

15년 이상 된 노후 가로등시설물을 개량하여 전기 안전사고를 예방하고 야간 교통 환경을 개선하여 도로이용자 편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 신풍로(도림로~대방로), 가마산길(도림로~가마산로65길) 복음길(제물포로~여의도공원)
- 규 모
- 가로등 NH250~400W 128본 철거. LED75W~100W 147본 설치
- 사업기간 : '16. 6. ~ 11.

□ 주요 추진실적

- '16. 5.10. : 계약심사 완료(서울시 계약심사과)
- '16. 5.13. : 공사 발주
- '16. 5.27. : 빛 공해 심의 완료(서울시 도시빛정책과)
- '16. 6.01. : 공사 착공
- '16. 9. : 복음길·가마산길 가로등 개량공사 준공
- 공 정 율 : 65%(신풍로)

□ 향후계획

- '16. 11. : 신풍로 가로등 개량공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,170,000 (시비 1,170,000)	921,697 (시비 921,697)	78.8

□ 위치도

