

부서별 주요업무 보고



도 로 과

보고 순서

1. 일반 현황
2. 주요업무 추진실적
3. 2016 주요업무 추진계획
4. 신규 · 주요투자 사업

1. 일반 현황

1 조직

도로과

- (5)개팀



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직 · 임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	-	1	5	11	8	3	-	2	1	1	-	-	-	-
현 원	31	-	1	7	11	4	3	1	4	-	-	-	-	-	-
과부족	△1	-	-	2	-	△4	-	1	2	△1	△1	-	-	-	-

3

주요시설 및 장비

□ 도로

- 주요간선도로 : 경인로 외 27개 노선
- 도로현황

연장 387.9km		도로율
시도 76.0km	구도 311.9km	23.35% (서울시 : 22.32%)

□ 교량 및 고가차도

교량(20개소) - 시 관리	고가차도(6개소) - 시 관리
양화교, 신정교, 양평교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교, 샛강다리고, 선유교, 한강교량(6개소 : 성산, 양화, 당산, 서강, 마포, 원효)	선유, 도림천, 영등포역, 보라매, 도림, 신길

□ 지하차도 및 지하보도

지하차도(12개소) - 시 관리	지하보도(1개소) - 구 관리
국회앞, 여의2교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측, 노들길(서울교남단), 신길, 서울교 접속 지하차도, 영등포, 대방, 여의교	여의초교 앞

□ 보도육교 및 입체교차로

보도육교(6개소) - 구 관리	입체교차로(5개소) - 시 관리
우신초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포 수원지, 영등포역 횡단보도육교	영등포R, 여의하류, 여의상류, 목동교동측IC, 염창IC

□ 조명시설

가로등 - 구 관리	보안등 - 구 관리
8,792등(LED 762)	9,744등(LED 1,355)

4

예산 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	집행액		예상잔액
		10.31기준	12.31까지	
계	7,997,148	4,588,334	3,073,723	335,091
도로개설 및 확장	758,830	507,644	248,913	2,273
도로정비 및 유지관리	3,489,956	1,446,494	1,885,245	158,217
보도관리	140,700	64,230	72,000	4,470
도로굴착	190,800	53,100	137,320	380
도로조명 시설 정비	2,364,544	1,625,760	582,819	155,965
행정운영경비	758,301	607,520	136,998	13,783
보전지출	294,017	283,586	10,428	3

2. 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	도림로 확장공사	5
②	대림동 812-12번지 도로개설공사	7
③	당산동~셋강생태공원간 연결로 설치공사	8
④	신도림역~도림동 연결로 개선공사	10
⑤	영등포역 횡단 보도육교 보수공사	12
⑥	포장도로정비 등 소파보수공사(연간단가)	13
⑦	도로시설물 설치 및 보수공사(연간단가)	13
⑧	도신로39길 3 노후계단 정비공사	14
⑨	양평로 지중화 사업	15
⑩	가로등시설물 정비공사(연간단가)	17
⑪	보안등 설치개량 및 유지보수공사(연간단가)	17
⑫	LED보안등 설치공사	18
⑬	도신로 가로등 개량공사	19

신길재정비촉진지구 활성화로 지역균형발전 및 장기미집행 도로사업시행으로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~ 신길동421-16간(신길광장)
 - ※ 금회 ㄱ 공사 - 신길동 355-678 ~ 신길동 355-663
 - ↳ 보상 - 2014년 인가구간(신길동420-192)
- 규모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m
 - ※ 금회 ㄱ 공사 - 도로확장 폭 25→30m, 연장 160m
 - ↳ 보상 - 2014년 인가구간 1필지 64㎡
- 사업기간 : 1997년 ~ 2016년
- 총사업비 : 52,650백만원(시비, 보상비 46,600, 공사비 5,900, 설계비150)
 - 연차별 소요예산

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	장래
총사업비	52,650	32,050	4,500	1,000	2,000	13,100
설계비	150	150	-	-	-	-
보상비	46,600	29,100	3,500	500	1,400	12,100
공사비	5,900	2,800	1,000	500	600	1,000

※ 총사업비(44,650백만원→52,650백만원)변경사유 : 신길16재정비촉진구역 해제에 따라 재정비촉진지구변경용역수립이 완료(2015.12월예정)되어 지구에서 제외되면 추가예산(80억원:보상비74억원,공사비6억원)을 배정 요구할 계획임.

□ 추진실적

- '78.12. 7. : 도시계획시설(도로) 결정 (건설부고시 제393호)
- '97. ~ '14.12. : 일부구간 확장완료
 - ㄱ 신길5동사무소측 : 기확장 850m, 미확장 300m(신길재정비촉진지구 내)
 - ↳ 성락교회측 : 기확장 710m, 미확장 440m
- '15. 4.~ 5. : 보상완료(1필지,64㎡)
- '15. 3.13. ~ 10.31.: 공사완료(성락교회측 160m)

향후계획


○ '16. 1.~ : 보상(37m) 및 공사시행(173m)

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,107,085 (시비 1,107,085) 이월107,085 당해1,000,000	882,969 (시비) 이월107,085 당해775,884	79.8

위치도

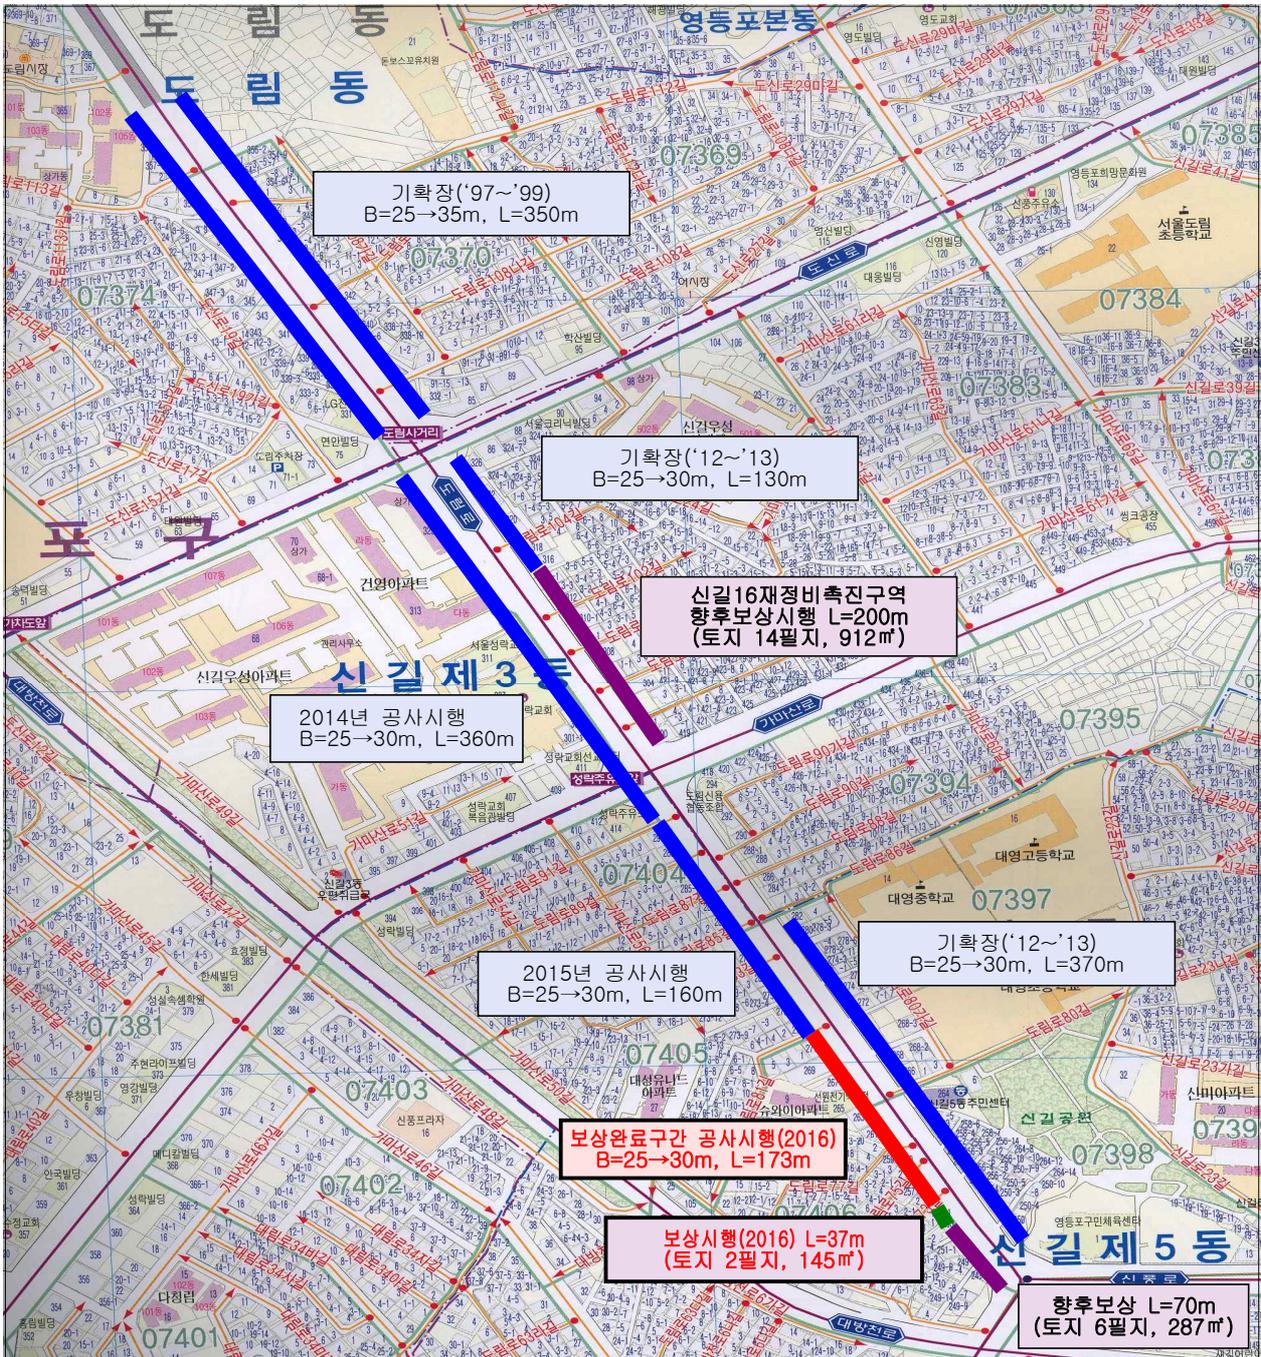

장기미집행 도시계획시설(도로)에 대한 사업시행으로 대림2생활권 지구단위 계획구역 개발활성화 및 민원해소, 쾌적한 주거환경 조성에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 대림동 812-12번지
- 규 모 : 도로개설 폭 6m, 연장 14m
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 총사업비 : 1,160백만원(구비, 보상비 1,104 공사비 56)
 - 연차별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	비 고
총사업비	1,160	200	481	479	
보 상 비	1,104	200	481	423	
공 사 비	56	-	-	56	

□ 추진실적


- '12. 4.27. : 대림생활권 지구단위 계획 결정
- '15. 5.22. : 보상완료(토지1필지 149㎡, 건물1동)
- '15. 7.17. : 공사완료

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
960,000 (구비 960,000) 이월481,000 당해479,000	959,589 (구비) 이월481,000 당해478,589	99.9

□ 위치도 및 현황사진

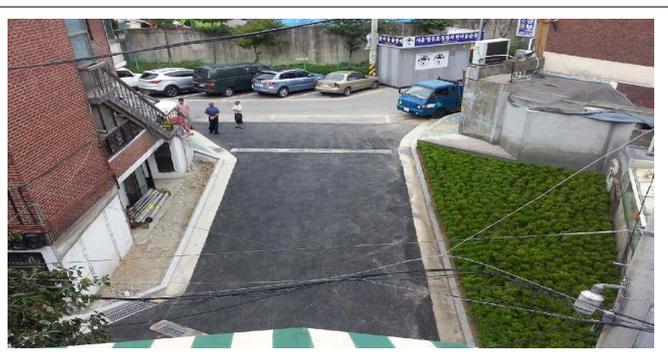

당산동~샛강생태공원간 보행자 및 자전거 연결로를 설치하여 샛강생태공원 및 여의도 방면 이용에 편의를 제공하여 한강시민공원 및 여의도 공원 등의 휴식공간 및 문화 공간의 접근성 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 당산동 버드나루로 14길 ~ 샛강생태공원
- 규 모 : 연결로 설치 B=5m, L=138m,
- 공사시행기관 : 서울시 한강사업본부
- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년
- 총사업비 : 6,472백만원(공사비 6,000(시비) 설계비 472(구비))
 - 연차별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	비 고
총사업비	6,472	182	1,290	5,000	
설계비(구비)	472	182	290	-	
공사비(시비)	6,000	-	1,000	5,000	

□ 추진실적

- '10.12. 7. : 보도육교 설계 현상공모 공고
- '10. 2.17. ~ 10.14. : 타당성 조사 및 기본계획 용역시행
- '13.10.10. : 투자심사 결과통보 (조건부추진)
- '14. 2.10. ~ '15. 2.10. : 기본 및 실시설계 용역시행
- '15. 1.26. ~ 2. 4. : 서울시 한강사업본부 설계도서 인계
- '15. 6.11. : 공사계약((주)오이코스, 서울시 한강사업본부시행)
- '15. 7.14. : 공사착공(공사기간 : 착공일로부터 10개월)
- '15. 11. : 교대 및 교각구조물 작업 (공정율 47%)
강관공장 제작중 (공정율 60%)

향후계획

○ '16. 5. : 공사준공 예정

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
6,000,000 (시비 6,000,000한강사업본부) 이월1,000,000 당해5,000,000	2,123,652	35.4

위치도



도림천으로 단절되어 있는 신도림역과 아파트 단지 간의 연결로의 설치로 보행로를 확보하여 신도림역의 보행접근로 및 편의성 향상을 도모코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신도림역 1호선 ~ 도림동 아파트단지간
- 규 모 : 연결로 폭 2.5m, 연장 104.6m
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 총사업비 : 2,880백만원(시비, 공사비 2,700, 설계비 180)
 - 연차별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	비 고
총사업비	2,880	50	253	2,577	
설 계 비	180	50	130	-	
공 사 비	2,700	-	123	2,577	

□ 추진실적 : (공정율 15%)

- '13. 5.13. ~ 10.24. : 타당성조사 용역시행
- '14. 3.11. ~ '15. 2.24. : 기본 및 실시설계 용역 시행
- '15. 4. 6. : 공사착수
- '15. 4. 7. : 공사설명회 개최
- '15. 11. : 교대기초 가시설 및 파일작업 (공정율 15%)
 강판공장 제작중 (공정율 70%)

※ 하천 내 제방굴착 공사 포함되어 수방기간 동안 재해방지를 위해 현장 공사 중지하고, '15.10.15이후 장비 진입로 및 교대설치 공사 착수
 ⇒현장 내 공사 미착수 기간 (5~9월)동안 강교 공장제작

□ 향후계획

- '16. 4. : 공사완료

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,700,138 (시비 2,700,138) 이월123,138 당해2,577,000	727,510 (시비) 당해727,510	26.9

□ 위치도



보도육교의 노후로 인한 안전사고를 예방하고, 이용편의를 위한 보수 및 리모델링으로 도시미관 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포본동 618-6
- 규 모 : 경사로 B=2.5m, L=34.9m, 계단 신설 등
- 사업기간 : '15. 4. ~12.

□ 추진실적 (공정율 45%)

- '15. 4. 9. : 한국철도시설공단 용지 사용 협의
- '15. 7. 1. : 공사 착공
- '15. 11. : 경사로 및 계단 기초설치

□ 향후계획

- '15.12. : 공사준공 예정

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
800,000 (시비 800,000)	160,250 (시비)	20.0

□ 위치도



6

포장도로정비 등 소파보수공사(연간단가)

도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 아스팔트포장 A=220a, 콘크리트포장 A=9a, 보도포장 A=13a
- 사업기간 : '15. 1. ~ 12.

□ 추진실적 (공정율 85%)

- 아스팔트포장 212a(89개소), 콘크리트포장 3a(13개소), 보도블록포장 9a(17개소)

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,203,487 (구비 1,203,487) 이월45,787 당해1,157,700	638,461 (구비 638,461) 이월 45,787 당해592,674	53.0

7

도로시설물 설치 및 보수공사(연간단가)

도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 과속방지턱 신설 및 보수 L=200m, 도색 A=1,000m²
난간 보수 및 설치 100경간, 볼라드 및 안전시설 등
- 사업기간 : '15. 1. ~ 12.

□ 추진실적 (공정율 80%)

- 도로시설물 세척(안전펜스, 보도육교 등) 6,800m²
- 과속방지턱 설치 및 보수 52개소, 볼라드 설치 및 보수 150개소
- 노후계단 정비 2개소, 안전손잡이 설치 3개소, 계단 캐노피 설치 1개소

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
651,000 (구비 601,000, 시비 50,000)	218,145 (구비 218,145)	34.0

연립주택 등 주택 밀집지역으로 주민들의 통행이 잦은 노후계단을 정비하여, 노약자 등에 대한 안전하고 편리한 보행환경과 휴식공간 조성으로 주민생활 편의와 도시미관 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 도신로39길 3
- 규 모 : 계단정비(H=5m, L=12m), 법면보강, 주변 도로정비
- 사업기간 : '15. 3. ~ 12.

□ 추진실적 (공정율 45%)

- '15. 3. ~ 6. : 실시설계 시행
- '15. 9. 4. : 공사 착공
- '15. 9. ~ 11. : 옹벽 공사 및 계단 설치

□ 향후계획

- '15.12.31. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
300,000 (시비 300,000)	81,850 (시비 81,850)	27%

□ 위치도



도시미관을 저해하는 난립한 전신주 및 가공선로의 지중화로 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동4가 73 ~ 56(선유도역~양평동사거리)
- 규 모 : 양평로 배전선로 지중화(양측, 총연장 500m)
- 사업기간 : '13. 1. ~ '15. 12.
- 총사업비 : 1,978백만원
 - 기 확보(2013년) : 1,000백만원(구청 500백만원+한전 500백만원)
 - 2015년 소요예산 : 978백만원(시 400/구 120/ 통신 458)

□ 추진실적 (공정율 40%)

- '13.10. 1. : 협약서 체결(한전, 구청)
- '13.12.17. : 배전선로 이설공사비 납부(466백만원)
 - ※ 공사비 분담비율(50:50)-(구비1억, 시비4억, 한전5억)
- '14.10. 7. : 통신설비 지중화 및 공사비 분담관련 관계자 회의 개최
 - 회의결과 : 공사비 분담비율(50:50), 도로복구비용 구청 100%
- '15. 7. 8. : 협약서 체결(통신사업자, 구청)
- '15. 9.24. : 통신선로 이설공사비 납부(392백만원)
- '15.10. : 공사시행(개폐기 및 변압기 설치)
- '15.11. : 지중화를 위한 굴착공사 시행

□ 향후계획


- '15.12. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
520,000 (시비 400,000, 구비 120,000)	392,000	75

□ 위치도

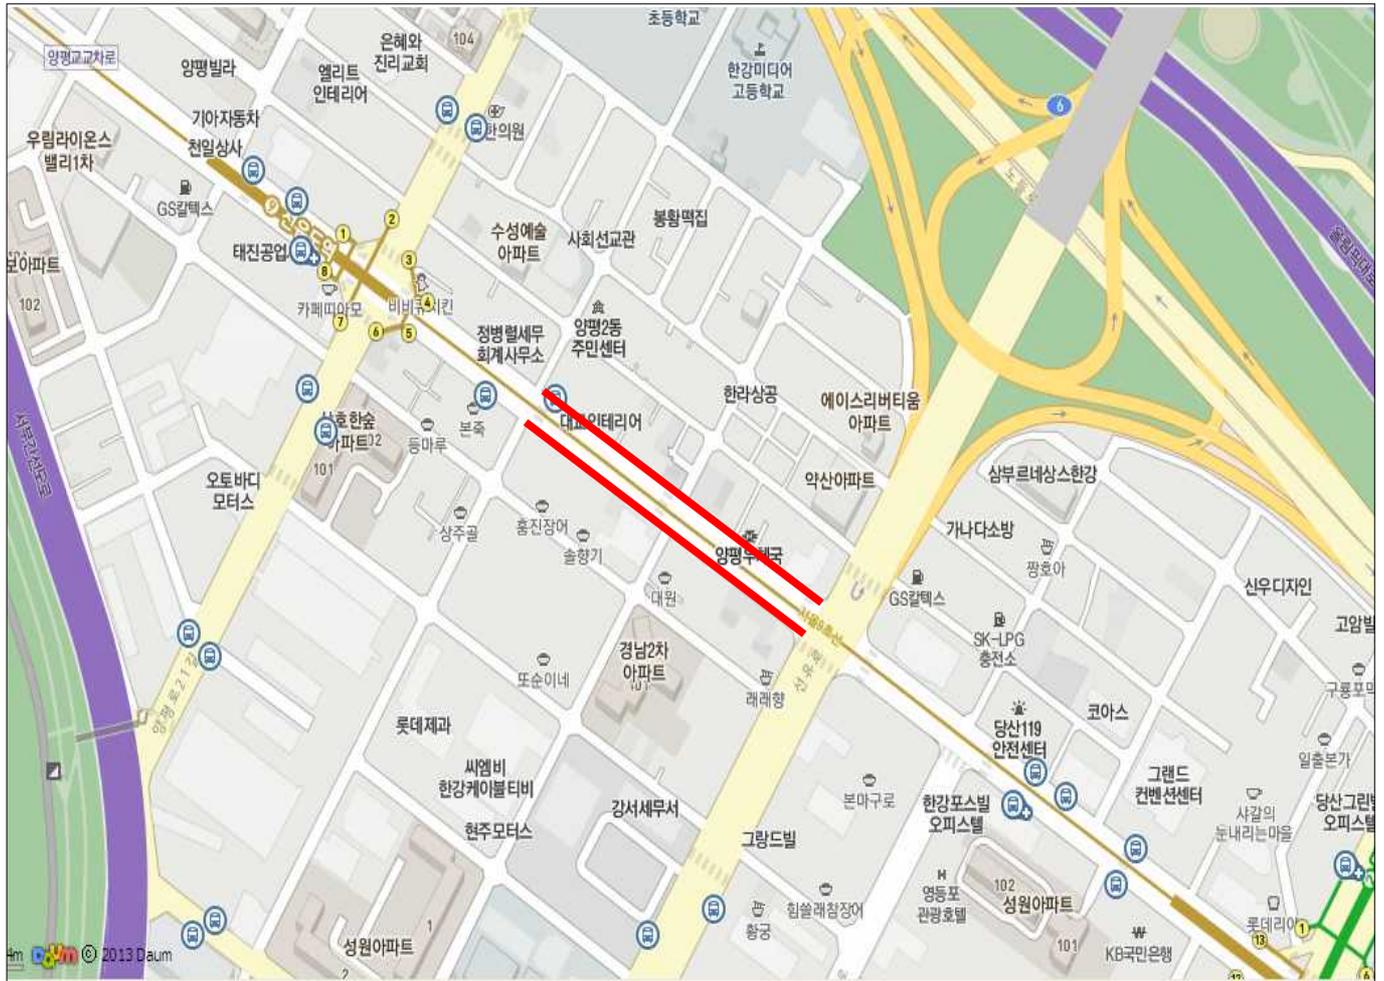

10 가로등시설물 정비공사(연간단가)**도로조명팀** **사업개요**

- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 기 간 : '15. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 가로등주 정비 10본, 분전함 정비 4면, 기타 정비 1식

 추진실적 (공정율 95%)

- 가로등 정비 72본, 분전함 정비 6면, 기타 정비 1식

 향후계획

- 노후 가로등시설물 정비 지속 추진

 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
172,000 (구비 172,000)	89,662 (구비 89,662)	52.1

11 보안등 설치 개량 및 유지보수공사(연간단가)**도로조명팀** **사업개요**

- 대 상 : 18개동 9,744등
- 기 간 : '15. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 보안등신설·개량 30등, 기타 고장등 보수 1식.

 추진실적 (공정율 95%)

- 보안등 설치 개량 70등, 고장 보안등 보수 2,300등

 향후계획

- 취약지역 보안등 설치 개량 및 고장 보안등 보수 지속 추진

 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
242,400 (구비 242,400)	103,691 (구비 103,691)	42.7

국가에서 추진 중인 지역 에너지절약사업 및 빛 공해 방지사업 일환으로 관내 노후 NH 100W보안등을 LED 50W이하 보안등으로 교체 설치하여 전기 에너지 절약을 통한 예산 절감 및 빛 공해를 해소하여 주민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 대림2동
- 기 간 : '15. 6.22.~ 10.14.
- 사업규모 : LED 50W이하 보안등 121등 교체

□ 추진실적


- 확산대형 나트륨등(100W)을 LED보안등(50W)으로 130등 교체
- '15.10.14 : 공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
127,000 (국 16,000, 시 41,000, 구비 70,000)	127,000 (국 16,000, 시 41,000, 구비 70,000)	100

□ 위치도

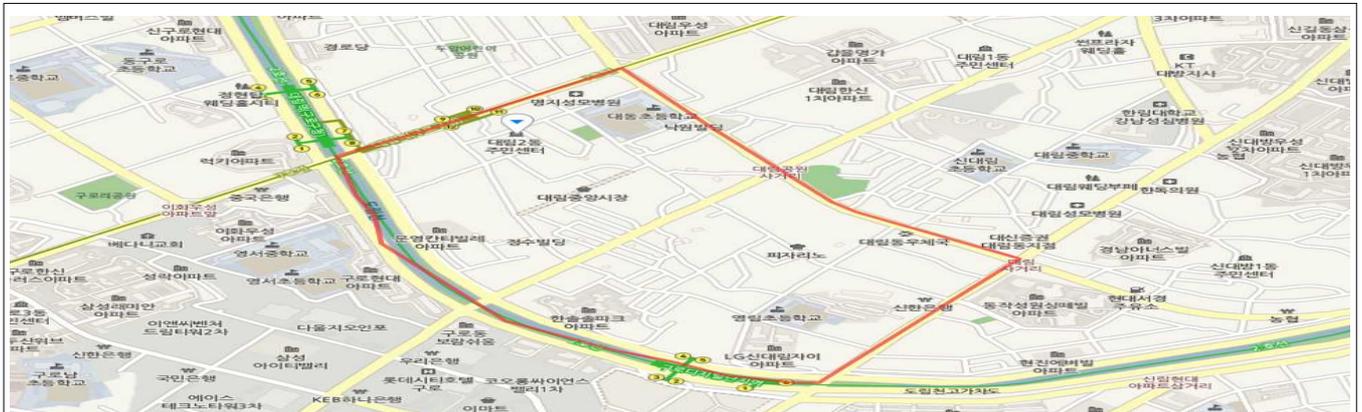

15년 이상 된 노후 가로등시설물에 대한 개량을 실시하여 전기안전사고 예방 및 야간 교통 환경 개선

사업개요

- 위 치 : 도신로(노량진로 ~ 도림천)
- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 기 간 : '15. 6. 1. ~ 11.30.
- 사업규모
 - 가로등(MH350W) 철거 124등/ LED80W가로등 설치 206등
 - 기타 배관 및 배선 1식

추진실적 (공정율 95%)

- 가로등(MH350W) 124등 철거, LED80W가로등 206등 설치

향후계획

- '15.11.20. 공사 준공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,097,000 (시비 1,097,000)	770,864 (시비 770,864)	70.2

위치도



3. 2016 주요업무 추진계획

연 번	사 업 명	쪽
①	신도림역~도림동 연결로 개선공사	21
②	도림동 286-11~187-39간 도로개설공사	22
③	포장도로정비 등 소파보수공사(연간단가)	23
④	도로시설물 설치 및 보수공사(연간단가)	23
⑤	도신로89~도림로332외 2개소 도로정비공사	24
⑥	도림로102길 주변의 3개소 도로정비공사	25
⑦	2015/16년 제설대책 추진	26
⑧	신길지하차도 자동염수살포장치 설치공사	27
⑨	보도정비공사(연간단가)	28
⑩	사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사(연간단가)	28
⑪	가로등시설물 정비공사(연간단가)	29
⑫	보안등 설치 개량 및 유지보수공사(연간단가)	30
⑬	LED 보안등 설치공사	31

1 신도림역 ~ 도림동 연결로 개선공사

도로계획팀

도림천으로 단절되어 있는 신도림역과 아파트 단지 간의 연결로의 설치로 보행로를 확보하여 신도림역의 보행접근로 및 편의성 향상을 도모코자 함.

추진개요

- 위 치 : 신도림역 1호선 ~ 도림동 아파트단지간
- 규 모 : 연결로 폭 2.5m, 연장 100.45m
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 총사업비 : 2,880백만원(시비)

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비 고
총사업비	2,880	50	253	2,577			
설 계 비	180	50	130				
공 사 비	2,700		123	2,577			

추진일정

- '16. 1.~2. : 강교 거치
- '16. 4. : 공사 준공 예정

□ 소요예산 : 총1,673,798천원 (시비1,673,798, 명시이월)

위 치 도



철도변 이면도로 개설로 신도림역을 이용하는 영등포동, 도림동 구민의 통행불편 해소 및 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 추진으로 민원해소.

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 286-2~187-18간
- 규 모 : 도로개설 폭 6m, 연장 284m
- ※ 보상 ㄱ 기 보 상 - 토지2필지(57㎡)
- ↳ 금회보상 - 토지8필지(189㎡)
- 사업기간 : 2010~2018년
- 총사업비 : 4,903백만원(구비, 보상비3,750, 공사비1,103, 설계비 50)

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	2016	장래	비고
총사업비	4,903	350			500	4,053	
설계비	50	50					
보상비	3,750	300			500	2,950	
공사비	1,103					1,103	

□ 추진일정

- '16. 1.~12. : 공사 및 보상시행

□ 소요예산 : 총500,000천원 (구비 500,000)

□ 위치도



3**포장도로정비 등 소파보수공사(연간단가)**

도로개선팀

 사업개요

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 아스팔트포장 A=160a, 콘크리트포장 A=10a, 보도포장 A=10a
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.

 추진일정

- '16. 2. : 공사 발주
- '16. 3. : 공사 계약 및 착공
- '16.12. : 공사 준공

 소요예산 : 총1,152,500천원 (구비 1,152,500천원)**4****도로시설물 설치 및 보수공사(연간단가)**

도로개선팀

 사업개요

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 지하보도, 보도육교, 과속방지턱 등 도로시설물 유지관리
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.

 추진일정

- '16. 2. : 공사 발주
- '16. 3. : 공사 계약 및 착공
- '16.12. : 공사 준공

 소요예산 : 총500,800천원 (구비 500,800천원)


5 도신로89~도림로332 외 2개소 도로정비공사 도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 도신로89 ~ 도림로332, 당산로16길 3-10 ~ 5-12, 가마산로 386 ~ 가마산로48길 30
- 규 모 : 아스팔트 포장 A=35.2a
- 사업기간 : '16. 3. ~ 9.

□ 소요예산 : 총182,000천원 (시비 182,000천원 주민참여예산)

□ 위치도 및 현황사진
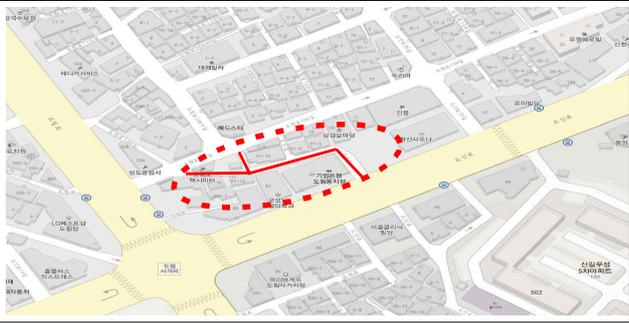
<p>도신로 89 ~ 도림로 332 (도림동) B=4m, L=105m, A=4.2a 46백만원</p> 	
<p>당산로16길 3-10 ~ 5-12 (당산1동) B=6m, L=50m, A=3a 34백만원</p> 	
<p>가마산로 386 ~ 가마산로48길 30 (대림3동) B=8~11m, L=290m, A=28a 102백만원</p> 	

6

도림로102길 주변 외 3개소 도로정비공사

도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 도림로102길 주변, 영신로1길 주변, 영등포로62길 8 뒤
신길로13길 주변
- 규 모 : 아스팔트 포장 A=30a
- 사업기간 : '16. 3. ~ 9.

□ 소요예산 : 총200,000천원 (구비 200,000천원 주민참여예산)

□ 위치도 및 현황사진

<p>도림로102길 주변 (신길3동) B=3~4m, L=300m, A=10a 50백만원</p>	
<p>영신로1길 주변 (도림동) B=2~4m, L=290m, A=6.5a 50백만원</p>	
<p>영등포로62길 8 뒤 (영등포본동) B=1~3m, L=250m, A=5a 50백만원</p>	
<p>신길로13길 주변 (신길5동) B=4m, L=210m, A=8.4a 50백만원</p>	

겨울철 강설 시 이면도로 및 제설 취약 지역 등 초동 제설작업 시행으로 주민 생활불편 최소화 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 제설대책본부운영

- 본부구성 : 5개반 48명
- 기 간 : '15.11.15. ~ '16. 3.15. (4개월)
- 운영방법

단계	평시	보강	1단계	2단계	3단계
내용	일상예보 (강수확률 30%미만 또는 2℃이상)	강설예보 (강수확률 30%이상 또는 2℃미만)	강설예보 (적설량 1~5cm미만 예보시)	대설주의보 (적설량 5cm이상 예보시)	대설경보 (적설량 10cm이상 예보시)

□ 제설구간 (도로 총연장 : 388km)

- 간선도로 63노선 : 109km
- 이면도로, 뒷골목 : 279km

□ 제설장비·자재 보유현황


제 설 장 비 (대)							제 설 자 재 (톤)			
소계	다목적 제설차	제설 삽날	염화칼슘 살포기			바브켓	소계	염화칼슘	소금	친환경
			대형	중형	소형					
60	3	11	4	6	34	2	1,118	374	717	27

□ 강설 및 비상근무 현황

년 도 별	'09/10	'10/11	'11/12	'12/13	'13/14	'14/15
강설일수 (일)	19	14	17	18	13	12
년 강설량 (cm)	66.9	36.4	13.4	53.7	27.5	13.5
비상근무(일)	79	39	34	38	37	24

□ 2015/16년 제설대책 중점 추진사항

- 제설용역 확대 : 직영2조, 용역13조 → 직영1조, 용역16조
- 친환경 제설재 사용 확대
- 도로 물청소차를 활용한 친환경 제설 확대(1대→2대)
- 제설장비 추가 확보 : 살포기 중형1대, 소형2대
- 제설 취약지역 자동액상살포장치 설치
 - 신길지하차도, 신길자이아파트, 신길4동주민센터, 도림동성당주변

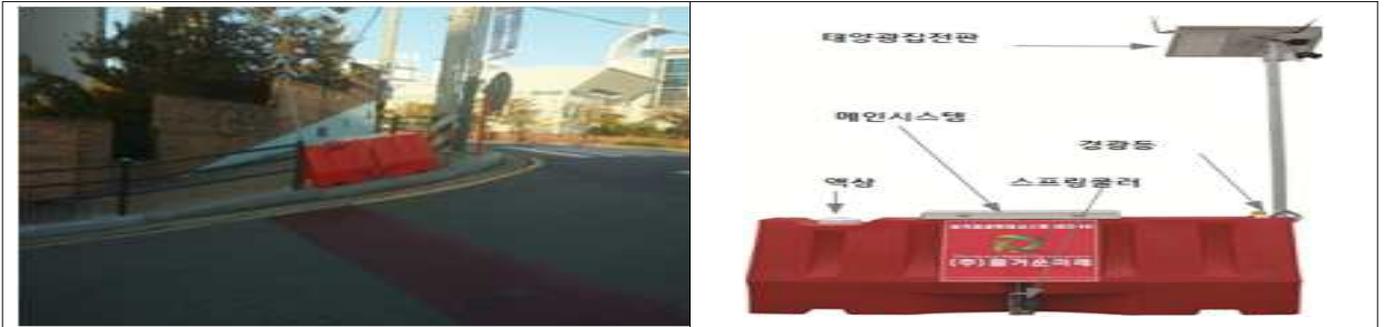

□ 소요예산 : 298,511천원 (시비 100,000, 구비 198,511천원)

8 신길지하차도 자동염수살포장치 설치 공사 도로개선팀

□ 사업개요

- 위 치 : 신길지하차도 상부도로
- 규 모 : 자동염수살포장치 설치 L=500m
 - 사려가시장 앞 방향 : 300m, 한성아파트 방향 : 200m
- 사업기간 : '16. 3. ~ 9.

□ 소요예산 : 168,000천원 (시비 168,000천원 주민참여예산)

□ 위치도 및 현황사진



노후·파손·침하 등으로 인한 보행불편을 해소하고 도시미관을 저해하는 보도블록을 보수·정비하여 도로이용 주민 생활불편을 최소화하고 안전사고를 예방하고자 함

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 보도블록 정비 16a
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 80,700천원(구비)

추진일정

- '16. 2. : 공사 발주
- '16. 3. : 공사 계약 및 착공
- '16.12. : 공사 준공

소요예산 : 총80,700천원 (구비 80,700)

10 사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사(연간단가) 보도관리팀

보도 턱낮춤 개선공사 등을 통한 장애인, 노약자 등 사회적 약자의 보행 환경 개선

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 보도 턱낮춤 정비 100개소, 점자블록 정비 1a 등
- 사업기간 : '16. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 60,000천원(구비)

추진일정

- '16. 2. : 공사 발주
- '16. 3. : 공사 계약 및 착공
- '16.12. : 공사 준공

소요예산 : 총60,000천원 (구비 60,000)

11**가로등시설물 정비공사(연간단가)****도로조명팀** **시설현황 : 가로등 8,792등**

(내구연한 15년경과 가로등 2,987등- 전체가로등의33.4%)

 사업개요

- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 규 모 : 가로등정비 106등, 기타 정비 1식
- 사업기간 : '16. 2.~ 12.

 추진일정

- '16. 1. : 계약심사 및 공사 발주
- '16. 2. : 공사 착공
- '16.12. : 공사 준공

 소요예산 : 총188,800천원 (구비 188,800)**12****보안등 설치 개량 및 유지보수 공사(연간단가)****도로조명팀** **시설현황 : 18개동 9,744등**

- 빗공해방지형 등기구 1,769등, 확산대형등기구 7,975등
- ※ 빗공해방지법령에 의거 확산대형등기구 7,975등 개량대상임 (81.8%)

 사업개요

- 규 모 : 보안등 설치·개량 90등, 기타 고장등 보수 1식.
- 사업기간 : '16. 1. ~12.

 추진일정

- '16. 1. : 계약심사 및 공사 발주
- '16. 2. : 공사 착공
- '16.12. : 공사 준공

 소요예산 : 총290,200천원 (구비 290,200)

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : LED 50W이하 보안등 121등 설치
- 사업기간 : '16. 5. ~ 11.

 추진일정

- '16. 4. : 빛 공해 방지 심의
- '16. 5. ~ 11. : 공사발주 및 준공

소요예산 : 총127,000천원 (국비 16,000, 사비 41,000, 구비 70,000)

Ⅳ. 신규 · 주요투자 사업

연 번	사 업 명	쪽
①	도림로 확장공사	32
②	대림3동 보안등을 LED등으로 환하게! 환하게	34
③	가로등 개량공사 (신풍로외 2개소)	35

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 추진개요

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~신길동421-16간(신길광장)
 - ※ 금회 ㄱ 공사 - 신길동355-662~신길동420-192
 - ㄴ 보상 - 신길동 420-193~신길동 421-29
- 규 모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m
 - ㄱ 신길5동사무소측 : 기확장 850m, 미확장 300m(신길재정비촉진지구 내)
 - ㄴ 성 락 교 회 측 : 기확장 870m, 미확장 280m
 - ※ 금회 ㄱ 공사 - 도로확장 폭 30→35m, 연장 173m(성락교회측)
 - ㄴ 보상 - 토지 2필지(145㎡), 연장 37m
- 사업기간 : 2009년 ~ 2017년
- 총사업비 : 52,650백만원(시비, 보상비 46,600, 공사비 5,900, 설계비150)
- 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	2016	장 래
총사업비	52,650	32,050	4,500	1,000	2,000	13,100
설 계 비	150	150	-	-	-	-
보 상 비	46,600	29,100	3,500	500	1,400	12,100
공 사 비	5,900	2,800	1,000	500	600	1,000


※ 총사업비(44,650백만원→52,650백만원)변경사유 : 신길16재정비촉진구역 해제에 따라 재정비촉진지구변경용역수립이 완료(2015.12월예정)되어 지구에서 제외되면 추가예산(80억원:보상비74억원,공사비6억원)을 배정 요구할 계획임.

□ 추진일정

- '16. 1. ~ : 공사 및 보상시행

□ 소요예산 : 총2,000,000천원 (시비 2,000,000)

□ 위치도

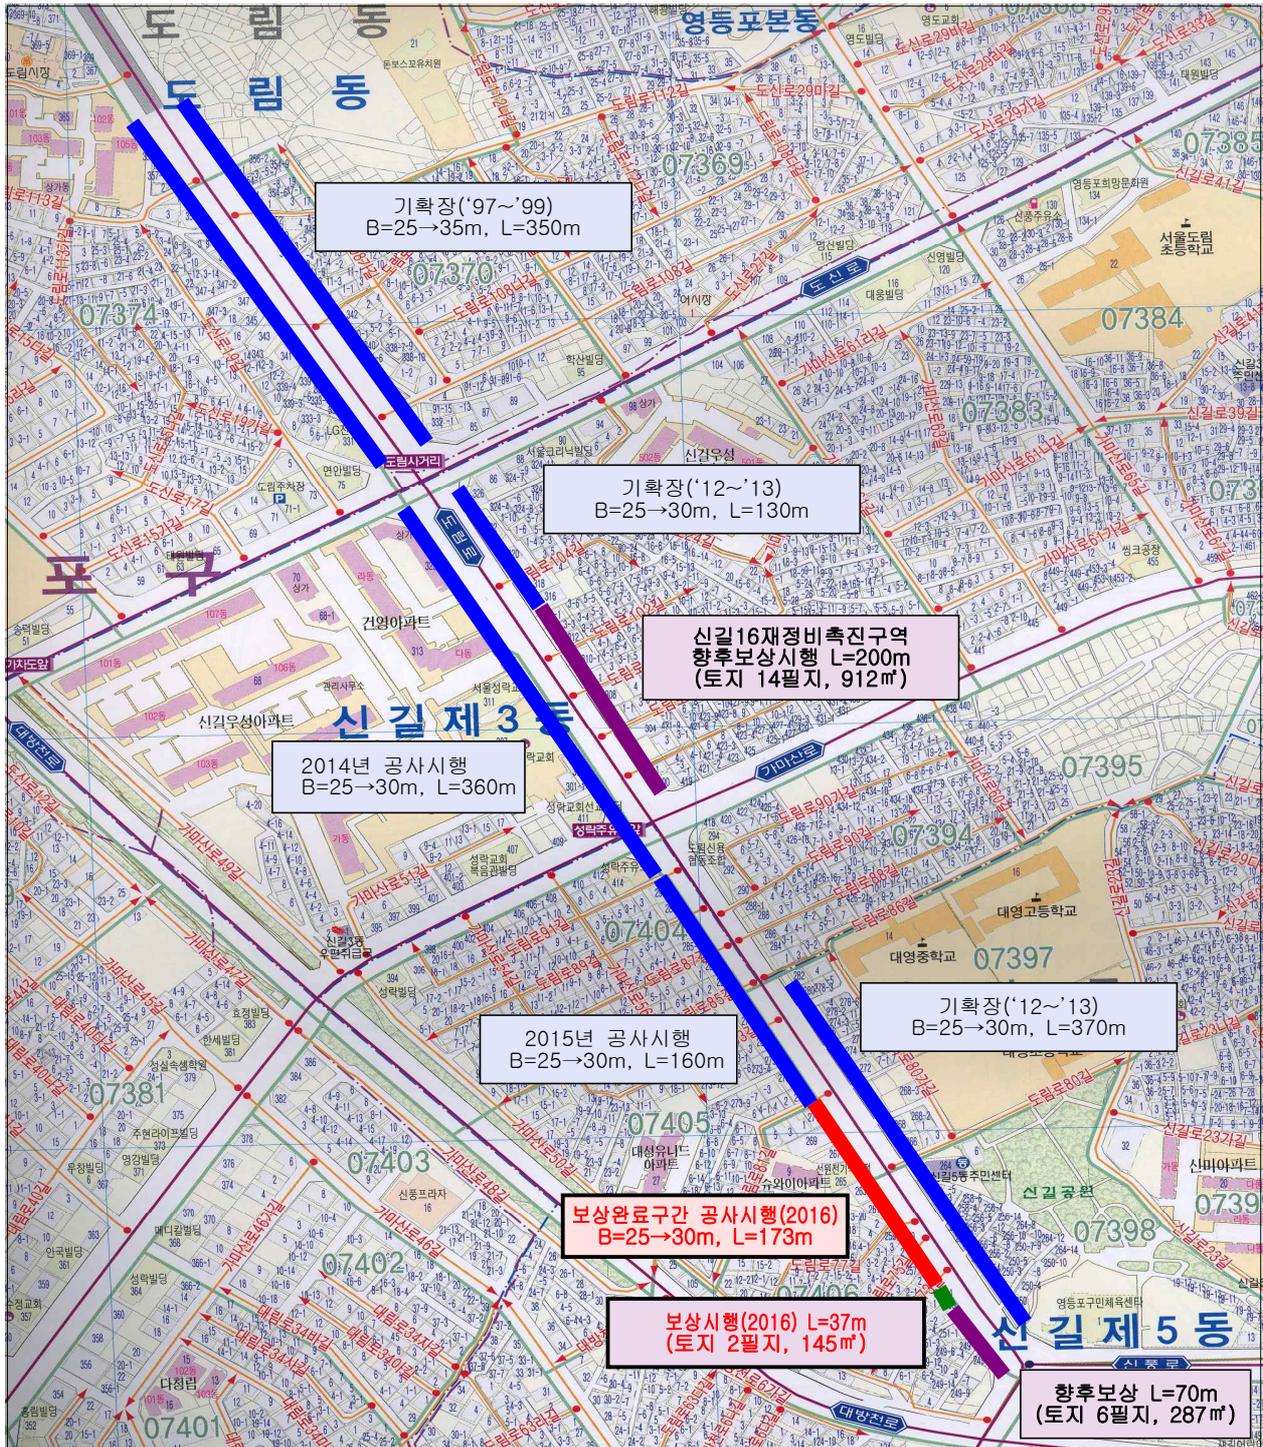

2 대림3동 보안등을 LED등으로 환하게! 환하게 도로조명팀

외국인 밀집지역인 대림3동 노후 확산대형 NH100W보안등을 LED50W등으로 개량 및 신설하여 야간 범죄 예방하고 빛 공해 해소를 통한 주민 삶의 질 향상 및 에너지절약을 통한 예산절감

□ 사업개요

- 위치 : 대림3동
- 규모
 - 노후 확산대형보안등 NH100W 철거 210등
 - LED50W보안등 설치 210등
- 기간 : '16. 5. ~ 11.

□ 추진일정

- '16. 4. : 빛 공해 방지 심의
- '16. 5. ~ 11. : 공사발주 및 준공

□ 소요예산 : 213백만원 (시비 213 주민참여예산)

□ 위치도



15년 이상 된 노후 가로등시설물을 개량하여 전기 안전사고를 예방하고 야간 교통 환경을 개선하여 도로이용자 편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 신풍로(도신로 ~ 대방로), 가마산길(도림사거리 ~ 가마산로65길)
복음길(제물포로 ~ 여의도공원)
- 규 모 : 가로등 MH250W~400W) 126본 철거 , LED80~120W 164본 설치
기타 배관 및 배선 1식
- 사업기간 : '16. 4. ~ 11.

□ 추진일정

- '16. 4.: 계약심사 및 빗공해방지 심의
- '16. 5. ~ 11. : 공사발주 및 준공

□ 소요예산 : 총1,190,000천원 (시비 1,190,000)

□ 위치도

