

제231회 구의회 제1차 정례회

2021. 6. 14. ~ 6. 29.

타인⁺ 영등포
탁인 영등포

2021년 주요업무 보고



도 로 과

보고 순서

| | |
|--------------------|----------|
| I . 일반 현황 | · · · 1 |
| II . 주요업무 추진실적 | · · · 5 |
| III . 신규·중점사업 추진실적 | · · · 16 |

I . 일반현황

1 조 직

도 로 과 - (6)개팀

| 도로계획팀 | 도로개선팀 | 보도관리팀 | 도로굴착팀 | 도로조명팀 | 지하안전관리팀 |
|---|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 도시계획시설 (도로) 입안 및 개설 - 부당이득금 반환청구소송 | <ul style="list-style-type: none"> - 포장도로 및 도로시설물 유지관리 - 제설대책 | <ul style="list-style-type: none"> - 보도유지관리 - 보도공사장 관리감독 | <ul style="list-style-type: none"> - 도로굴착허가 및 복구 - 도로굴착기금 운용관리 | <ul style="list-style-type: none"> - 가로등, 보안등 관리 - 노후조명시설 정비 | <ul style="list-style-type: none"> - 지하안전관리 계획의 수립 - 지하안전관리 규정 준수여부 및 실태점검 |

2 인 력

| 구 분 | 계 | 일 반 직 | | | | | | 관 리 운 영 직 | | | | 별 정 직 · 임 기 제 | | | |
|-----|----|-------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|---------------|----|----|----|
| | | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
| 정 원 | 35 | | 1 | 6 | 15 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 현 원 | 35 | | 1 | 7 | 16 | 6 | 4 | | 1 | | | | | | |
| 과부족 | - | | - | 1 | 1 | - | △2 | | - | | | | | | |

3 주요시설 및 장비

도로현황: 주요간선도로(경인로 외 27개 노선)

| 연장 390.6km | | 도로율 |
|------------|------------|------------------------|
| 시도 76.0km | 구도 314.6km | 23.4% (서울시: 22.42%) |

시설물 현황

| 계 | 교 량 | 고가차도 | 지하차도 | 지하보도 | 보도육교 | 입 체 교차로 | 보행육교 승강기 |
|------|-----|------|------|------|------|---------|----------|
| 58개소 | 20 | 6 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 |

시설물 세부현황

| 교 량(20개소) - 시 관리 | 고가차도(6개소) - 시 관리 |
|--|---------------------------------|
| 양화교, 신정교, 양평교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교, 선유교, 샛강다리, 한강교량(6개소: 성산, 양화, 당산, 서강, 마포, 원효) | 선유, 도림천, 영등포역, 보라매, 도림, 신길 |
| 지하차도(12개소) - 시 관리 | 지하보도(1개소) - 구 관리 |
| 국회 앞, 여의2교, 목동교 동측, 오목교 동측, 성산, 신정교 동측, 노들길(서울교남단), 신길, 서울교 접속 지하차도, 영등포, 대방, 여의교 | 여의초교 앞 |
| 보도육교(8개소) - 구 관리 | 입체교차로(5개소) - 시 관리 |
| 우신초교 앞, 문래, 양평1, 양평2, 영등포수원지 앞, 영등포역횡단, 도림, 선유교 기존 | 영등포R, 여의하류, 여의상류, 목동교동측IC, 염창IC |
| 보행육교 승강기(6개소) | |
| 양평1보행육교, 양평2보행육교, 문래보행육교, 오목교, 영등포역 횡단보도육교(북측), 영등포역 횡단보도육교(남측) | |

조명시설

| 가 로 등 - 구 관리 | 보 안 등 - 구 관리 |
|--------------------------|--------------------------|
| 9,535등 (LED 6,434/67.5%) | 9,425등 (LED 4,852/51.5%) |

4

예산현황

(단위: 천원)

| 단위사업명 | 예산액 | 집행액 | 집행률(%) (5.31.기준) |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 계 | 15,263,482 | 10,791,089 | 70.7 |
| 도로건설을 통한 기반시설확충 | 6,709,613 | 6,171,157 | 91.9 |
| 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리 | 3,533,271 | 1,604,099 | 45.4 |
| 걷기편한 보도환경 조성 | 1,202,600 | 1,163,946 | 96.8 |
| 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리 | 3,021,988 | 1,567,745 | 51.9 |
| 인력운영경비 | 623,748 | 212,467 | 34.1 |
| 기본경비 | 172,262 | 71,675 | 41.6 |

Ⅱ . 주요업무 추진실적

| 연번 | 사 업 명 | 쪽 |
|----|---------------------------------|----|
| ① | 장기미집행 도시계획 도로개설 | 5 |
| ② | 도로 및 도로(조명)시설물 관리 정비 | 7 |
| ③ | 2021/22 제설대책 추진 | 8 |
| ④ | 도로 물고임 개선 | 10 |
| ⑤ | 주택가 이면도로 안전한 통행로를 만들어 주세요 | 11 |
| ⑥ | 골목길 급경사 구간 안전조치 | 12 |
| ⑦ | 디지털 정보를 활용한 체계적인 굴착공사장 관리 | 13 |
| ⑧ | 도로조명설비 유지관리 및 LED개량 | 14 |
| ⑨ | 도로하부 공동(空洞)조사사업 | 15 |

장기미집행 도시계획 도로개설을 통하여 구민불편 해소 및 편리한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 대림동 967-8~962-1 외 14개소
- 사업기간: '19. 8. ~ '22. 12.
- 사업내용: 토지보상 및 도로개설 공사
- 총사업비: 35,550백만원(보상비 34,000, 공사비 1,550)

□ 주요 추진실적

| 구분 | 사 업 명 | 보상비 | 공사비 | 비 고 |
|------|-----------------------|--------|-----|--------------------------|
| '19년 | 대림동 967-8 ~ 962-1 | 70 | 75 | 보상완료 |
| | 신길동 325-1 ~ 320-8 | 1,572 | 61 | 보상완료 |
| | 신길동 315-35 ~ 318-1 | 1,308 | 77 | 보상완료 |
| | 신길동 196-6 ~ 205-69 | 1,876 | 93 | 보상완료 |
| | 대림동 1116-15 ~ 705-2 | 4,719 | 130 | 보상완료 3,664 수용재결 1,055 |
| '20년 | 신길동 296-12 ~ 325-77 | 104 | 143 | 보상완료 32 공탁예정 72 |
| | 신길동 230-1 ~ 255-1 | - | - | 공공재개발 예정구역으로 보류 |
| | 신길동 4464 ~ 4408-1 | 1,672 | 66 | 보상완료 950 공탁예정 722 |
| | 신길동 4300-30 ~ 4300-37 | 1,212 | 46 | 보상완료 |
| '21년 | 대림동 897-1 ~ 952-15 | 2,165 | - | 보상완료 1,090 집행예정 1,075 |
| 합 계 | | 14,698 | 691 | |

□ **향후계획**

- 대림동 1116-15~705-2 외 2개소 도로개설사업('19~'20년)
 - '21. 6. ~ 9. : 수용재결 및 공탁예정
- 대림동 897-1~952-15 도로개설사업('21년)
 - '21. 6. ~ 7. : 보상완료

□ **예산현황**

(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|--|--|--------|
| 6,285,962 (시 1,892,962 구비 4,393,000) | 6,081,864 (시 1,892,962 구비 4,188,903) | 96.8 |

- '20년 이월: 1,892,962천원(시)
- '21년 본예산: 4,393,000천원(구비)

2

도로 및 도로(조명)시설물 관리 정비

도로개선/도로조명팀

주민 생활에 불편을 주는 노후·파손된 도로, 도로시설물 및 도로조명 시설을 신속히 정비하여 안전사고를 예방하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요 및 추진계획

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 규 모 | 추진 실적 | 소요예산 |
|-----------------------------|---|---|--|
| 포장도로정비 등 소파보수공사 (연간계약) | 아스팔트정비 23,400 ^m ² 콘크리트정비 1,000 ^m ² 보도정비 1,000 ^m ² | (공정률 55%) 아스팔트포장 12,800 ^m ² 보도블록포장 540 ^m ² | 1,900,000 (구비) |
| 도로시설물 설치 및 보수공사 (연간계약) | 과속방지턱 보수(도색) 1,500 ^m ² 방호울타리 및 중앙분리대 등 설치 및 보수 1,440m 구조물 세척 및 도색 8,100 ^m ² 도로시설물 보수·보강 1식(보도육교, 지하보도, 옹벽, 석축 등) | (공정률 43%) 블라드 구매 110개 안전헨스 설치 및 보수 145m 도로시설물 보수·보강(보도육교, 지하보도, 옹벽, 석축 등) | 550,000 (구비) |
| 보도정비공사 (연간계약) | 보도블록 정비 8,000 ^m ² 등 | (공정률 45%) 보도블록 정비 3,600 ^m ² | 1,233,000 (시 383,000 구비 850,000) |
| 사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사 (연간계약) | 보도 턱낮춤 정비 100개소 등 | (공정률 45%) 보도 턱낮춤 45개소 | 557,000 (시 397,000 구비 160,000) |
| 포장도로 굴착 복구 공사 (연간계약) | 아스팔트 정비 18,000 ^m ² 보도블록 정비 4,500 ^m ² | (공정률 49%) 아스팔트 포장 7,900 ^m ² 보도블록 정비 3,200 ^m ² | 2,821,059 (기금) |
| 불량맨홀 정비 공사 (연간계약) | 불량맨홀 정비 200개소 | (공정률 80%) 불량맨홀 정비 160개소 | 270,000 (기금) |
| 가로등시설물 정비 공사 (연간계약) | 관내 가로등 9,535등 유지관리 | (공정률 70%) LED등기구 교체 418개 | 287,000 (구비) |
| 보안등 설치개량 및 유지보수 공사 (연간계약) | 관내 보안등 9,425등 유지관리 | (공정률 42%) LED보안등 교체 563개 | 458,000 (구비) |

□ 예산현황

(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|--|--|--------|
| 8,076,059 (시 780,000, 구비 4,205,000 기금 3,091,059) | 3,626,273 (시 400,000, 구비 2,176,273 기금 1,050,000) | 44.9 |

겨울철 강설에 대비하여 제설대책본부를 운영하고 강설시 제설작업에 만전을 기함으로써 원활한 교통소통 및 주민 불편 사항을 최소화하는 제설대책을 추진하고자 함

□ 사업개요

○ 제설대책본부 운영

- 기간: '21. 11. 15. ~ '22. 3. 15.(4개월)
- 구성: 13개반 88명
- 제설대상: 388.8km(간선도로 61.9km, 보조간선도로 및 이면도로 326.9km)
- 단계별 근무 기준

| 구분 \ 단계 | 평 시 | 보 강 | 1 단 계 | 2 단 계 | 3 단 계 |
|---------|------------------------------|--|--|--|--|
| 내 용 | 일상예보 (강수확률 30%미만 또는 2℃이상) | 강설예보 (강수확률 30%이상 또는 2℃ 미만 적설량 1cm 미만 예보시) | 강설예보 (적설량 5cm 미만 예보시) | 대설주의보 (적설량 5cm 이상 예보시) | 대설경보 (적설량 10cm 이상 예보시) |
| 제설책임자 | 제설담당 | 도로개선팀장 | 도로과장 | 안전교통국장 | 구청장 |
| 근 무 자 | 1명 | 15명 | 207명 | 451명 | 634명 |
| 근무기준 | • 도로과 1명 | • 도로과 4명 • 용역업체 11명 | • 도로과 1/4 (7명) • 본부요원 1/4 (5명) • 동주민센터 1/4(91명) • 구청 1/4 (동장요구시) • 환경미화원 80명 • 용역업체 24명 | • 도로과 1/2(11명) • 본부요원 1/2(11명) • 동주민센터 1/2(164명) • 구 청 1/4(161명) • 환경미화원 80명 • 용역업체 24명 | • 도로과 23명 • 본부요원 1/2 (21명) • 동주민센터 1/2(164명) • 구 청 1/2(322명) • 환경미화원 80명 • 용역업체 24명 |

- 장비·자재 보유현황

| 제 설 장 비 (대) | | | | | | | 제 설 자 재 (톤) | | | |
|-------------|---------|-------|----------|--------|--------|-----|-------------|------|-----|-----|
| 소계 | 다목적 제설차 | 제설 삽날 | 염화칼슘 살포기 | | | 로우더 | 소계 | 염화칼슘 | 소금 | 친환경 |
| | | | 대형(15t) | 중형(5t) | 소형(1t) | | | | | |
| 50 | 2 | 11 | 3 | 5 | 28 | 1 | 494 | 174 | 250 | 70 |

- 제설작업 용역시행
 - 직영조 편성: 2개조 / - 용역조 편성: 13개조
 - 인 력: 24명(직영 2명, 작업반장 1명, 작업원 6명, 운전원 13명, 장비기사 2명)
 - 장 비: 덤프트럭 13대(15톤 3대, 5톤 5대, 1톤 5대), 다목적제설차 2대, 백호(0.4m) 2대
 - ※ 보강 시 1/2 또는 전부 투입, 1·2·3단계 장비 전부 투입

□ **주요 추진실적**

- 제설장비 점검 및 수리
 - 살포기 소모품 교체 수리(대형15t 3대, 중형5t 2대, 소형1t 13대)
 - 다목적 제설차량 주요부품 점검 및 소모품 교환 등

□ **향후계획**

- 제설함 설치(370개소)
 - 고가차도, 지하차도 및 취약지점(20개소), 주요 노선(103개소)
 - 이면도로, 고갯길 등(199개소), 보도육교 8개소(21개소), 초등학교(27개소)
- 보행자 미끄럼 안전사고 저감대책
 - 상습결빙 구간에 낙상주의 안내표지판 부착
- 도로 물청소차를 활용한 친환경 제설 시행
 - 기존 도로 물청소차(6톤) 2대에 친환경 염수 적재하여 간선도로 제설
 - 액상제 염수 살포로 초동 제설 능력 향상 등 친환경 제설 시행
- 자동액상살포장치 설치·운영
 - 고정식 자동액상살포장치(2개소)
 - 신길지하차도, 도림고가차도(각 저장하우스 1동, 분사노즐 500m)
 - 이동식 자동액상살포장치(2개소 / 5대)
 - 신길자이아파트 주변(3대), 도림동성당 주변(2대)

□ **예산현황**

(단위: 천원)

| 예 산 액 | 집 행 액 | 집행률(%) |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 170,000 (시 100,000, 구비 70,000) | 30,000 (시 30,000) | 17.6 |

주민생활에 불편을 주는 도로 물고임을 근본적으로 해결하기 위한 배수장치 설치로 안전하고 쾌적한 시설환경 조성 및 도시미관 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 규 모: 물고임 배수장치 설치 30개소, 측구(투수) 정비 134m 등
- 사업기간: '21. 2. ~ 12.

□ 주요 추진실적

- '21. 2. ~ 4. : 도로 물고임 정비 대상 조사
- '21. 4. : 공사 발주 및 계약
- '21. 5. : 공사 착공(물고임 배수측구 등 정비 15개소)

□ 향후계획

- '21. 6. ~ 8. : 물고임 배수측구 등 정비 15개소
- '21. 8. 31. : 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| 100,000 (구비 100,000) | 50,000 (구비 50,000) | 50 |

□ 현황사진(전·후)



5 주택가 이면도로 안전한 통행로를 만들어 주세요 도로개선팀

주민 생활에 불편을 주는 노후 파손된 도로를 신속히 정비하여 안전사고를 예방하고 쾌적한 도로 환경을 조성하고자 함 (구 주민참여예산)

□ 사업개요

- 위 치: 가마산로 394 등
- 규 모: 아스팔트 포장 정비 1,820 m^2
- 사업기간: '21. 2. ~ 12.

□ 주요 추진실적

- '21. 4. ~ 5. : 도로 정비
- '21. 5. 10. : 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| 50,000 (구비 50,000) | 50,000 (구비 50,000) | 100 |

□ 현황사진(전·후)



주민생활에 불편 및 사고 우려가 있는 골목길 급경사 도로를 신속히 정비하여 안전사고 예방 및 쾌적한 도로 환경을 조성하고자 함. (구 주민참여예산)

□ 사업개요

- 위 치: 가마산로63길 19-25 부근
- 규 모: 아스팔트 재포장 및 미끄럼방지 설치 364m²
- 사업기간: '21. 4. ~ 12.

□ 주요 추진실적

- '21. 3. ~ 4. : 현장조사 및 주민협의
- '21. 5. : 차도 재포장 364m²

□ 향후계획


- '21. 6. : 미끄럼방지포장 설치 364m²
- '21. 6. 30. : 공사 준공

□ 예산현황


(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| 64,000 (구비 64,000) | 35,000 (구비 35,000) | 54.7 |

□ 현황사진

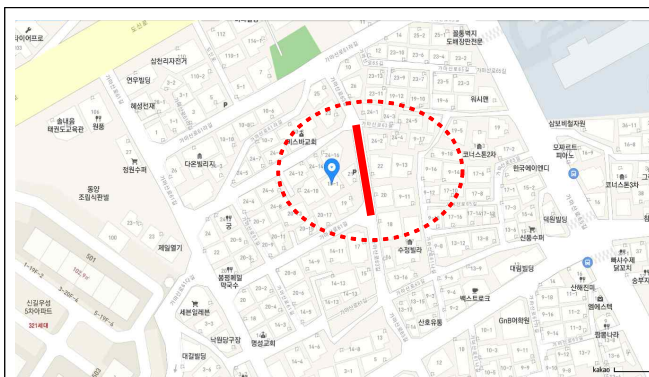

위치도

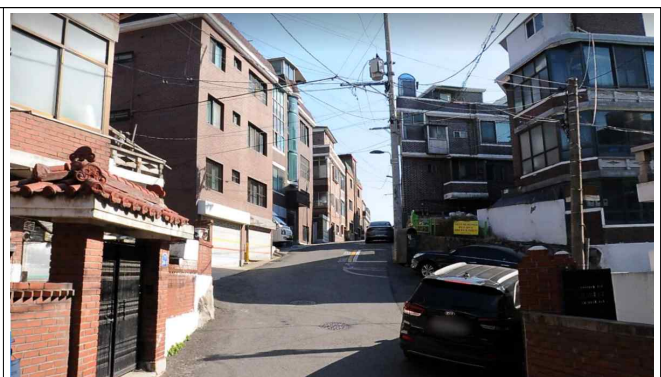

현황사진

도로굴착복구시스템 허가증 교부시 QR코드 생성을 통한 디지털 공사정보를 제공하여 체계적인 공사장 관리를 추진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : '20. 12. 23. ~ '22. 12. 12.
- 1차 연도 : '20. 12. 23. ~ '21. 6. 20.
- 사업내용 : 도로굴착복구시스템 재구축
- 사업주체 : 서울시 도로관리과
 - 우리구 제안사항 : 허가증 내 QR코드(공사 및 지하시설물 정보 연계) 생성
 - ※ 현재 허가번호, 장소 등을 입력한 도로굴착복구시스템 별도 조회로 시간 소요 발생

□ 주요 추진실적

- '20. 9. 28. : 도로굴착복구시스템 개선 업무 협의 (영등포구 → 市 도로관리과)
- '20. 10. 22. : 도로굴착복구시스템 개선 업무 협의 회신(市 도로관리과 → 영등포구)
 - 재구축 용역 추진과정에서 제안사항 세부 검토
- '20. 12. 23. ~ 현재 : 시스템 분석 및 설계
- '21. 5. 14. : TF회의 개최 (영등포구 관계자 및 용역사 참석)
 - 제안사항 반영여부 및 진행사항 확인

□ 향후계획

- '21. 6. 21. ~ '22. 6. 20.
 - 도로굴착복구시스템 개발
- '22. 6. 21. ~ '22. 12. 12.
 - 도로굴착복구시스템 시범운영

노후된 도로조명설비의 개량 및 시설 개선 사업을 추진하여 에너지를 절감하고 안전하며 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

| 구 분 | 사 업 명 | 내 용 | 사업기간 | 예산액 (백만원) |
|-----|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 가로등 | 영신로 노후 가로등 광원교체 ※연간계약 통해 시행 | LED등기구 130등 교체 | 2021. 3. ~ 4. (4.30. 완료) | 100(구비) |
| | 도림로 LED보행등 설치 ※연간계약 통해 시행 | LED가로등기구 15등 교체 LED보행등기구 29등 신설 | 2021. 3. ~ 4. (4.30. 완료) | 20(구비) ※구 주민참여예산 |
| | 의사당대로 가로등 개량 | 노후 등주 53본, 분전반 3면 교체 | 2021. 3. ~ 11. | 294(시) |
| 보안등 | 대림1동 외 4개동 LED보안등 설치 | LED보안등 548등 교체 (당선동, 당선2동, 대림동, 대림2동) ※신길4동, 신길6동 낙찰차액 활용 60등 추가교체 | 2021. 3. ~ 6. | 351 (시 51, 구비 300) |
| 소계 | | | | 765 (시 345, 구비 420) |

□ 주요 추진실적

- '21. 2. ~ 5.: 공사 시행(공정률 75.7%)

□ 향후계획

- '21. 6. : 기성금 지출
- '21. 11. : 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

| 예 산 액 | 집 행 액 | 집행률(%) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| 765,000 (시 345,000, 구비420,000) | 579,120 (시 163,764, 구비 415,356) | 75.7 |

도로에서 발생하는 지반침하 사고와 관련, 도로하부 공동(空洞)조사사업을 추진하여 국민불안을 해소하고 안전사고를 예방하고자 함

□ 사업개요

- 대 상: 관내 관리도로(구도) 58개 노선 144km
- 기 간: '22년 2월 ~ 12월
- 사업내용: 지표투과 레이더(GPR) 탐사를 통한 공동(空洞)조사
 - 차량형 GPR 1차 탐사(공동탐지), 휴대용 GPR 2차 조사(공동확인)
 - 공동조사 결과에 따라 굴착복구(원인자)

□ 주요 추진실적

- '21. 5: 2021년 영등포구 지하안전관리계획 수립
- '21. 5: 도로하부 공동(空洞)조사사업 기본계획 수립

□ 향후계획

- '21. 6: 도로하부 공동(空洞)조사사업 세부계획 수립
- '21. 6 ~ 8: 지하시설물관리자 비용분담 협의
- '22. 1 ~ 12: 공동조사사업 용역 발주 및 시행

□ 소요예산(예산): 총400,000천원(구비) -내년예산 반영

Ⅲ. 신규·중점사업 추진실적

1 신길지하차도 상부 교차로 구조개선

도로계획팀

신길지하차도 상부는 심한 높이차로 인하여 차량 및 보행자에게 사고의 위험이 상존하여 구조개선을 통한 합리적 교통체계 확보로 원활한 차량 소통 및 안전사고를 예방하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 신길동 신길지하차도 상부
- 규 모: 도로구조개선 B=20m, L=160m
- 사업기간: '21. 1. ~ 12.

□ 주요 추진실적

- '21. 3.: 공사 계약
- '21. 3. ~ 4.: 도로점용공사장 교통소통대책
- '21. 5.: 공사 착공

□ 향후계획

- '21. 6. ~ 9.: 지하매설물 이설
- '21. 6. ~ 11.: 도로구조개선(도로포장 등)
- '21. 12.: 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| 3,400,000 (시 3,400,000) | 1,049,963 (시 1,049,963) | 30.8 |

□ 위치도



대림동 942-7 주변 도로정비공사를 시행하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 대림동 942-7 주변
- 규 모: 보도블록 철거 530 m^2 , 아스팔트 포장 1,400 m^2 등
- 사업기간: '21. 5. ~ 10.
- 총사업비: 200,000천원(대림3주택재건축정비사업조합 예치금)

□ 주요 추진실적

- '21. 3. 16.: 대림동 942-7 협의매수
- '21. 4. 13.: 도로정비공사 요청(대림3주택조합→영등포구)
- '21. 5. : 교통규제심의 협의(영등포경찰서)

□ 향후계획

- '21. 6.: 공사 착공
- '21. 10.: 공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|--------------------------|----------------------|--------|
| 200,000 (예치금 200,000) | 4,400 (예치금 4,400) | 2.2 |

□ 위치도 및 현황사진



3 횡단보도 주변 조도개선 사업

도로조명팀

관내 교차로 횡단보도에 조명설치 및 조도(照度)개선 사업을 추진하여 보행자 교통사고 예방 및 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 양평동사거리 횡단보도 등 32개소
- 규 모

| 구 분 | 수량(등) | 위 치 |
|---------|-------|-------------------------|
| LED 투광등 | 92 | 양평동사거리 등 25개소 |
| LED 가로등 | 10 | 버스중앙차로(경인로) 횡단보도 4개소 주변 |
| LED 조명등 | 24 | 버스중앙차로(경인로) 승차대 6개소 |
| 계 | 126 | |

- 사업기간: 2021년 5월 ~ 8월
- 총사업비: 100,000천원(구 주민참여예산)

□ 주요 추진실적

- 사업대상지 검토: 유관기관(교통행정과, 영등포경찰서) 설치요청 장소(사고다발 구간)
- 계약심사 및 일상감사의뢰(5.14.)

□ 향후계획

- 2021. 6.: 계약 및 공사 시행
- 2021. 8.: 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

| 예 산 액 | 집 행 액 | 집행률(%) |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| 100,000 (구비 100,000) | 78,600 (구비 78,600) | 78.6 |

기존 문래보도육교에 설치된 좁고 이동속도가 느린 엘리베이터를 교체하여 안양천 생태공원을 이용하는 지역 주민들의 이용편의 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 문래로4길 4
- 기 간: '21년 1월 ~ 10월
- 사업내용: 엘리베이터 교체 1대, 보도육교 계단 교체 1개소,
전기인입공사 1식, 부대시설 정비 1식
- 총사업비: 350,000천원

□ 주요 추진실적

- '21. 4: 실시설계용역 시행 및 준공
- '21. 5: 문래보도육교 E/V 교체공사 시행

□ 향후계획

- '21.10: 문래보도육교 E/V 교체공사 준공

□ 위치도 및 현황



□ 예산현황

(단위: 천원)

| 예 산 액 | 집 행 액 | 집행률(%) |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| 350,000 (구비 350,000) | 19,800 (구비 19,800) | 5.7 |

보도블록 노후로 인하여 평탄성 불량 등 보행불편을 초래하는 보도를 보수·정비하여 안전사고를 예방하고 교통약자의 걷기편한 보행환경 조성하고자 함

□ 사업개요

- 규 모 : 보도블록 정비 54,180㎡ 등
- 사업기간 : '21. 3. ~ 11.

□ 사업현황

| 연번 | 사업명 | 위치 | 공사내용 | 사업비(천원) |
|----|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 영등포로 보도정비공사 | 영등포시장 사거리 ~ 영등포로터리 | • 보도정비 47,500㎡ | 1,300,000 (가로경관과) |
| 2 | 선유동1로 보도정비공사 | 선유로 120 ~ 영등포로 85-1 | • 보도정비 730㎡ | 190,000 (시바-특별교부금) |
| 3 | 디지털로 보도정비공사 | 디지털로 433 ~ 디지털로 463 | • 보도정비 1,240㎡ | 370,000 (시비) |
| 4 | 시흥대로 보도정비공사 | 시흥대로 601 ~ 시흥대로 681 | • 보도정비 2,800㎡ | 500,000 (시비) |
| 5 | 영중로 보도정비공사 | 영등포시장역 ~ 영등포시장사거리 | • 보도정비 1,910㎡ | 500,000 (가로경관과) |

□ 주요 추진실적

- 영등포로 보도정비공사 : 공사 계약 및 착공 ('21. 5.31.)
- 선유동1로 보도정비공사 : 공사 시행('21.3.~6.)
- 디지털로 보도정비공사 : 공사 시행 ('21. 4.~6.)
- 시흥대로 보도정비공사 : 공사 시행 ('21. 4.)
- 영중로 보도정비공사 : 계약심사 및 일상감사('21. 5.)

□ **향후계획**

- '21. 6.~11. : 영등포로 보도정비공사 착공(6월) 및 준공(11월)
- '21. 6. : 선유동1로 보도정비공사 준공
- '21. 6. : 디지털로 보도정비공사 준공
- '21. 6. : 시흥대로 보도정비공사 준공
- '21. 6.~11. : 영중로 보도정비공사 시행(6월) 및 준공(11월)

□ **예산현황**

(단위: 천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행률(%) |
|-----------|---------|--------|
| 2,860,000 | 875,000 | 30.6 |

□ **2021년 보도정비 단일공사 현황**

| 연번 | 사업개요 | 비고 |
|----|---|-----------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 공사명: 영등포로 보도정비공사 • 위치: 영등포시장 사거리 ~ 영등포로터리 • 규모: 보도정비 47,500m² (B=4.0~4.5m, L=640m) • 공사기간: '21. 4. ~ 11.   | <p>착공 (5.31.)</p> |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • 공사명: 선유동1로 보도정비공사 • 위치: 선유로 120 ~ 영등포로 85-1 • 규모: 보도정비 730m² • 공사기간: '21. 3. ~ 6.   | <p>준공 (6월)</p> |

| | | |
|----------|--|--------------------|
| <p>3</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 공 사 명: 디지털로 보도정비공사 • 위 치: 디지털로 433 ~ 디지털로 463 • 규 모: 보도정비 1,240m^2 • 공사기간: '21. 3. ~ 6.   | <p>준공 (6월)</p> |
| <p>4</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 공 사 명: 시흥대로 보도정비공사 • 위 치: 시흥대로 601 ~ 시흥대로 681 • 규 모: 보도정비 2,800m^2 • 공사기간: '21. 4. ~ 9.   | <p>준공 (6월)</p> |
| <p>5</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 공 사 명: 영중로 보도정비공사 • 위 치: 영등포시장역 ~ 영등포시장사거리 • 규 모: 보도정비 1,910m^2 • 공사기간: '21. 6. ~ 11.   | <p>시행 (6월)</p> |
