

제142회 영등포구의회

2008년도 제2차 정례회

'08. 11. 21 ~ 11. 25



주요 업무 보고

-2008년도 추진실적 및 2009년도 계획-

2008. 11



공원 녹지과

보 고 순 서

- 일반 현황 1
- 2008 주요업무 추진실적 3
- 2009 주요업무 계획 28

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직					기 능 직			
		5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	10급
정 원	29	1	4	5	4	5		2	3	5
현 원	29	1	4	6	4	4	1	8		1
과부족	-			+1	-	-1	+1	+6	-3	-4

2 조 직



3 주요시설 및 장비

4 예 산 현 황

구 분	도 시 공 원					마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근 린			어린이					
		계	구공원	시공원						
개소수	29	11	7	4	18	23	104	54개 노선	2종	14개소
면 적 (㎡)	597,546.8	543,463.9	141,973.9	401,490	54,082.9	15,825.7	488,814	15,976 주	2주	16종 158점

예산 현액

(단위 : 천원)

단위사업명	①예산현액	②집행액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집행액	집행예정액		
합 계	19,583,947	14,842,033	4,741,914		
공원녹지관리 수준향상	12,121,926	9,319,210	2,802,716		
아름다운 환경 및 편리한시설 만들기	2,460,339	1,968,546	491,793		
안양.도림천 특화	528,538	332,524	196,014		
푸른공간 늘리기	4,327,858	3,121,994	1,205,864		
인력운영비	129,710	94,474	35,236		
기본경비	15,576	5,285	10,291		

Ⅱ. 주요업무 추진실적

1 유수지 주변 녹지량 확충(시비)

유수지 주변에 녹지를 조성하여 유수지내 체육시설을 이용하는 주민에게 녹음을 제공하는 등 도시 미관 향상 및 주민의 삶의질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 3개소(신길유수지, 대림유수지, 도림유수지)
- 규 모 : 4,210㎡(신길 1,740㎡,도림 1,280㎡,대림 1,190㎡)
- 사업기간 : 2008. 2 ~ 12. 10
- 사업내용 : 수목식재 및 휴게시설 설치
- 사 업 비 : 700백만원

□ 추진실적

- 2008. 4 ~ 6 : 실시설계용역 발주 및 준공
- 2008. 6. 24 : 서울시 설계심의 완료(자연생태과)
- 2008. 8. 19 : 공사 발주
- 2008. 9. 11 ~ 12.10 : 공사 착공 및 준공 ※ 공정율 70%

□ 향후 추진계획

- 2008.12.10 : 공사 준공예정



2 2008 생활권주변 자투리땅 녹화(시비,구비)

생활권주변 자투리땅을 녹화하여 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동3가 29-3외 17개소
- 규 모 : 2,300m²
- 사업기간 : 2008. 7 ~ 10
- 사업내용 : 수목식재 및 시설물 설치
- 사 업 비 : 363백만원(시비 150백만원, 구비 213백만원)

□ 추진실적

- 2008. 4 ~ 5 : 설계용역
- 2008. 6 : 설계심의(서울시), 일상감사(영등포구)
- 2008. 7 : 공사발주 및 계약
- 2008. 8 : 공사착공(구비)
- 2008. 11 : 공사준공(구비)

□ 향후 추진계획

- 2008. 11~12 : 공사발주 및 계약(시비)
- 2009. 2 : 공사착공(시비)
- 2008. 5 : 공사준공(시비) ※ 공정율 60%



3 공원화장실 재건축(구비)

노후 및 협소한 공원화장실을 근본적으로 아름답고 향기나는 시설로 개선하여 날로 높아지는 주민 문화 수준에 부응하고 질 높은 서비스를 제공

□ 사업개요

○ 공사개요

- 메낙골 근린공원 화장실 설치 (A=5.76m²)
- 자매공원 화장실 재건축(A=15.84m²)
- 양남공원·동심공원 화장실 리모델링(양남: 8.91m², 동심: 4.62m²)
- 사업기간 : 2008. 1 ~12
- 총사업비 : 270백만원(구비 200백만원, 시비70백만원)

□ 추진실적

- 2008. 1.23 : 자매공원 화장실 서울시 타당성심사
- 2008. 5. 2 : 양남·동심공원화장실 리모델링 준공(완료)
- 2008. 5. 23: 메낙골 근린공원 화장실 도시디자인 심의 통과
- 2008. 5. 29: 메낙골 근린공원 화장실 설치계획 수립 및 구매요청

□ 향후추진계획

- 2008. 7. 15 : 메낙골 화장실 설치 공사 발주
- 2008. 12. 31 : 중앙어린이공원 화장실 설치 완료
- 2008. 9. 30 : 자매공원 실시설계용역 준공
- 2008. 11.30~2009. 4. 30 : 자매공원 화장실 공사시행



4 신길근린공원 시설개선(구비)

신길공원은 시설이 노후되고 부지경사로 인하여 토사 유실에 의한 주택가 침수가 우려될 뿐만 아니라 그동안 일부 공원용지 보상이 완료된 지역에 아름답고 쾌적한 공원을 조성하여 주민들의 정서함양은 물론 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 425-45일대
- 면 적 : 19,782m²
- 사업기간 : 2008. 5 ~ 8.01
- 사업내용 : 시설물설치 및 수목식재
 - 산책로 324m², 정자1동
 - 게이트볼장 1면, 체력단련시설4점 등
- 총사업비 : 166백만원

□ 추진실적

- 2008. 1.28 : 실시설계 용역 발주
- 2008. 2.12 : 실시설계 용역 착공
- 2008. 3.31 : 실시설계 용역 준공
- 2008. 4.10 : 정비 공사 발주
- 2008. 4.28 : 정비 공사 착공
- 2008. 7.20 : 정비 공사 준공

※ 공정율 100%



5 안양천 현대식 화장실 설치사업(구비)

이용인구의 증가에 대비하여 안양천에 적정 수량의 화장실을 설치하여 편의제공

□ 사업개요

- 위 치 : 양화교 갈대축구장 주변 제방
- 규 모 : 1동(12.65m²)
- 사업기간 : 2008. 4~8월
- 사업내용 : 현대식 화장실 1개소 설치
- 총사업비 : 60백만원

□ 추진실적

- 서울시 디자인심의 : 2008. 6.11
- 2008. 6~7월 : 관급자재 구매(이동식 화장실:39,376천원)
- 화장실 설치공사 : 2008, 8~9월 ※ 공정율 100%



6 마을단위 야외체육시설 설치(구비)

체육활동 인구 증가에 대비하고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 마을단위 야외체육시설을 설치하여 구민건강 증진 및 체육인구 저변확대

□ 사업개요

○ 체육시설 현황

- 운동장 : 47면(축구장7, 농구장5, 족구장3, 배드민턴18, 기타14 등)
- 운동기구 : 299점(하늘걷기8, 온몸역기18, 허리돌리기47, 기타226 등)

○ 위치 및 사업비

구 분	위 치	사 업 비 (백만원)
	11개소	360
상반기	배드민턴장(당산2동, 오목교)	80
“	대방천녹지대,	30
“	전철녹지대(전철아파트 주변녹지대)	60
“	대림지역공원(원지, 대림, 다사랑, 신우어린이공원)	80
하반기	구 포괄(고추말공원, 신길1동 마을마당, 대림공원 등)	110

○ 사업기간 : 2008. 2 ~ 8

□ 추진실적

- 2008. 2 ~ 3 : 현장조사 및 정비계획 수립
- 2008. 4 ~ 5 : 실시설계용역 발주 및 준공
- 2008. 6 13 : 체육시설 설치공사 발주
- 2008. 7 3 : 체육시설 설치공사 계약 및 착공
- 2008 8. 18 : 공사 준공 ※ 공정율 100%

7 안양천 GREEN WAY 조성(시비)

환삼덩굴 등 경관을 저해하는 식물이 자라고 있는 안양천 제방사면에 하천생태와 부합되는 다양한 초종으로 녹화하여 아름다운 하천경관 조성

□ 사업개요


- 위 치 : 오목교 ~ 신정교(약 0.8km)
- 규 모 : 9,966m²(m²당 조성비 : 약200,000원)
- 사업기간 : 2008. 4 ~ 2009. 6.30
- 사업내용 : 식재기반 조성, 식생매트 설치, 산책로 조성 등
- 총사업비 : 2,000백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 안양천 그린웨이(Green Way)조성사업 추진계획수립
- 2008. 2 : 기술용역 타당성 심의(기술심사담당관)
- 2008. 4 : 실시설계용역 착공
- 2008. 8 : 서울시 설계심의(자연생태과)
- 2008. 8 : 서울시 건설기술심의(계약심사과)
- 2008. 8 : 서울시 계약 심사 ※ 공정율 0%

□ 향후 추진계획

- 2008. 11 ~ 2009. 6 : 공사발주 및 준공

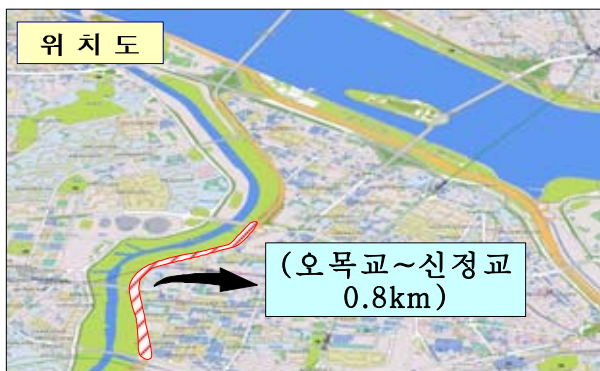

8 걷고싶은 녹화거리 조성(시비) - 사고이월사업

행정자치 중심의 녹화거리 조성과 주변아파트 담장개방 및 열린 녹지조성, 학교공원화사업을 복합적으로 시행하여 신길6동 벚꽃길 일대를 Green town으로 탈바꿈하는 사업으로 가로변 녹시율 증대 및 쾌적한 거리환경을 조성하여 이용하는 주민들의 정서함양에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 벚꽃길~외솔길 일대
- 규 모 : 1,295m
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2008. 6
- 사업내용 : 왕벚나무외 42종 식재, 벽천외 35종 설치 등
- 사 업 비 : 1,510백만원(시비)

□ 추진실적

- 2007. 6 ~ 10 : 설계용역 시행
- 2007. 9 ~ 10 : 설계심의, 계약심사
- 2007. 12 ~ 2008. 6 : 사업시행
- 2008. 7. : 준공 ※ 공정율 100%



9 여의도 동·서로 녹지량 확충(시비)

가로변 유휴지에 녹지를 조성, 향토수종 식재하여 녹지량을 확충함으로 쾌적한 보행공간 확보 및 가로경관 향상 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의도 동·서로 전구간
- 규 모 : 약 7,000m
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2009. 6
- 사업내용 : 살구, 이팝, 산수유, 개나리 등 봄꽃식재
- 사 업 비 : 723백만원

□ 추진실적

- 2008. 7 ~ 8 : 설계용역 및 공사발주
- 2008. 10. 7 : 실시설계용역 발주
- 2008. 10. 24 : 실시설계용역 계약

□ 향후 추진계획

- 2008. 10. 24 ~ 12. 6 : 실시설계 용역
- 2009. ~ 12. 6 : 공사시행



도심에 숲 효과를 제공하고 있는 가로수가 매연 등으로 인해 수세가 점차 쇠약해지고 있으므로 생육환경 개선을 위하여 하단 띠녹지 조성 및 보호판을 확대 설치하여 건강한 생육여건을 조성하고 가로수 병렬 식재로 가로변 녹지량 확충에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 제물포로외 7개노선
- 규 모 : 띠녹지 조성 3,448m²
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2008. 6
- 사업내용 : 키큰나무(반송외 6종), 키작은나무(회양목외 3종) 식재 등
- 사 업 비 : 648백만원(시비)

□ 추진실적

- 2007. 10 ~ 11: 설계용역 시행
- 2008. 11. : 설계심의, 계약심사
- 2008. 12 ~ 6 : 사업시행
- 2008. 7. : 준공 ※ 공정율 100%



11 가로수 가지치기(구비)

우리구 영등포로 등 3개노선 가로수 중 수고가 지나치게 높거나 가지가 울창하여 태풍 등에 도복되어 안전사고의 위험이 있는 수목 및 민원사항 등에 의해 정비가 필요한 수목에 대한 전지작업을 시행함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포로 등 7개 노선
- 규 모 : 수목전지 620주
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 4
- 사업내용 : 버즘나무, 은단풍 620주 전지
- 사 업 비 : 100백만원

□ 추진실적

- 2008. 1 : 현장조사 및 설계, 일상감사
- 2008. 2 ~ 4. 8 : 사업시행 ※ 공정율 100%



12 공공기관 담장녹화(시비)

공공기관 담장을 허문 후 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동4가 24번지 강서세무서
- 규 모 : 담장철거 180m, 녹지조성면적 638m²
- 사업기간 : 2008. 2~12
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 206백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 공공기관 담장 녹화사업 추진계획 수립
- 2008. 3 ~ 5 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2008. 6 : 시 조경과 설계심의 시행
- 2008. 10~11: 공사시행 ※ 공정율 70%

□ 향후 추진계획

- 2008. 11. 25 : 공사준공



13 2008 아파트 열린녹지 조성(시비)

아파트 담장을 허문 후 단지내 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동5가 현대3차아파트 외 2개소
- 규 모 : 녹지조성 3,630m²
- 사업기간 : 2008. 2~11
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 822백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 2008 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
- 2008. 3 ~ 5 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2008. 6 : 시 조경과 설계심의 시행
- 2008. 9 ~ 12 : 공사시행 및 준공 ※ 공정율 100%



14 2008 도시구조물 벽면녹화(시비)

도시내 회색빛 콘크리트 옹벽, 방음벽, 담장 등 인공적으로 만들어진 구조물 벽면에 덩굴성 식물을 식재하여, 피복·녹화함으로써 가로변 녹시율을 높이고 도시경관을 개선하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 3개소 (양평동 관악고등학교 뒤 방음벽, 양평동 남양약품 벽면, 양평동5가 7-7번지 방음벽 등)
- 규 모 : 423m
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 11
- 사업내용 : 경계석 설치 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 61백만원

□ 추진실적

- 2008. 3~ 5 : 현장조사
- 2008. 6 ~ 7 : 자체설계 완료
- 2008. 7 ~ 11. 12 : 공사시행 및 준공 ※ 공정율 100%



15 왕벚나무 수세회복(구비)

여의동·서로 왕벚나무의 수세가 점차 쇠약해지고 있으므로 생육공간의 확대, 뿌리수술, 영양제 공급 등 생육환경을 개선하여 매년 시행하는 여의도 봄꽃축제 장으로써의 기능을 유지코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동·서로, 안양천 뚝방, 신길6동 벚꽃길,도림고가 주변
- 규 모 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충방제
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 9
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 21주, 병해충방제 4,184주
- 사 업 비 : 50백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 현장조사 및 설계
- 2008. 3 : 공사착공
- 2008. 9. 15 : 공사준공



16 가로수 보식 및 식재(구비)

신설도로 및 교통사고, 자연고사 등으로 가로수가 없는 지역에 가로수를 식재하여 민원을 해소하고 가로변 녹지량 확충 및 쾌적한 가로공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 도신로 등 8개노선
- 사업기간 : 2008. 6 ~ 9. 16
- 사업내용 : 칠엽수 등 3종 72주 식재, 가로수보호판 164조 설치 등
- 사업비 : 130백만원

□ 추진실적

- 2008. 1 ~ 2 : 현장조사 및 사업계획 수립
- 2008. 3 ~ 5 : 실시설계 시행
- 2008. 6 : 공사착공
- 2008. 9. 15 : 공사준공 ※ 공정율 100%



17 | 공원 전기시설물 개량(구비)

공원에 설치된 공원 등의 전기설비가 노후되어 우기시 감전사고가 우려되며, 접지 불량 등으로 등이 자주 꺼지는 사례가 빈번하여 공원이용자에게 불편을 초래하고 있어, 시설물을 개선하여 밝고 쾌적한 공원환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 20개소(여의도동55 자매공원 등 20개소)
- 규 모 : 자매공원 22개소 공원등 개선 및 동심공원 외 18개소 전기시설물 개량
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 12
- 총사업비 : 30백만원

□ 추진실적

- 2008. 4.24 : 동심공원의 18개소 전기시설물 정비공사 발주
- 2008. 4.30 : 공사 착공
- 2008. 5.19 : 공사 준공 ※ 공정율 100%

□ 향후 추진계획

- 2008. 10 : 자매공원 공원등 시설개선 공사발주
- 2008. 12 : 자매공원 공원등 시설개선 공사준공



노후된 공원 시설물을 현대식으로 재정비하여 쾌적한 도시경관 조성
(서울시에서 우리구로 이관)

□ 사업개요

- 위 치 : 중마루 근린공원(영등포1동 222)
- 규 모 : 벤치 교체, 연못정비, 잔디식재, 화강석판석 포장 및 수목식재 등
- 사업기간 : 2008. 6.2 ~ 2008. 8.1
- 총사업비 : 300백만원

□ 추진실적

- 2008. 1.28 : 서울시 기술용역 타당성 심사
- 2008. 3.31 : 실시설계 용역 준공
- 2008. 5. 2 : 공사 발주
- 2008. 6. 2 : 공사 착공
- 2008. 8. 1 : 공사 준공 ※ 공정율 100%



공원의 노후시설을 개선하고 산책로, 운동기구 조형물 등을 설치하여 쾌적한 공원으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 자매근린공원(여의도동 56번지)
- 규 모 : 16,500m²
- 사업기간 : 2008. 11. 15 ~ 2008. 12. 31
- 총사업비 : 800백만원

□ 추진실적

- 2008. 1.25 : 서울시 기술용역 타당성 심의
- 2008. 2.27 : 자매근린공원 시설개선공사 실시설계 용역 발주
- 2008. 3.18 : 자매근린공원 시설개선공사 용역 착공
- 2008. 6. 2 : 서울시 공원디자인 및 설계심의

□ 향후 추진계획

- 2008. 11. 15. : 착공
- 2008. 12. 31. : 준공



녹지공간 및 공원시설이 절대 부족한 우리구 메낙골 근린공원에 수경시설물을 설치하여 도시 경관을 향상하고 구민의 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 메낙골근린공원(신길동 4934-4호)
- 규 모 : 51,470m²
- 사업기간 : 2008. 5.14 ~ 7.15
- 총사업비 : 700백만원
- 시설규모
 - 바닥분수 1개소 : 12.5m×12.5m
 - 산책로 탄성포장 : 862.5m²(폭 2.5m/ 연장344m)

□ 추진실적

- 2008. 1.23 : 서울시 기술용역 타당성 심의
- 2008. 1.28 : 실시설계 용역 발주
- 2008. 3.21 : 설계심의(서울시 공원조성과)
- 2008. 3.27 : 용역 준공
- 2008. 5.14 : 공사 착공
- 2008. 7. 15 : 공사 준공 ※ 공정을 100%



조성된지 10년 이상의 노후된 어린이공원을 재정비하여 공원의 질적수준을 향상시키고 어린이와 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 생활권 놀이·휴게 공간으로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 서강공원(영등포3동 8가 28) / 양남공원(양평1동 205)
- 규 모 : 3,264m² (서강 1,797m² / 양남 1,467m²)
- 사업기간 : 2008. 7 ~ 10. 31
- 총사업비 : 466백만원

□ 추진실적

- 2008. 1. 29 : 계획수립
- 2008. 1. 29 : 실시설계 용역 발주
- 2008. 4. 30 : 주민설명회(2회)
- 2008. 5. 12 : 용역준공
- 2008. 6. 23 : 일상감사
- 2008. 7 : 공사계약 및 착공
- 2009. 10.31 : 공사 준공 ※ 공정율 100%



공원내 대형수목을 전지하여 안전사고를 예방하고 나대지 피복 등 녹지를 정비하여 쾌적한 공원경관 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 자유어린이공원 외 4개소
- 규 모 : 자산홍 외 3종 2,685주 및 맥문동 1,200본 식재
- 사업기간 : 2008. 6 ~ 7
- 총사업비 : 19백만원

□ 추진실적

- 2008. 6. 03 : 공사발주
- 2008. 6. 10 : 공사계약 및 착공
 - 실 적
 - 자유공원 : 자산홍(H0.4 × W0.4) 식재 2,030주
 - 문래공원 : 영산홍(H0.3 × W0.4) 식재 325주
 - 영등포소공원 : 쥐똥나무(H1.5 × W0.4) 식재 330주
 - 당산공원 생태연못 : 맥문동(10cm) 식재 1,200본
- 2008. 7. 19 : 공사준공 ※ 공정을 100%



공원 등 도시환경 시설을 장애인,노인,임산부 등의 사회적 약자가 편하게 이용할 수 있도록 점진적으로 시설을 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 동심어린이공원 외 5개소
- 규 모 : 장애인 유도블럭 274m, 블라드 25개, 점토블럭 포장 561m²
 - 동심공원 : 장애인유도블럭 16m / 블라드 4개소
 - 신우공원 : 장애인용 블라드 3개소
 - 신일공원 : 점토블럭포장 62m² / 장애인유도블럭 21m
 - 대림공원 : 장애인용 블라드 12개소
 - 원지공원 : 블라드 1개소 / 장애인유도블럭 118.5m 설치
 - 다사랑공원 : 점토블럭포장 499m² / 장애인유도블럭 118.5m 등
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 8
- 총사업비 : 59백만원

□ 추진실적

- 2008. 3. 14 : 계획수립
- 2008. 6. 18 : 공사발주
- 2008. 6. 23 : 공사착공
- 2008. 7. 21 : 공사준공 ※ 공정율 100%



조성된지 10년 이상의 노후된 어린이공원을 재정비하여 공원의 질적수준을 향상시키고 어린이와 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 생활권 놀이·휴게 공간으로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 양평어린이공원 외 4개소 (중앙, 원지, 신우, 신길)
- 규 모 : 145,869m²
- 사업기간 : 2008. 4 ~ 10
- 총사업비 : 128백만원

□ 추진실적

- 2008. 4. 10 : 정비계획 수립
- 2008. 4. 28 : 공사계약
- 2008. 5. 06 : 공사착공
- 2008. 10. 2 : 공사준공 ※ 공정율 100%

- 실 적

- 근린공원 : 문래, 당산, 신길, 예낙골
- 어린이공원 : 중앙, 원지, 신우, 동성, 대림, 자유, 다사랑, 강마을, 신일, 고추말



공원내 대형수목을 전지하여 안전사고를 예방하고 나대지 피복 등 녹지를 정비하여 쾌적한 공원경관 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 다사랑어린이공원 외 9개소
- 규 모 : 수목(버즘나무) 가지치기 206주
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 3
- 총사업비 : 29백만원

□ 추진실적

- 2008. 1. 23 : 계획 수립
- 2008. 2. 12 : 공사착공
- 2008. 3. 04 : 공사준공 ※ 공정율 100%
- 실 적 : 버즘나무 206주 전지
 - 당산공원(2), 서강(17), 중앙(14), 양평(23), 문래(76),
다사랑(6), 원지(18), 두암(20), 신우(14), 동심공원(16)



Ⅲ. 주요업무 추진계획

1 꽃담 마을마당 토지보상(구비)

추진계획

- 위 치 : 영등포구 당산동5가 4-23
- 규 모 : 2,582.3m²
- 사업기간 : 2009. 1 ~12
- 총사업비 : 7,400백만원
- 연도별 추진실적 및 계획
 - 2005 : 2,388백만원, - 2006 : 1,500백만원
 - 2007 : 700백만원, - 2008 : 500백만원, - 2009 : 500백만원



2 가로수 유지관리 사업(구비)

추진계획

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 878백만원(시비 335백만원, 구비 543백만원)
- 2009. 1 ~ 3 : 가로수 가지치기
- 2009. 4 ~ 9 : 왕벚나무 수세회복, 가로수 생육환경 개선
- 2009. 9 ~ 12 : 가로수 보식 및 식재

3 마을단위 야외체육시설 설치(구비)

□ 추진계획

- 위치 : 대방천길 3개소(신길공원~신도림고가), 신길공원(신길동341-3)
- 면적 : 1,000m²
- 사업기간 : 2009. 2월 ~ 9월
 - 2009. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2009. 3 ~ 5 : 상반기 체육시설물 설치 시행
 - 2009. 6 ~ 7 : 현장조사 및 민원 요구사항 수렴
 - 2009. 8 ~ 9 : 하반기 체육시설물 설치 시행
- 총사업비 : 104백만원

4 신길근린공원 시설개선(구비)

□ 추진계획

- '09. 2 ~ 3. : 기본 및 실시설계
- '09. 3 : 공사발주 및 착공
- '09. 3~ 10 : 공사 및 준공
- 총사업비 : 618백만원



5 2009 어린이공원 현대화(시비,구비)

- 위치 : 영일공원(상상어린이공원)
- 면적 : 총5,413m²
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 5월
 - 2009. 1월 : 어린이공원 현대화(상상어린이공원) 공사 발주
 - 2009. 2 ~ 4 : 공사 착공 및 공사
 - 2009. 5월 : 공사 준공
- 총사업비 : 1,182백만원(시비 591, 구비 591)

6 2009년 공원시설물 정비(구비)

□ 세부 추진계획

- 위치 : 신우어린이공원 외 10개소
- 규모 : 노후시설물 교체 및 보수, 바닥포장, 체력단련시설 설치 등
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 8월
 - 2009. 1월 : 공원시설물 정비계획 수립
 - 2009. 2 ~ 4 : 실시설계 용역발주 및 시행 ※ 주민의견수렴
 - 2009. 5 ~ 8 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 362백만원



7 **공원 내 수목 가지치기 및 보식(구비)**

□ 세부 추진계획

- 위치 : 다사랑어린이 공원 외 3개소
- 규모 : 공원내 위험수목 전지 120주, 수목 4,000주 식재 및 지피류 3,000본 식재 등
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 5월
 - 2009. 1월 : 계획수립
 - 2009. 2 ~ 3 : 실시설계 용역 발주 및 시행
 - 2009. 3 ~ 5 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 46백만원

8 **경부 제3녹지 보상 및 녹지조성(시비)**

□ 추진계획

- 위치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 규모 : 7,912m²
- 총사업비 : 158억 (보상 및 녹지 조성)

(단위:백만원)

계	2007	2008	2009	비고
15,841	2,500	4,000	9,341	

- 2009. 1 ~ 12 : 투자사업 계획에 의거 보상 완료
- 2009. 3 ~ 6 : 기본 및 실시설계 용역
- 2009. 7 ~ 12 : 녹지조성(공사)



9 안양천 그린웨이 조성(시비)

□ 추진계획

- 위치 : 영등포구 안양천 일대(양화교 ~ 양평교) 제방법면
- 면적 : 6,300m²
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 12월
 - 2009. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2009. 2 ~ 5 : 기술용역심의, 실시설계 용역 발주 및 시행
 - 2009. 6 ~ 9 : 서울시설계심의 및 기술심의,계약심의
 - 2009. 9 ~ 12 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 1,460백만원

10 2009 아파트 열린녹지 조성(시비)

□ 추진계획

- 위 치 : 8개소-당산동(당산2가현대,현대3차), 양평동(삼성),
문래동(진주,두산두래,현대1차,현대2차), 대림동(현대3차)APT
- 규 모 : 녹지조성 27,601.8m²
- 사업기간 : 2009. 2 ~ 12
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 5,274백만원
- 2009. 2 : 2008 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
- 2009. 3 ~ 5 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2009. 9 ~ 12 : 공사시행

11 양평제1유수지 수생식물 보완식재(시비)

□ 추진계획

- 위치 : 영등포구 양평동 3가 57번지 일대(양평 제1유수지)
- 면적 : 30,200m²
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 11월
 - 2009. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2009. 2 ~ 5 : 실시설계 용역 발주 및 시행
 - 2009. 5 ~ 6 : 용역보고회 개최 ※ 주민의견수렴
 - 2009. 6 ~ 7 : 서울시설계심의 및 계약심사
 - 2009. 8 ~ 11 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 525백만원



12 문래근린공원 지하병커 재정비(구비)

□ 추진계획

- 위 치 : 영등포구 문래동3가 66번지일대
- 규 모 : 면적 839m²(17m×20m×2.47m)
- 사업기간 : 2009. 2 ~12.
- 총사업비 : 37백만원(구비)
- '09. 2 ~ 8. : 기본 및 실시설계
- '09. 9 ~11. : 공사 및 준공

13 | 공원내 우리 꽃·농작물 전시(구비)

추진계획

- 사업기간 : 2009. 4 ~ 10.
- 전시공원 : 당산공원, 문래공원, 신길공원
- 전시수량 : 계절별 각 공원당 300박스(완성품)
- 전시가능 품목 : 농작물(메밀 등), 향토작물(목화 등), 텃밭식물(수세미 등)
- 총사업비 : 58백만원(구비)
- '09. 3. : 사업계획 수립
- '09. 4. ~10. : 공원별 전시
 - 당산공원 : 농작물(보리, 메밀, 고추 등)
 - 문래공원 : 향토작물(목화), 수경식물 등
 - 신길공원 : 약용식물, 텃밭식물 등

14 | 안양천 인라인트랙 정비(구비)

추진계획

- 위치 : 안양천 둔치(문래2동 31(천) - 신정교 아래)
- 면적 : 4,233m²
- 사업기간 : 2009. 3월 ~ 6월
 - 2009. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2009. 2 ~ 3 : 실시설계 용역 발주 및 시행
 - 2009. 3 ~ 4 : 실시설계 계약 및 착수, 용역보고회 개최
 - 2009. 4 ~ 5 : 설계용역 준공 및 공사발주
 - 2009. 5 ~ 6 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 151백만원

15

생활권주변 자투리땅 녹화사업(구비)

□ 추진계획

- 위치 : 문리1동 54-2 등 5개소
- 면적 : 2,000m²
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 6월
 - 2009. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
 - 2009. 2 ~ 3 : 실시설계 용역 발주 및 시행
 - 2009. 3 ~ 4 : 실시설계 계약 및 착수, 용역보고회 개최
 - 2009. 4 ~ 5 : 설계용역 준공 및 공사발주
 - 2009. 5 ~ 6 : 공사시행 및 준공
- 총사업비 : 156백만원
