

제176회 구의회 제1차 정례회

행복중심 영등포

부과 Zero 청렴 UP

【국 별】

2013년 주요업무 보고



건 설 국

보고 순서


I . 일 반 현 황	1
II . 주요업무 추진실적	7

I. 일반 현황

1 인 력

구분	계	일반직						기능직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정원	189	1	6	27	39	42	11	5	15	35	8
현원	193	1	6	34	47	22	16	3	29	34	1
과부족	4	0	0	7	8	△20	5	△2	14	△1	△7

2 조 직

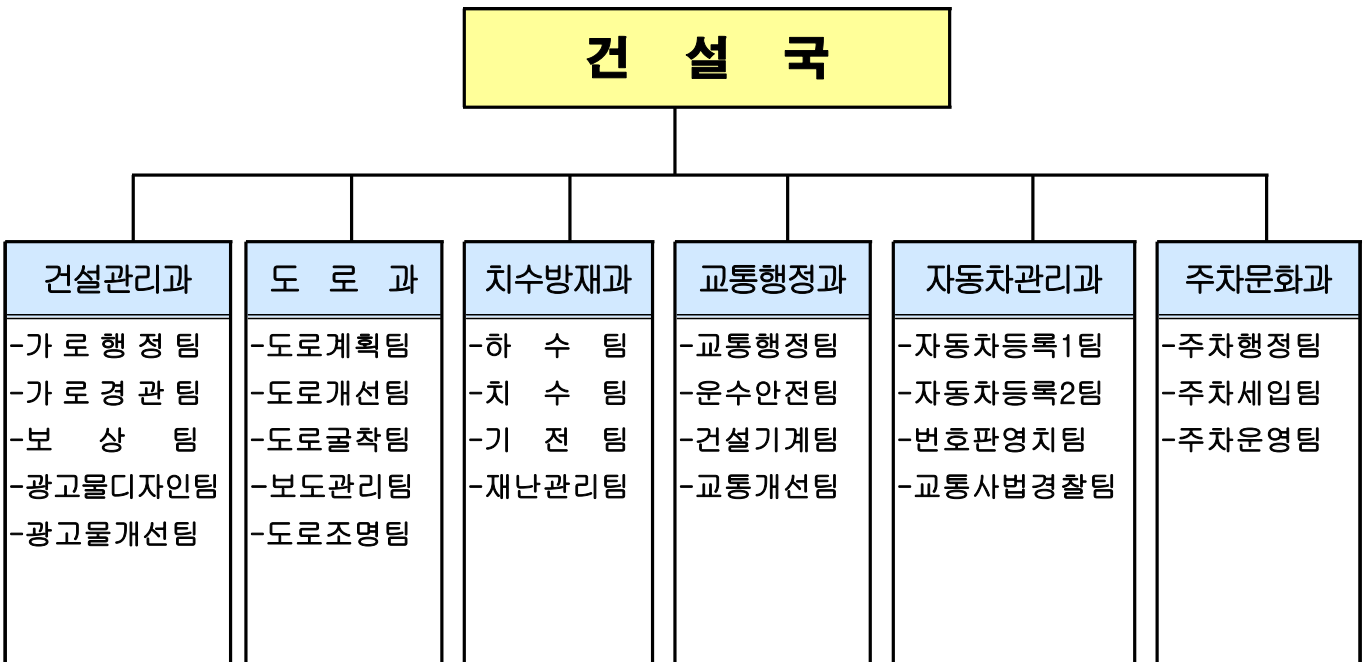

3

주요시설 및 장비

건설관리과

- 가로시설물 현황----- (건설관리과)
 - 가로판매대 80, 구두수선대 78, 노점상 단속초소 4개소

도 로 과

- 도로시설물 현황 ----- (도 로 과)
 - 도로(경인로 외 27개 노선)

연장 387km		도로율	포장을
시도76km	구도 311km	23.34% (서울시 : 22.24%)	100%

- 시설물 : 44개소 (교량14, 고가차도6, 보도육교6, 지하차도12, 지하보도1, 입체교차로5)
- 가로등 : 8,781등
- 보안등 : 9,707등

치수방재과

- 하수도시설 현황 -- ----- (치수방재과)
 - 하수관거 473km, 맨홀 8,921개소, 빗물받이 21,437개소, 횡단하수거 407개소
- 빗물펌프장 : 8개소 펌프 56대(영등포, 양평1·2, 문래, 도림2, 신길, 대림2·3)
- 간이펌프장 : 7개소, 펌프 16대
- 하천 현황 : 4개소, 17km (한강, 안양천, 도림천, 대방천)

교통행정과

- 자동차 운수사업체 현황----- (교통행정과)

계	마을버스	택시		화물		대여업	주선업
		법인	개인	법인	개별		
3,980	9개노선((5개)	12	1,476	171	2,178	11	127

자동차관리과

자동차 등록 -----(자동차관리과)

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	이륜자동차
154,311	105,721	7,189	23,501	541	17,359

주차문화과

주차장 현황 : 9,332개소, 135,208면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	9,332	69	18	42	9	81	28	2	51	9,182	1,613	1,640	2,897	3,032
면수	135,208	6,869	5,607	941	321	10,107	2,613	430	7,064	118,232	2,722	2,432	55,722	57,356

CCTV 현황 : 199대

○ 불법 주·정차 단속용 : 107대 ○ 그린파킹 감시용 : 92대

4 예산 현황

부서별 예산 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산액	집행액	집행율(%)
계	52,796,209	18,371,230	34.80
건설관리과	660,032	174,943	26.50
도로과	9,135,218	1,931,521	21.10
치수방재과	6,132,245	1,588,629	26.00
교통행정과	1,067,349	200,625	18.70
자동차관리과	338,695	147,810	43.64
주차문화과	35,462,670	14,327,702	40.40

□ 주요 사업예산 현황

(단위 : 천원)

주요 사업	예산액	집행액	집행율(%)
계	34,909,682	7,201,516	20.6
1. 노점 및 노상적치물 등 정비	345,726	105,634	30.5
2. 대림로 간판이 아름다운 거리 조성사업	940,000	0	0
3. 도림로 확장공사	3,140,000	4,599	0.01
4. 여의도 고등학교 방음벽 교체공사	429,000	0	0
5. 양평동3가 서부간선도로 경계옹벽 개선공사	351,000	19,118	5
6. 영등포본동 602번지 옹벽개선공사	350,000	13,442	3
7. 여의도 광장APT사이 가로등 설치공사	140,000	0	0
8. 관내 LED 보안등 설치공사	460,000	0	0
9. 도림1배수분구 하수관거 종합정비	6,000,000	1,118,000	18.6
10. 문래동 55~44간 사각형거 기능개선 공사	1,610,000	43,359	2.7
11. 가마산로 하수관 개량공사	1,160,000	1,046,988	90
12. 신길동 449번지 주변외 3개소 하수관 개량공사	921,760	74,850	8.0
13. 어린이 교통안전 체험장 조성	309,000	0	0
14. 경부선(국철1호) 지하화 추진사업	88,000	525	5.8
15. 과태료 체납자 번호판 영치	132,128	64,252	48.63
16. 공영주차장 확충사업 추진	11,693,068	4,710,749	40.3
17. 불법 주정차 무인단속시스템 성능개선 사업	840,000	0	0
18. 경부제3녹지 지하주차장 건설	6,000,000	0	0

목 차

〈2013년도 주요업무 추진실적〉

1. 노점 및 노상적치물 등 정비 7
2. 옥외광고물 정비 및 수준향상 8
3. 대림로 간판이 아름다운 거리 조성사업 9
4. 도림로 확장공사 10
5. 여의도 고등학교 방음벽 교체공사 12
6. 양평동3가 서부간선도로 경계옹벽 개선공사 13
7. 영등포본동 602번지 옹벽개선공사 14
8. 여의도 광장APT사이 가로등 설치공사 15
9. 관내 LED 보안등 설치공사 16
10. 수방대책 추진 17
11. 도림1배수분구 하수관거 종합정비 19
12. 문래동 55~44간 사각형거 기능개선 공사 20
13. 가마산로 하수관 개량공사 21
14. 신길동 449번지 주변외 3개소 하수관 개량공사 22
15. 양평1유수지 악취저감을 위한 저류조 설치 계획 23

16. 교통유발부담금 및 기업체 교통수요 관리	24
17. 어린이 교통안전 체험장 조성	26
18. 경부선(국철 1호) 지하화 추진사업	27
19. 의무보험 미가입 운행 차량 조치	28
20. 과태료 체납자 번호판 영치	29
21. 공영주차장 확충사업 추진	30
22. 불법 주정차 무인단속시스템 성능개선 사업	31
23. 경부제3녹지 지하주차장 건설	32

II. 주요 업무추진 실적

1 노점 및 노상적치물 등 정비

건설관리과

도로상 불법 노점상 및 노상 적치물의 효율적인 정비로 도로기능 회복 및 도로 보행권 확보로 쾌적하고 편리한 가로환경을 조성코자 함

□ 추진방향

- 노점상에 대한 정비 방법을 세분화하고 선별적·탄력적으로 정비
- 도로변 점포의 무단 점유행위 집중 제도·단속
- 반복·상습적 위반 행위자에 대한 과태료 부과 등 행정 조치

□ 추진실적

- 가로정비 단속 실적
 - 과태료 및 변상금 부과 : 36건 / 12,859천원
 - 노점 및 노상적치물 단속 : 9,581건
 - 강제수거 : 475건 / 이동조치 : 9,106건
- 가로정비 단속업무 추진 현황
 - 공휴일·야간 등 근무시간 외 노점상 특별 정비 : 21회
 - 영일(마늘)시장 특별 정비 : 5. 27 ~ 6. 28
 - 제9회 한강 여의도 봄꽃축제 가로정비 : 4. 11 ~ 4. 21
 - 영등포역 주변 포장마차 주류판매 단속 : 3. 26 ~ 4. 30
 - 시흥대로 노점상 일제 정비 : 3. 5 ~ 3. 15
 - 신학기 학교주변 노점상 및 노상적치물 정비 : 2. 25 ~ 3. 8
- 보도상 영업시설물 관리
 - 도로점용료 부과 : 158건, 34,745천원
 - 시설대부료 부과 : 156건, 80,586천원

□ 향후 추진계획

- 대형·기업형 포장마차 집중 단속 및 대집행
- 반복·상습적 불법행위 지역은 가로정비 용역 인력 고정배치 및 순찰을 강화하여 불법노점 행위 사전 차단

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
345,726	105,634	30.5%

2 옥외광고물 정비 및 수준향상

건설관리과

옥외광고물 정비와 지속적인 관리 등을 통하여 경관이 아름다운 도시 이미지를 창출하고 불법광고물 신규 발생을 억제하고자 함

사업목표 (단위 : 건)

구 분	정비물량	정비대상	비고
고정 광고물	2,000	무허가·신고, 표시위반 광고물	
유동 광고물	12,000	불법현수막, 벽보, 에어라이트 등	

추진방향

- 사전에 충분한 안내 홍보로 자율정비 유도
- 『불법광고물이 없는 거리』 조성
- 불법광고물 단속 및 사후 관리 체계 강화

추진실적 (2013. 5월말 기준)

- 불법광고물 정비실적 : 10,929건
 - 가로형간판 등(83건), 현수막(10,226건), 입간판(290건), 에어라이트(140건), 전단지·벽보 등(190건)
- 공공근로자 활용 불법첨지류(전단지·벽보 등) 정비실적 : 56,591건

향후 추진계획

- 취약시간대(야간, 주말) 불법광고물 특별정비
- 불법광고물 제거 용역 및 사설안내표지판 정비
- 학교주변 청소년 유해광고물 등 집중 정비로 청소년 보호 예방
- 불법광고물 및 광고주에 대한 행정처분 확행으로 불법 행위 근절

기대효과

- 쾌적한 생활환경 조성과 아름다운 도시 이미지 창출
- 도시미관 수준 향상과 불법광고물 신규 발생 억제

소요예산 (단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
23,226	6,453	27.8%

사람 중심의 쾌적하고 아름다운 거리를 조성하고자 무질서하게 난립되어 있는 불법 광고물을 일제 정비하고, 작고 아름답게 디자인된 광고물로 교체 설치함으로써 가로경관을 개선해 나가는데 만전을 기하기 위함.

사업목표

- 노후되고 무질서한 간판을 아름다운 간판으로 교체함으로써 아름다운 도시경관을 조성
- 기존 형광등이나 네온간판을 LED 간판으로 교체함으로써 80% 이상의 에너지 절감

추진방향

- 주민협의회를 구성하여 사업의 민주성과 객관성 제고
- 간판 디자인 등의 주민의견 수렴을 통한 창의적이고 아름다운 거리 조성

추진실적

- 2013. 2 : 간판이 아름다운 거리 기본계획 수립
- 2013. 5 : 정비시범구역 고시 및 주민협의회 구성
- 2013. 5 : 주민의견 수렴 및 착공

향후 추진계획

- 2013. 8 : 사업 완료

기대효과

- 개선대상 거리의 환경개선 및 가로변 도시미관 제고

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
940,000 (국 470,000, 시 282,0000, 구비188,000)	-	0%

신길재정비 촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기 미집행 도로사업 시행으로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길5동 421-16
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기 개설 350, 미 개설 800)
 - ┌ 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비 촉진지구 내)
 - └ 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2014년
- 총사업비 : 44,550백만원(보상비 39,700 공사비 4,700 설계비 150)
 - 특별회계 : 15,350백만원(보상비 13,700 공사비 1,500 설계비 150)
 - 일반회계 : 29,200백만원(보상비 26,000 공사비 3,200)

□ 추진실적

- 특별회계
 - 4월~5월 : 공사시행(도로확장 폭 12.5→17.5m 연장 500m)
 - ┌ 1차구간 : 130m 경계석 및 측구 설치, 보도 조성
 - └ 2차구간 : 저축건물 5개동 철거
- 일반회계
 - 3월 28일 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가고시(L=120m)
 - 4월 ~ 5월 : 보상계획 열람공고

□ 향후 추진계획


- 특별회계
 - 2014년 4월 : 공사준공 예정
- 일반회계
 - 6월~12월 : 감정평가 실시 후 보상협의

□ 연차별 사업계획(시비)

(단위:백만원)

구분		계	기투자	2012	2013	2014	장래
추진내용	특별회계	보상	13,700	13,700			
		공사	1,500		660	840	
		용역	150	150			
	일반회계	보상	26,000	13,000	100	2,300	10,600
		공사	3,200	1,200			2,000
총사업비		44,550	28,050	760	3,140	14,600	

□ 위치도

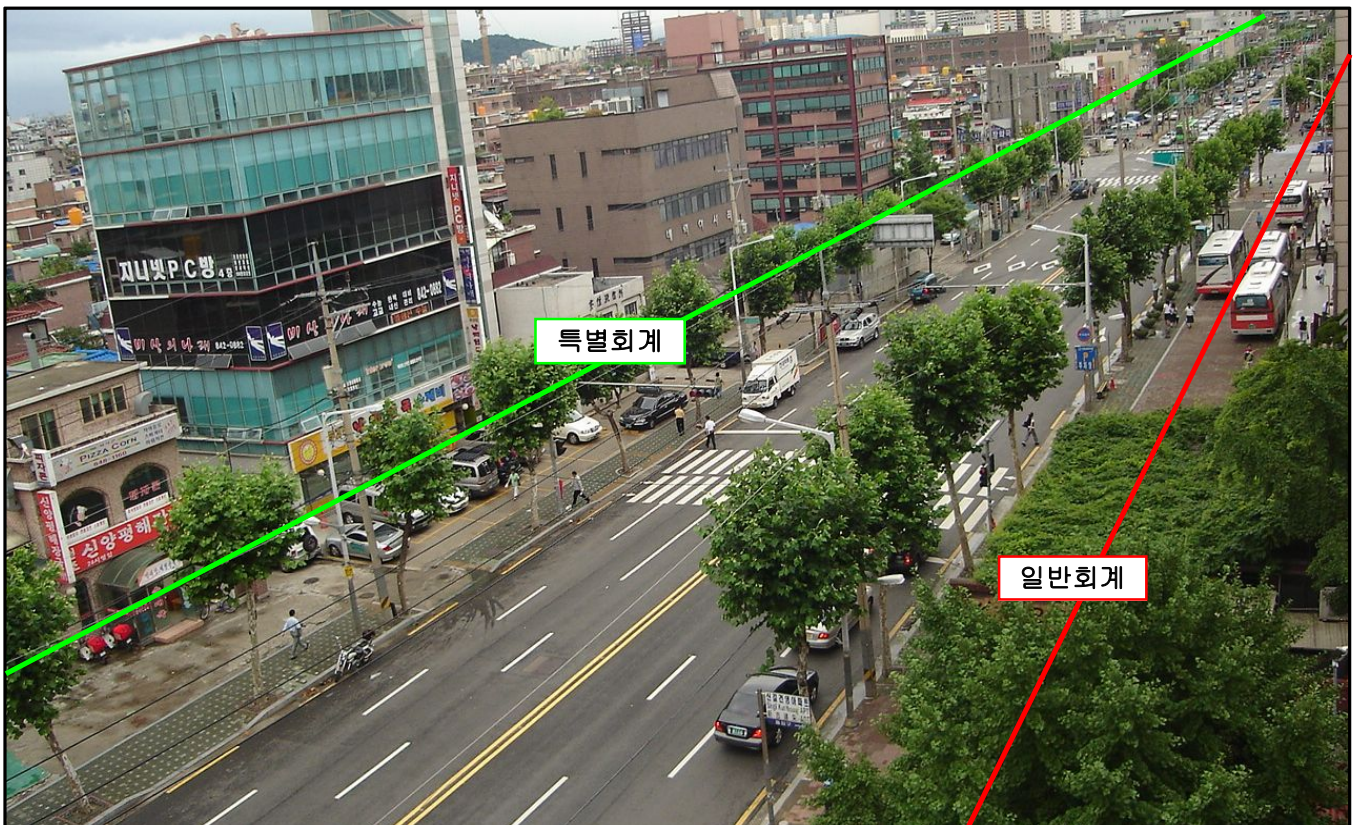

여의도동 여의도고등학교 앞 주변에 설치된 노후되고 소음 저감 효과가 떨어진 기존 방음벽을 도시미관과 주위환경에 어울리는 방음 효과가 우수한 신제품으로 교체해 학생들의 면학분위기 조성 및 도시미관 향상에 기여하고자 함

사업개요

- 추진기간 : 2013. 5월 ~ 11월
- 위 치 : 여의도동 30-1 여의도고등학교 앞
- 사업규모 : 방음벽 교체(H= 4.5m ⇒ 5m, L= 156m)

추진실적

- '13. 5월 실시설계

향후 추진계획

- '13. 6월 : 공사발주
- '13. 7월 : 공사착공
- '13. 11월 : 공사준공

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
429,000 (시비)	-	0%

양평동3가 서부간선도로경계 선유서로35길 주택가 이면도로변 옹벽이 노후되어 안전사고의 위험이 있으며 도시미관을 저해하고 있어 이로인한 주민불편사항을 해소하고 쾌적한 주거환경 및 도시미관 향상에 기여코자 함

사업개요

- 추진기간 : 2012. 12월 ~ 2013. 12월
- 위 치 : 양평동3가 선유서로35길 9~129
- 사업규모 : - 옹벽설치 H=2.6m, L=123m
 - 아스팔트 포장 : A=2.1@

추진실적

- '12. 11월 : 실시설계
- '12. 12월 : 공사발주
- '13. 5월 : 공사착공(공정률 : 60%)

향후 추진계획

- '13. 7월 : 공사준공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
351,000 (시비)	19,118	5%

영등포본동 영등포구 영신로 14 ~ 6간 노후옹벽에 대한 안전사고 발생우려 및 도시미관저해로 재보수하여 민원을 해소하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

사업개요

- 추진기간 : 2013. 3월 ~ 9월
- 위 치 : 영등포본동 영신로 14 ~ 6간
- 사업규모 : - 난간 교체 및 신설 L=188m
 - 보도신설 A=210m²
 - 옹벽상부 아스팔트 포장 : A=4@
 - 옹벽외벽 목재루버 설치 A=231m²

추진실적

- '13. 5 ~ 6월 : 실시설계 및 공사발주

향후 추진계획

- '13. 6월 : 공사착공
- '13. 9월 : 공사준공

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
350,000 (시비)	13,442	3%

가로등이 한쪽배열로만 설치되어 있어 보도가 어두운 여의도 광장아파트 외 1개소에 보행가로등을 설치하여 야간 도로이용자 편의를 제공하기 위함

□ 추진 방향

- 가로등이 한쪽 배열로 설치되어 야간 통행 불편 해소
- 전력소모가 작고 연색성이 우수한 LED 50W 보행등 22등 설치로 에너지 절약실천

□ 추진실적

- '13. 5월 : 공사 설계물량조사 및 설계완료

□ 향후 추진계획

- '13. 6월 : 빛 공해 방지 심의 완료 및 공사 착공 실시
- '13. 10월 : 공사 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
140,000	-	0%

□ 위치도



국가에서 추진 중인 지역 에너지절약사업 및 빛 공해 방지사업 일환으로 관내 노후 NH 100W보안등을 LED 50W 보안등으로 교체 설치하여 전기 에너지 절약에 적극 동참하고 예산 절감에 이바지하고자 함

추진방향

- 노후 보안등 우선하여 LED보안등으로 교체 설치 추진
- 빛 공해 발생 지역 LED보안등 적용 추진
- NH 100W를 LED 50W 보안등으로 교체하여 에너지 절약 및 예산절감

추진실적

- '13. 4월 : 영등포구 LED보안등 보급기준 제정, 계약심사
- '13. 5월 : 공사발주(양평2동 - 시비 260,000천원)
- '13. 6월 : 빛 공해 방지 심의, 공사 시행

향후 추진계획

- '13. 6월~12월 : 공사 발주 및 준공(영등포본동, 도림동)
(2013년 시비 100,000천원, 구비 100,000천원)

기대 효과

- 빛 공해 민원 해소 및 에너지절약 공공요금 절감과 원전 하나 줄이기 정책에 부합 기대

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
460,000 (시 360,000, 구 100,000)	-	0%

금년 풍수해 대책은 기상이변에 따른 집중강우에 대응하여 사전준비 점검·정비하고 풍수해 대책본부 운영을 철저히 하여 단 한건의 침수 피해도 없도록 『큰 비에도 주민이 안심할수 있는 영등포 구현』에 이바지 하고자 함.

□ 풍수해 대책기간 : 2013. 5. 15 ~ 10.15(5개월간)

- 재난안전대책(풍수해)본부 상황실 구축 운영(본부장-구청장)
 - 조직구성 : 구청 - 8개반 80명
 - 동주민센터 - 3개반 15명(18개동)

□ 현 황

- 금년 여름철 기상전망
 - 강수량은 평년(501~940mm) 보다 많고, 대기불안정에 의한 많은 비가 내릴 때가 있겠고, 지역적인 편차가 크겠음.
- 수방시설 현황
 - 빗물펌프장 : 15개소(간이펌프장 7개소 포함), 수문 : 21개소(57문)
 - 하수시설 : 473.220km/ 빗물받이 21,437개소
 - 하천제방 : 11.44km(안양천,도림천,대방천)

□ 추진방향

- 수방시설물의 기능 유지관리 및 점검·정비 신속 추진
- 수해취약지역 및 시설물에 대한 순찰·점검 강화
- 침수취약가구 돌봄서비스 강화
- 수방대비 물자 비축 및 수해예방 홍보 강화

□ 세부 추진 내용

1. 수방대비 순찰 - 점검·정비추진 : 3.15 ~ 5.14.(2개월간)
 - 재해취약시설분야 : 1,2차 점검 완료

- 대형 및 일반공사장, 도로시설물(옹벽, 축대, 지하차도), 옥외광고물, 하천 등
(대상부서 - 건축과, 주택과, 도시계획과, 도로과, 건설관리과, 치수방재과)
- 점검결과 특이사항 없음
- 하수분야
 - 노후불량 하수관 정비공사(3건) : 6월말 완공목표 추진
 - 하수관 및 빗물받이 준설 등 유지관리공사(4건) : 수해취약지역 완료
(대림동, 신길동, 양평동 조기 추진 - 6월말 완료)
- 치수분야
 - 안양천, 도림천, 대방천 순찰·점검 - 특이사항 없음
 - 수방시설(유수지, 저류조)순찰·점검 - 특이사항 없음
 - 대림동 저지대지역 차수관 및 역지변 설치사업 추진
(물막이판 45m, 역지변 712개)
- 기전분야 - 빗물펌프장(8개소), 수문시설(21개소), 간이펌프장(7개소)
 - 기계분야 : 모터펌프, 제진기, 크레인, 수문, 양수기 정비 및 시운전 완료
 - 전기분야 : 수배전반, CCTV, 수위계 정비 및 시운전 완료
- 기 타
 - 풍수해 예방을 위한 안전관리 예방활동 홍보 3~5월 5회 실시
 - 풍수해 대책 관계자 및 공무원 돌봄서비스 담당자 집합교육 시행(5.13)
 - 가정하수관 진동청소기 동 주민센터(대림2) 배치 주민 무료 대여 시행
 - 지하주택 통,반장, 건축공사장, 자율방재단 비상연락망 구축 완료
 - 침수취약가구 공무원 돌봄서비스 점검 시행

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
147,050	48,887	33%

도림1배수분구의 노후 및 불량하수관거를 개량하는 등, 종합계획에 의한 정비를 함으로써 통수능 확보와 수해 예방 및 효율적인 하수처리로 수질 개선에 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 대림1,2,3동 전체
- 사업규모
 - 하수관 신설·개량 : D300~D1500mm, L=9.28km
 - 하수암거 신설 : ■1.5×1.0m~■2.0×2.0m, L=1.45km
 - 강관압입 추진 : D1800mm, L=0.67km
 - 하수암거 보수·보강 : ■1.0×1.0m~■2.4×2.4m, L=3.2km
- 사업비 : 6,000백만원(서울시 하수도사업 특별회계)
- 사업기간 : 2013.3 ~ 2013. 8. 8

□ 추진실적

- 1,2구역 공사시행(2010. 8. ~ 2013. 8. 8)
 - 하수관 신설·개량 : D300~D1500mm, L=11.45km
 - 하수암거(강관추진) 신설 : ■1.5×1.5m~■2.0×2.0m, L=1.99km
 - 하수암거 보수·보강 : ■1.0×1.0m~■2.4×2.4m, L=3.2km

□ 향후 추진계획

- 2013년 1,2구역 준공예정(2013. 8. 8)
- 잔여구역(3~7구역) 예산 확보후 공사 발주하여 계속사업으로 추진

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
6,000,000 (시비)	1,118,000 (시비)	18.6%

하수암거 노후 및 구배불량으로 인한 유수정체 구간을 정비하여 기능향상 및 악취제거

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동3가 55-16 ~ 문래동6가 44번지
- 규 모
 - 하수암거 구배조정 및 단면보수 : 2[■]3.0×2.0m, L=1,390m
 - 하수관 신설 : D450^{mm}, L=500m
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2013. 11.
- 총사업비 : 1,610,000천원(시비)

□ 추진실적

- 2013. 2. 20. ~ 5. 10. : 실시설계용역 시행
- 2013. 6. 10. : 공사계약심사 결과 통보(서울시 → 영등포구)
- 2013. 6. 19. : 예산 재배정

□ 향후 추진계획

- 2013. 6. : 공사발주
- 2013. 12. : 공사준공

□ 기대효과

- 노후 및 구배불량인 사각형거 기능개선으로 하수소통 원활 및 악취로 인한 민원 해소

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,610,000 (시비)	43,359	2.7%

본 사업은 집중호우 시 도로상 노면수처리 불량지역인 가마산길의 노후되고 불량한 하수관을 정비하여 도로침수를 방지하고, 이면도로 하수관을 확대 개량하여 하수소통을 원활토록 하여 주민불편해소 및 수해예방에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 가마산로(신길4동 235번지 ~ 신길4동 245-35번지)
- 규 모 : 하수관 신설 및 개량
 - 2012년 1차분 : D800~1200mm, L=192m
 - 2013년 2차분 : D600~800mm, L=299m
- 공사기간 : 2012. 5. 8 ~ 2013. 5. 31
- 총사업비 : 1,160,000천원(시비) - 2013년 660,000천원

□ 추진실적

- 2012. 05.08 : 계약
- 2012. 05.09 : 착공
- 2012. 11.20 : 1차 준공(D800~D1000mm, L=192m)
- 2013. 02.22 : 2차분 계약 및 착공
- 2013. 06.11 : 2차 준공(D450~D1000mm, L=594m)

□ 기대효과

- 노후 및 구매불량인 하수관을 교체하여 우천시 지역침수 예방

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,160,000 (시비)	1,046,988	90%

2010~11년 집중호우시 배수불량으로 인한 도로 침수 구간에 대하여 하수관을 확대·개량하여 하수소통을 원활히 하고 침수를 예방하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 449번지 주변외 3개소
- 규 모 : 하수관 개량 D600~1,350mm, L=529m
- 공사기간 : 2013. 4. 18 ~ 10. 14
- 계약금액 : 839백만원(시비)
- ※ 총사업비(예산) : 921백만원(시비)
(도급비:617백만원, 관급자재비:195백만원, 이전비:109백만원)

□ 추진실적

- 2013. 3. 21 : 공사발주
- 2013. 4. 17 : 공사계약
- 2013. 4. 18 : 공사착공
- 2013. 6. 12 현재 : 총 529m중 340m 완료, 공정율 64%

□ 향후 추진계획

- 2013. 6. 30 : 공사완료(예정)

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
921,760 (시비)	74,850	8%

※ 2013년 7월 : 공사준공 후 사업비 집행 예정

양평1유수지 저류조 설치계획이 '16~'19년으로(2단계) 계획되어 있는 사항에 대하여, 현장시장실 운영시 주민들의 건의로 공사시기를 3년 단축하여 2015년 착공하여 2016년 준공하고자 함.

□ 추진배경

- 잔류수 악취로 인한 인근주민들(1,200세대, 3,500명 상당)의 끊임없는 민원발생
- 악취제거 시설과 함께 상부에 친환경 공간조성으로 기피시설 인식 전환과 삶의 질 향상 기대.

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동3가 57외 1(양평1 빗물펌프장 유수지)
- 규 모 : 저류조 시설용량 46,000 m^3
- 기 간 : 2016. ~ 2019.
- 총 사업비 : 245억원(시비)

□ 추진실적

- 2013. 3. ~ 5 : 양평1유수지 악취발생에 따른 조사
- 2013.6.10 : 서울시장 현장시장실 방문 검토
⇒ 당초 2019년 준공 예정인 사업시기를 3년단축
▶ 올해 타당성 조사, '14년 설계, 15년 착공, '16년 준공

□ 향후 추진계획

- '14. 4 ~ '14.12. : 기본 및 실시설계
- '15. 2. ~ '16.12. : 공사시행 및 준공
- '15년 : 저류조 설치와 병행하여 주민친화 체육공원 조성관련 사업비 확보
- 예상 사업비 : 31.6억원(시, 구비 각 15.8억원).

교통 혼잡을 유발하는 시설물의 소유자에게 교통유발부담금을 부과하여 대중교통육성 및 도시교통개선을 위한 투자재원을 확보하고, 기업체의 자율적인 교통량 감축 프로그램 이행시 교통유발부담금 감면 등을 통해 대중교통 이용 활성화 도모

□ 추진방향

- 교통유발부담금 부과 및 징수
 - 과년도 체납분에 대한 집중 납부 독려
 - 교통유발부담금 부과·징수를 위한 철저한 시설물 현장조사 및 자료정비
 - 교통유발부담금 미사용신고 접수 및 신속한 감면결정
- 기업체 교통수요관리
 - 공공기관 및 기업체 교통수요관리 프로그램 100% 참여 권장
 - 수요관리제도 적극 홍보 및 지속적인 이행 독려

□ 추진실적

- 교통유발부담금 과년도 체납분 징수 : 175건, 49백만원
- 교통유발부담금 과년도 체납분 결손처리 : 83건, 56백만원
- 교통유발부담금 부과자료 정비
 - 신·증축 건물 및 소유권 이전 자료 입력 및 체납자의 주소 정리
- 과년도 체납에 대한 압류 : 590백만원 (체납대비 압류율 94%)
- 기업체교통수요관리 일반시설물 181개, 대형시설물 88개 참여
 - 경감프로그램 신청업체 이행점검 2회(분기별 1회) 실시
- 기업체교통수요관리 홍보
 - 홈페이지, 소식지, 전광판, IPTV 등을 활용한 홍보활동
 - 2013년 대형시설물 중점관리계획 수립
 - 대중교통이용 활성화 캠페인 1회 실시(2013년 영등포어린이축제)
: 현수막 및 홍보물(물티슈 3,000개) 제작·배포

□ **향후 추진계획**

○ **교통유발부담금 부과 및 징수**

- 과년도 체납 정리계획 수립, 압류 및 체납고지서 반복발송 등 징수강화
- 현년도 교통유발부담금 부과·징수
 - 6월 ~ 7월경(4주) : 교통유발부담금 부과시설물 전수조사
 - 8월 : 시설물 소유자에게 미사용 신고 안내문 송부 및 우편·팩스 등을 통한 접수, 변동전산자료 입력
 - 9월 : 교통유발부담금 경감심의위원회 운영 및 경감률 결정
 - 10월 : 교통유발부담금 부과 및 고지서 발송, 징수

○ **기업체 교통수요관리**

- 기업체 교통수요관리 참여 시설물수 총 8개 이상 증대
- 수요관리제도에 대한 홍보활동 강화, 간담회 개최 등 기업체와 공감대 형성
- 교통량 감축활동 이행점검 강화로 제도의 실효성 확보

□ **소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
99,188	14,385	14.5%

어린이들의 교통안전의식을 고취시켜 올바른 교통문화를 정착하고 교통 사고를 예방하기 위한 안전교육장으로 활용할 수 있는 어린이 교통안전 체험장을 조성하고자 함

추진방향

- 안양천내 어린이 교통안전체험장 조성 부지 확보 및 체험장 설치

추진실적

- '12.05.14 : 안양천 신정교하부 어린이 교통안전체험장 계획(구청장)
- '12.07.27 ~ 9.24 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- '12.09.20 : 서울지방국토관리청 하천점용허가 신청
- '12.12.26 : 서울지방국토관리청 하천점용허가 불가 통보
- '13.04.04 : 어린이교통안전체험장 조성을 위한 안양천 하천점용허가신청
- '13.06.10 : 어린이교통안전체험장 조성을 위한 안양천 하천점용 변경허가 신청

향후 추진계획

- 6월 : 어린이 교통안전체험장 조성을 위한 안양천 하천점용허가(변경)신청
- 6월 ~ 9월 : 어린이 교통안전체험장 공사 추진

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
309,000 (시비 150,000, 구비 159,000)	-	0%

경부선으로 인해 단절된 교통과 지역발전의 문제점을 극복하고자 동일 상황에 처한 7개 지방자치단체가 협약을 체결하여 경부선 지하화 사업이 중앙정부의 국책사업으로 추진될 수 있도록 공동 용역수행 등의 노력을 함께 추진함

□ 추진방향

- 7개 지자체 공동 연구 용역 추진으로 타당성을 검토하여 향후 국책사업으로 추진될 수 있는 근거 마련

□ 추진실적

- '12.05.03 : 공동협약식 개최
 - '12.10.31 : 서명운동 추진 (영등포구 122,125명, 총 1,027,278명)
 - '12.12.20 : 경부선(국철1호) 지하화 추진협의회 구성 (고시일자)
 - '13.04.24 : 경부선(서울역~당정역)지하화 기본구상용역 시행계획 수립
 - '13. 5.28 : 경부선 국철지하화 기본구상 용역 시행
 - 용역기간 : '13. 5.30 ~ '14. 5.29
 - 계약금액 : 74,730천원
- ※ 총 7개 지자체 공동 용역금액 705,000천원중 우리구 분담액 74,730천원

□ 향후 추진계획

- 6.26 : 경부선(서울역~당정역)지하화 기본구상용역 착수보고회 개최

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
88,000	525	5.8%

자동차손해배상보장법 제8조(운행의 금지)를 위반한 자를 처벌하여 무보험운행을 예방하고 사고 시 피해자를 보호함으로써 자동차 운전자의 준법정신 고취 및 건전한 자동차 문화를 정착시키고자 함

사업개요

- 추진기간 : 2013. 1. 1 ~ 12.31
- 추진방향
 - 공소시효 만료전 사건처리로 모든 범법자에 대한 법앞의 평등 실현
 - 사건접수후 신속 처리하여 시간경과에 따른 수사의 어려움 완화 노력
- 추진절차
 - 사건접수 → 출석요구 → 신문조사 → 법칙금부과, 이첩, 검찰송치

추진실적

(단위:대수)

접 수			검찰 송치					타기관 이첩 등	수납	진행중
계	과년도 이월	현년도 접수	소계	기소	혐의 없음	기소 중지	공소권 없음			
2,512	2,160	352	170	31	24	102	13	252	54	2,036

향후 추진계획

- 공소시효 도래사건 우선 처리
 - 2009년 발생사건(2014년 공소시효 만료) : 268대
- 2010년, 2011년 접수분 처리
 - 출석요구서 통지 누락건 발취 통지로 추후 사건처리시 행정절차 요건 구비

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
4,800	-	0%

자동차관련 과태료 상습 체납자의 자동차 번호판 영치를 통해 자동차관련 과태료 체납 징수율을 제고하는 한편 의무보험 미가입 및 검사 미필 차량의 운행을 제한함으로써 시민의 안전을 도모하고자 함.

□ 사업목표

- 자동차 관련 과태료 체납자의 질서위반행위 근절
- 과태료 상습 체납자 엄중 관리

□ 추진방법

- 번호판 영치 대상 차량 선정을 통한 사전 안내문 발송
- 3인 1개조 편성 현장 단속을 통한 체납 차량 운행 제한
- 영치차량의 번호판 관리 및 과태료 징수

□ 영치대상 차량

- 과태료 합계액 30만원 대상으로 60일 이상 체납 차량
- 자동차의무보험 미가입 자동차, 자동차 정기검사 또는 종합검사 미필 자동차

□ 추진실적

- “자동차번호판 영치 사전안내서” 우편 송달 : 2013. 3.28
- 3,748건 3,844천원

- 자동차 번호판 영치 및 징수 실적

(단위:대/천원)

대상 건수	영치 건수	총 징수금액	과태료 징수 내역	
			우리구 소관	타지역 소관
3,748	72	24,111	26/11,084	46/13,027

□ 향후 추진계획

- 번호판 영치 대상 차량 재선정 및 사전 안내문 발송
- 자동차 관련 과태료 체납차량 번호판 영치 지속 추진

□ 기대효과

- 번호판 영치에 따른 대포차 운행 제한으로 시민의 안전 도모
- 체납과태료 징수로 세수 확보

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
132,128	64,252	48.63%

주차난이 심각한 주택가 밀집지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장을 건설하여 골목길의 주차난을 해소하고 이면도로 통행권을 확보하여 지역주민들의 생활 편의를 증진 하고자 함

□ 추진방향

- 주차환경이 열악한 도림, 영등포본동, 신길동 일대 주차장 건설부지 확보
- 주차장(거주자, 노상)설치 가능한 도로에 대한 조사로 주차 공간 확보
- 부설주차장 야간개방, 자투리땅 활용, 주차환경개선지구 추가지정 등 다양한 홍보로 주차장 부지 확보

□ 추진실적

- 신길5동 공영주차장 건설 : 1개소 27면
- 이룬자동차 전용주차장 건설 : 2개소(영등포역, 당산역)
- 경부제3녹지 지하공영주차장 건설 서울시 투자심사 통과 : 5.29

□ 향후 추진계획

- 경부제3녹지 지하공영주차장건설 실시설계 용역 시행 : 7월 ~ 11월
- 주차장 (거주자우선주차, 노외, 노상)부지 확보 : 연중
- 주차환경개선지구 추가 지정 : 9월 ~ 10월
- 부설주차장 야간개방 추진 : 5개소 100면
- 자투리땅활용 주차장 설치 : 연중

□ 기대효과

- 주차환경이 열악한 지역 주차시설 확충으로 주차난 해소에 기여
- 주택 밀집 지역 내 주차장 건설부지 확보로 주민편의 증진

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
11,693,068	4,710,749	40.3

내구연한이 도래된 무인단속시스템을 자동방식으로 성능을 개선하여 현장상황에 적합한 고화질 동영상 송신을 구현, 범죄 취약지역으로 부터 구민의 안전과 보행인들이 안전하게 생활할 수 있도록 효율적인 단속업무를 수행하고자 함

□ 추진방향

- 24시간 무인단속을 실시하여 불법주정차 단속 및 범죄예방 활동 강화
- 어린이보호구역내 불법주정차 차량으로 교통사고뿐만 아니라 각종사고가 빈번하여 시스템 성능개선 필요

□ 추진실적

- 불법주정차 무인단속 CCTV시스템 성능개선 추진계획 : 5. 1
- 무인단속 CCTV성능개선 조달청 발주의뢰 : 5. 6
- 구매협의를(안) 검토결과 제출(조달청) : 5.30
- 계약방법 결정 및 구매추진안내 (조달청- 일반/협상) : 6. 4

□ 향후 추진계획

- 사업기간 : 6월 ~ 8월
- 대 상 : 30대 ('07년 노후 반자동 CCTV시스템)
- 성능개선 내용
 - 반자동 무인단속시스템에서 무인자동단속(방법겸용)시스템으로 개선
 - 카메라 41만 화소 ⇒ 130만 화소로 교체
 - 영상저장장치 스토리지 증설 (100TERA)

□ 기대효과

- 도로 기능을 유지하고 주민의 편의를 도모하는 등 올바른 주차의식 고취
- 시민이 자발적으로 참여하는 올바른 주차질서의식 공감대 형성

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
840,000(구비)	-	0%

경부제3녹지 지하에 공영주차장을 건설하여 주택가 주차난 해소 및 지하철 1호선 대방역 이용객들이 환승주차장으로 이용토록 함으로써 토지 이용의 효율성을 높이고 이면도로 통행권 확보 및 소방도로의 기능 유지로 지역주민들의 생활 편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 주차장 규모 : 지하 2층 자주식, 121면
- 건축면적 : 2,352 m^2 (연면적 4,704 m^2)
- 녹지면적 : 7,912 m^2
- 대지지목 : 녹지

□ 추진실적

- 경부제3녹지 지하주차장 건설계획 구청장 방침 : 4. 4
- 서울시 공공투자관리센터 및 재정담당관실 현장 실사 : 4.22 ~ 24
- 서울시 투자심사 완료 : 5.29
- 실시설계 용역계획 수립 : 6월 이후

□ 향후 추진계획

- '13. 7월 : 실시설계 용역 발주
- '13. 11월 : 실시설계 용역 준공
- '13. 12월 : 공사발주
- '14. 12월 : 공사 준공(예정)

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
6,000,000 (시비 3,000,000, 구비 3,000,000)	-	0%
