

제134회 구의회 임시회

'08. 7. 14 ~ 7. 22

2008년도

주요 업무 계획



공원 녹지과

순 서

● 일반 현황 1

● 정책목표와 방향 3


● 주요업무 추진실적 및 계획 .. 4

1. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직					기 능 직			
		5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	10급
정 원	28	1	4	4	4	5		2	3	5
현 원	28	1	4	6	4	4	2	6		1
과부족	-			+2		-1	+2	+4	-3	-4

2 조 직

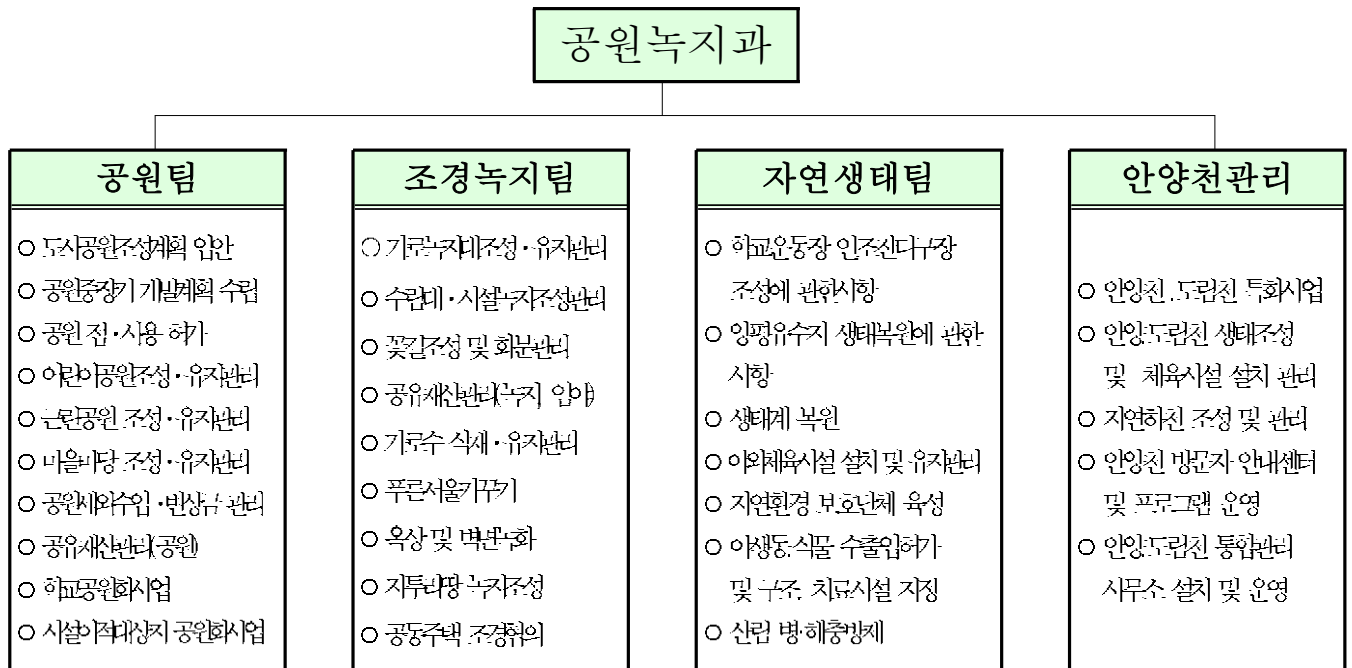

3 주요시설 및 장비

구 분	노 시 공 원					마을 마닝	녹시대	가로수	부호수	세육 시설
	총계	근 린		어린이						
		계	구공원							
개소수	28	10	6	4	18	23	104	54개 노선	2종	14개소
면적 (㎡)	597,546.8	543,463.9	141,973.9	401,490	54,082.9	15,825.7	488,814	15,976 주	2주	16종 158점

4

예산 현황

□ 예산 현황

(단위 :천원)

사업명	예산액	집행액	집행율
합 계	8,721,229	2,641,111	30.28
공원녹지관리 수준향상	1,710,849	365,705	21.37
아름다운환경 및 편리한시설만들기	2,230,950	693,060	31.06
안양.도림천 특화	528,538	105,731	20
푸른공간 늘리기	3,327,859	1,042,079	31.31
인력운영비	805,463	380,946	47.29
기본경비	117,570	53,590	45.58

II. 정책목표와 방향

목 표

싱그러운
푸른 영등포 만들기



방 향

푸른공간 늘리기

아름다운 환경 및 편리한 시설 만들기

공원 녹지 관리 수준향상

Ⅲ. 주요업무 추진실적 및 계획

1. 푸른공간 늘리기

1 도림2동 마을마당 조성(구비)

□ 사업개요

- 위치 : 2개소(도림2동 182-5, 도림2동 182-6)
- 규모 : 52㎡(토지보상, 마을마당 조성)
- 사업기간 : 2008. 1 ~12
- 사업내용 : 토지보상
- 총사업비 : 230백만원
- ※ 2007실적 : 3개소, 700백만원

□ 추진실적

- 2008.1.11 : 공공공지 사업 실시계획 인가를 위한 공람공고
- 2008.2.12 : 도시계획시설(공공공지)사업 실시설계 계획작성고시
- 2008.2.14 : 공원녹지과-1451호로 도로과에 보상의뢰
- 2008.6.11 : 도림동 마을마당 조성공사 보상중(가로경관과)

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 ~ 12 : 보상완료
- 2009. 1 ~ 4 : 공사시행



2 꽃담 마을마당 토지보상(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 당산동5가 4-23
- 규 모 : 2,582.3m²
- 사업기간 : 2005. 1 ~2009. 12
- 총사업비 : 7,400백만원

□ 추진실적

- 계약일 : 2006.6.30
- 계약이행계획
 - 1차분 지급 : 2005.6.13(2,388백만원 / 지급완료)
 - 2차분 지급 : 2006.1.31(1,500백만원 / 지급완료)
 - 3차분 지급 : 2007.4.19(700백만원 / 지급완료)

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 ~ 12 : 500백만원
- 2009. 1 ~ 12 : 2,312백만원



3 경부제3녹지 보상(시비)

장기 미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 녹지의 기능을 회복시킴으로써 민원해소와 녹지의 체계적인 확충으로 도시경관 수준 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 68-3 일대
- 규 모 : 7,912㎡
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 12
- 사 업 비 : 6,776백만원(시비)

※ 2007실적 : 2,500백만원(토지부분 감정완료, 사고이월)

□ 추진실적

- 2008. 4. 3 : 보상계획수립 및 보상계획열람공고
- 2008. 5~6 : 감정평가 시행중

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 : 보상액 산정
- 2008. 8 ~ 12 : 협의계약 통지, 계약체결 및 보상금 지급
- 2009. 12 : 시설녹지 공사완료 예정



4 유수지 주변 녹지량 확충(시비)

□ 사업개요

- 목 적 : 유수지 주변에 녹지를 조성하여 유수지내 체육시설을 이용하는 주민에게 녹음을 제공하는 등 도시 미관 향상 및 주민의 삶의 질 향상
- 위 치 : 3개소(신길유수지, 대림유수지, 도림유수지)
- 규 모 : 유수지 부지면적 37,015㎡
- 사업기간 : 2008. 2 ~ 12
- 사업내용 : 수목식재 및 휴게시설 설치
- 사 업 비 : 700백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 유수지 주변 녹지량 확충사업 추진계획 수립
- 2008. 3 : 기술용역 타당성 심의(기술심사담당관)
- 2008. 4 ~ 6 : 실시설계용역 발주 및 준공
- 2008. 6. 24 : 서울시 설계심의 완료(자연생태과)

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 : 서울시 계약심사(계약심사과)
- 2008. 8 : 유수지 주변 녹지량 확충사업 발주
- 2008. 9 ~ 11 : 공사시행 및 준공



5 2008 생활권주변 자투리땅 녹화(시비,구비)

생활권주변 자투리땅을 녹화하여 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동3가 29-3외 17개소
- 규 모 : 2,300m²
- 사업기간 : 2008. 7 ~ 10
- 사업내용 : 수목식재 및 시설물 설치
- 사 업 비 : 363백만원(시비 150백만원, 구비 213백만원)
※ 2007 실적 : 대림삼거리 교통섬 등 14개소, 324백만원

□ 추진실적

- 2008. 4 ~ 5 : 설계용역
- 2008. 6 : 설계심의(서울시), 일상감사(영등포구)

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 : 공사발주 및 계약
- 2008. 8 ~ 10 : 공사시행



2. 아름다운 환경 및 편리한 시설 만들기

6 공원화장실 재건축(구비)

□ 사업개요

- 메낙골 근린공원 화장실 설치 (A-5.76m²)
- 자매공원 화장실 재건축(A-15.84m²)
- 양남공원·동심공원 화장실 리모델링(양남: 8.91m², 동심: 4.62m²)
- 사업기간 : 2008. 1 ~12
- 총사업비 : 270백만원(구비 200백만원, 시비70백만원)

□ 추진실적

- 2008. 1.23 : 자매공원 화장실 서울시 타당성심사
- 2008. 5. 2 : 양남·동심공원화장실 리모델링 준공(완료)
- 2008. 5. 23 : 메낙골 근린공원 화장실 도시디자인 심의 통과
- 2008. 5. 29 : 메낙골 근린공원 화장실 설치계획 수립 및 구매요청

□ 향후 추진계획

- 2008. 7. 15 : 메낙골 화장실 설치 공사 발주
- 2008. 7. 31 : 메낙골 화장실 설치 공사 준공
- 2008. 9. 30 : 자매공원 실시설계용역 준공
- 2008. 10.30 : 자매공원 화장실 공사발주
- ※ 2007실적 : 2개소, 100백만원



7 신길근린공원 시설개선(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 425-45일대
- 면 적 : 19,782m²
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 7.20
- 사업내용 : 시설물설치 및 수목식재
- 총사업비 : 170백만원

□ 추진실적

- 2008. 1.28 : 실시설계 용역 발주
- 2008. 2.12 : 실시설계 용역 착공
- 2008. 3.31 : 실시설계 용역 준공
- 2008. 4.10 : 정비 공사 발주
- 2008. 4.28 : 정비 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2008. 7.20 : 정비 공사 준공



8 안양천 현대식 화장실 설치사업(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 양화교 갈대축구장 주변 제방
- 규 모 : 1동(12.65m²)
- 사업기간 : 2008. 4~8월
- 사업내용 : 현대식 화장실 1개소 설치
- 총사업비 : 60백만원

□ 추진실적

- 서울시 디자인심의 : 2008. 4~6월
- 2008. 6~7월 : 관급자재 구매(이동식 화장실:39,376천원)

□ 향후 추진계획

- 화장실 설치공사 : 2008, 7~8월
- 기존 현대식화장실 설치사진



9 마을단위 야외체육시설 설치(구비)

□ 사업개요

○ 목 적

- 체육활동 인구 증가에 대비하고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 마을단위 야외체육시설을 설치하여 국민건강 증진 및 체육인구 저변확대

○ 체육시설 현황

- 운동장 : 47면(축구장7, 농구장5, 족구장3, 배드민턴18, 기타14 등)
- 운동기구 : 299점(하늘걷기8, 온몸역기18, 허리돌리기47, 기타226 등)

○ 위치 및 사업비

구 분	위 치	사 업 비 (백만원)
	11개소	360
상반기	배드민턴장(당산2동, 오목교)	80
“	대방천녹지대,	30
“	전철녹지대(전철아파트 주변녹지대)	60
“	대림지역공원(원지, 대림, 다사랑, 신우어린이공원)	80
하반기	구 포괄(고추말공원, 신길1동 마을마당, 대림공원 등)	110

○ 사업기간 : 2008. 2 ~ 11

※ 2007년도 실적 : 3개소(11종 37점), 100백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 ~ 3 : 현장조사 및 정비계획 수립
- 2008. 4 ~ 5 : 실시설계용역 발주 및 준공
- 2008. 6 ~ 12 : 체육시설 설치공사 발주

□ 향후 추진계획

- 2008. 3 ~ 7 : 체육시설 설치공사 계약 및 착공
- 2008. 7 ~ 8 : 공사 시행 및 준공
- 2008. 9 ~ 11 : 하반기 체육시설 설치 및 정비시행

□ 사업개요


- 목 적 : 환삼덩굴 등 경관을 저해하는 식물이 자라고 있는 안양천 제방사면에 하천생태와 부합되는 다양한 초종으로 녹화하여 대표적인 GREEN WAY로 조성
- 위 치 : 오목교 ~ 신정교(약 0.8km)
- 규 모 : 9,990m²(m²당 조성비 : 약200,000원)
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 12
- 사업내용 : 식재기반 조성, 식생매트 설치, 산책로 등
- 총사업비 : 2,000백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 안양천 그린웨이(Green Way)조성사업 추진계획수립
- 2008. 2 : 기술용역 타당성 심의(기술심사담당관)
- 2008. 3 ~ 8 : 실시설계용역 발주 및 준공

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 : 서울시 설계심의(자연생태과)
- 2008. 8 : 서울시 기술심의(기술심사담당관)
- 2008. 8 : 서울시 계약심사(계약심사과)
- 2008. 9 ~ 12 : 공사발주 및 준공

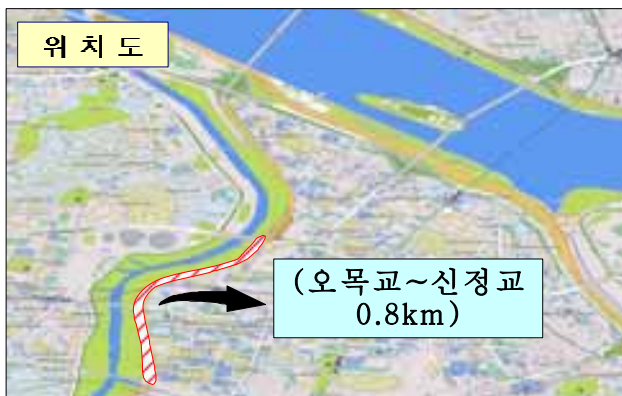

11 | 걷고싶은 녹화거리 조성(시비) - 사고이월사업

행정자치 중심의 녹화거리 조성과 주변아파트 담장개방 및 열린 녹지조성, 학교공원화사업을 복합적으로 시행하여 신길6동 벚꽃길 일대를 Green town으로 탈바꿈하는 사업으로 가로변 녹시율 증대 및 쾌적한 거리환경을 조성하여 이용하는 주민들의 정서함양에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 벚꽃길~외솔길 일대
- 규 모 : 1,295m
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2008. 6
- 사업내용 : 왕벚나무외 42종 식재, 벽천외 35종 설치 등
- 사 업 비 : 1,510백만원(시비)

□ 추진실적

- 2007. 6 ~ 10 : 설계용역 시행
- 2007. 9 ~ 10 : 설계심의, 계약심사
- 2007. 12 ~ 2008. 6 : 사업시행
- 2008. 6. 30 : 준공(완료)



12 가로변 녹지량 확충 및 향토수종 식재(시비)

가로변 유휴지에 녹지를 조성, 향토수종 식재하여 녹지량을 확충함으로써
쾌적한 보행공간 확보 및 가로경관 향상 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의도 동·서로 전구간
- 규 모 : 약 7,000m
- 사업기간 : 2008. 7 ~ 12
- 사업내용 : 살구, 이팝, 산수유, 개나리 등 봄꽃식재
- 사 업 비 : 720백만원(시비 추경편성 예정)

※ 2007실적 : 953백만원(여의대교, 양평가로녹지)

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 ~ 8 : 설계용역 및 공사발주
- 2008. 9 ~ 11 : 공사시행



13 가로수 생육환경 개선(시비) - 사고이월사업

도심에 숲 효과를 제공하고 있는 가로수가 매연 등으로 인해 수세가 점차 쇠약해지고 있으므로 생육환경 개선을 위하여 하단 띠녹지 조성 및 보호판을 확대 설치하여 건강한 생육여건을 조성하고 가로수 병렬 식재로 가로변 녹지량 확충에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 제물포로외 7개노선
- 규 모 : 띠녹지 조성 3,448㎡
- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2008. 6
- 사업내용 : 키큰나무(반송외 6종), 키작은나무(회양목외 3종) 식재 등
- 사 업 비 : 648백만원(시비)

□ 추진실적

- 2007. 10 ~ 11 : 설계용역 시행
- 2007. 11. : 설계심의, 계약심사
- 2007. 12 ~ 2008. 6 : 사업시행
- 2008. 6. 30 : 완료



14 가로수 가지치기(구비)

우리구 영등포로 등 3개노선 가로수 중 수고가 지나치게 높거나 가지가 울창하여 태풍 등에 도복되어 안전사고의 위험이 있는 수목 및 민원사항 등에 의해 정비가 필요한 수목에 대한 전지작업을 시행함

사업개요

- 위 치 : 영등포로 등 7개 노선
- 규 모 : 수목전지 620주
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 4
- 사업내용 : 버즘나무, 은단풍 620주 전지
- 사 업 비 : 100백만원

추진실적

- 2008. 1 : 현장조사 및 설계, 일상감사
- 2007. 2 ~ 4 : 사업시행

15 공공기관 담장녹화(시비)

공공기관 담장을 허문 후 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동4가 24번지 강서세무서
- 규 모 : 담장철거 180m, 녹지조성면적 638m²
- 사업기간 : 2008. 2~12
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 215백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 공공기관 담장 녹화사업 추진계획 수립
- 2008. 3 ~ 5 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2008. 6 : 시 조경과 설계심의 시행

□ 향후 추진계획

- 2008. 9 ~ 12 : 공사시행



16 2008 아파트 열린녹지 조성(시비)

아파트 담장을 허문 후 단지내 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동5가 현대3차아파트 외 2개소
- 규 모 : 녹지조성 3,470m²
- 사업기간 : 2008. 2~12
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 822백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 2008 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
- 2008. 3 ~ 5 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 2008. 6 : 시 조경과 설계심의 시행
- ※ 2007실적 : 양평동동양아파트 등 6개소, 997백만원

□ 향후 추진계획

- 2008. 9 ~ 12 : 공사시행



17 2008 도시구조물 벽면녹화(시비)

도시내 회색빛 콘크리트 옹벽, 방음벽, 담장 등 인공적으로 만들어진 구조물 벽면에 덩굴성 식물을 식재하여, 피복·녹화함으로써 가로변 녹시율을 높이고 도시경관을 개선하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 2개소 (양평동 관악고등학교 뒤 방음벽, 양평동 남양약품 벽면 등)
- 규 모 : 500m
- 사업기간 : 2008. 6 ~ 10
- 사업내용 : 경계석 설치 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 87백만원

□ 추진실적

- 2008. 6~7 : 자체 설계중

□ 향후 추진계획

- 2008. 6 ~ 7 : 자체설계 완료
- 2008. 7 ~ 10 : 공사시행



18 왕벚나무 수세회복(구비)

여의동·서로 왕벚나무의 수세가 점차 쇠약해지고 있으므로 생육공간의 확대, 뿌리수술, 영양제 공급 등 생육환경을 개선하여 매년 시행하는 여의도 봄꽃축제 장으로써의 기능을 유지코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동·서로, 안양천 뚝방, 신길6동 벚꽃길, 도림고가주변
- 규 모 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충방제
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 9
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 21주, 병해충방제 4,184주
- 사 업 비 : 50백만원

□ 추진실적

- 2008. 2 : 현장조사 및 설계
- 2008. 3 : 공사착공

□ 향후 추진계획

- 2008. 9 : 공사준공



19 가로수 보식 및 식재(구비)

신설도로 및 교통사고, 자연고사 등으로 가로수가 없는 지역에 가로수를 식재하여 민원을 해소하고 가로변 녹지량 확충 및 쾌적한 가로공간을 조성하고자 함

사업개요

- 위 치 : 도신로 등 8개노선
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 6
- 사업내용 : 칠엽수 등 3종 72주 식재, 가로수보호판 164조 설치 등
- 사 업 비 : 130백만원

추진실적

- 2008. 1 ~ 2 : 현장조사 및 사업계획 수립
- 2008. 3 ~ 5 : 실시설계 시행
- 2008. 6 : 공사착공

향후 추진계획

- 2008. 9 : 공사준공



20 가로수 수종갱신(시비)

관내 가로수 중 노쇠하고 거대하여 보도이용에 불편을 주고, 태풍 등에 의한 도복 위험이 있는 수목을 작은 수목으로 교체 식재하여 민원을 해소하고 안전사고를 예방하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 대방로, 시흥대로, 도림로, 대림로
- 규 모 : 가로수 수종갱신, 띠녹지 조성 등
- 사업기간 : 2008. 6 ~ 11
- 사업내용 : 가로수 수종갱신 954주, 띠녹지 조성 등
- 사 업 비 : 1,000백만원

□ 추진실적

- 2008. 3 ~ 4 : 현장조사 및 사업계획 수립
- 2008. 5 : 설계용역 발주
- 2008. 6 : 설계용역 착공

□ 향후 추진계획

- 2008. 7 : 설계심의, 디자인심의, 계약심사
- 2008. 7 : 설계용역 준공
- 2008. 8 ~ 11 : 사업시행



3. 공원 녹지관리 수준향상

21 | 공원 전기시설물 개량(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 20개소(여의도동55 자매공원 등 20개소)
- 규 모 : 자매공원 22개소 공원등 개선 및 동심공원 외 18개소 전기시설물 개량
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 12
- 총사업비 : 30백만원
※2007실적 : 2개소(자유,평화공원), 30백만원

□ 추진실적

- 2008. 4.24 : 동심공원의 18개소 전기시설물 정비공사 발주
- 2008. 4.30 : 공사 착공
- 2008. 5.19 : 공사 준공

□ 향후 추진계획

- 2008. 10 : 자매공원 공원등 시설개선 공사발주
- 2008. 11 : 자매공원 공원등 시설개선 공사준공



22 중마루 근린공원 재정비(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 중마루 근린공원(영등포1동 222)
- 규 모 : 웬스 교체, 연못정비, 잔디식재, 화강석판석 포장 및 수목식재 등
- 사업기간 : 2008. 6.2 ~ 2008. 8.1
- 총사업비 : 300백만원

□ 추진실적

- 2008. 1.28 : 서울시 기술용역 타당성 심사
- 2008. 2.11 : 실시설계 용역 발주
- 2008. 3.31 : 실시설계 용역 준공
- 2008. 5. 2 : 공사 발주
- 2008. 5.30 : 공사 계약
- 2008. 6. 2 : 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2008. 8. 1 : 중마루공원 시설개선 공사 준공



23 자매(양카라) 근린공원 시설개선사업(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 자매(양카라) 근린공원(여의도동 56번지)
- 규 모 : 16,500m²
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 12
- 총사업비 : 800백만원

□ 추진실적

- 2008. 1.25 : 서울시 기술용역 타당성 심의
- 2008. 2.27 : 자매근린공원 시설개선공사 실시설계 용역 발주
- 2008. 3.18 : 자매근린공원 시설개선공사 용역 착공
- 2008. 6. 2 : 서울시 공원디자인 및 설계심의

□ 향후 추진계획

- 2008. 8. : 서울시 심의 및 계약심사
- 2008. 9. : 실시설계 용역 준공
- 2008. 10. : 공사 발주
- 2008. 12. : 공사 착공



□ 사업개요

- 위 치 : 메낙골근린공원(신길동 4934-4호)
- 규 모 : 51,470m²
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 7.3
- 총사업비 : 700백만원
- 시설규모
 - 바닥분수 1개소 : 12.5m×12.5m
 - 산책로 탄성포장 : 862.5m²(폭 2.5m/ 연장344m)

□ 추진실적

- 2008. 1.23 : 서울시 기술용역 타당성 심의
- 2008. 1.28 : 실시설계 용역 발주
- 2008. 3.21 : 설계심의(서울시 공원조성과)
- 2008. 3.27 : 용역 준공
- 2008. 4.10 : 메낙골 근린공원 친수공간 조성공사 발주

□ 향후 추진계획

- 2008. 7. 15 : 메낙골 근린공원 친수공간 조성공사 준공



□ 사업개요

- 위 치 : 서강공원(영등포3동 8가 28) / 양남공원(양평1동 205)
- 규 모 : 3,264㎡ (서강 1,797㎡ / 양남 1,467㎡)
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 9
- 총사업비 : 466백만원

□ 추진실적

- 2008. 1. 29 : 계획수립
- 2008. 1. 29 : 실시설계 용역 발주
- 2008. 4. 30 : 주민설명회(2회)
- 2008. 5. 12 : 용역준공

□ 향후 추진계획

- 2008. 6 : 공사발주
- 2009. 7 ~ 9 : 공사착공 및 준공



□ 사업개요

- 위 치 : 자유어린이공원 외 3개소 (문래,영등포소공원,당산)
- 규 모 : 자산홍 외 3종 2,685주 및 맥문동 1,200본 식재
- 사업기간 : 2008. 6 ~ 7
- 총사업비 : 19백만원

□ 추진실적

- 2008. 6. 03 : 공사발주
- 2008. 6. 10 : 공사계약 및 착공

- 실 적

- | | | |
|-------------|------------------------|--------|
| · 자유공원 | : 자산홍(H0.4 × W0.4) 식재 | 2,030주 |
| · 문래공원 | : 영산홍(H0.3 × W0.4) 식재 | 325주 |
| · 영등포소공원 | : 쥐똥나무(H1.5 × W0.4) 식재 | 330주 |
| · 당산공원 생태연못 | : 맥문동(10cm) 식재 | 1,200본 |

□ 향후 추진계획

- 2008. 7. 19 : 공사준공



□ 사업개요

- 위 치 : 동심어린이공원 외 5개소
- 규 모 : 장애인 유도블럭 274m, 블라드 25개, 점토블럭 포장 561m²
 - 동심공원 : 장애인유도블럭 16m / 블라드 4개소
 - 신우공원 : 장애인용 블라드 3개소
 - 신일공원 : 점토블럭포장 62m² / 장애인유도블럭 21m
 - 대림공원 : 장애인용 블라드 12개소
 - 원지공원 : 블라드 1개소 / 장애인유도블럭 118.5m 설치
 - 다사랑공원 : 점토블럭포장 499m² / 장애인유도블럭 118.5m 등
- 사업기간 : 2008. 3 ~ 8
- 총사업비 : 59백만원

□ 추진실적

- 2008. 3. 14 : 계획수립
- 2008. 5. 27 : 공사발주
- 2008. 6. 23 : 공사착공

□ 향후 추진계획

- 2008. 8. 12 : 공사준공



□ 사업개요

- 위 치 : 두암공원(대림3동 715) / 영일공원(영등포1동 647-3)
- 규 모 : 6,890m² (2,088평)
- 사업기간 : 2007. 9 ~ 2008. 12
- 총사업비 : 600백만원 (예정)

□ 추진실적

- 2007. 9. 12 : 어린이놀이터 종합개선방안 검토 ※ 시장지시사항
- 2008. 3. 05 : 시민고객 맞춤형 상상어린이공원 조성계획 수립 (서울시)
- 2008. 5. 22 : 조성기본계획(안) 현상공모 (서울시)
- 2008. 6월 : 상상어린이공원 100개소 기본 및 실시설계(서울시)

□ 향후 추진계획

- 2008. 6 ~ 8 : 주민의견수렴 및 실시설계 완료
- 2008. 9 ~ 12 : 공사착공 및 완료



□ 사업개요

- 위 치 : 양평어린이공원 외 4개소 (중앙, 원지, 신우, 신길)
- 규 모 : 36,255㎡ (10,987평)
- 사업기간 : 2008. 4 ~ 6
- 총사업비 : 54백만원

□ 추진실적

- 2008. 4. 10 : 정비계획 수립
- 2008. 4. 28 : 공사계약
- 2008. 5. 06 : 공사착공
- 2008. 6. 25 : 공사준공

- 실 적

- 양평공원 : 노후된 조합놀이대 1조 교체 및 정자 계단 수리 1식
- 중앙공원 : 파도타기 등 운동기구 2조 설치
- 원지공원 : 임시창고 및 평의자 보수 1식
- 신우공원 : 파손 웬스 정비 15경간
- 신길공원 : 노후된 어린이놀이기구 정비 1식



30 | 공원내 수목 가지치기 공사(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 다사랑어린이공원 외 9개소
- 규 모 : 수목(버즘나무) 가지치기 206주
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 3
- 총사업비 : 29백만원

□ 추진실적

- 2008. 1. 23 : 계획 수립
- 2008. 2. 12 : 공사착공
- 2008. 3. 04 : 공사준공
- 실 적 : 버즘나무 206주 전지
 - 당산공원(2), 서강(17), 중앙(14), 양평(23), 문래(76), 다사랑(6), 원지(18), 두암(20), 신우(14), 동심공원(16)

