

제150회 영등포구의회
2009년도 제2차 정례회
'09.11.20 ~ 12.18



주요업무보고

- 2009년도 추진실적 및 2010년도 계획 -



도 로 과

보 고 순 서


- **일 반 현 황** 1
- **2009 주요업무 추진실적** 4
- **2010 주요업무 계획** 13
- **특 수 사 업** 28

I. 일반 현황

I 인 력

구 분	계	일반직					기능직				
		5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정 원	35	1	4	4	7	3	1	3	6	4	2
현 원	31	1	4	6	3	4	1	2	8	2	
과부족	-4			2	-4	1		-1	2	-2	-2

II 조 직 : 1과 4개팀

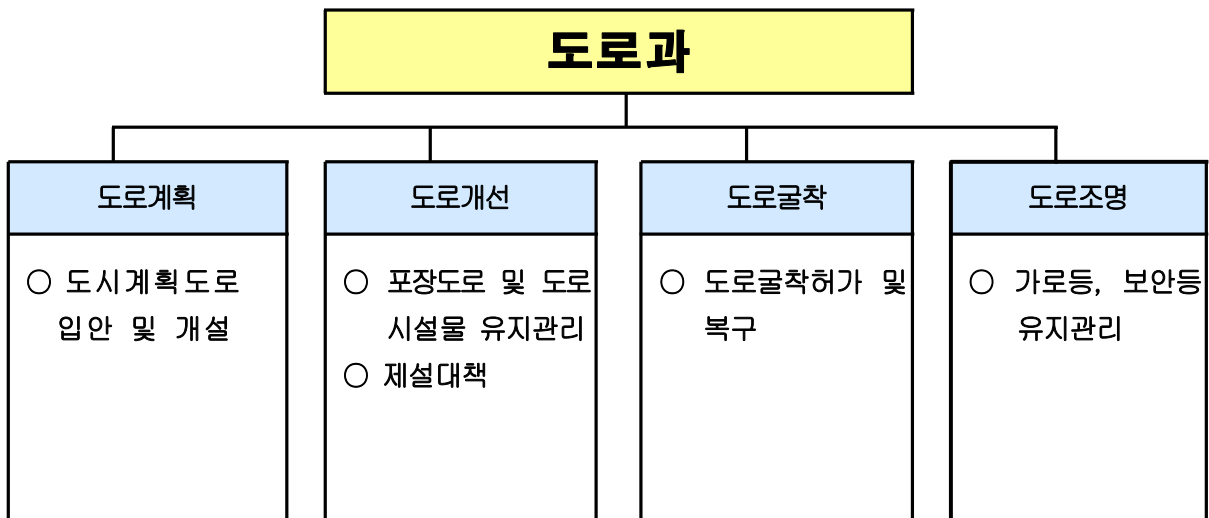

III 주요시설 및 장비

□ 도 로

- 주요간선도로 : 경인로외 27개 노선
- 일반도로

연장 387.82km		도로율
시도 76.02km	311.80km	23.31% (서울시 : 21.68%)

□ **교량 및 고가차도**

교 량(12개소)	고가차도(6개소)
양화교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 신정교, 양평교, 염창교, 여의교, 구로교	문래, 선유, 도림, 도림천, 신길, 영등포역

□ **지하차도 및 지하보도**

지하차도(10개소)	지하보도(1개소)
국회앞, 영등포, 대방, 신길, 여의2교, 여의교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측	여의초교앞

□ **보도육교 및 입체교차로**

보도육교(11개소)	입체교차로(5개소)
우신초교, 신길마을금고, 도림초교, 영동초교, 영등포수원지, 당중초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포역횡단근로복지공단	영등포R, 여의하류, 목동교, 동측IC, 염창IC, 여의상류

□ **조명시설**

가 로 등	보 안 등
8,538 등	9,356 등

IV 예산 현황

예산 현액

(단위 : 천원)

단위사업명	①예산현액	②집행액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집행액	집행예정액		
합 계	18,999,859	11,972,601	2,888,601	3,837,186	301,471
도로개설및 확장	10,057,608	5,550,108	663,226	3,837,186	7,088
도로개설 지원	24,829	8,740	10,359		5,730
도로정비	5,557,399	4,033,323	1,359,818		164,258
도로관리	422,365	212,609	195,195		14,561
도로조명 시설 정비	853,364	478,750	318,890		55,724
도로조명 관리	1,429,548	1,134,847	244,701		50,000
인력운영비	487,631	417,631	67,450		2,550
기본경비	167,115	136,593	28,962		1,560

Ⅱ. 주요업무 추진실적

1 도림로 도로확장공사

신길재정비 촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16(신길광장)
- 규 모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350m, 미개설 800m)
 - 특별회계 : 좌측 L=500m(지구단위구역)
 - 일반회계 : 우측 L=800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : '09년 ~ '13년
- 총사업비 : 61,220백만원(보상비 56,870 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,590백만원(보상비 21,440 공사비 1,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,480백만원(보상비 35,430 공사비 3,200)
- ※ '09 보상비(일반회계) : 2,000백만원(토지 4필지 275㎡)



□ 추진실적

- '78.12. 7 : 도시계획시설(도로)결정(건설부고시 제39호)
- 사업추진경위
 - '97~'99년 : 1차공사 완료(도림고가 남단~도림사거리, 연장 350m)
 - '08. 9 : 투자심사실시(적정)
 - '09. 3 : 사업인가고시(800m중 300m)
 - '09.11현재 : 보상 실시 중

□ 향후계획

- '10. 02 : 보상 및 실시설계 용역 시행
- '11~'13 : 공사 시행

위 치 도

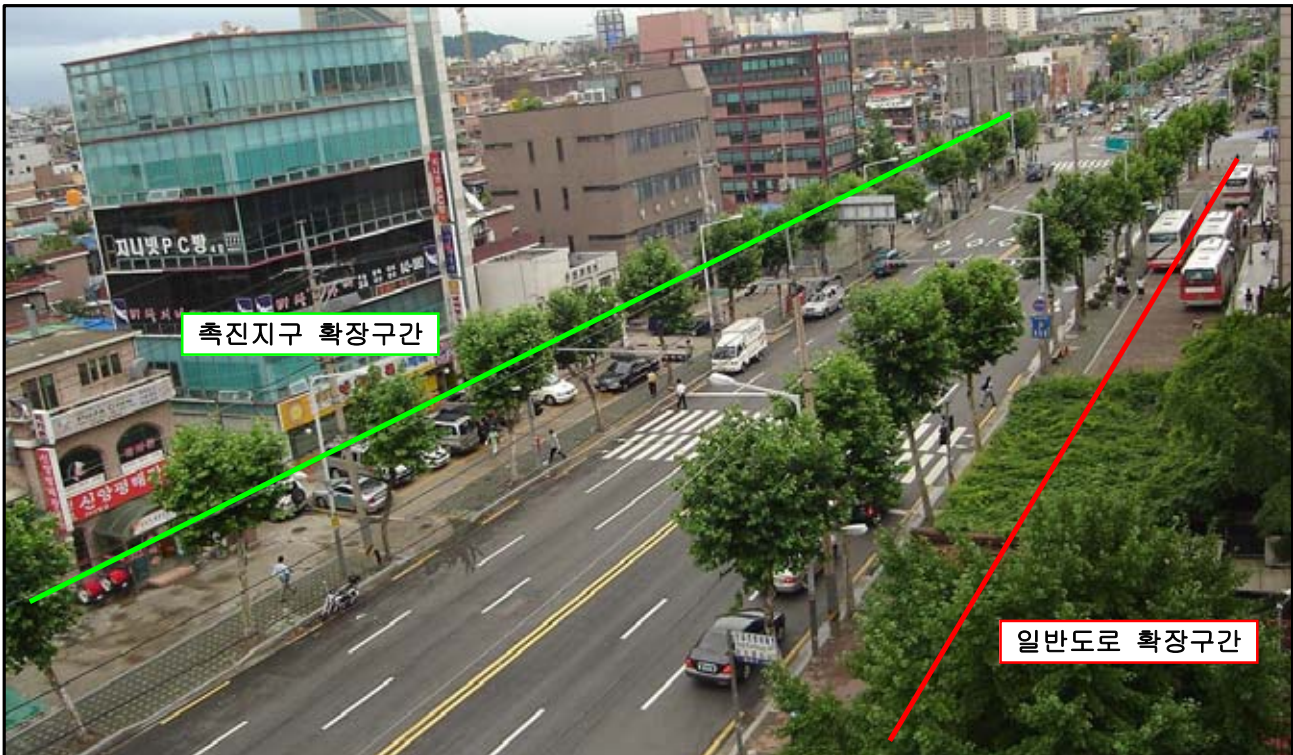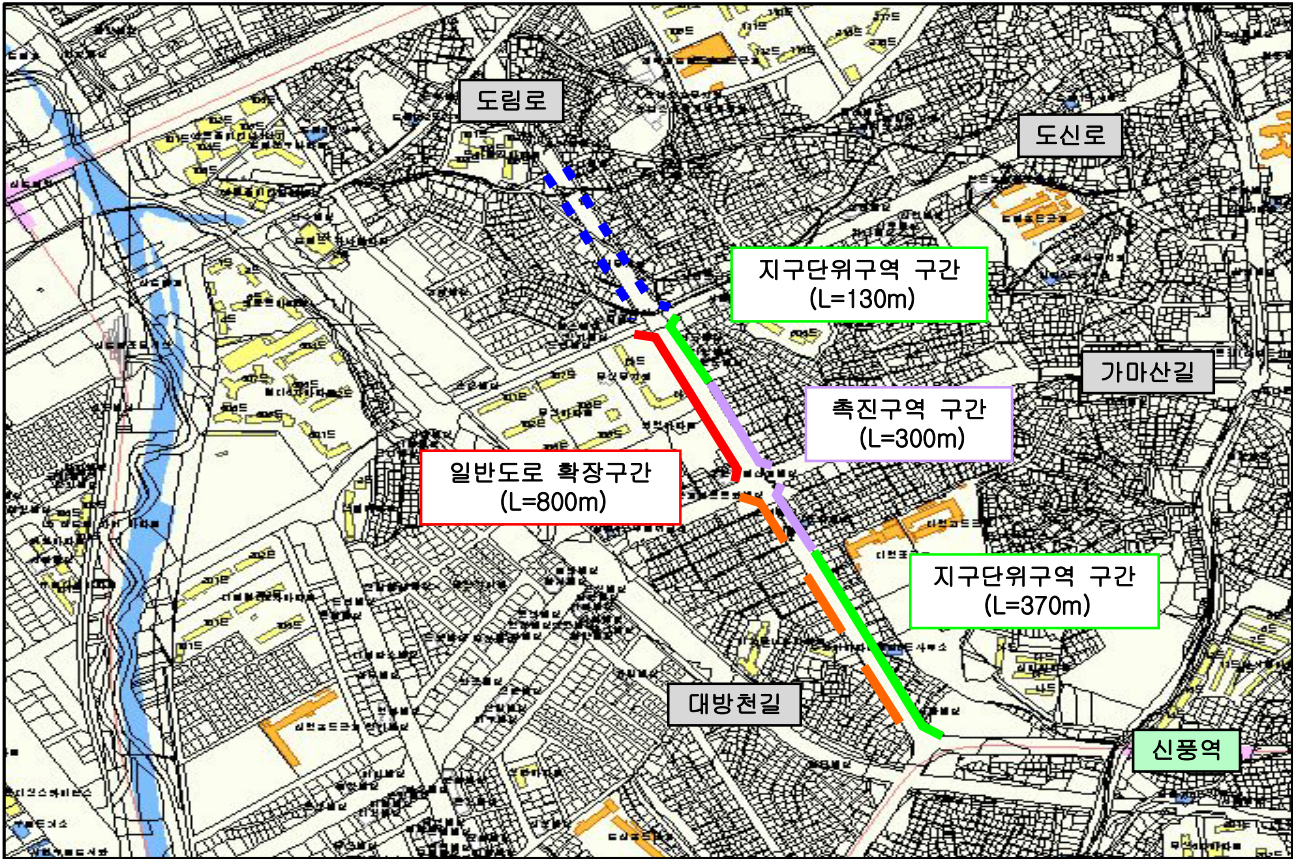

2

영진시장~대신시장간 도로개설공사

'01년이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 완성하여
교통량 분산 및 지역균형발전 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(기개설 1,130m, 미개설 140m)
- 사업기간 : '94년 ~ '10년
- 총사업비 : 24,210백만원
 - ┌ 1구간 : 15,926백만원
 - └ 2구간 : 8,284백만원(보상비 7,884백만원, 공사비 400백만원)
- ※ '09 보상비 : 3,884백만원(토지 795㎡)

□ 추진실적


- '36.12.26 : 도시계획시설(도로)결정(조선총독부공시 제722호)
- 사업추진경위
 - '94 ~ '00년 : 일부구간 도로개설 완료(L=820m)
 - '05.1~'09.3 : 사업인가고시(미개설구간 450m)
 - '06. 9 : 실시설계용역 완료(미개설구간 450m)
 - '07.9~'09.6 : 공사시행(미개설 450m중 310m)
 - '09. 11 : 잔여구간 보상 완료(공탁)

□ 향후계획

- '10년 : 보상 실시(4,000백만원)
- '10. 3. ~ 12.30 : 공사 시행 (잔여구간 L=140m)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 영진시장~대신시장간 도로개설공사

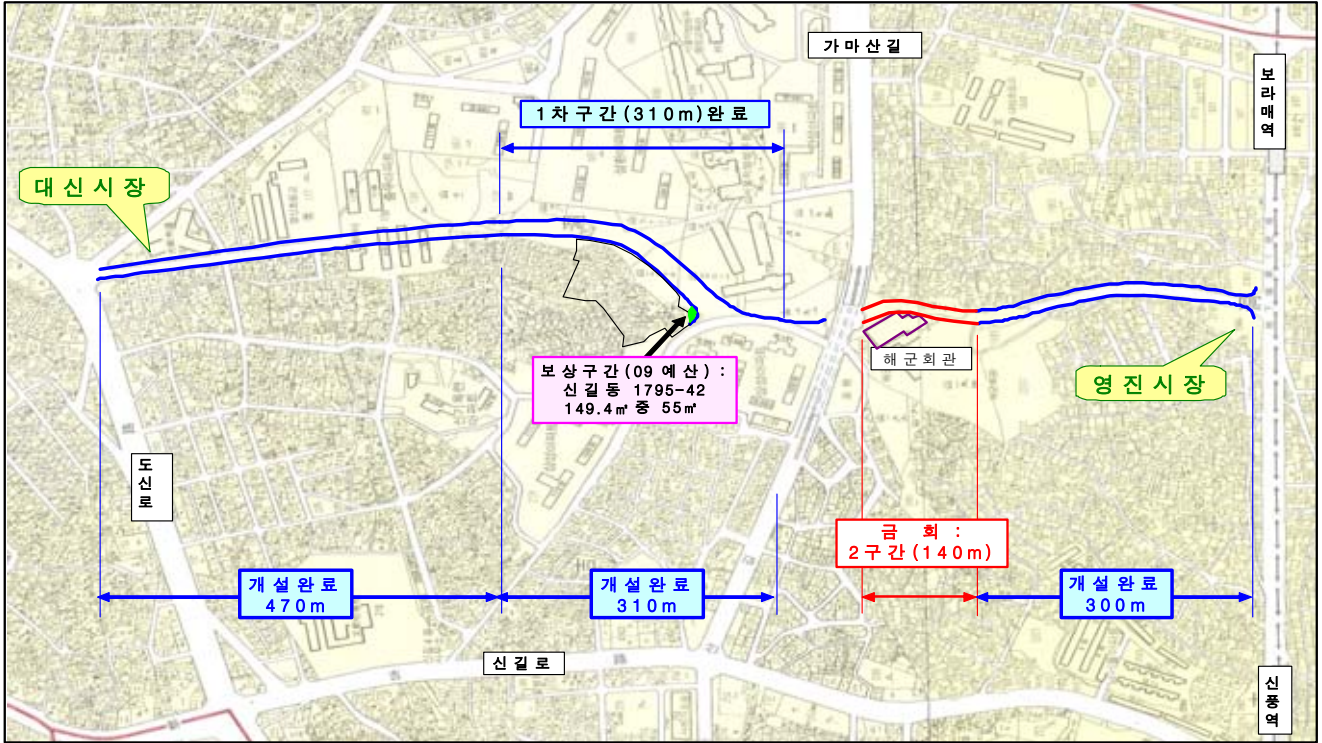

3

용호로 및 여의동로 보행환경 개선공사

노후화된 기존 보도를 정비하여 보행환경개선 및 도시미관을 제고하고 서울시에서 역점사업으로 추진중인 “서울거리 르네상스사업”과 연계하여 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 용호로(여의동 56~50-3), 여의동로(여의동 56~62)
- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1,700m
- 사업기간 : '09. 2.~'09.11
- 총사업비 : 1,785백만원(시비 892백만원, 구비 893백만원)

□ 추진실적

- 실시설계 계약 : '09. 02. 02
- 서울시 디자인심의 : '09. 04. 15
- 실시설계 용역완료 : '09. 04 .30
- 공사 시행 : '09.6.12 ~ '09.11.20(현공정율 98%)

□ 향후계획

- '09. 11. 20 : 공사준공 예정

위 치 도

▶ 공사명 : 용호로 및 여의동로 보도환경 개선공사



4

여의도 지하보도 보행환경 개선사업

사회적약자인 장애인, 노약자, 임산부 등의 지하보도 계단을 이용한 보행 불편을 해소코자 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기를 설치하여 보행자 편의를 도모하고 폐쇄가 불가한 지하보도에 대하여는 새로운 디자인으로 단장으로 쾌적하게 다닐 수 있는 지하 보행환경을 제공코자 함.

□ 사업개요

- 사업위치 : 여의도 지하보도 3개소(여의초교 앞, 원효대교 앞, KBS별관 앞)
- 사업규모
 - 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기 설치 2개소
 - 지하보도 환경개선 1개소(바닥타일교체 A=160㎡, 벽면타일교체 A=600㎡, 천정판 교체 A=250㎡, 계단보수 150㎡, 캐노피교체 N=2개소)
- 사업기간 : '08. 3. ~ '10.10
- 총사업비 : 895백만원 (2009년:400백만원)

□ 추진실적

- '08.4. ~ 11. : 실시설계 용역 시행
- '09.3. ~ 6. : 공사 시행 2개소(원효대교앞, KBS별관앞)
 - 지하보도 폐쇄 : 2개소(원효대교앞, KBS별관앞) - 출입구 12개소

□ 향후계획

- '10. 1 : 공사발주(여의초교앞)
- '10. 3. ~ 10. : 공사 시행

위 치 도

▶ 공 사 명 : 여의도 지하보도 보행환경 개선사업



5 노후 가로등 개량공사

15년이상 경과되어 노후된 가로등 시설개선에 대한 연차적 계획을 수립 시행하여 통행인 편의제공 및 안전사고 예방을 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 사업규모
 - 가로등 개량 250등 (도림천로99, 용호로55, 여의동로 96)
 - 여의도 주거지역 광원교체 132등
- 사업기간 : '09. 3 ~ '09. 10
- 총사업비 : 1,446백만원(시비 1,385백만원, 구비 61백만원)

□ 추진실적

- '09.05 : 여의도 주거지역 광원교체공사 완료(100%)
- '09.09 : 도림천로 가로등 개량공사 완료(100%)
- '09.10 : 용호로 가로등 개량공사 완료(100%)
- '09.09 : 여의동로 가로등 개량공사 완료(100%)

□ 향후계획

- 야간 보행환경 개선 및 안전사고 예방을 위한 지속적인 유지관리

Ⅲ. 2010 주요업무 계획

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

1

도림로 도로확장공사(시비)

도로계획담당관, 균형발전촉진본부

신길재정비촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 추진방향

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - 특별회계 : 좌측 L= 500m(지구단위구역)
 - 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 총사업비 : 61,220백만원(보상비 56,870 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,440백만원(보상비 21,440, 공사비 1,000, 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,630백만원(보상비 35,430, 공사비 3,200)

□ 추진계획



○ 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장래	
추진내용	특별회계	용역			150			
		보상	21,440			8,000	13,440	
		공사	1,000				1,000	
	일반회계	용역						
		보상	35,430	7,000	2,000		13,000	13,430
		공사	3,200	1,200				2,000
총사업비		61,220	8,200	2,000	8,150	27,440	15,1430	

○ 2010년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	1,030㎡	사업인가고시	보상협의(800㎡)	이의재결	공탁(230㎡)
	용역	1식	착수	지문 및 심의	성과품 완료	
집행계획		보상 8,000 용역 150	-	보상 6,000 용역	보상 - 용역 150	보상 2,000 용역 -

위 치 도

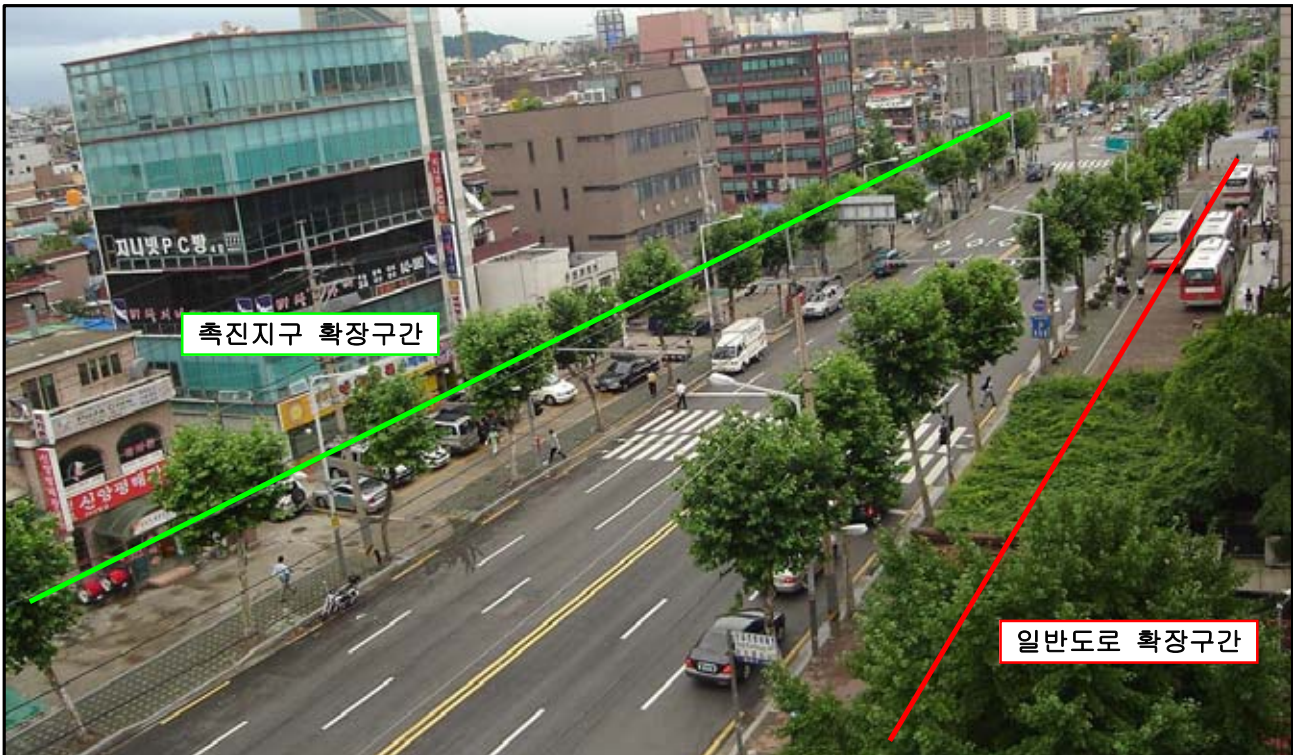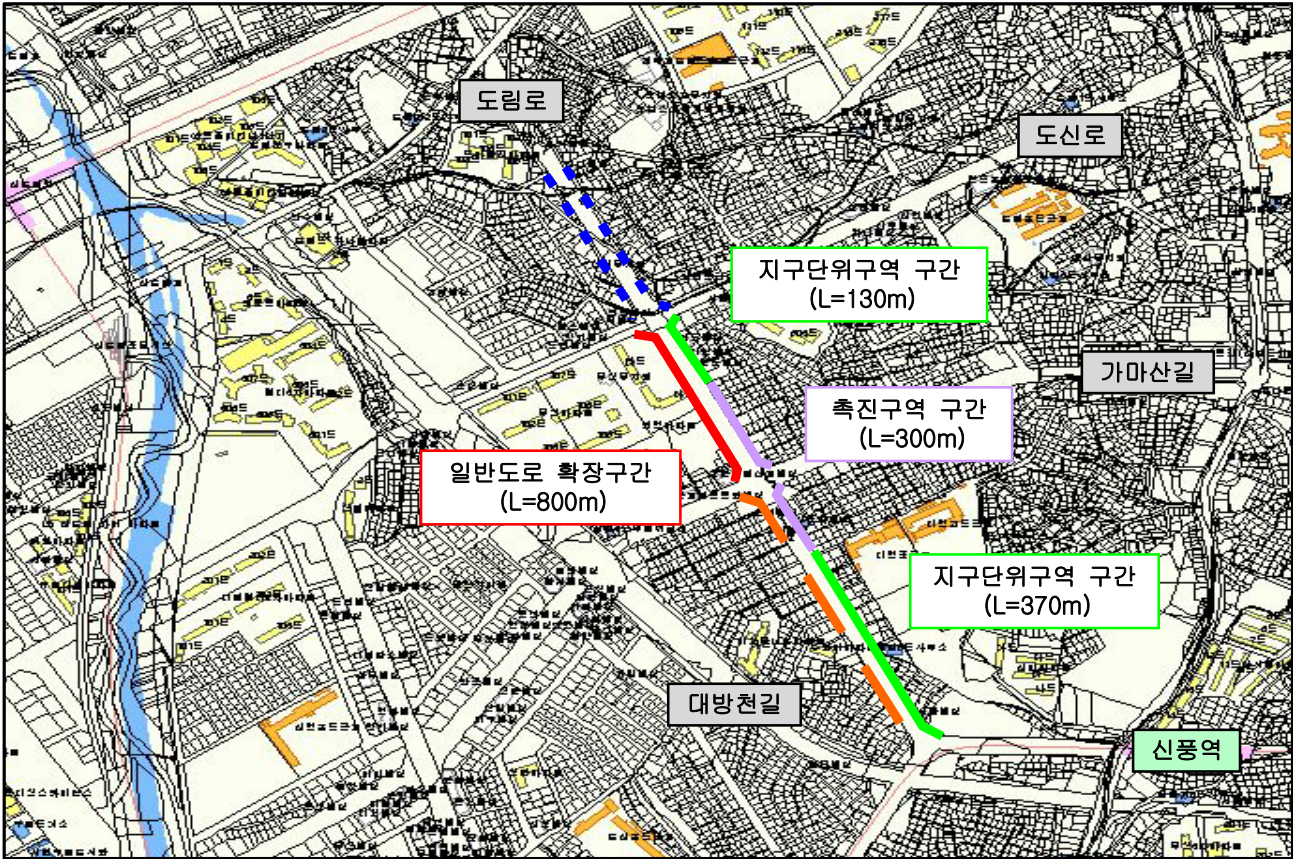

2 영진시장~대신시장간 도로개설공사(시비)

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 완성하여 교통량 분산효과 및 주민 숙원 사업 해결

□ 추진방향

- 위치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m (기개설 1,130m, 미개설 140m)
- 사업기간 : 1994 ~ 2010년
- 총사업비 : 24,210백만원 (보상비 20,439 공사비 3,656 설계비 115)

□ 추진계획


- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비고
추진내용	용역	115	115					
	보상	20,439	12,555	3,884	4,000			
	공사	3,656	3,256		400			
총사업비		24,210	15,926	3,884 구비 184 시보조금 3,700	4,400			구비 184 : 1차구간 보상비

- 2010년 계획 (2차구간:해군호텔앞) (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	987㎡	보상협의	이의재결	공탁 등	
	공사	B=15m,L=140m	공사계약	공사착공	-	준공
집행계획		보상 4,000 공사 400	보상 공사	보상 공사	보상 4,000 공사	보상 공사 400

위 치 도

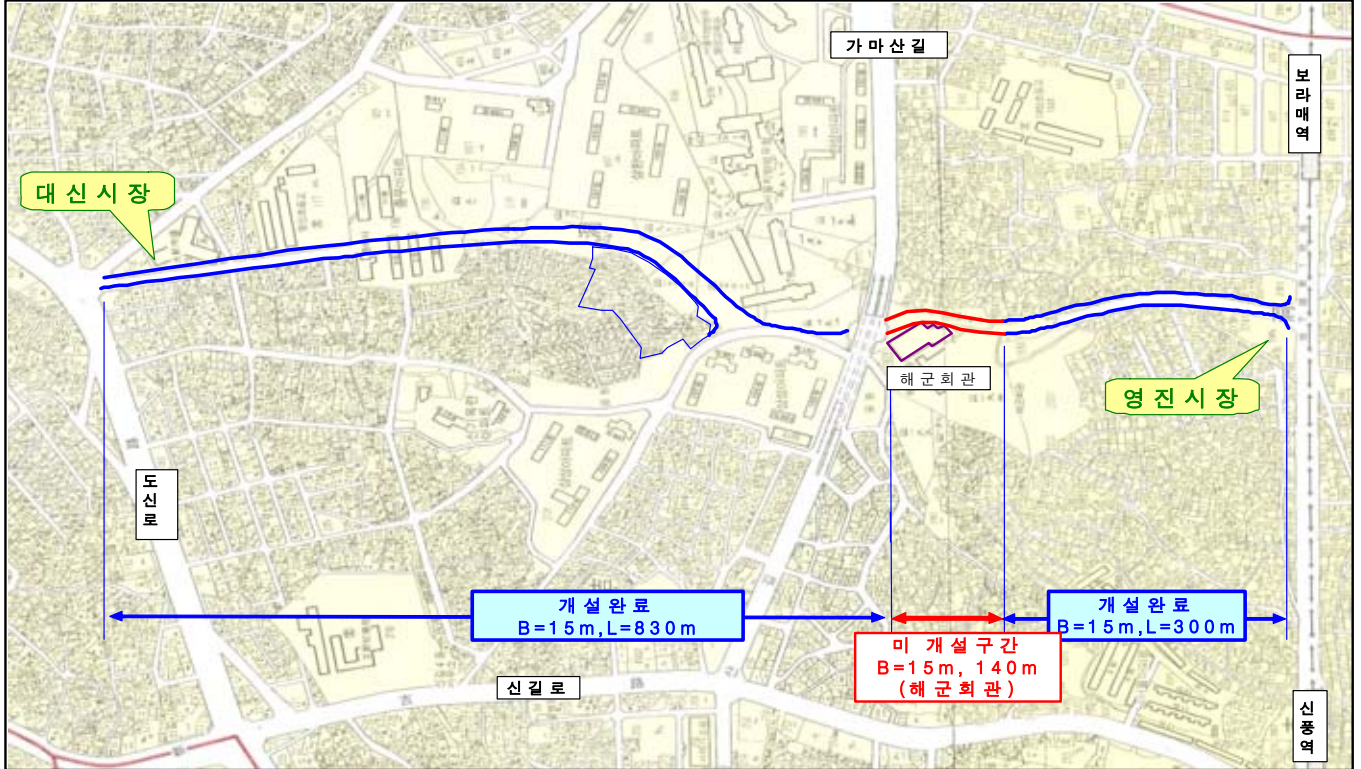

3 대방천변 도로개설공사(시비+구비)

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편 해소

□ 추진방향

- 위치 : 신길동 670-2 ~ 445-21간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - 기개설 : 660m('98년 ~ '01년)
 - 미개설 : 420m
- 사업기간 : 1998년 ~ 2012년
- 총사업비 : 10,250백만원(보상비 8,000 공사비 2,200 설계비 50)

□ 추진계획


- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비고
추진내용	용역	50		50				
	보상	8,000	3,000	2,500		2,500		-교부금2,000 -구비 500
	공사	2,200	400			800	1,000	지장물이설 등 포함
총사업비		10,250	3,400	2,550		3,300	1,000	

- 2010년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	1,043㎡	보상협의	이의재결	공탁등	
	공사	B=6m, L=420m	공사계약	공사착공	-	
집행계획		보상 2,500 공사	보상 1,000 공사	보상 500 공사	보상 1,000 공사	보상 공사

위 치 도

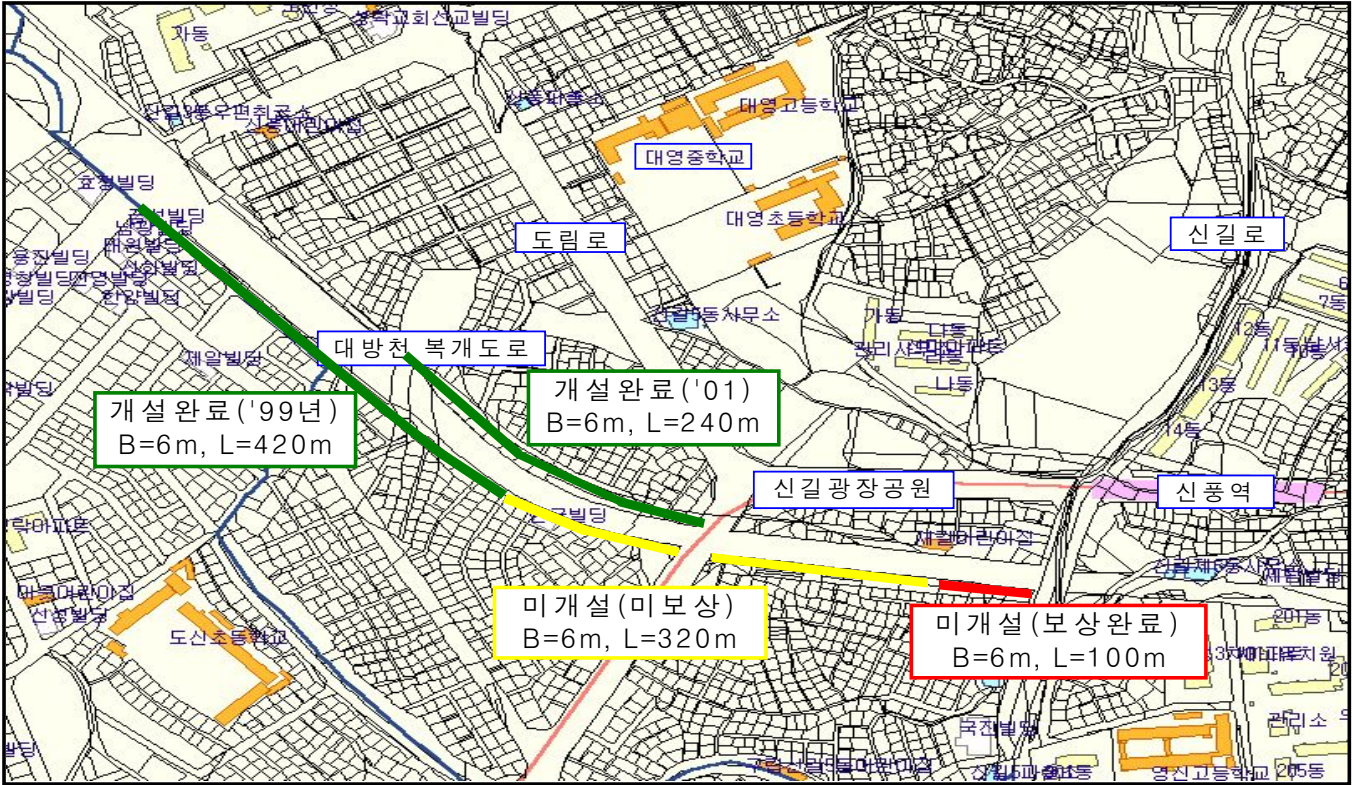

4 도림2동 286-11 ~ 187-39간 도로개설공사(구비)

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 주민 숙원사업 해소 및 주거환경 개선

□ 추진방향

- 위치 : 도림2동 286-11 ~ 도림동 187-39간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=284m
- 사업기간 : 2010년 ~ 2012년
- 총사업비 : 4,200백만원(보상비 3,350 공사비 800 설계비 50)

□ 추진계획


- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2009	2010	2011	장 래	비고
추진내용	용역	50			50			
	보상	3,350			300	1,700	1,350	
	공사	800					800	
총사업비		4,200			350	1,700	2,150	

- 2010년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진내용	보상	135㎡	사업인가고시	보상협의	이의재결	공탁
	용역	1식	착수	지문 및 심의	성과품 완료	
집행계획		보상 300 용역 50	-	보상 200 용역	보상 - 용역 50	보상 100 용역 -

위 치 도

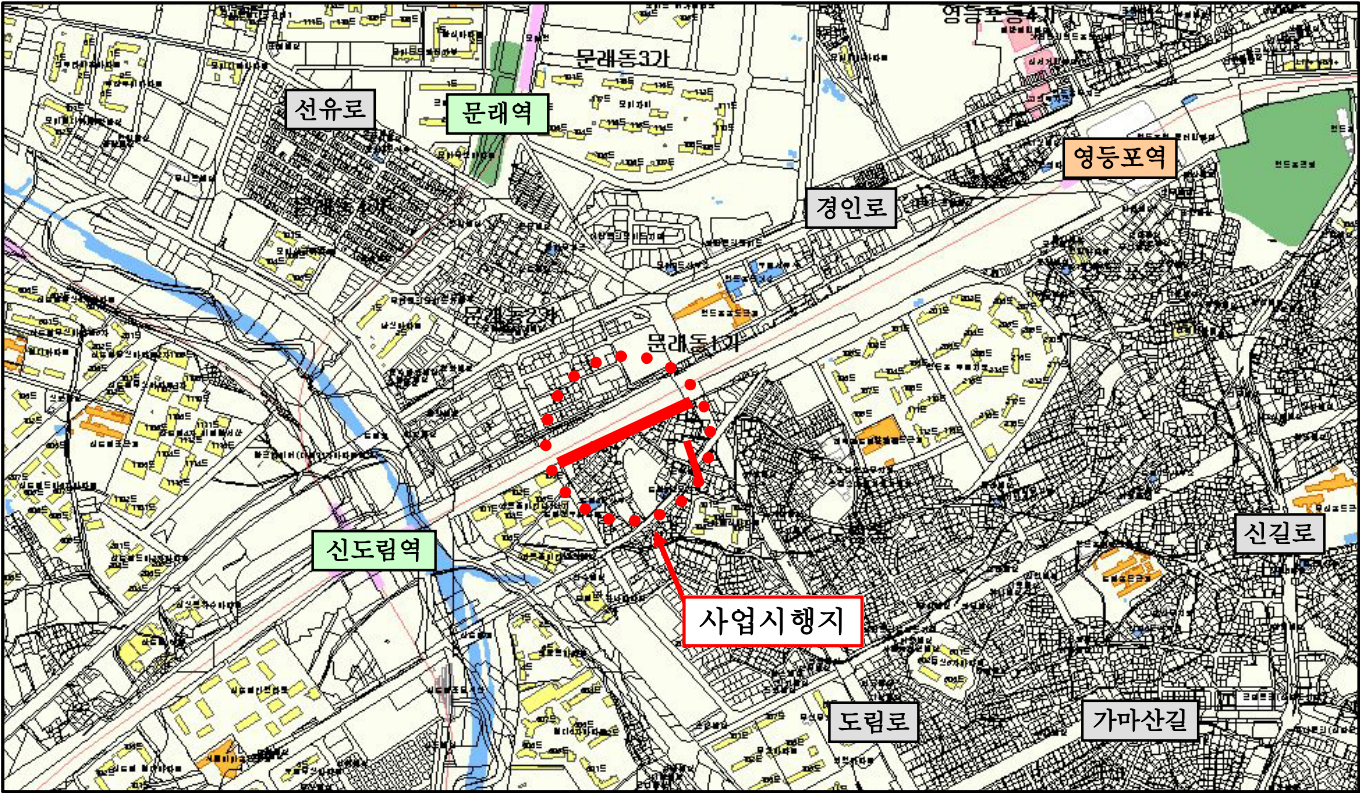

안전한 도로 유지 관리

5 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선

노후훼손 및 노면상태가 불량한 도로를 신속히 보수정비하여 주민 통행 불편을 해소하고 지속적인 도로 관리로 도로의 기능성 유지 및 안전사고 사전예방

□ 추진방향

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 35,720m
- 사업기간 : '10. 1 ~ 12
- 사업규모

- 보도정비 : A= 100a 아스팔트정비 : A= 200a 콘크리트포장 : A= 40a

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009	2010	2011	2012	비 고
이면도로 수준향상	1,800	1,800	3,000	3,000	

6 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 및 장애인 편의시설 설치

노후, 훼손 및 파손된 도로시설물을 신속히 보수·정비하여 안전사고를 예방하고 장애인편의시설 설치 및 정비하여 편의증진에 기여

□ 추진방향

- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업기간 : '10. 1 ~ 12
- 사업규모
 - 지하보도 1개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
 - 난간·과속 방지턱 및 블라드 설치 등 도로부속시설물
 - 횡단보도 신설 및 이전, 보도진출입부 점자블록 설치 등 장애인편의시설

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009	2010	2011	2012	비 고
시설물 내구성 확보	1,100	1,000	2,000	2,000	

7 여의도 지하보도 보행환경 개선사업

사회적약자인 장애인, 노약자, 임산부 등의 지하보도 계단을 이용한 보행 불편을 해소코자 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기를 설치하여 보행자 편의를 도모하고, 폐쇄가 불가한 지하보도에 대하여는 새로운 디자인으로 단장하여 쾌적하게 다닐 수 있는 지하 보행환경을 제공코자 함

□ 추진방향

- 사업위치 : 여의도 지하보도 3개소(여의초교 앞, 원효대교 앞, KBS별관 앞)
- 사업규모
 - 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기 설치 2개소
 - 지하보도 환경개선 1개소(바닥타일교체 A=160㎡, 벽면타일교체 A=600㎡, 천정판 교체 A=250㎡, 계단보수 150㎡, 캐노피교체 N=2개소)
- 사업기간 : '08. 3.~'10.10
- 총사업비 : 895백만원

□ 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분		계	2008	2009	2010	비 고
추진 내용	실시설계용역	45	45			
	원효대교앞 지하보도	400		400		
	KBS별관앞 지하보도					
	여의초교앞 지하보도	450			450	
총사업비		895	45	400	450	

- 2010년 계획 (단위:백만원)

구 분		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 내용	공 사	여의초교 지하보도	착공	공사시행	준공	-
	집행계획	공사 450	-	-	공사 450	-

위 치 도

▶ 공사명 : 여의도 지하보도 보행환경 개선사업



8 도로굴착복구 효율적 추진

도로굴착으로 인한 공사장의 관리실태가 부실하여 이에 따른 시민 불편을 가중 시키고 있어 신속하고 책임 있는 도로복구로 시민편의 위주의 공사장 관리로 개선하고자함.

□ 도로현황

- 도로 폭 : 4m~50m
- 도로연장 : 386km
- 면 적 : 4,374,579 m^2

□ 굴착복구 효율적 추진방향

- 시민위주의 공사장 관리(소규모 당일굴착 당일복구)
- 간선도로는 야간(22:00~익일06:00) 또는 공휴일 공사시행
- 중복굴착 방지를 위한 사전심의 및 조정 (10m이상굴착)
- 굴착복구시 GIS지도 활용함으로써 지하시설물 손상사고 방지

□ 도로 굴착 허가 현황('09.10.31현재)

- 금년도 실적 : 1,681건 L=35,078m A=38,387 m^2
- 내년도 계획 : 1,508건 L=40,372m A=41,200 m^2

9 주민과 함께하는 제설대책 추진

□ 추진기간 : '10.11.15 ~ '11.3.15(4개월간)

□ 추진방향

- 내 집 내 점포 앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상
- 직장 및 직능단체, 각종 보도매체를 통한 대시민 홍보강화 및 참여유도
- 취약지역 주민 및 반 단위 책임제설 담당자에게 기상상황 및 제설작업 시행통보 등 문자메시지 전송 확대 시행
- 노약자·장애인·독거노인 등 눈을 치울 수 없는 주민들에 대한 지원
⇒ 직능단체 등을 활용 제설자율봉사단 구성 지원

□ 제설자재 및 장비 현황

(단위 : 대)

구 분	다목적 차 량	살포기			제설삽날	제설자재(포)	
		소형	중형	대형		염화칼슘	소금
계	3	25	4	3	3	29,000	5,400
기 존	3	25	4	3	3	29,000	2,800
추가확보							2,600

□ 기타 행정사항

- 디자인화된 소형염화칼슘함 구매 및 배치(기확보 185개, 추가구매 115개)
- 학교 통학로 주변 제설용 염화칼슘 배치(24개소, 120포)
- 주요도로 및 취약지역 염화칼슘 및 보관함 배치(100개소, 500포)
- 버스전용차로 및 기타 보도육교주변 염화칼슘 및 보관함 배치(28개소, 140포)
- 제설유공자 표창수여
 - 제설참여 공무원, 환경미화원, 학생, 시민단체 등에 수여

밝고 쾌적한 거리조성

10 노후 가로등 개선(시·구비)도로관리담당관

15년이상 경과되어 노후된 가로등 시설개선에 대한 연차적 계획을 수립 시행하여 통행인 편의제공 및 안전사고 예방을 도모하고자 함.

□ 가로등 현황

- 가로등 : 69개 노선 8,538등(가로등 8,310, 육교등 87, 하부등 141)

□ 추진방향

- 전기 안전사고 예방과 도시미관 향상
- 고효율·고연색성 자재 사용으로 에너지절약(기존 15~30LX → 개선 15~22LX)
- 노후 조명시설 개선을 위해 연차적 예산투입

□ 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위 : 백만원)

구 분		사업비 (등수)	연 도 별			
			2009	2010	2011	2012
가로등	계	9,772 (1,591)	1,446 (386)	2,586 (385)	3,010 (430)	2,730 (390)
	시비	7,555 (1,129)	1,385 (254)	2,040 (285)	2,100 (300)	2,030 (290)
	구비	2,217 (462)	61 (132)	546 (100)	910 (130)	700 (100)

- 2010년 계획 (단위 : 백만원)

대상노선			사업개요			사업비
			조도(Lx)	등수	광원	
가로등	구분	계		385		2,586
	시도	여의서로, 양평로, 가마산길, 버드나룻길	22	285	250W	2,040
	구도	대림1로, 신길2로	15	100	250W	546

11 골목길 밝은거리(보안등) 개선

어두운 골목길 보안등 추가 설치와 노후시설을 정비하여 시설물의 수준 향상을 도모하고 밝은 거리 조명 환경을 조성하고자 함.

□ 시설현황

시설 등수	광 원 별			보 안 등 종 류 별		
	50W이하	70W	100W이상	전용주	한전주	건축물
9,356	4,343	311	4,702	2,575	4,814	1,695

□ 추진방향

- 보안등 적소 설치로 민원해소 및 밝은 보행환경 조성
- 노후시설 적기 정비로 민원발생 최소화
- 보안등 조명환경 조성을 위해 연차적 예산 투입

□ 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위 : 백만원)

구 분	사 업 비 (등 수)	연 도 별			
		2009	2010	2011	2012(장래)
계	2,300 (18,200)	400 (3,900)	400 (3,600)	700 (5,200)	800 (5,500)
보안등 신설·개량	1,520 (2,350)	230 (400)	250 (450)	480 (700)	560 (800)
보안등 유지 보수	780 (15,850)	170 (3,500)	150 (3,150)	220 (4,500)	240 (4,700)

- 2010년 계획 (단위 : 백만원)

구 분	구 역 별					
	계		1 구 역 (영등포·당산·양평·문래·도림동)		2 구 역 (신길·대림동)	
	공사비	등수	공사비	등수	공사비	등수
계	400	3,600	190	1,760	210	1,840
보안등 신설·개량	250	450	120	210	130	240
보안등 유지 보수	150	3,150	70	1,550	80	1,600

IV. 특 수 사 업

1 당산동 ~ 여의서로간 보도육교 설치

당산동 삼성3차 APT ~ 여의도 국회 윤중로간 보행다리를 설치하여 시민들의 보행불편 해소 및 지하철 9호선과 연계하여 한강시민공원 접근의 편리성 제공

□ 사업목표 : 여의도샛강 생태공원과 『한강르네상스』 프로젝트 계획과 연계하여 시민 볼거리 제공

□ 추진방향

- 위치 : 당산동 삼성APT ~ 여의도 여의서로간
- 규모 : B=4.5m, L=315m
- 사업기간 : '10 ~ '12
- 사업비 : 16,000백만원

□ 세부 추진계획

○ 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	2009	2010	2011	장래	비고
추진 내용	기본및타당성조사용역	160		160			
	설계 및 감리비	1,500			200	1,300	
	공사	14,340			3,000	11,340	
	보상비						
총사업비		16,000		160	3,200	12,640	

※ 14,340백만원 × 1.25% = 179백만원 (적용 160백만원)

□ 향후 추진계획

- '10. 1월 : 기본 및 타당성조사 용역
- '10. 9월 : 용역완료
- '10. 9월 : 투·융자심사 요청

위 치 도

