

구의회 2009년 제 1차 정례회

'09. 7. 1 ~ 7.14

2009년도

주요업무 추진현황



건설교통국

순 서

- 일반 현황 1
- 정책목표와 방향 4
- 주요업무 추진실적 및 계획 ... 5

I. 일 반 현 황

1 인 력

구 분	계	가로경관과	도 로 과	치수방재과	교통행정과	주차문화과
정 원	196	34	35	43	50	34
현 원	186	35	32	41	46	32
과부족	△10	1	△3	△2	△4	△2

※ 비전임 계약직(주차단속원 29명)

2 조 직



3

주요시설 및 장비

가로시설물 현황----- (가로경관과)

- 가로판매대 94, 구두수선대 90, 노점상 단속초소 3

도로시설물 현황 ----- (도 로 과)

- 도 로 : 387km [(도로율 23.16% 서울시 21.68%),포장을 100%]
- 간선도로 : 75.66km(경인로 외 27개소)
- 시 설 물 : 47개소 (교량12 고가차도6 보도육교11 지하차도10 지하보도3 입체교차로5)
- 가 로 등 : 8,538등
- 보 안 등 : 9,356등

하수도시설 현황 ----- (치수방재과)

- 하수관거 455,776m 맨홀 8,864개소 빗물받이 21,308개소

빗물펌프장 : 8개소 펌프 51대 (영등포·신길,양평1·2, 문래·대림2·3,도림2)

간이펌프장 : 7개소 펌프16대

하 천 현황 : 4개소 16.94km (한강,안양천,도림천,대방천)

자동차 등록 ----- (교통행정과)

계	승용 차	승 합 차	화 물 차	특수자동차	비 고
146,688	113,894	8,968	23,239	547	

건설기계 등록

계	영 업 용	자 가 용	관 용	비 고
16,241	15,135	1,097	9	서울시 전체(47,620대)의 34%

주차장 현황 : 9,579개소 170,992면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소 계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소 계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소 계	그린 파킹	일반 주택	공 동 주택	일 반 건축물
개소	9,579	79	18	45	16	125	24	2	99	9,375	1,366	2,566	2,833	2,610
면수	170,992	8,507	6,631	983	893	9,345	2,355	442	6,548	153,140	2,252	8,896	69,070	72,922

CCTV 현황 : 148대

- 불법 주·정차 단속용 : 80대 ○ 그린파킹 감시용 : 68대

4

예산 현황

□ 예산 현황


(단위 : 천원)

부서명	예산액	집행액	집행율 (%)
총 계	74,158,505	22,220,839	30.0
가로경관과	693,938	283,394	40.8
도로과	15,566,323	6,328,538	40.7
치수방재과	14,517,989	5,016,607	34.6
교통행정과	1,016,255	460,207	45.3
주차문화과 (특별회계)	42,364,000	10,132,093	24.0

□ 주요 사업예산 현황

예산총액	정책사업	단위사업	세부사업
74,158,505천원	11건	21건	69건

II. 정책목표와 방향



III. 주요업무 추진실적 및 계획

쾌적하고 편리한 가로경관 조성

1 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업목표

- 도로 본래 기능 회복 및 시민 통행권 확보
- 신발생 노점 최대 억제 및 발생 즉시 강제수거

□ 정비대상 : 총 2,177개소

- ┌ 기업형 노점 : 113개소
- ├ 노 점 상 : 484개소
- └ 노상 적치물 : 1,580개소

□ 추진실적

- 도로법 위반 변상금 및 과태료 부과 (6.15현재)
 - ┌ 과 태 료 : 203건 36,140천원
 - ├ 변 상 금 : 125건 48,413천원
- 강제 수거 : 1,060건
 - ┌ 노 점 상 : 621건
 - ├ 노상 적치물 : 439건
- 고 발 : 15건
- 안내문 배부 : 3,652매

□ 향후 추진계획

- 시민불편 가중지역 노점상 중점 정비
 - 단속지역 : 지하철역, 버스정류장 주변 및 야간 여의도 포장마차 등
- 정비방법
 - 지하철역, 버스정류장 주변 : 매일 정비
 - 야간 포장마차 : 주1회 야간단속 실시
 - 강제정비 노점상은 과태료 부과 및 상습노점상은 고발 조치
 - 당산역 주변 및 여의도 국제 디자인거리 조성 지역 : 매일 용역 배치하여 제도 및 정비

2 보도상 영업 시설물 관리

□ 사업목표

- 깨끗하고 아름다운 도시미관 향상
- 보도상 영업 시설물 관리를 통한 시민 보행권 확보

□ 시설물 현황 : 184개소

- 가로판매대 94개소, 구두수선대 90개소

□ 추진실적

- 시설물 특별점검 실시 ('09. 4.1 ~ 4.30)

- 시 정 명 령 : 15개소
- 과태료 부 과 : 12개소 1,400천원

- 수시 점검을 통한 자율정비 및 강제정비
- 보도상 영업 시설물 교체 ('09.2월)
 - 가로 판매대 26개소 교체 (총 184개소)

□ 향후 추진계획

- 보도상 영업 시설물 교체 추진
 - 가로판매대(68개소) 및 구두수선대(90개소) 교체
- 정기 및 수시 점검을 통한 보도상 영업 시설물 관리 철저
- 중점 점검사항
 - 전대·전매, 허가장소 임의변경, 시설물 구조변경
 - 음식물 조리행위 여부, 허가면적 이외 장소에 상품 및 기타 물건적치
- 운영자 준수사항 위반자에 대해 행정조치 (시정명령, 허가취소)
- 가로 판매대 전기 안전점검 실시

3 노점 및 불법 적치물 정비 홍보를 위한 희망근로자 운용

□ 목 적

- 가로환경을 저해하고 주민생활에 불편을 초래하는 노점상 및 불법 노상 적치물에 대해 희망근로 사업과 연계 제도 인력을 투입하여 홍보 및 자율 정비를 유도하여 쾌적한 도시 경관을 조성

□ 추진방법

- 추진기간 : '09. 6. 1 ~ 11. 30(6개월)
- 근무시간 : 주 5일 (09:00~18:00)
- 인 원 : 50명
- 정비지역 : 전 지역 (9개조 편성 운영)
- 각 조별 지역장 및 구역장을 선정하여 홍보 및 제도 활동 추진

□ 추진실적

- 점포앞 적치물 정비 홍보물 배부 및 제도 : 1,785건
- 사전 제도를 통한 통행로 확보

□ 기대효과

- 깨끗한 거리환경 조성 및 시민 통행로 확보
- 가로정비 인력부족 해소와 신규노점 사전예방
- 희망 근로자를 통한 일자리 창출에 기여

공익사업 수행을 위한 보상

4 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

□ 사업개요

- 대상 사업 : 총 6개사업 (신규사업 3, 계속사업 3)
 - 도로개설 : 영진시장~대신시장 간 도로개설 외 3개소
 - 공원조성 : 신길동 68-3 일대(경부3녹지) 녹지조성 외 1개소
- 대상 건수 : 229건 (토지 51, 지장물 60, 영업권 59, 주거이전비 59)
- 사업 예산 : 13,202백만원 (시비 5,760, 구비 7,442)

□ 추진실적 (보상완료 2, 협의중 4)

(단위 : 천원)

연번	사업명	보상예산	사업규모	보상대상/추진실적	비고
1	대림동 1051-9 ~ 810-56 간 도로개설	445	B: 6m L: 158m	- 토지 : 11/11 - 지장물 : 24/24 - 영업권 : 8/ 8	보상완료
2	꽃담 마을마당 조성	2,312	807.5㎡	- 토지 : 2/2	보상완료
3	영진시장~대신시장 간 도로개설	3,884	B: 15m L: 24m	- 토지 : 6/2 - 지장물 : 5/0	협의촉구 발송
4	신길동 227-6 ~ 260-3 간 도로개설	801	B: 8m L: 60m	- 토지 : 1/0 - 지장물 : 2/0	협의공문 발송
5	도림로 확장공사	2,000 (시비)	B: 25~30m L: 800m	- 토지 : 4/0 - 지장물 : 4/0	협의공문 발송
6	신길동 68-3 일대 녹지조성	3,760 (시비)	A: 7,912㎡	- 토지 : 28/14 - 지장물 : 25/24 - 영업권 : 51/50 - 주거이전비 : 26/21	협의공문 발송

□ 향후 추진계획

- 협의 중인 4개 사업은 7월중 수용재결 신청예정 (9월중 보상완료)

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

5 도림로 도로확장공사(시비) 도로계획담당관,균형발전촉진본부

□ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→ 35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비촉진지구내)
 - 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 1997년 ~ 2013년
- 총사업비 : 61,070백만원(보상비 56,720 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,590백만원(보상비 21,440 공사비 1,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,480백만원(보상비 35,280 공사비 3,200)
- ※ '09 예산 : 2,000백만원(보상 ; 일반회계)

□ 추진실적


- 보 상
 - '09. 3.19 : 실시계획인가(L=800m중 300m)
 - '09. 4.22 : 보상계획수립 및 공고
 - '09. 6.10 : 보상협의 통보(4필지 275㎡)

□ 향후 추진계획

- 미 협의 시 수용재결 예정('09. 8)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림로 도로확장공사

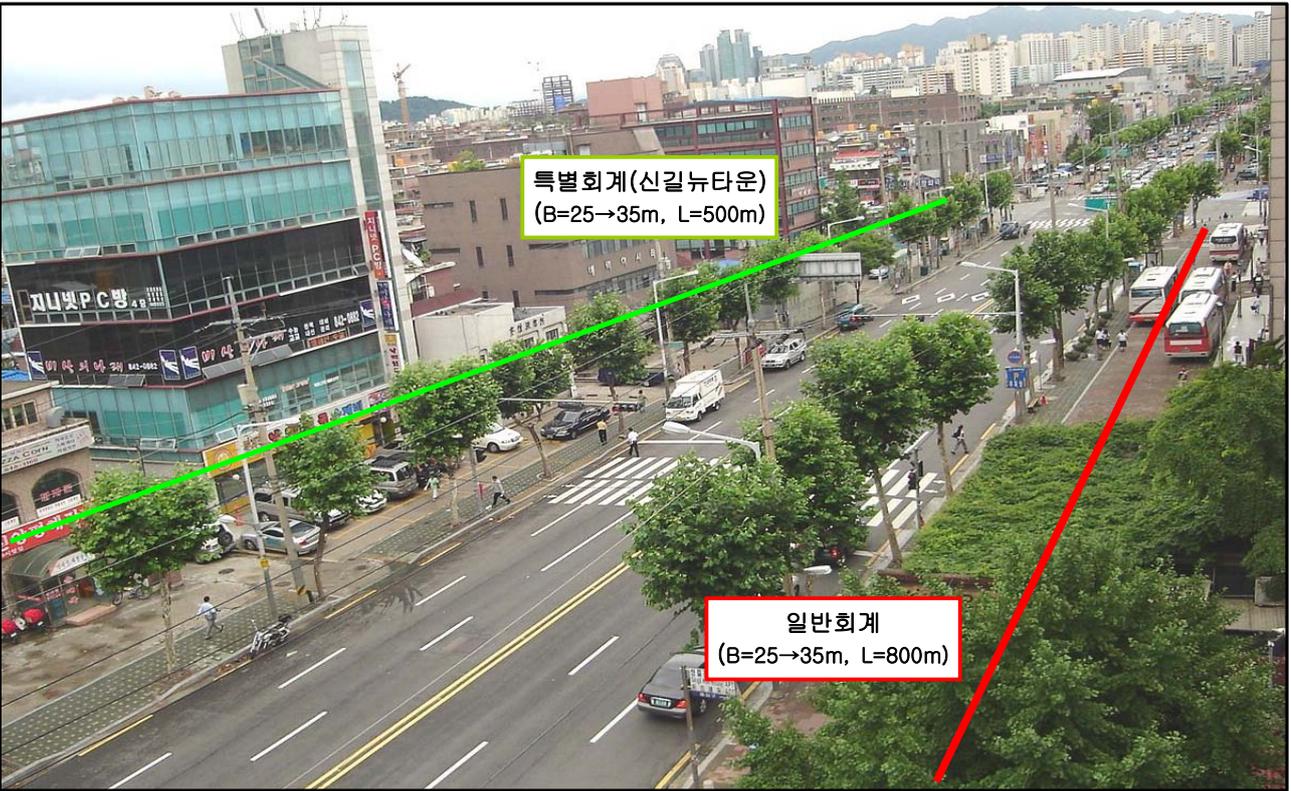

□ 사업개요

- 위 치 : 해군호텔앞 부지 (신길7동 1870)
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=140m
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 사 업 비 : 7,800백만원 (보상비 7,400 공사비 400)
 - '09년 예산 : 3,884백만원 (보상비: 2차구간 3,700 기개설구간 184)

※ 총 사업개요

- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(미개설 : 140m)
- 사업기간 : 1994년 ~ 2011년
- 총사업비 : 23,910백만원 (보상비 20,139 공사비 3,656 설계비 115)

□ 추진실적



- 보 상(잔여구간 L=140m)
 - '09. 2.12 : 사업인가 고시
 - '09. 4.23 : 보상협의 통보(4필지 1,638 m^2)
 - '09. 5.~6월 : 보상협의 촉구(2회)

□ 향후 추진계획

- 협의 불응 시 수용재결 신청('09. 7)
- 수용재결 결과 보상금 수령 거부 시 공탁예정('09. 10)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 영진시장~대신시장간 도로개설공사

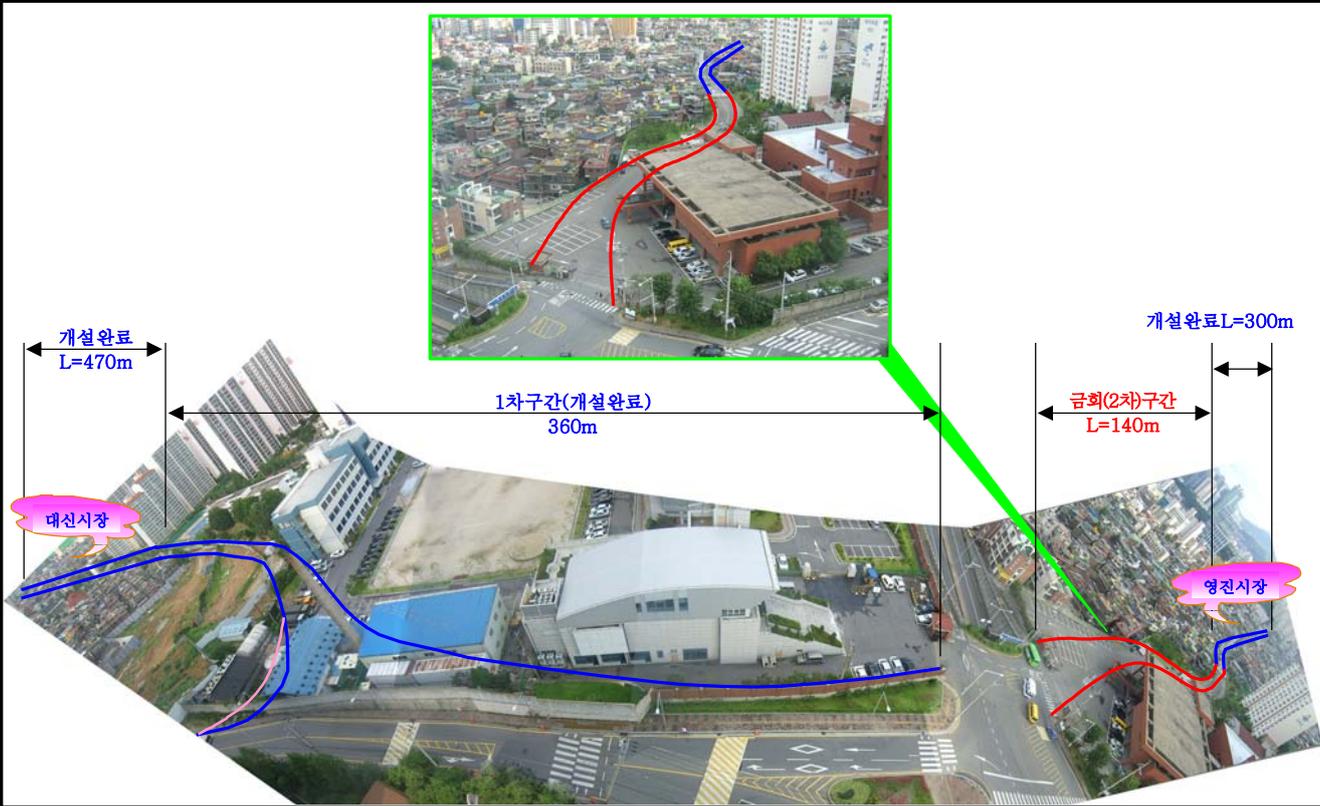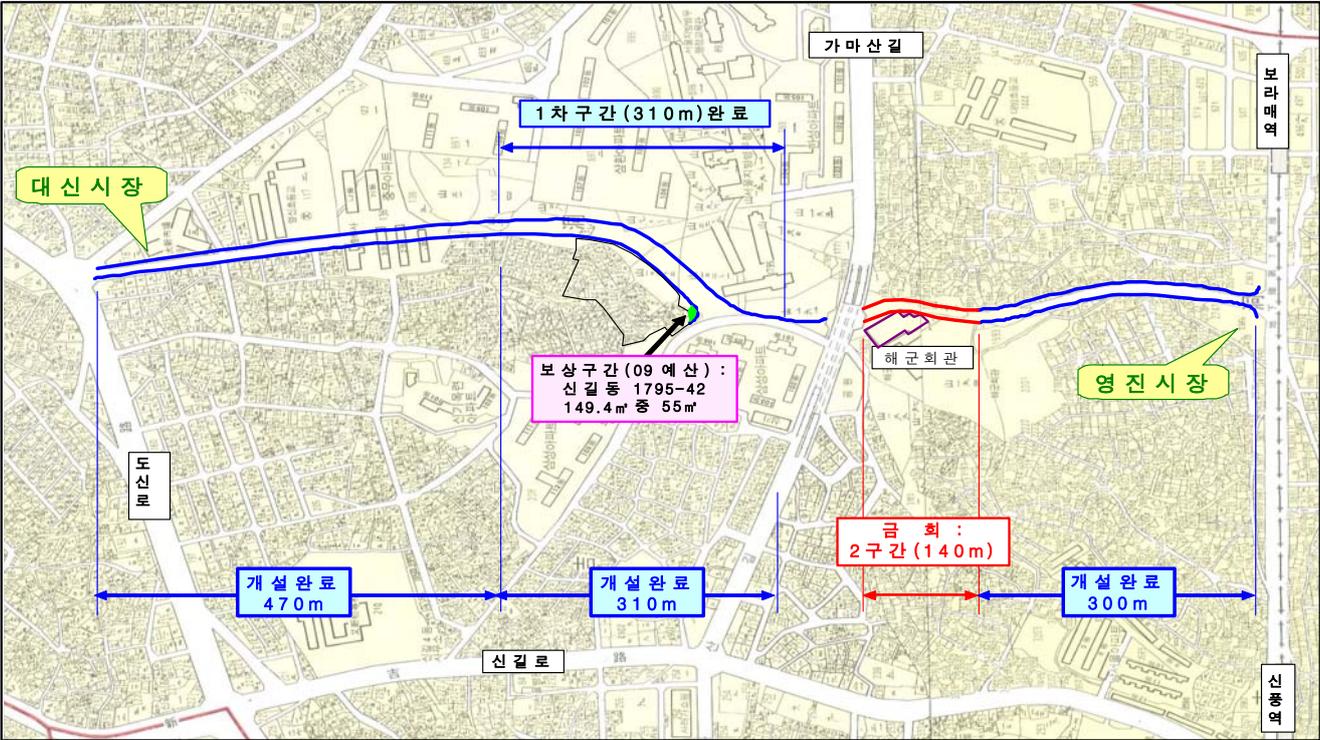

7 대방천변 도로개설공사

□ 사업개요

- 위치 : 신길동 381-9 ~ 신길동 455-19간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - 기개설 : 660m('98년 ~ '01년)
 - 미개설 : 420m
- 사업기간 : 1998년 ~ 2012년
- 총사업비 : 9,150백만원(보상비 7,700 공사비 1,400 설계비 50)

□ 추진실적


- 대방천변 도로개설공사 실시설계 용역 실시
 - 용역기간 : '09. 1. 30 ~ 5.29
 - 사업비 : 50백만원
 - 시행사 : 대한콘설탄트 (주) 대표 정진우

□ 향후 추진계획

- '09년 6월 실시설계용역 완료 후 본청에 시비3,000백만원 요청

위 치 도

▶ 공사명 : 대방천변 도로개설공사

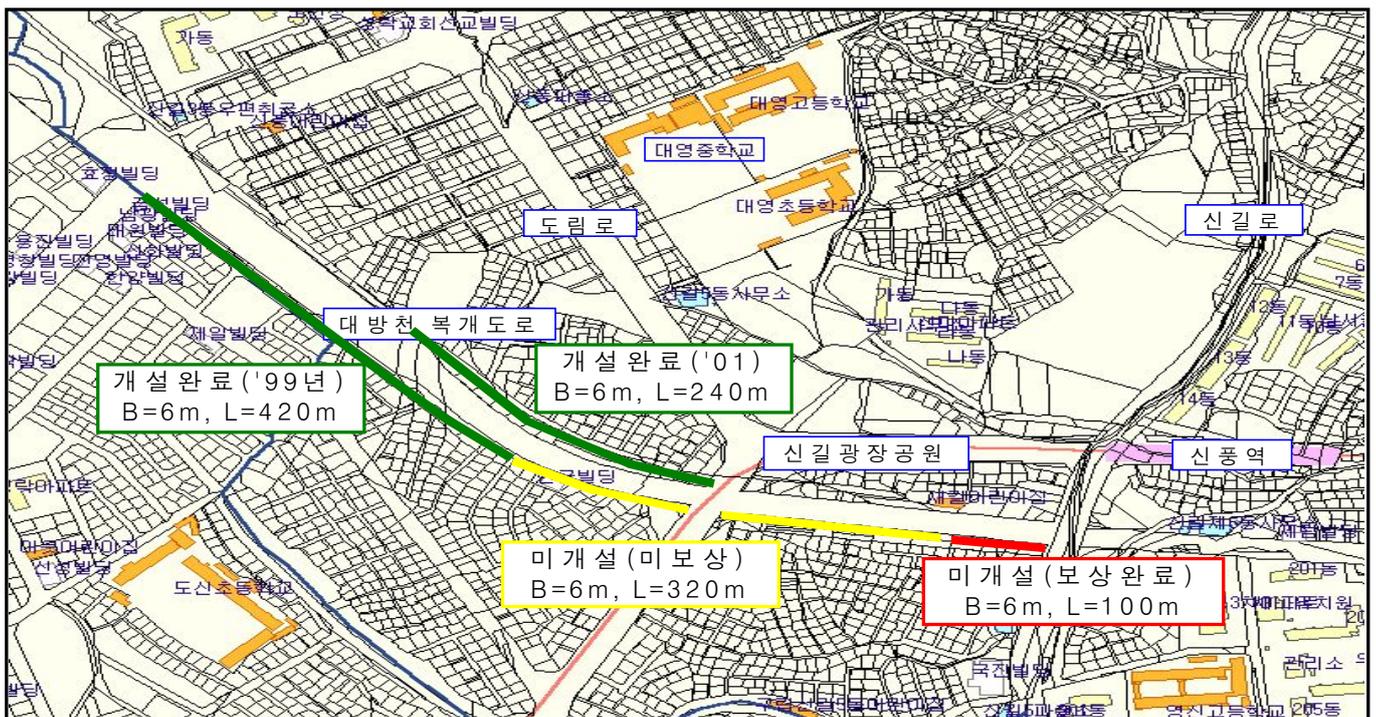

밝고 쾌적한 거리조성

8 노후 조명시설 연차적 개선추진 (시·구비)도로관리담당관

□ 사업개요

- 사업비 : 1,446백만원(구비61,시비1,385)
- 대상노선
 - 도림천로,용호로,여의동로 : 가로등설치 254등
 - 여의도주거지역 광원교체 : 132등
- 효과
 - 가로등안전사고예방 및 도시미관향상
 - 고효율,고연색성 자재사용으로 에너지 절약

□ 추진실적

- 여의도주거지역 광원교체 : '09.5.6일 준공
- 도림천로 : 배관 및 기초공사완료

□ 향후 추진계획

- 도림천로 : '09. 8월말 준공 예정
- 용호로,여의동로 : '09.10월말 준공 예정(보도환경개선과 병행시공)

9 골목길 밝은거리 조명환경 조성

□ 사업개요

- 사업비 : 400백만원
- 위 치 : 관내 전지역
- 보안등 신설·개량(310개소), 유지보수(3,100등)

□ 추진실적

- 보안등 신설·개량 220개소 완료
- 보안등 유지보수 1,700등 완료

□ 향후 추진계획

- 주민민원요청에 따라 지속적인 보수 및 신설
- 연말까지 노후 보안등 적출, 개량으로 전기안전사고 예방

안전한 도로 유지 관리

10 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선

□ 사업개요

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 41,750m
- 사업기간 : '09. 2 ~ 12월
- 사업규모
 - 보도정비 : A = 57a
 - 아스팔트정비 : A = 106a
 - 콘크리트포장 : A = 4a
- 총사업비 : 1,800백만원

□ 추진실적

- 공사착공 : '09. 2. 4
- 공사실적(공정 90%)
 - 문래동(5가) 5-10~8외 60개소 정비완료

□ 향후 추진계획

- '09. 11월 준공 예정

11 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 및 장애인편의시설 설치

□ 사업개요

- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업기간 : '09. 1 ~ 12월
- 사업규모
 - 지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
 - 난간 · 과속 방지턱 및 볼라드 설치 등 도로부속시설물
 - 횡단보도 신설 및 이전, 보도진출입부 점자블록 설치 등 장애인편의시설
- 총사업비 : 1,100백만원

□ 추진실적

- 공사착공 : '09. 1. 30
- 공사실적(공정 90%)
 - 과속방지턱 설치 및 보수 62m, 과속방지턱 도색 3,560 m^2
 - 디자인웬스설치 및 보수 220경간
 - 장애인편의시설 설치 및 보수 6a

□ 향후 추진계획

- '09. 11월 준공 예정

12 용호로 및 여의동로 보행환경 개선사업 (시비+ 구비)

□ 사업개요

- 사업위치 : 용호로(원효대교남단~여의교북단) 및 여의동로(여의교북단~여의상류C)
- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1.7km, A=120a
- 사업기간 : '09. 1 ~ '09. 11
- 총사업비 : 1,785백만원(시비 892백만원, 구비 893백만원)

□ 추진실적

- 실시설계용역
 - '09. 1월 : 실시설계용역 발주
 - '09. 3월 : 실시설계 시행
 - '09. 3 ~ 4월 : 서울시 보도디자인 심의
 - '09. 5월 : 용역준공
- 공 사
 - '09. 6.12 : 공사착공

□ 향후계획

- '09. 11월 : 공사 준공

13 여의도 지하보도 일대 보행환경 개선사업

□ 사업개요

- 사업위치 : 여의도 지하보도 3개소(여의초교 앞, 원효대교 앞, KBS별관 앞)
- 사업규모
 - 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기 설치 2개소
 - 지하보도 환경개선 1개소(바닥타일교체 A=160m², 벽면타일교체 A=600m², 천정판 교체 A=250m², 계단보수 150m², 캐노피교체 N=2개소)
- 사업기간 : '08. 3.~'10.12
- 총사업비 : 845백만원

□ 추진실적

- 지하보도 폐쇄 : 2개소
 - 원효대교 앞, KBS별관 앞 지하보도 폐쇄
- 신호기 및 횡단보도 설치 : 4개소

□ 향후 추진계획

- 2010년 여의초교 앞 지하보도 보행환경개선사업 추진(연차적 사업)

위 치 도

▶ 공사명 : 용호로 및 여의동로 보도환경 개선사업



▶ 공사명 : 여의도 지하보도 보행환경 개선사업



하수관거 유지보수

14 노후·불량 하수관거 개량 (시·구비, 물재생계획과)

□ 사업개요

- 총 : 9건 / 98억원
(구비사업 : 3건 / 24억원, 시비사업 : 6건 / 74억원)
- 규 모
 - 하수관 개량공사 : 6건 / 3,190m
 - 하수암거 보수·보강공사 : 1건 / 1,290m
 - 연간단가공사 : 2건 (하수시설물 보수 및 빗물받이 준설)
- 사업기간 : '09. 1 ~ '09. 11(연간단가공사는 '10. 2월까지)

□ 추진실적

- 공사완료 : 4건(하수관개량공사 3, 암거 보수보강공사 1)
- 공사중 : 3건(하수관개량공사 3)

□ 향후 추진계획

- '09. 07 : 하수관개량공사 2건 준공 (당산동4가 30번지, 문래동 10번지)
- '09. 11 : 하수관개량공사 1건 준공 (양남사거리 주변)
- '10. 02 : 연간단가공사 2건 준공 (하수시설물 보수, 빗물받이 준설)

15 도림1배수분구 하수관거 종합정비 (시비, 물재생계획과)

□ 개 요

- 위 치 : 영등포구 대림1·2·3동, 동작구 신대방1동 지역
- 규 모
 - 면 적 : 3.24 km^2 (영등포구 2.71 / 동작구 0.53)
 - 하수관개량 : 41,350m(영등포구 33,810 / 동작구 7,540)
- 사업기간 : '09. 1 ~ '12. 12 (4년간)
- 총사업비 : 52,100백만원 (설계비 2,100 / 공사비 48,000 / 감리비 2,000)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2009년	2010년	2011년	2012.이후
계	52,100	0	2,100	17,000	16,000	17,000
실시설계비	2,100		2,100			
공 사 비	48,000			15,000	16,000	17,000
감 리 비	2,000			2,000		

□ 추진현황 및 계획

- '08. 7.31 : 하수관거 종합정비사업 추진요청 (구→시)
- '08.10 ~ '08.12 : 기술용역 타당성·예산투자심사·건설기술심의 완료
- '09. 1 ~ '09.11 : 실시설계용역 시행 (설계용역 공정 75%)
- '10. 1 ~ '12.12 : 공사시행 (연차별 집행)

□ 사업개요

- 위 치 : 구로디지털단지역 ~ 안양천 합류부
- 사업규모
 - 제방보축 : L=308m (H=0.3 ~ 2m)
 - 저수호안 정비 : L=4km
 - 자전거 및 산책로 : L=2,788m
 - 기 타 : 쉼터 3, 진입로 2, 체육시설 등
- 사업기간 : '08. 3 ~ '10. 5
- 총사업비 : 7,192백만원(시비 5,678 / 구비 1,514)

□ 추진실적

- '06. 9 : 『친환경적인 생태하천 복원계획』 (시장방침)
- '06.12 ~ '07.10 : 도림천 하천정비 실시설계용역(서울시)
- '08. 6. 18 : 시비보조사업기준 재조정 결과통보(서울시→구)
- '08.10 : 공사착공
- '08.10 ~ '09. 6 : 저수호안 조경석 쌓기 4.0km 완료

□ 향후 추진계획

- '10. 5 : 공사 준공

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동6가 99번지(한솔아파트 앞)
- 시설규모 : 지하보·차도(폭 4~12m, 높이 3.5m, 연장 110m)
- 사업기간 : '08. 10 ~ '10. 6
- 총사업비 : 21,800백만원(시비, 서울시 한강사업본부 시행)
[설계비 500 / 감리비 700 / 공사비 20,600]

□ 추진실적

- '07.10 ~ 11 : 시의원(문병렬) 건의
조은주 외 1,968인 서울시의회 청원
신영애 외 1,209인 집단민원
- '07.11 : 청원 수용(서울시의회)
- '07.12.28 : 민원처리결과 통보(한강사업본부 → 영등포구)
- '08.04.16 : 서울시 투자사업심사분석 의뢰
(영등포구 → 한강사업본부)
- '08.06.25 : 서울시 투자사업 실무심사
(기본계획 및 사업추진방침 미 수립으로 반려)
- '08.10.23 : 기본 및 실시설계용역 시행(한강사업본부)
- '09.04.13 : 공사착공[남양건설(주), 신성월드건설(주)]

□ 향후 추진계획

- '10. 6. : 공사완료 (예정)

예방위주의 수방대책

18 수방대책 추진 (구비)

□ **사업목표** : 풍수해 사전준비대책 추진, 주민홍보 시스템 강화

□ **추진방향**

- 수방시설물 사전 점검·정비
- 수방자재 확보 및 저지대 침수지역 모래주머니 배치
- 주민들의 자발적 침수피해 예방 지원
- 대 시민 홍보시스템 강화
- 총사업비 : 230백만원 (급량비, 수방자재, 일용인부 노임 등)

□ **세부 추진계획**

- 수방시설물 점검 : 제작사, 자체 정비점검 등
- 하수도 준설시행 : 우기 전 연간목표량 60% 준설 (빗물받이 1회 이상)
- 수방자재 확보 : 모래주머니 50,000매 등
- 침수방지 예방사업 추진 : 역류방지기 및 자동펌프 설치지원
- 노후·불량 하수도 개량정비 및 수방시설물(펌프장, 수문 등)기능 강화
- 대 시민 홍보시스템 강화
 - 수방교육 및 홍보캠페인 실시
 - 배수펌프 및 강변육갑문 개폐 시운전 실시
- 사전 수해대비 자동음성동보시스템 시행(15,000세대)

수 방 시 설 유 지 관 리

19 양평1빗물펌프장 외 1개소 증설 (시기금, 하천관리과)

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동3가 57(양평1펌프장), 도림2동 254(도림2동펌프장)
- 사업규모
 - 펌프장 용량증대 : 양평1(2,424 → 4,080 m^3 /분 : 증1,656 m^3 /분)
도림2동(1,301 → 1,745 m^3 /분 : 증444 m^3 /분)
- 사업기간 : '07. 12 ~ '10. 8
- 총사업비 : 23,823백만원(설계비 723 / 감리비 1,100 / 공사비 22,000)

□ 추진실적

- '07.4~10 : 기상이변을 대비한 빗물펌프장 수방대처능력 향상을 위한 기본계획용역 시행(서울시)
- '07.12~'08.8 : 기본 및 실시설계용역 시행
- '08.5~8 : 디자인 자문 및 설계심의
- '08. 9 : 계약심사 완료
- '08.12. 4 : 재난관리기금 심의완료 (기금배정)
- '09.1 : 공사착공
- '09.1 ~ 6 : 토출관 추진공사 완료
(양평1 : D=2,000 mm 3열, L=78m
도림2 : D=1,500 mm , L=26m)

□ 향후 추진계획

- '10. 8 : 공사 준공

□ 사업개요

- 수문 정밀점검 용역실시
- 모터펌프보수 및 노후전기설비 개량
- 펌프장 건물 및 조명설비 보수

□ 추진실적

- 수문 정밀점검 용역 실시 완료
 - 규 모 : 강변4호 수문 외 8개소
 - 사업기간 : '09. 1. 20 ~ '09. 3. 27
 - 사 업 비 : 45백만원
- 모터펌프 보수 및 노후전기설비 개량 완료
 - 규 모 : 펌프수리 4대, 배전반 3면, 변압기 2대 교체 등
 - 사업기간 : '09. 1. 22 ~ '09. 4. 10
 - 사 업 비 : 160백만원
- 펌프장 건물 및 조명설비 보수 완료
 - 규 모 : 문래·양평2·영등포·신길펌프장
 - 사업기간 : '09. 1. 22 ~ '09. 4. 10
 - 사 업 비 : 80백만원

21 수방시설 장비개량 및 유지보수(시비)

□ 사업개요

- 재해대책상황실 모니터교체
- 강변육갑문 개량

□ 추진실적

- 재해대책상황실 내부 인테리어 및 모니터 교체 완료
 - 규 모 : LCD모니터 교체(8대), 상황실 내부 인테리어
 - 사업기간 : '09. 1. 22 ~ '09. 3. 4
 - 사 업 비 : 45백만원
- 강변육갑문 개량 완료
 - 규 모 : 권양기 5톤 및 문비(4m x 3.5m) 교체
 - 방 식 : 상하 여닫이 → 수직롤게이트
 - 사업기간 : '08. 11. 1 ~ '09. 4. 30
 - 사 업 비 : 250백만원

재난관리체계의 확립

22 재난 및 안전관리 종합대책

□ 사업개요

- 안전관리체계 구축 및 주민홍보 강화
- 각종 재난대비 주민 홍보물 제작 배부

□ 추진실적

- 주민홍보 강화
 - 재난대비 국민행동매뉴얼 ‘안전길잡이’ 제작 배부 : 2,500부
- 국가 재난대응 안전한국 훈련 실시
 - 도상 및 실제훈련 병행실시 : 1회
- 안전문화운동 홍보물 제작 배부 : 지갑티슈 25,000매

□ 향후 추진계획

- 재난대응 현장조치매뉴얼 제작
- 풍수해보험(단체보험) 가입 실시
- 사전재해 영향성검토 지속 추진
- 안전문화운동 홍보물 제작 배부
- 2010년 안전관리계획 제작 배부

녹색 교통 이용 활성화

23 자전거도로 개설사업 (구비+시비) < 자전거교통추진반

□ 사업개요

○ 대상구간 : 5개구간 9.3km

연번	가로명	자전거도로 구간	연장 (km)	비고 (주요경유)
1	양산로	양평3가 30-17(안양천육교) ~ 당산동1가 2001-(경남@)	1.5	안양천, 구청역
2	오동나무길 글마당길	양평2가 3-1(양평역) ~ 문래6가 55(현대6차@)	0.6	관악고교
3	한어울길 한전길 풍요길	양평1가 20(신동아@) ~ 문래3가 21번지	1.2	문래역
4	동아리길 문학길, 통운길	양평2가 25(관악고교) ~ 문래3가 53(룩스)	1.5	문래역, 흥플러스
5	당산로 도림로	당산3가 393(현대해상) ~ 대림2동 1051(유도회관)	4.5	문래, 구청, 대림역

□ 추진실적

구간	자전거도로 구간	연장 (km)	단계별 추진실적				
			기본계획	합동조사(경찰)	규제심의	실시설계	시비확보
①	양평3가 30-17(안양천육교) ~ 당산동1가 2001-(경남@)	1.5	● (완료)	● (완료)	● (완료)	● (완료)	● (진행중)
②	양평2가 3-1(양평역) ~ 문래6가 55(현대6차@)	0.6	● (완료)	● (완료)	● (완료)	● (완료)	● (진행중)
③	양평1가 20(신동아@) ~ 문래3가 21번지	1.2	● (완료)	● (완료)	● (완료)	● (완료)	● (완료)
④	양평2가 25(관악고교) ~ 문래3가 53(룩스)	1.5	● (완료)	● (완료)	● (6월 예정)		
⑤	당산3가 393(현대해상) ~ 대림2동 1051(유도회관)	4.5	● (완료)	● (완료)	● (6월 예정)		


○ 1번, 2번축 사업비 요청 (09.5.25) : 583백만원

○ 3번축 사업비(시비) 확보(09.5.20) : 344백만원

□ 향후추진계획

○ 3번축 : 09.9월 완료 예정

□ 위치도

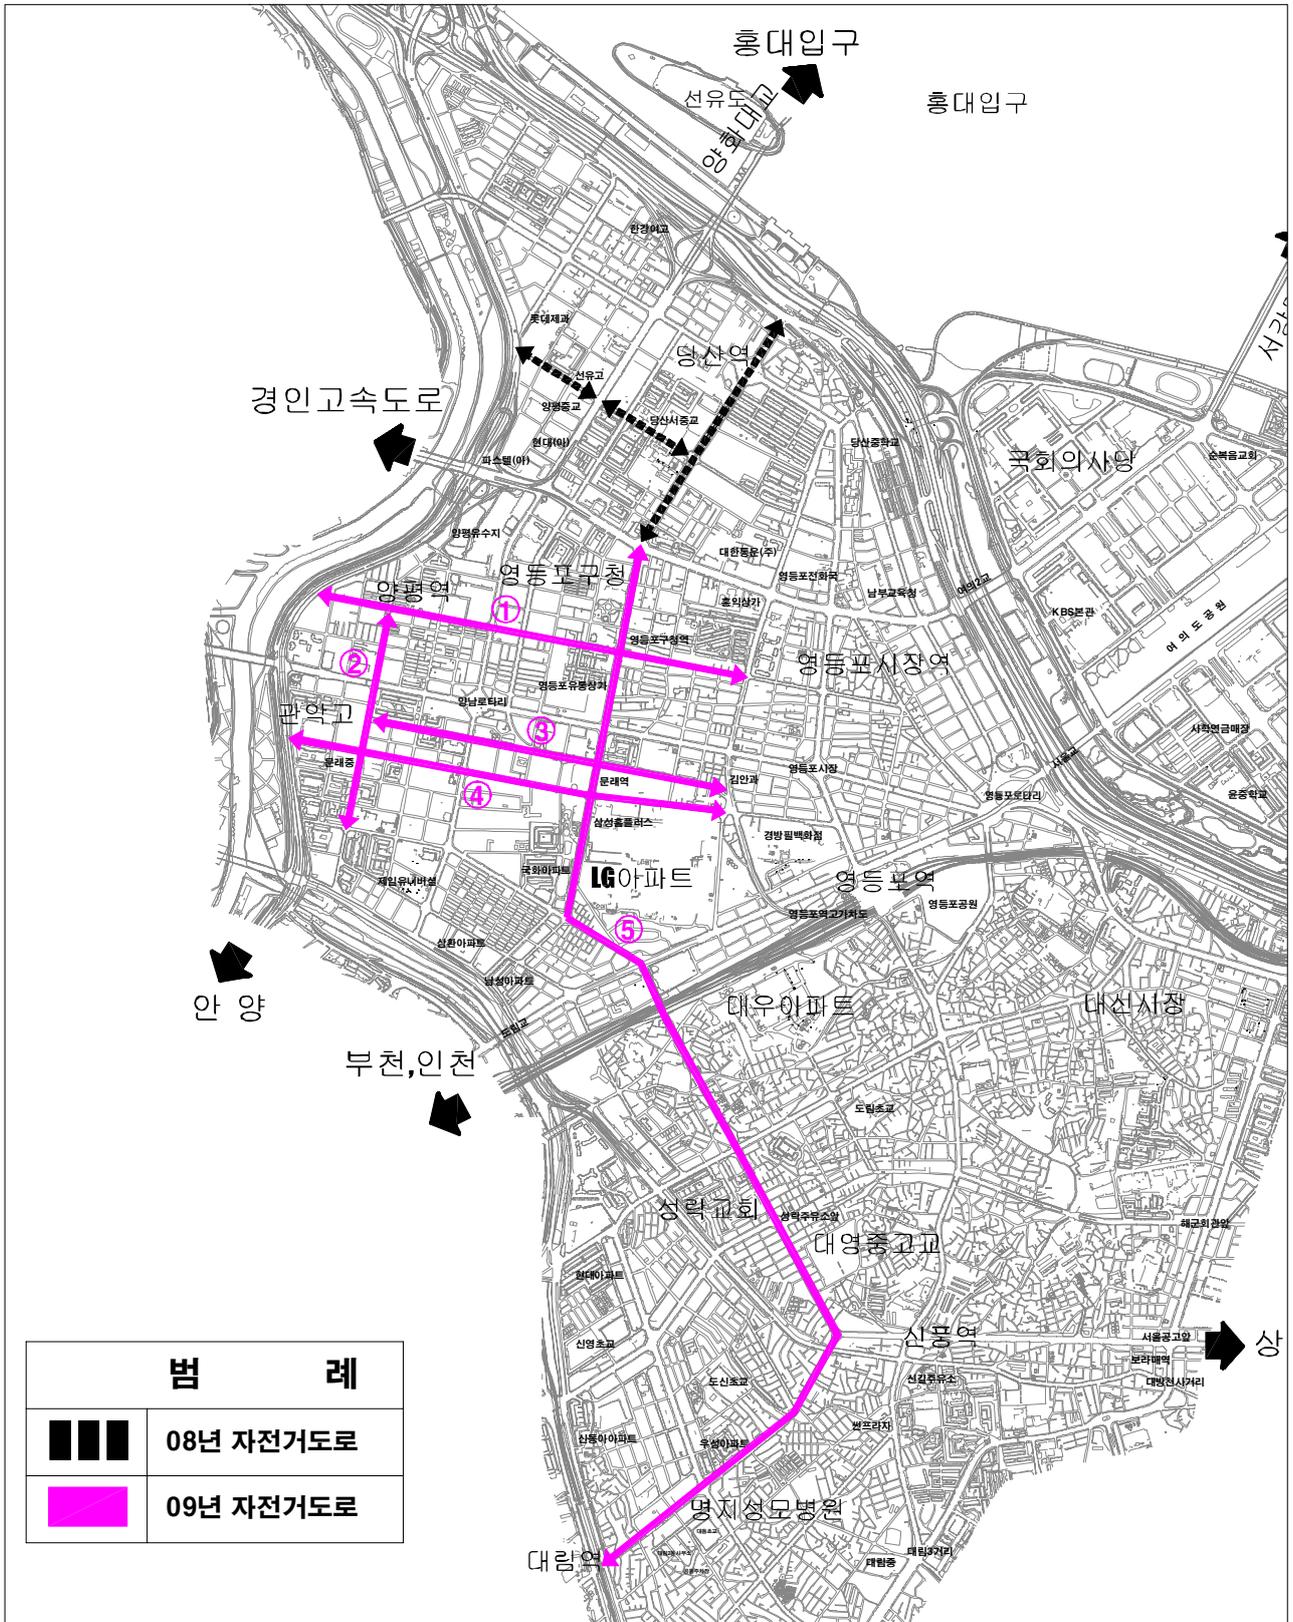

□ 사업개요

- 자전거전용도로 11개구간 14.4km, 자전거보관대 900대 확보
- 공공임대 자전거 대여소 설치 (22개소 220대)

□ 추진실적

【 여의도 자전거도로 개설사업 】

- 08.11.14 : 설계용역 추진 (기간연장 당초 09.3.14 → 6.30)
- 09.6.1 : 9개구간 11km 서울지방경찰청 규제완료

【 여의도 공공자전거 시스템 구축 】

- 09.2월 : 사업계획 방침
- 09.4월 : 공공자전거 시스템구축 용역 공고
- 09.5월 : 공공자전거 시스템구축 제안서 접수 및 평가

□ 향후 추진계획

【 여의도 자전거도로 개설사업 】

- 09.6월 : 2개구간 3.4km 경찰청 규제완료 예정
- 09.7월 : 공사시행

【 여의도 공공자전거 시스템 구축 】

- 09. 9월 : 시스템구축 용역완료
- 09.11월 : 시범사업자 선정
- 09.12월 : 시스템설치 및 시험운영
- 2010.3월 : 정상운영 시작

고객중심의 쾌적한 교통환경 조성

25 어린이보호구역(School Zone)환경개선(시비)〈교통운영담당관〉

□ 사업개요

- 추진기간 : '09.1 ~ 09.12
- 사업대상 : 어린이집 8개소
(신길5동, 무지개영재, 국회, 해태, 남서울, 은석, 양평1동, 신이화 어린이집)
- 개선내용
 - 도로시설 : 보도칼라포장, 고원식교차로, 방호울타리 설치 등
 - 교통시설 : 횡단보도, 통합교통안전표지 및 기타 노면·표지판 설치
- 예산확보액 : 260,000천원 (시비50% 국비50%)

□ 추진실적

- 09. 1.15 : 용역사업 계약(도로교통공단) 완료
- 09. 3.30 : 서울지방경찰청 교통규제심의 완료
- 09. 4.14 : 용역사업 완료
- 09. 5.15 : 어린이보호구역 개선사업 공사 착공
- 09. 6.15 : 공사(토목) 중 (진행율 8%)

□ 향후 추진계획

- 09. 7.24 : 공사완료 예정

□ 사업개요

- 추진기간 : 2009년 중
- 추진내용
 - 민원담당공무원에 대한 친절 및 One-Stop 직무교육 강화
 - 교통민원서비스현장의 조기 이행 정착
 - 민원처리 상황의 공개로 투명성 확보

□ 추진실적

- 민원창구공무원 one-stop민원처리 직무 교육 실시
 - 대 상 : 10명(자동차등록민원창구 세무 취득등록담당)
 - 교육일시 : 매주 화요일 및 기타 민원처리 문제점 발견시
 - 추진실적 : 총 22회(주 1회)
- 대민원 친절교육 실시
 - 교 관 : 자동차등록팀장
 - 교육대상 : 자동차등록계직원 12명
 - 추진실적 : 총 22회 (주 1회)
- 자동차등록 도우미 운영실적
 - 민원 서식대서 4,200여건 및 자동차번호판 탈부착 3,500여건
- 민원실 편의 시설 및 환경개선: 민원실 화분비치 5개 비치
- 민원처리온라인공개시스템 운영 : 일일결산 확행

□ 향후 추진계획

- 지속적인 교육 실시로 신속, 공정한 민원처리 및 민원불편사항 해소
 - 친절미소띠우기 및 반갑게 맞이하기
- 주민 만족도 설문조사 실시

법규위반 단속으로 준법정신 고취

27 버스전용차로 소통의 원활화

〈교통지도담당관〉

□ 사업개요

- 추진기간 : '09.1 ~ 09.12
- 버스전용차로 현황 (7개 노선 11.14km)
 - 가로변전용차로 : 3개노선6.85km(노량진로, 용호로, 영등포로, 양평로)
 - 중앙 전용차로 : 4개 노선 4.29km(경인로, 시흥대로, 대방로)
- 버스전용차로 단속노선 (2개 노선 4.9km)
 - 가로변 전용차로 : 용호로, 영등포로
- 운영방법
 - 전담단속반 운영 : 기능직2명, 공익8명
 - 근무시간 : 08:00~17:00
 - 위반행위자에 대해서는 과태료 부과 처분
 - 주행목적이 아닌 우회전을 위한 전용차로 점선구간의 통행 및 승하차를 위한 점선구간의 일시진입은 단속대상에서 제외
 - 단속은 위반차량에 대하여 비디오촬영

□ 추진실적

- 단속실적 : 5,408건
- 처리내용 : 과태료(2,862건), 경찰서이첩 5건, 의견수용 309건,
의견진술중 2,232건

□ 향후 추진계획

- 버스전용차로 단속원에 대한 교육실시
 - 함정단속 등 불필요한 오해를 줄 수 있는 단속 금지 등

□ 사업개요

- 단속기간 : 2009. 1. 1 ~ 12. 31
 - ※ 설날, 추석연휴 기간은 별도로 특별대책 수립 실시
- 전담단속반 운영 : 기능직3명
- 단속시간
 - 주 간 : 07:00 ~ 18:00까지
 - 야 간 : 22:00 ~ 익일 01:00까지
 - 밤샘주차 : 24:00 ~ 익일 06:00까지
- 중점단속 대상
 - 택 시 : 승차거부, 호객행위, 합승, 부당요금 징수, 미터기 미사용 등
 - 버 스 : 정류소 무정차 통과, 정류소 질서문란행위, 정류소외 승·하차 등
 - 기 타 : 차고지외 밤샘주차, 불법 구조변경 등
- 중점단속 지역
 - 대 방 역 : 조기 근무자 배치
 - 영등포역, 당산역 주변 및 기타 민원발생 유발지역
- 단속방법
 - 사업용 차량 불법행위 단속과 승차질서 제도 병행 실시
 - 심야시간대 운전자와의 충돌 대비하여 필요시 경찰지원요청

□ 추진실적

- 단속실적 : 1,042건
 - 버스 452건, 택시 71, 화물 352건, 기타 167건
- 처리내용 : 과태료 66건, 과징금 81건, 타시군구 이첩 895건

□ 향후 추진계획

- 영업용 자동차의 준법의식 고취로 안전사고 예방
- 불법영업행위 근절로 시민 불편사항 해소

□ 사업개요

- 공사위치 : 영등포구 대림3동 780번지(대림운동장)
- 사업규모
 - 연 면 적 : 6,349 m^2
 - 주차규모 : 지하2층, 철근콘크리트조
 - 주차면수 : 192면(지하1층 95대, 지하2층 97대)
- 사업기간 : 2007.12.31 ~ 2009.04.15
- 소요예산 : 9,589백만원(시비 4,375백만원 · 구비 5,214백만원)

□ 추진경위

- '07.02.09 : 지하공영주차장 건설계획
- '08.01.11 : 공사 착공
- '09.04.15 : 준 공

□ 운영상황

- 운영주체 : 영등포구도시시설관리공단
- 주차요금 : 10분당 100원(5급지 30%할증)
- 유료운영 : '09.05.01 ~

□ 현황사진



○ 지상부 전경



○ 지하공영주차장 진출입로 전경



○ 지하1층 전경



○ 지하2층 전경

다가구, 다세대, 연립주택 등 주거 밀집지역에서 주차난이 심각하고 주차장 확보율이 낮은 지역에 주차장을 건설하여 주택가의 부족한 주차시설을 확보함으로써 지역주민들의 불편을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 영등포구 신길1동 120-82 및 120-92
- 사업규모
 - 부지면적 : 540 m^2
 - 건설내용 : 평면식 노외주차장 18면 설치
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 3
- 사업비 : 1,862백만원(추정⇒ 부지 매입비, 공사비)

□ 추진실적

- '09.02.27 : 신길1동 주택가 공영주차장 건설 계획
- '09.03.23 : 공영주차장 건설관련 소관사항 검토 협의
- '09.05.12 : 도시계획시설(주차장) 입안
- '09.05.20 : 도시계획시설(주차장) 결정 요청
- '09.06.04 : 도시관리계획(안) 열람공고
- '09.06.24 : 도시관리계획(안) 심의위원회 심의

□ 향후 추진계획

- '09. 7월 ~ 8월 : 투자심사 의뢰 및 공유재산 심의 의뢰
- '09. 9월 ~ : 토지 및 건물 보상 의뢰
- '09. 12월 ~ : 공사착공 전 실시설계

31 Green Parking(녹색주차마을)사업(시비-주차계획담당관)

주택가 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장과 녹지를 확보하여 안전하고 쾌적한 생활도로 조성으로 자연친화적인 주거환경 개선

□ 사업개요

- 대문과 담장을 허물어 주차장과 조경을 설치하여 주거환경개선
- 안전보행을 위한 쾌적한 생활도로 조성
- 보안과 불법주차 등 방지를 위한 CCTV 설치 운영
- 차고지 확보의식 정착 및 주민자율관리체계 구축

□ 추진실적

(2009. 6월)

목 표		실 적		비 고
가 구	주차면	가 구	주차면	
260	390	69	133	※ 그간실적('04 ~'08년도 1,297가구 2,119면)

※ 각 구 전반적으로 사업추진 부진

- 뉴타운, 재개발, 재건축 등으로 사업대상지 축소
- 많은 사업시행으로 사업물량 확보 및 발굴에 어려움

□ 향후 추진계획

- 금년도 사업목표 달성

구 분	담장허물기사업	생활도로조성사업	CCTV설치사업
목 표	260동 390면	1,000m	10 개소
사업시기	'09. 9월 한	'09. 7~9월	'09. 8~9월

- 다각적인 홍보활동 전개
 - 주민조성위원회 활용 및 홍보의 다양화 추진
- 서울시 인센티브 평가대비

주차질서 확립으로 주차문화 개선

32 주민에게 다가서는 주차질서 확립

날로 심화되는 도시교통을 원활히 하고 도로 본래의 기능을 확보하기 위하여 지속적인 불법주차 단속을 추진함으로써 시민편익을 증진 하고 차량의 소통을 원활히 하고자 함

□ 추진방향

- 통과성 기능이 강한 간선도로와 보조간선 도로 주변 집중단속 실시
- 주택가 접근성 도로는 탄력적 단속을 통한 생활불편 해소
- 주민불편사항의 신속한 조치 및 친절봉사 구현

□ 추진실적('09. 6월)

(단위 : 건수)

구 분	우리구			서울시			타부서 및 기관
	소 계	인 력	CCTV	소 계	인 력	CCTV	인 력
총 계	63,864	33,122	30,742	11,567	3,260	8,307	92

□ 향후 추진계획

- 기동단속조 확대 편성 : 2개조 ⇒ 3개조
 - 기동성 및 탄력적 지도단속으로 주차질서 확립
 - 취약시간대(출, 퇴근) 집중 단속
- 불법주·정차 단속공무원 친절 교육 강화 : 월 1회
- 상습불법주차지역 및 민원다발지역 수시 특별단속 실시
 - 야간, 휴무일 특별근무 확대실시
 - 기동단속반 운영으로 취약지역 및 민원사항 신속조치

관내 거주하는 어르신의 주차질서 계도활동을 통하여 어르신 사회참여 지원 및 지역사회 유대감을 형성하고 주차질서를 개선함으로써 주민 편의를 증진코자 함

□ 사업개요

- 추진근거 : 노인복지법 제23조, 구청장방침 제406호(2008.12.31)
- 사업목적 : 어르신 일자리창출과 사회참여, 선진주차질서 확립
- 사업기간 : 2009. 2월 ~ 6월(5개월)
- 참여인원 : 연인원 9,600명(1일 160명)

□ 추진실적(상반기)

- 참여인원 : 연인원 7,680명(1일/ 160명, 4시간, 월/ 12회)
- 예 산 : 206,810천원
- 실 적 : 44,600건(이동 및 계도조치)

□ 향후 추진계획

- 주요 계도활동 지역 범위 확대
 - 이면도로 및 골목진입로, 마을버스 통행로, 일방통행로
 - 어린이 보호구역 및 그린파킹사업지구 주변
- 경기활성화를 위한 하반기 일자리 추가사업 추진
 - 추경예산 편성[주차문화과-7128(2009. 4. 2)]
 - 확대사업기간 : 2009. 7월 ~ 12월(6개월)
 - 참여인원 : 연인원 11,520명(1일/ 160명)
 - 총예산 : 322,010천원 (본예산 206,810천원 + 추경예산 115,200천원)
