

제161회 영등포구의회

제1차 정례회

교육·복지·사람중심



---

# 2011년 주요업무 보고

---




건 설 국

# I. 일 반 현 황

## I 인 력

구분	계	일 반 직						기능직					기타
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급	계약직
정원	171	1	5	21	36	37	15	5	4	26	15	2	4
현원	177	0	5	30	51	10	21	4	7	38	7	0	4
과부족	6	△1	0	9	15	△27	6	△1	3	12	△8	△2	0

## II 조 직

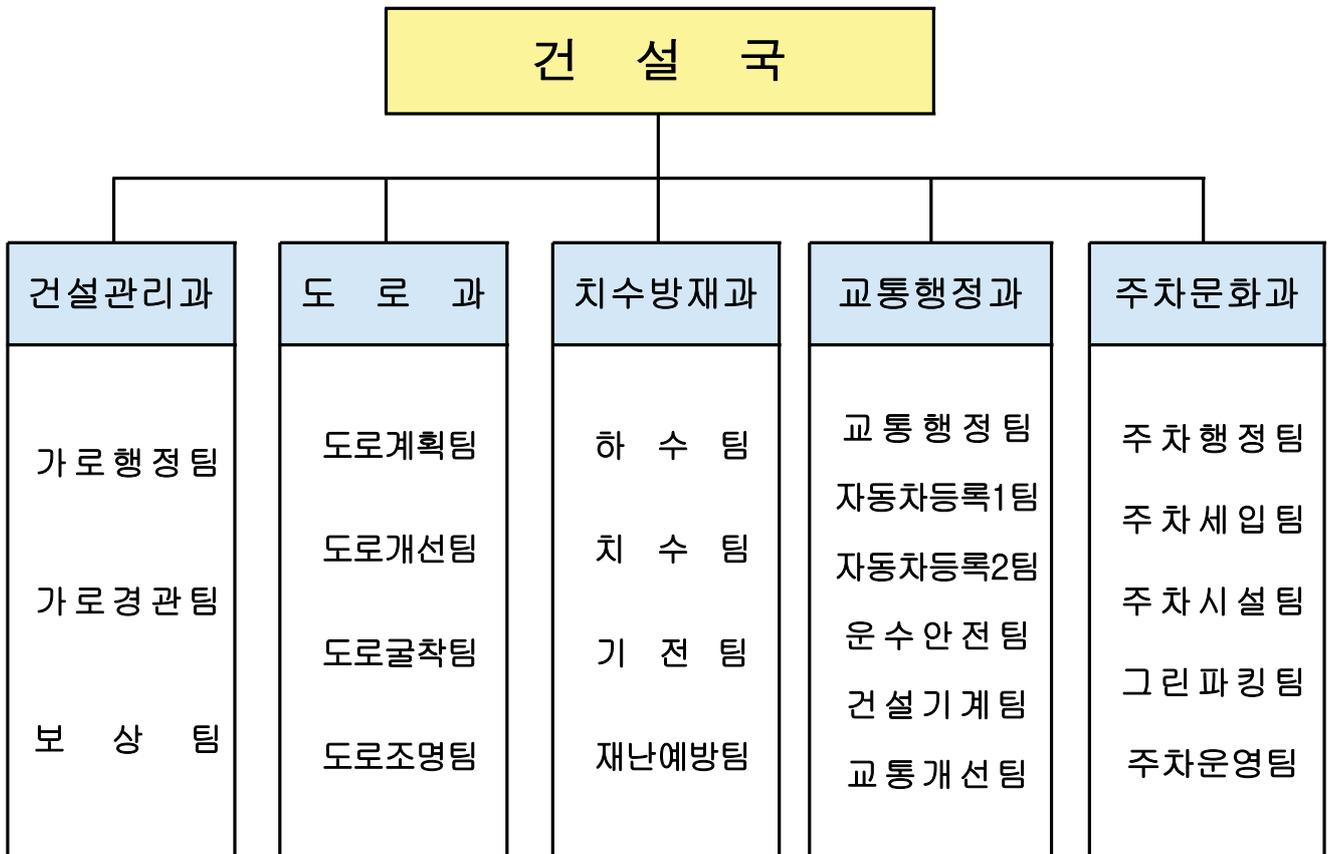

### III 주요시설 및 장비

- 가로시설물 현황** ----- (건설관리과)
  - 가로판매대 86, 구두수선대 83, 노점상 단속초소 4
- 도로시설물 현황** ----- (도 로 과)
  - 도 로 : 387km [(도로율 23.31% 서울시 21.96%),포장율 100%]
  - 간선도로 : 76.02km(경인로 외 27개소)
  - 시 설 물 : 42개소 (교량12 고가차도5 보도육교9 지하차도10 지하보도1 입체교차로5)
  - 가 로 등 : 8,658등
  - 보 안 등 : 9,894등
- 하수도시설 현황** ----- (치수방재과)
  - 하수관거 456,499m 맨홀 8,914개소 빗물받이 21,412개소
- 빗물펌프장** : 8개소 펌프 54대(영등포 양평1·2 문래 도림2 신길 대림2·3)
- 간이펌프장** : 7개소 펌프16대
- 하 천 현황** : 4개소 16.94km (한강, 안양천, 도림천, 대방천)
- 자동차 등록** ----- (교통행정과)

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	비고
141,538	108,380	7,890	24,600	668	

**건설기계 등록**

계	영업용	자가용	관용	비고
17,212	15,856	1,344	12	서울시 전체(47,753대)의 36.04%

**주차장 현황** : 9,832개소 170,314면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	9,832	66	18	37	11	137	27	2	108	9,629	1,539	2,619	2,829	2,642
면수	170,314	7,126	5,878	823	425	8,231	2,565	442	5,224	154,957	2,604	9,062	69,007	74,284

- CCTV 현황** : 172대
  - 불법 주·정차 단속용 : 84대    ○ 그린파킹 감시용 : 88대

## IV

## 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	집행액	집행율
계	67,796,118	15,601,872	23.1%
건설관리과	721,478	285,675	39.5%
도로과	16,023,915	7,348,033	45.9%
치수방재과	6,290,072	1,677,746	34.3%
교통행정과	1,021,653	293,320	28.7%
주차문화과	43,739,000	5,997,098	14%

## Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽	부 서 명
①	건전재정 확립을 위한 세외수입 증대추진 .....	5	건설관리과
②	국회 도로사용 변상금 부과에 따른 소송수행 ..	6	건설관리과
③	공익사업의 효율적수행을 위한 손실보상 추진	8	건설관리과
④	도림로 확장 공사 .....	9	도 로 과
⑤	대방천변 도로개설 공사 .....	11	도 로 과
⑥	영동초교앞 외 2개소 보도육교 철거 공사 .....	13	도 로 과
⑦	수방대책 추진 .....	15	치수방재과
⑧	도림1 배수분구 하수관거 종합정비 .....	17	치수방재과
⑨	대림3동 빗물펌프장 증설 .....	19	치수방재과
⑩	빗물펌프장 수방시설 유지관리 .....	20	치수방재과
⑪	경방 타임스퀘어 주변 교통소통 대책 .....	21	교통행정과
⑫	교통편의 시설물 설치 및 유지관리 .....	23	교통행정과
⑬	주차질서 확립으로 주민불편 해소 .....	24	주차문화과
⑭	주정차위반 과태료 징수율 향상 .....	25	주차문화과
⑮	주차장운영 개선 사업 .....	26	주차문화과

# 1 | 건전재정 확립을 위한 세외수입 증대추진

## □ 사업개요

○ 사업목표 (단위:천원)

계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	공유재산임대	징수교부금
7,530,491	5,579,376	194,788	92,000	42,500	1,621,827

- 세외수입 증대를 위한 숨은 세원 지속적 발굴
- 공공용지의 적정한 관리로 불법 행위자에 대한 변상금 부과
- 장기 및 고액 체납자에 대한 특별관리로 징수율 극대화

## □ 추진실적(6.30현재)

년도	목 표	부 과	징 수	체 납	징수율
'11	7,530,491	4,787,700	4,660,976	126,723	97.3
'10	6,821,822	5,416,426	5,221,428	194,998	96.3
'09	6,466,310	6,794,571	6,535,485	259,086	96
'08	6,003,724	6,735,824	5,871,839	863,985	87

## □ 향후 추진계획

- 지적과 및 재무과와 유기적인 협조체계로 지속적 세원 발굴
- 반송분, 체납자에 대한 철저한 원인분석으로 재 송달 등으로 체납일소
- 체납자 재산조회 및 재산소유자 등 적극적인 재산압류로 채권확보

## 2 국회 도로사용 변상금 부과에 따른 소송수행

### □ 사업개요

- 점용구간 : 여의서로 국회 주변 연장 2.1km  
- 서강대교 남단 ~ 여의서로 ~ 여의2교 구간
- 점용면적 : 7,488m<sup>2</sup>(폭 3.5m ~ 7m)  
- 여의도동 8-1 : 588m<sup>2</sup>, 여의도동 8-2 : 6,900m<sup>2</sup>
- 변상금 부과 : 18,434백만원

소재지 (행정재산)	점유지번	지목	점용면적 (m <sup>2</sup> )	부과기간	소유자 (국공유재산)	점유자	변상금 (천원)
합 계			7,488				18,433,957
여의도동 8-1 8-2	여의도동 1번지	도로	8-1 : 588m <sup>2</sup>	'02.07.01~ '07.06.30	서울특별시	국회사무처	8,936,179
				'07.07.01~ '07.12.31	서울특별시	국회사무처	1,213,056
			8-2 : 6,900m <sup>2</sup>	'08.01.01~ '08.12.31	서울특별시	국회사무처	2,713,651
				'09.01.01~ '09.12.31	서울특별시	국회사무처	2,641,766
				'10.01.01~ '10.12.31	서울특별시	국회사무처	2,929,305

### □ 추진실적


- '07. 9. 3 : 도로사용 변상금 부과
- '08. 4.25 : 행정법원 1심 판결(우리구 패소 ⇒ 항소)
- '08.12. 9 : 고등법원 2심 판결(우리구 승소 ⇒ 대한민국에서 상고)  
- 현장사진 및 점유현황에 대한 증거자료 등 미비점을 보완하여 정당성 주장
- '09. 2월 : 상고이유서 및 답변서 제출
- '11. 6월 : 현재 대법원 심리 진행중

### □ 향후 추진계획

- 원상복구 시까지 지속적인 행정조치 예정
- 승소 시 변상금 18,434백만원 부과에 대한 징수교부금 74억원의 세입 증대 기대

※ 첨부 : 위치도 및 현황사진 1부.

# 【위치도 및 현황사진】

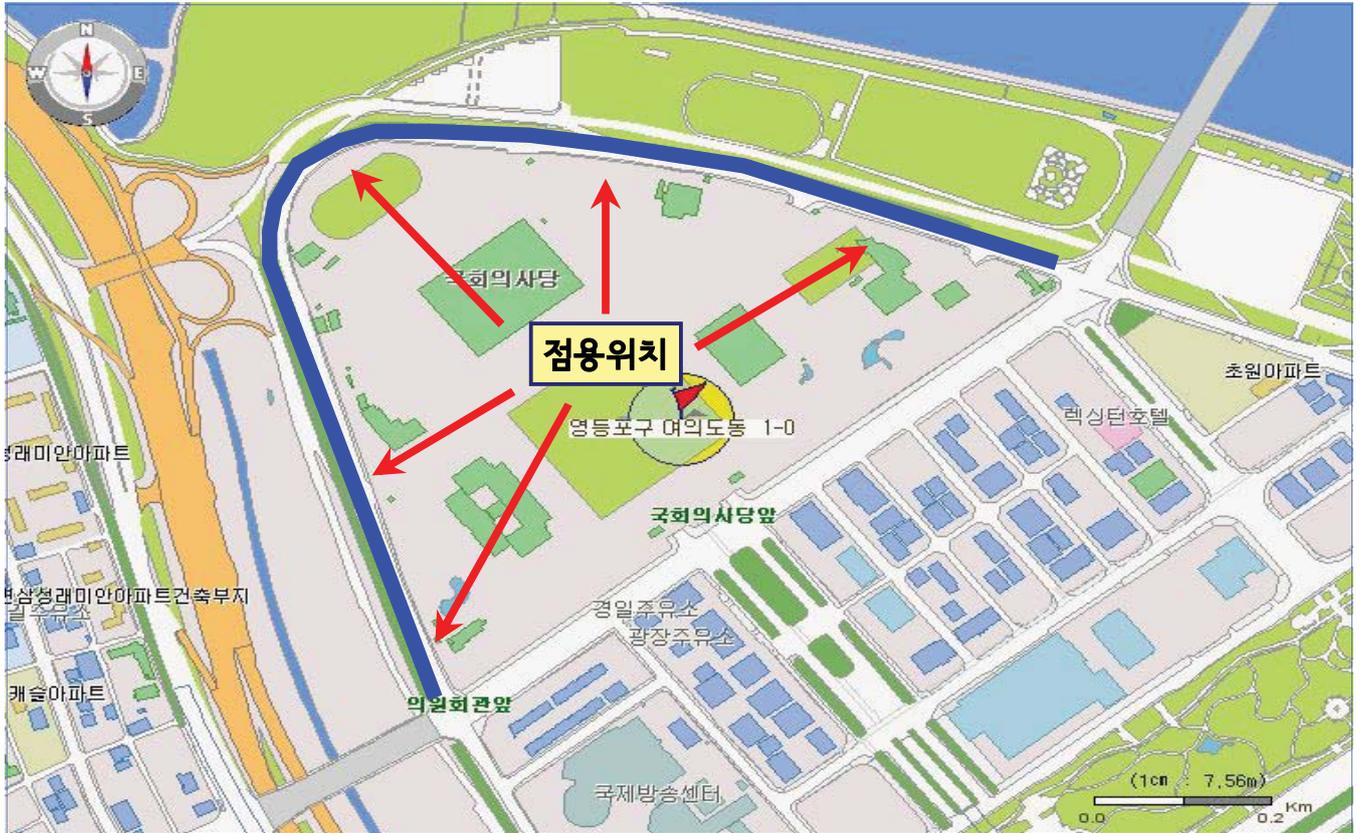

## 3

## 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

공익사업의 수행을 위한 손실보상업무 추진시 공공복리 증진과 재산권의 적정한 보호를 도모하고 공익사업을 신속하고 효율적으로 추진코자 함

## □ 사업개요

- 총 3개 사업(계속사업)
- 소요예산 : 16,160백만원(시비)
- 집행액 : 5,095백만원

## □ 보상대상 사업현황(6.30현재)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	규모	소요예산	집행액	추진사항
계	5건		16,160	5,095	
1	도림로 확장공사	B = 35m L = 330m	11,000 (시비)	1,984	- 1구간 보상 완료 보상액 : 20억 - 2구간사업인가(3.27) 보상액 : 90억 - 보상계획열람공고(5.2) - 감정평가 의뢰(5.25) - 계속 사업
2	경부제3녹지 조성공사	A = 7,912m <sup>2</sup>	3,900 (시비)	3,111	- 12건 보상 완료 - 2건 수용재결금 보상 신청통지 - 계속 사업
3	대방천변도로 개설공사	B = 6m, L = 130m	1,260 (시비)		- 2구간사업인가(1.13) - 보상계획열람공고(3.11) - 감정평가 의뢰(4.28) - 감정평가기간 연장 - 계속사업

## 4 도림로 확장공사 - 시 100%

신길재정비촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기 미집행 도시계획사업 시행으로 주민 숙원해소

### □ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→ 35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
  - 특별회계 : 우측 L= 500m(신길재정비 촉진지구내)
  - 일반회계 : 좌측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 총사업비 : 48,450백만원(보상비 43,000 공사비 5,300 설계비 150)
  - 특별회계 : 19,150백만원(보상비 17,000 공사비 2,000 설계비 150)
  - 일반회계 : 29,300백만원(보상비 26,000 공사비 3,300)
- 2011년 사업비(보상) : 11,000백만원(특별회계 : 9,000 일반회계 : 2,000)


### □ 추진실적

- '78. 12. 07 : 도시계획시설(도로)결정(건설부고시 제393호)
- '97 ~ '99년 : 일부구간 확장완료(도림고가 남단 ~ 도림사거리, L=350m)
- '08. 09 : 투·융자심사(적정)
- '09. 03. ~ '10. 02. : 실시계획인가(일반회계구간 L = 433m)-보상완료
- '10. 03. 22 ~ 12. 16 : 기본 및 실시설계 용역 시행
- '10. 05. 27 : 실시계획인가(특별회계구간 L = 220m)-보상완료
- '11. 02. 17 : 실시계획인가(일반회계구간 L = 50m)-보상완료
- '11. 03. 17 : 실시계획인가(특별회계구간 L = 280m)-감정평가中

### □ 향후 추진계획

- '11. 10 : 2012년 서울시 사업예산 확보요청
- '11. 02 ~ '12. 12 : 토지 등 보상
- '12. 03 : 공사착공 및 시행

# 위 치 도

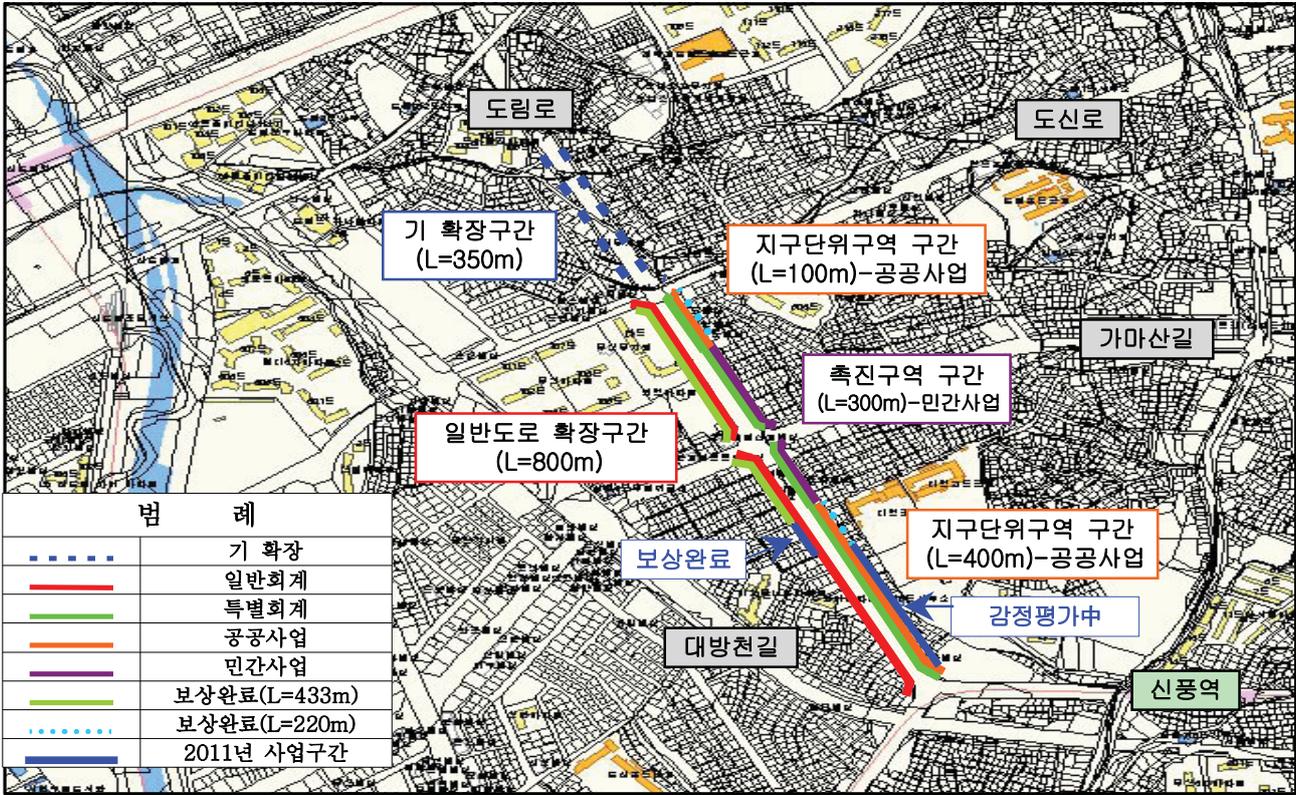

장기 미집행 도시계획시설(도로)사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편해소

#### □ 사업개요

- 위 치 : 신길동 381-9 ~ 455-19간
- 규 모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
  - 기개설 : 660m(1998년 ~ 2001년)
  - 미개설 : 420m
- 사업기간 : 1998년 ~ 2012년
- 총사업비 : 13,257백만원(보상비 10,600 공사비 2,607 설계비 50)
  - ※ 2011년 사업비 : 2,267백만원(보상비 : 1,260 공사비 : 1,007)
- 도 급 자 : 휴인건설(주) 대표 이정임


#### □ 추진실적

- '70. 08. 31 : 도시계획시설(도로) 결정(서고시 제36호)
- '99. 06 ~ '01. 11 : 일부구간 도로개설완료(L = 660m)
- '09. 01. 30 ~ 05. 29 : 기본 및 실시설계 용역 시행
- '09. 12. ~ '10. 06. : 실시계획인가(L = 192m) - 보상완료
- '10. 12. 16 : 실시계획인가(L = 128m) - 감정평가중
- '11. 02. 22 : 공사발주방침(장기 계속계약)
- '11. 03. 15 : 공사계약 및 공사착공(2011. 03. 18)
- '11. 06현재 : 상수관(D200mm) 및 도시가스관 이설 공사중

#### □ 향후 추진계획

- '11. 06 ~ 12월 : 2011년 추경 및 2012년 본예산 요청(구비)
- '11. 12 : 금년도 발주공사(1차구간) 완료
- '12. 03 ~ '12. 12 : 2차구간 공사시행(B = 6m, L = 128m)

# 위 치 도

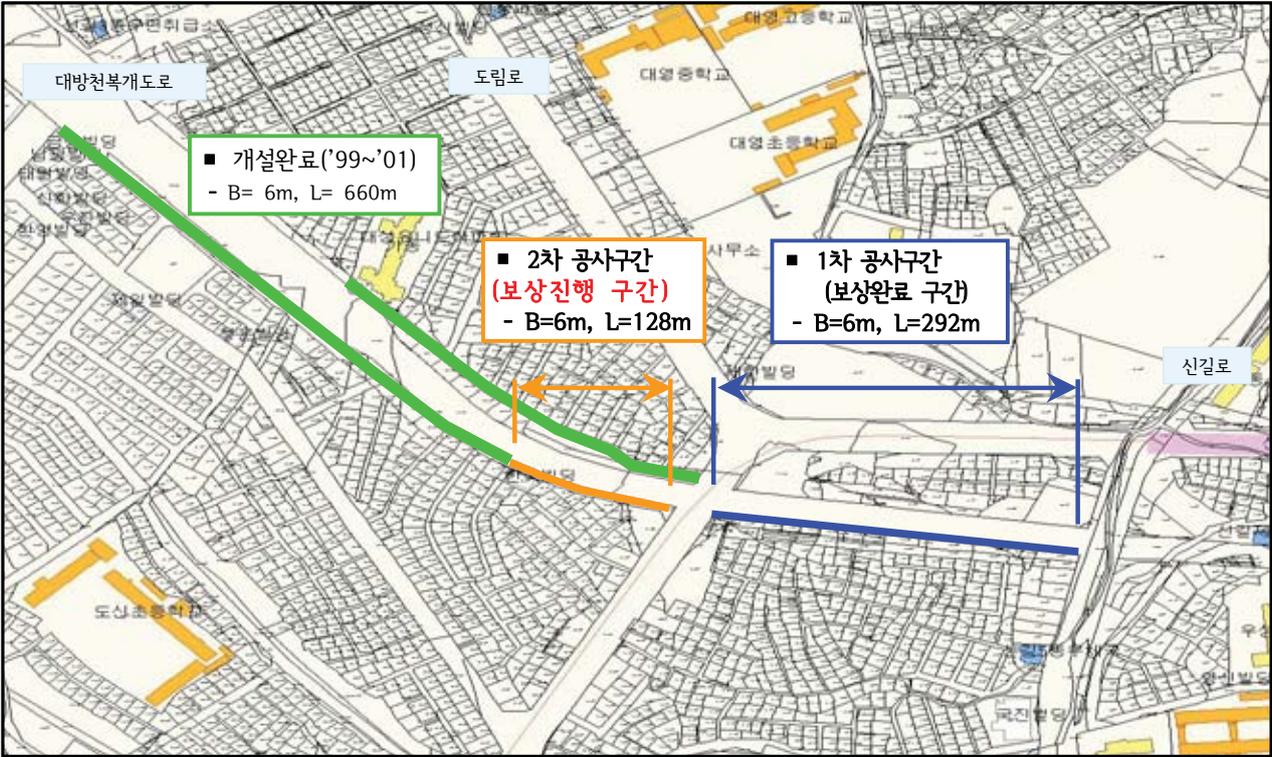

보행약자의 이동편의를 위하여 육교 철거후 평면 횡단보도 및 신호등을 설치하여 보행약자의 통행불편 해소

#### □ 사업개요

- 위 치 : 보도육교 3개소(영동초교 앞, 당중초교 앞, 신길마을금고 앞)
- 규 모
  - 보도육교 철거 3개소
  - 교통시설물(횡단보도 및 신호등 설치) 1식, 도로정비 1식
- 공사기간 : 2011. 01 ~ 2011. 07
- 총공사비 : 160백만원(육교철거 70백만원, 교통시설물 설치 90백만원)
- 도 급 자 : 서경건설개발(주) 대표 오성균
  - 도로시설물 보수 및 장애인 편의시설 설치(연간단가) 공사에 포함 철거시행

#### □ 추진실적


- '10. 07. : 주민 설문조사 실시
- '11. 01. 03 : 서울지방경찰청 교통규제심의 요청
- '11. 03. 15 : 교통규제심의 완료(육교철거, 신호등 및 횡단보도 설치)
- '11. 06. 08 : 계약심사 의뢰(교통시설물-신호등 및 횡단보도 등 설치)
- '11. 06. 16 : 공사발주(교통시설물 설치)

#### □ 향후 추진계획

- '11. 06 : 공사계약 및 착공(교통시설물 설치)
- '11. 07 : 육교철거 및 교통시설물 공사완료

# 위 치 도

▶ 공사명 : 영동초교 앞 외 2개소 보도육교 철거공사

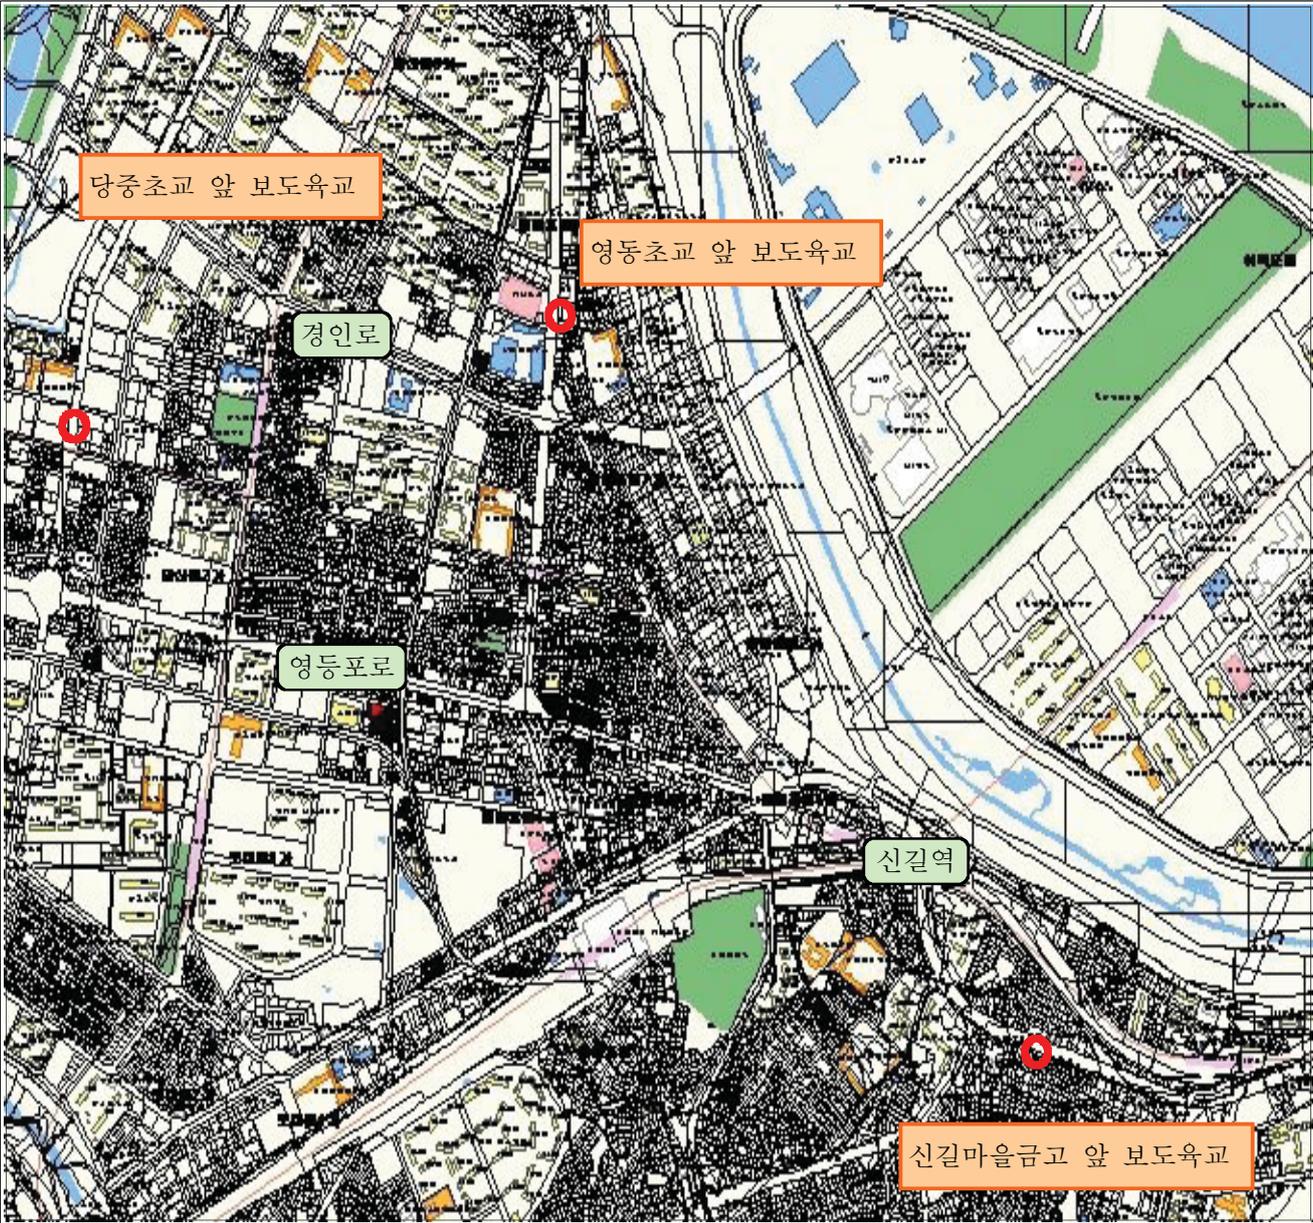

지난해 국지성 집중호우(9.21)로 인한 우리구 일부지역 침수발생 등 피해 사고를 거울 삼아 금년에는 단 한건의 침수 피해가 없도록 집중 강우에 대응하여 사전 점검·정비하고 풍수해 대책본부 구축 운영을 철저히 하고자 함.

## □ 현 황

### ○ 금년도 기상현황

- 금년도 5월~7월 기온은 평년보다 높고, 강수량은 평년과 비슷하거나 다소 많을 것으로 기상 예측함.

### ○ 수방시설 현황

- 빗물펌프장 : 15개소(간이펌프장 7개소 포함), - 수문 21개소(57문)
- 하수관거 : 447.659km, - 빗물받이 : 22,000개소
- 하천제방 : 11.44km(안양천, 도림천, 대방천)

## □ 추진실적

### ○ 수방대비 사전준비 완료(5개분야) : 2011.2.1 ~ 3. 14.

- 재해취약시설분야 점검·정비 계획 수립 통보 - 6개부서
  - 대형 및 일반공사장, 도로시설물(옹벽,축대,지하차도),옥외광고물,하천등
- 하수분야 정비 계획 수립 - 10건 발주완료
  - 도림1배수분구정비공사 등 6건, ·하수관준설 등 유지관리공사 4건
- 치수분야 점검·정비 계획 수립 - 치수방재과
  - 안양천, 도림천, 대방천내 공사장(1개소) 및 하천제방(수문포함)점검
  - 수방시설(유수지 4개소, 저류조 1개소)
- 기전분야 점검·정비 계획 수립
  - 수방용 소형양수기, 빗물펌프장(15개소) 기전설비 제작사 점검·정비
  - 수문(21개소)정기점검, 안전진단 용역
- 재난대비 특정관리시설 순찰점검계획수립 : 특정관리대상시설물1,179개소)
  - 공동주택, 다중이용건축물, 건축공사장, 옹벽, 석축, 지하차도 등

○ 수방대비 순찰·점검·정비 추진 : 3.15~5.14.

- 비우기 기간중 상기 5개분야 지속적인 순찰·점검·정비활동 추진
- 재해취약시설 - 2차 점검 완료(특이 사항 없음)
- 하수분야
  - 노후불량 하수관 정비공사(6건) 6월말 완공목표 추진
  - 하수관 및 빗물받이 준설 등 유지관리공사(4건) : 수해취약지역 완료
- 치수분야
  - 안양천, 도림천, 대방천 순찰·점검 - 5회실시(특이사항 없음)
  - 수방시설(유수지,저류조)순찰·점검 - 6회실시(특이사항 없음)
- 기전분야 - 빗물펌프장 및 수문시설
  - 기계분야 : 모터펌프(3대), 제진기(3대), 크레인(4대), 수문(2개소)  
양수기 정비 및 자동 시운전 완료
  - 전기분야 : 수배전반, cctv, 수위계 정비 및 자동 시운전 완료
- 재난대비 특정관리시설분야 순찰 점검
  - 순찰점검 : 4회실시(재난등급변경관리 1개소(양남시장))
  - 재난위험시설 해제(3개소(광성연립 가,나,다동))
- 기 타
  - 안전관리활동 홍보추진 : 2회(매월4일 정기활동 추진)
  - 풍수해대책 본부요원 및 동 주민센터 집합교육 완료
  - 지하주택, 통,반장, 건축공사장, 자율방재단 비상연락망 구축완료
  - 수방자재 및 모래마대 전진배치 완료
  - 민·관·군 협조체제 및 비상연락망 구축 완료
  - 침수취약가구 공무원 돌봄서비스(1가구 1담당제) 점검 및 시행

○ 재난안전대책(풍수해분야)

- 재난안전대책(풍수해)본부 상황실 구축 운영(본부장-구청장)
  - 기간 : 2011.5/15~10.15(5개월간)
  - 조직구성 : 구청 - 8개반 104명  
동주민센터 - 3개반 15명(18개동)

□ 예 산 액 : 178,000천원(구비)

노후 하수관거의 구간별 단위개량사업만으로는 하수관거의 기능유지에 어려움이 있어 배수분구별 종합계획을 수립 정비함으로서, 하수관거의 통수능 확보는 물론 수해예방에 만전을 기하고자 함

## □ 개 요

- 위 치 : 영등포구 대림1·2·3동, 동작구 신대방1동 지역
- 규 모 - 면 적 : 2.71km<sup>2</sup>
  - 하수관거 개량 및 정비 : 60.5km
  - 하수암거 보수보강 : 3.5km
- 사업기간 : '10. 8 ~ '14. 12
- 시 공 사 : 흥익산업개발(주), 매일종합건설(주)
- 총사업비 : 79,640백만원 (시비)

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2010년이전	2011년	2012년	2013이후
계	79,640	6,200	4,000	10,800	58,640
실시설계비	1,900	1,900	-	-	-
시 설 비	75,240	4,100	3,800	10,000	57,340
감 리 비	2,500	200	200	800	1,300

## □ 추진실적

- '08. 7. 31 : 하수관거 종합정비사업 추진요청 (구 → 시)
- '08. 10~'08. 12 : 서울시 예산투자심사 등 각종 사전심사
- '09. 2 ~ '10. 2 : 실시설계 시행
- '10. 3 ~ '10. 6 : 공사계약심사 등 각종 발주전 심사
- '10. 8월 : 공사 착공
  - 공사추진내용(2011.6월 현재) : 암거보수보강 2.8km, 하수관거개량 2.5km


## □ 향후계획

- '14. 12 : 공사준공(연차별 집행)

## □ 예산액 : 79,640백만원 (시비)

# 위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림1배수분구 하수관거 종합정비사업

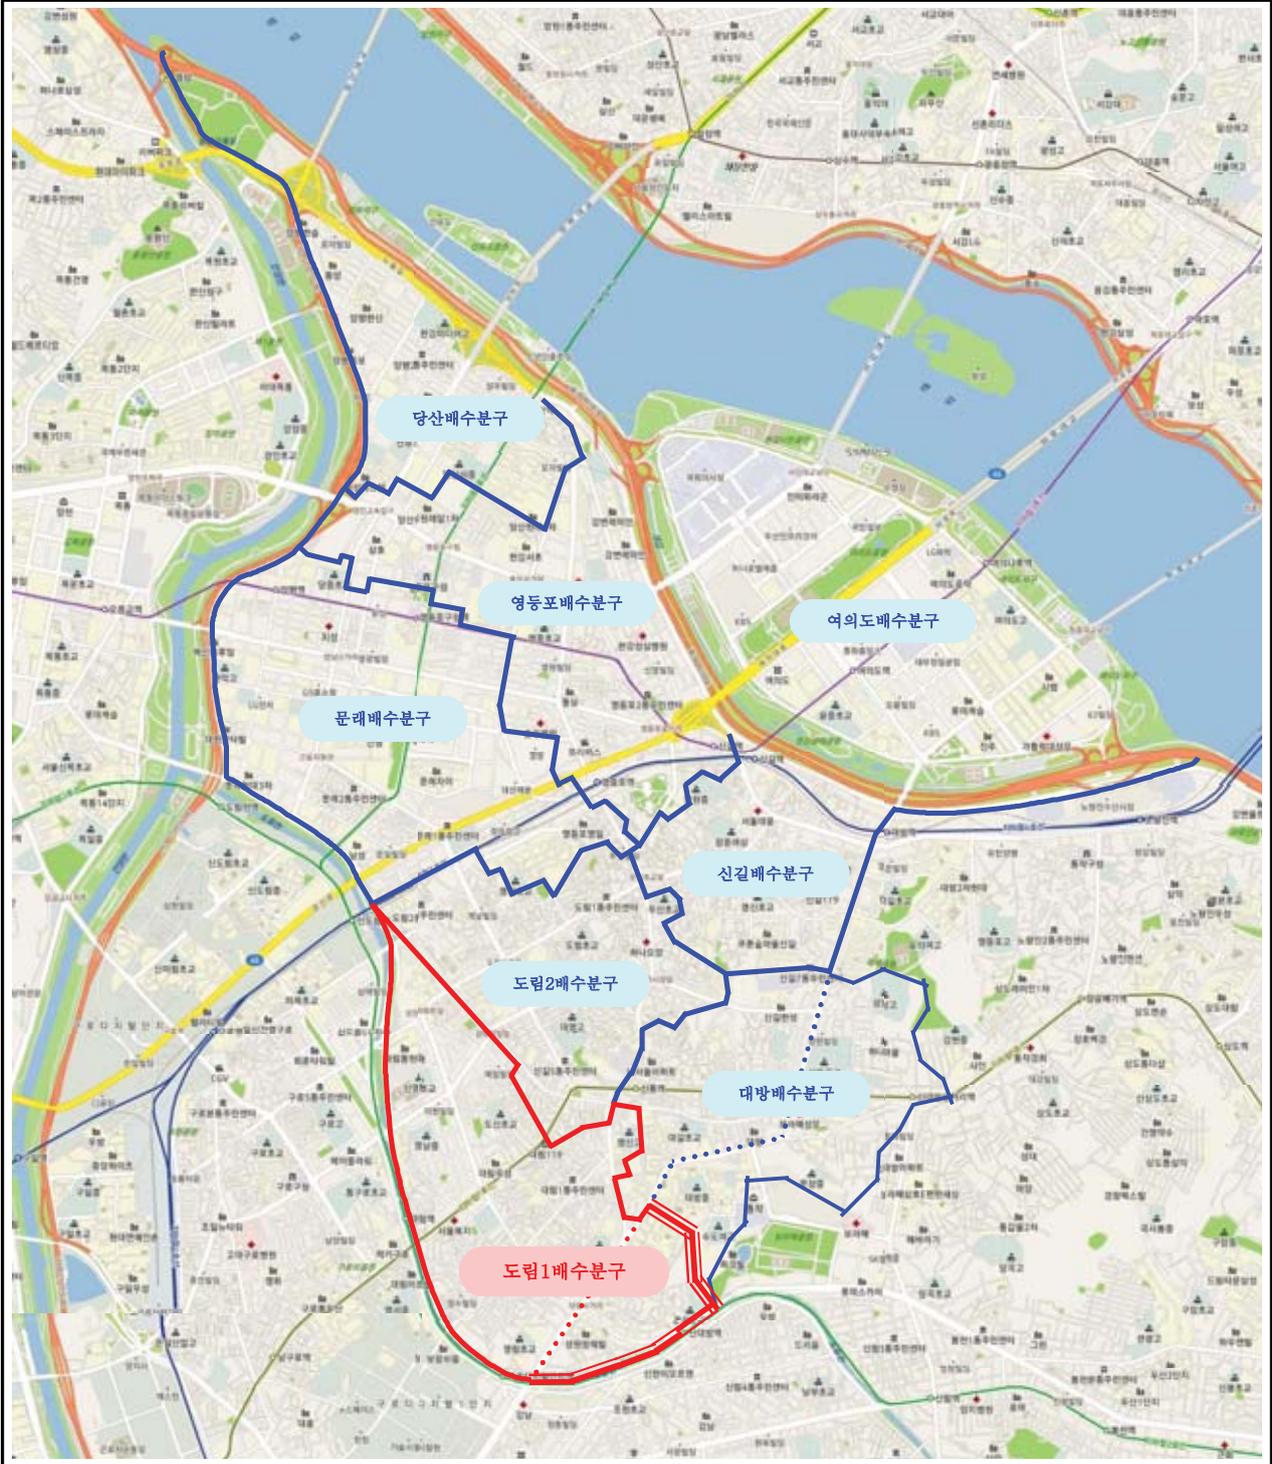

『기상이변을 대비한 빗물펌프장 배수처리능력 향상』을 위해 빗물펌프장의 용량을 증설하여 집중호우시 침수피해 최소화

사업개요

○ 위 치 : 대림동 611번지

○ 사업규모

- 펌프용량 증대 : 기정 550HPx7대, 500HPx3대

존치 550HPx7대, 교체 600HPx2대,400HPx1대

신설 1,500HPx2대(계:12대)

○ 사업기간 : '11.02.~'12.09

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주)

○ 총사업비 : 10,560백만원(시기금)

추진실적

○ '09.12.~'10.11 : 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)

○ '10.11.27 : 빗물펌프장 증설공사(3차) 발주시행 통보(서울시)

○ '11.02.07 : 공사착공

○ '11.04.30 : 토출관 추진완료

○ '11.06.현재 : 증설동 터파기 및 가시설 공사중

향후 추진계획

○ '12.09. : 공사 완료 예정

예산액 : 10,560백만원(시기금)

빗물펌프장 및 수문 등 수방시설에 대한 점검·정비를 수방기간 전에 완료하여 수방준비 및 사전 재해예방에 만전을 기함

#### □ 사업목표

- 노후된 빗물펌프장 및 수문 시설 예방정비로 사전 수해예방
- 수방기간 전 점검·정비 완료하여 수방준비에 철저

#### □ 사업개요

- 추진기간 : '11. 1. 1 ~ '11. 5. 31(5개월)
- 추진범위 : 빗물펌프장 (8개소), 수문 (21개소)

#### □ 추진실적

- 빗물펌프장 모터펌프 보수 (5.6 완료)
  - 모터펌프 4대  
(양평1: 630HP 1대, 도림2 500HP 1대, 대림3 500HP 1대, 대림2 250HP 1대)
- 수문 정밀점검 용역 (6.3 완료)
  - 정밀점검 7개소  
(도림2동, 대림2동, 대림3동, 문래, 대방, 양평1배수문, 여의도수문, 안양천제방)
- 빗물펌프장 노후시설 정비 (4.11 완료)
  - 관사 옥상방수 및 시설보수 (옥상방수:양평2, 창고설치:양평2,문래)
- 수방용 양수기 점검·관리 용역 (5.30 구, 주민센터 보관분 정비완료)
  - 수방용양수기 1,990대 (구:119대, 동주민센터:1,871대)

#### □ 향후 추진계획

- 수방기간중 수방설비 작동상태를 점검하여 사전정비
- 수방에 문제가 있는 시설 우선 정비후 노후설비 년차적으로 개량추진

#### □ 예 산 액 : 180,000천원(구비)

## 11 경방 타임스퀘어 주변 교통소통대책

우리구 경방 타임스퀘어 주변에 교통정체를 완화하고 대중교통 접근성을 제고시키는 방안을 마련하는 등 실질적인 교통소통대책을 수립함으로써 주민 편의를 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 영중로(구 양평로) 버스정류장 정차노선 분산
- 경방길 (타임스퀘어 앞) 버스노선 신설 및 중앙버스정류장 설치

### □ 추진실적

- 문래고가 철거와 연계 경방길 버스노선 (7개노선) 신설
- 경방길 소방서앞 버스정류장 혼잡완화를 위한 정류장 분산·운영
  - 소방서앞 ⑫번 버스정류장 전방 40m 앞에 추가 정류장 신설 및 정차노선 분산 (소방서앞 4개노선, 추가정류장 3개노선)

### □ 향후 추진계획

#### 【 경방 타임스퀘어 앞 경방길 중앙버스정류장 신설 】

- 경방부지 인접 대지(영등포4가 318-2) 오피스텔 공사에 따른 도로확폭 (4차→6차) 완료이후 중앙버스정류장 설치 추진

#### 【 양평로 버스정류장 정차노선 분산 】

- 단 기
  - 위 치 : 영등포4가 55번지 앞 ⑦번 버스정류장 (10개노선)
  - 내 용 : ⑦번 정류장 10개노선중 영등포역에서 우회전하는 5개노선을 ⑧번 정류장으로 이전·분산
- 중장기
  - 위 치 : 양평로(영등포역→시장사거리) 구간 ①~⑥ 버스정류장
  - 계 획 : 6개 정류장을 4개 정류장으로 통폐합후 노선 조정

## □ 양평로 버스정류장 현황도



구 도로상 교통사고 예방과 운전자 시인성 확보를 위해 도로부속시설물을 필요 지점에 설치 및 관리함으로서 교통환경 개선을 도모코자 함

#### □ 사업개요

- 추진목적 : 교통사고 예방 및 운전자 시인성 확보
- 추진내용 : 반사경/시선유도봉/도로안내표지판 설치 및 정비
- 추진방법
  - 교통시설물(반사경/시선유도봉) : 연간단가 계약
  - 도로안내표지판 : 별도 계약

#### □ 추진실적

- 교통시설물 설치 및 유지보수
  - 2011년 2월 18일 연간단가계약(계약금액 : 18백만원)
  - 반사경 정비 : 15개                      - 시선유도봉 정비 : 34개
- 도로안내표지판 신설 및 정비
  - 신길역 도로안내표지판 이설 및 문안변경 외 5개소
  - 계약금액 : 24백만원

#### □ 향후 추진계획

- 교통시설물 설치 및 유지보수 추진(2011.1~2011.12)
- 도로표지판 도로명표기 정비계획 추진
  - 도로안내표지판 도로명정비 : 양평로 143번지 외 82개소
  - 추진일정 : 2011.6월 중 완료예정

#### □ 예산액 : 총 63백만원

- 교통시설물 설치 및 유지보수 : 20백만원
- 도로안내표지판 신설 및 정비 : 43백만원

## 13 주차질서 확립으로 주민불편 해소

도로 본래의 소통 원활 기능 확보 및 주민생활불편 적극 해소를 위해 지속적인 불법주차 단속으로 주민편익을 증진하고 차량소통의 원활을 기하고자 함

### □ 추진방향

- 간선도로와 보조간선 도로의 강력한 주차단속 실시
- 주택가 접근성 도로는 탄력적 단속을 통한 생활불편 해소

### □ 추진실적(5.30 현재)

(단위:건수)

구 분	우리구			서울시		
	소계	인력	CCTV	소계	인력	CCTV
총 계	58,084	38,450	19,634	8,581	5,134	3,447

### □ 향후 계획

- 불법주차 단속조별 책임구역제(순환) 실시 (11개조 23명)
- 기동단속조 3개조 운영으로 기동성확보 및 취약지역 순찰
- 탄력적인 지도·단속으로 주차질서 확립
  - 주요 간선도로 불법주차 일소 (집중 단속, CCTV운영 내실화)
  - 어린이보호구역 등·하교시간대 특별순찰 강화 및 단속
  - 이면도로 및 차량소통에 큰 불편이 없는 지역은 계도 위주 단속
- 주민불편 및 민원사항 적극 해소
  - 야간, 휴무일 특별근무 실시
  - 기동단속반 운영으로 취약지역 및 민원사항 신속조치
- 주행형 CCTV 단속시스템으로 효율적인 주차단속 실시

## 14 주정차위반 과태료(세외수입) 징수율 향상

불법 주정차 위반 과태료를 적기에 부과·징수하여 세외수입을 안정적으로 확보하고 상습 및 고액체납자에 대하여는 재산압류 등의 적극적인 체납관리로 세외수입 징수율을 향상시키고자 함

### □ 사업개요

- 체납고지서 송달에 주력하여 체납과태료 납부 독려
- 재산 압류를 통한 채권확보 노력
- 압류 등 시효중단 사유 없으면서 징수율 소멸시효가 완성된 경우 결손 처분을 실시하여 체납액 정리

### □ 추진실적

- 체납고지서 발송 : 256,444건 11,809백만원(2006~2010년 고지분)
- 압류시행
  - 자동차압류 : 15,579건 635백만원
  - 부동산압류 : 51명 1,762건 76백만원
  - 신용카드매출채권 압류 : 예고장 발송 171명/8,070건/352백만원, 압류 진행중
- 거주자우선주차 신청 시 과태료 체납자 제외 실시
- 고지서 수납자료 압류해제 : 31,105 건 1,306백만원
- 시효결손 처분 : 18,557건 754백만원

### □ 향후 추진계획

- 과년도 체납고지서 지속적 발송
- 신용카드매출채권 압류 연내 완료, 추심 및 세입조치
- 차령초과 말소자 중 30만원이상 체납자 부동산조회 실시 및 압류 시행 (하반기 시행 예정)
- 시효결손 자료 정비 및 결손 처분 지속적 시행

## 15 주차장운영 개선 사업

현재 운영중인 공영주차장에 새롭고 효율적인 주차관제시스템으로 교체 설치하여 주차장 운영 수지개선 및 이용주민의 편익을 증진 하고자 함

### □ 사업목표

- 공영주차장 재정수지 개선 및 이용주민 편익 증진

### □ 추진개요

- 대 상(8개소) : 신규구축 6, 전면교체 2
  - 신규구축 : 영등포본동제2, 당산2동, 도림동, 문래동, 신길6동, 대림3동
  - 전면교체 : 신길4동1동1마을공원, 대림어린이공원
- 기 간 : 2011. 6.10 ~ 7. 9
- 예 산 : 163,200천원(신규구축 122,400    전면교체 40,800)
- 내 용 : 6개소에 대해 신규로 구축하고, 고장이 잦아 기능을 못하는 2개소에 대해 전면 교체하여 이용주민 편익을 증진하고 인력을 감축(3.5명→1명/개소당)운영하여 비용을 절감하고자 함.

### □ 추진실적

- 8개소 설치 예정일 : 2011. 7. 9
- 주차관제시스템 설치공사 후 운영수지 개선 기대

### □ 문제점

- 야간에는 주차관리원 없어 시간주차를 받지 않고 월정기 주차차량만 출입을 시키지만 주차차량 파손 등의 민원야기 우려가 있음

### □ 향후 계획

- 운영 결과를 분석하여 차량 파손 등의 문제점 야기시 별도대책 강구
