

교육·복지·사람 중심



제176회 구의회 정례회



# 2013년 주요업무 보고



## 푸른도시과

# 보고 순서


I . 일반 현황	•••• 1
II . 주요업무추진실적	•••• 6
III . 신규·주요투자사업	•••• 29

# I . 일반현황

## 1 인 력

구 분	계	일 반 직(계약직 포함)						기 능 직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	29		1	5	4	4	6		2	3	4
현 원	27		1	5	4	8			4	5	
과부족	-2					4	-6		2	2	-4

## 2 조 직

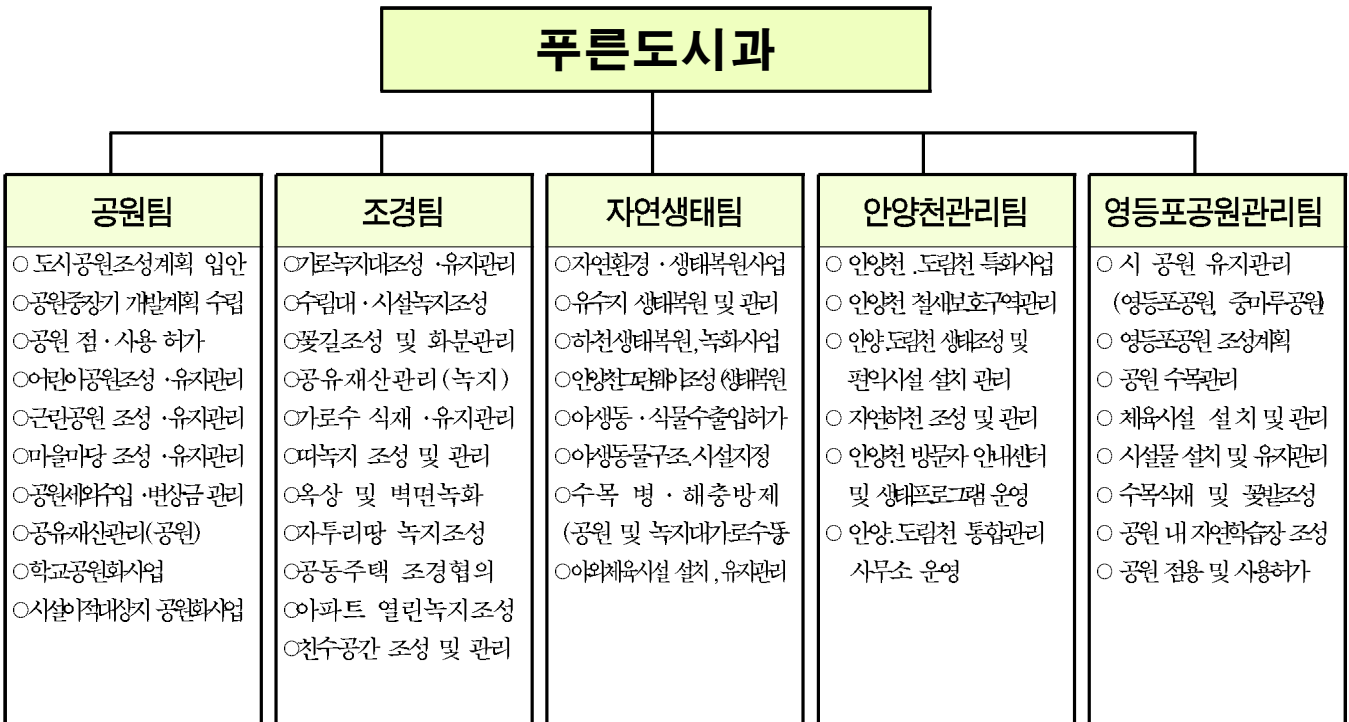

**3**

**주요시설 및 장비**

구 분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	33	10	6	4	18	5	29	143	86개 노선	2종	62개소
면 적 (㎡)	611,880	549,698	141,752	407,946	54,637	7,545	15,151	581,482	16,091주	2주	22종 668점

**4**

**예산 현황**

사 업 별

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집행액	집행율
계	7,560,270	1,937,911	25.63%
공원녹지관리수준향상	2,897,574	815,016	28.13%
아름다운 환경 및 편리한 시설만들기	2,561,268	635,468	24.81%
안양·도림천 특화	449,663	141,496	31.47%
푸른공간 늘리기	987,113	145,578	14.75%
인력운영비	480,483	124,949	26.01%
기본경비	184,170	75,402	40.94%

## 목 차

### 〈주요업무 추진실적〉

1. 어린이공원 정비 .....	6
2. 공원 내 수목 가지치기 및 식재 .....	7
3. 열린학교(학교공원화) 유지관리 .....	8
4. 공중화장실 환경개선 사업 .....	9
5. 공원시설물 정비 .....	10
6. 전기시설물 유지관리공사(연간단가) .....	11
7. 대림로 가로수 바꿔심기사업 .....	12
8. 가로변 녹지량 확충사업 .....	13
9. 가로수 생육환경 개선사업 .....	14
10. 아름다운 꽃길 조성사업 .....	15
11. 도시구조물 벽면녹화사업 .....	16
12. 공공건물 옥상녹화사업 .....	17
13. 가로수 보식 및 식재 .....	18
14. 가로수 가지치기 .....	19
15. 띠녹지 보식 및 정비 .....	20
16. 녹지대 위험수목 정비사업 .....	21
17. 생활주변 자투리땅 녹화사업 .....	22
18. 천수공간 수경시설 유지관리 .....	23

## 목 차

### 〈주요업무 추진실적〉

19. 양평유수지 생태복원 특화사업 .....	24
20. 안양천 그린웨이 4차 조성사업 .....	25
21. 마을단위 야외체육시설 설치 .....	26
22. 왕벚나무 수세회복 .....	27
23. 안양·도림천 꽃묘식재 .....	28

### 〈신규·주요투자사업〉

1. 마을마당 재정비 사업 .....	29
2. 문래동 게이트볼장 조성사업 .....	30
3. 녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사 .....	31
4. 나라꽃 무궁화 보급·확대사업 .....	32
5. 당산동 지정보호수 쉼터 조성사업 .....	33
6. 우리골목길 우리숲으로 가꾸기사업 .....	34
7. 도림천 음수대 설치공사 .....	35
8. 안양천 제방 산책로 수목 보식 .....	36
9. 영등포공원 시설 정비사업 .....	37
10. 영등포공원 배드민턴장 정비사업 .....	38
11. 시공원 보수정비사업 .....	39
12. 영등포 올레길(생태순환길) 조성 .....	40

## 목 차

### 〈신규·주요투자사업〉

13. 문래 물놀이장 조성 .....	41
14. 양평동 불량주택 밀집지역 공원화 .....	42
15. 경부제3녹지 조성사업 .....	43
16. 아파트 열린녹지 조성사업 .....	44
17. 안양천 그린웨이 5차 조성사업 .....	45

## Ⅱ. 주요업무 추진실적

### 1 어린이공원 정비

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상

#### 사업개요

- 위 치 : 신우어린이공원 외 4개소
- 사업내용 : 어린이공원 내 소규모 물놀이장 조성, 노후 편익시설 및 어린이놀이기구 정비 등
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 6

#### 추진방향

- 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공으로 이용자 안전사고 예방
- 주민 편익시설 정비로 공원 이용 만족도 향상 및 활성화 도모

#### 추진실적

- 2013. 02. 04 : 실시시설계약역 시행 (02.07~03.18)
- 2013. 04. 29 : 공사착공

#### 향후 추진계획

- 2013. 06. 27 : 공사 준공

#### 기대효과

- 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 공원 이용 활성화 도모
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

#### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
184,000천원 (구비)	160,834천원 (구비)	87%



## 2 | 공원 내 수목 가지치기 및 식재

공원 내 수목 중 무성한 수관 형성으로 공원 인접 주택에 민원을 야기 및 공원 이용에 위해가 되는 수목에 대하여 정비공사를 시행하여 안전사고 예방 및 쾌적한 공원 환경 제공코자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 다사랑어린이공원 등 29개소
- 사업내용 : 공원 내 지장 수목 정비 및 고사목 제거 등
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 6

### □ 추진방향

- 공원 인접 주택의 고질적인 민원 야기 수목 정비로 고질 민원 해소
- 안전하고 쾌적한 공원 조성으로 주민 삶의 질 향상에 기여

### □ 추진실적

- 2013. 02. 18 ~ 02. 19 : 자체설계
- 2013. 03. 05 ~ 03. 29 : 1차 공사 착공 및 준공

### □ 향후 추진계획

- 2013. 07. 01 ~ 07. 05 : 자체 설계
- 2013. 07. 10 : 2차 공사 발주
- 2013. 07. 31 : 2차 공사 준공

### □ 기대효과

- 공원 내 주택가 인접 대형 및 위험 수목을 전지하여 안전사고 예방
- 수목의 불필요한 가지 전지로 수목생리 활성화를 통한 공원경관 향상

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
40,000천원 (구비)	23,000천원 (구비)	57%

### 3

## 열린학교(학교공원화) 유지관리

열린학교 조성사업 대상 학교 내 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지 환경 제공코자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 윤중중학교 외 5개소
- 사업내용 : 학교공원화사업 수목 버즘나무 외 6종 141주 정비
- 사업기간 : 2013. 2 ~ 4.

#### □ 추진방향

- 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고 예방
- 아름답고 쾌적한 녹지 환경 제공으로 주민 삶의 질 향상에 기여

#### □ 추진실적

- 2013. 02. 28 : 현장 조사
- 2013. 03. 06 : 계약심사 요청
- 2013. 03. 11 : 공사발주
- 2013. 03. 14 ~ 04. 02 : 공사 시행 및 준공

#### □ 기대효과

- 녹지 및 휴식공간 관리로 쾌적한 교육 환경 제공으로 학생들의 정서 함양에 기여
- 열린 녹지 및 휴식공간 제공으로 지역 환경 개선에 기여

#### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
20,000천원 (구비)	19,800천원 (구비)	100%

## 4

**공중화장실 환경개선 사업**

도시공원 내 노후한 공중화장실 시설을 개선하여 이용주민에게  
편안하고 쾌적한 공원환경 제공

 **사업개요**

- 위 치 : 어린이공원 3개소
  - 대림어린이공원(대림1동 870)
  - 양남어린이공원(양평1동 205)
  - 동심어린이공원(대림3동 742)
- 규 모 : 노후시설 교체 등
- 사업기간 : 2013. 2월 ~ 6월
- 내 용 : 노후 공중화장실 정비 및 편의시설 확충

 **추진방향**

- 공중화장실 시설 정비로 공원이용 활성화

 **추진실적**

- 2013. 02. 05 : 실시설계 용역 시행
- 2013. 04. 03 : 실시설계 용역 준공
- 2013. 05. 02 : 공사 착공

 **향후 추진계획**

- 2013. 06. 12 : 공사준공

 **기대효과**

- 이용주민에게 편안하고 쾌적한 공원환경 제공

 **소요예산**

예산액	집행액	집행율(%)
65,000천원 (구비)	54,318천원 (구비)	83%

## 5

# 공원시설물 정비

파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의시설을 확충하여 공원환경 개선에 기여하고자 함

### 사업개요

- 위 치 : 당산근린공원 등 9개소
- 규 모 : 도시공원 및 마을마당 시설정비
- 사업기간 : 2013. 2월 ~ 6월
- 내 용 : 노후시설 교체 및 보수, 바닥포장, 체력단련시설 설치 등

### 추진방향

- 공원이용 활성화에 기여

### 추진실적

- 2013. 02. 14 : 실시설계용역 시행
- 2013. 03. 19 : 실시설계용역 준공
- 2013. 04. 22 : 공사 착공

### 향후 추진계획

- 2013. 06. 20 : 공사 준공

### 기대효과

- 도시공원 내 노후시설 정비로 공원을 이용하는 이용주민 편익증진
- 노후되고 파손되어 위험한 공원시설물을 정비하여 각종 안전사고 예방

### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
354,000천원 (구비)	220,290천원 (구비)	62%

## 6 전기시설물 유지관리공사(연간단가)

공원 및 녹지대에 설치되어 있는 전기시설물(공원등, 전력시설)의 유지 관리를 위해 전기공사 연간단가를 시행함으로써 민원발생시 신속한 민원처리에 만전을 기하고자 하며 전기시설물 사전점검을 통하여 전기안전사고를 미연에 방지하여 효율적인 전기시설물 유지관리를 하고자 함

### 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 녹지대 66개소
- 기 간 : 2013. 01월 ~ 12월
- 규 모 : 공원등 500여등
- 내 용 : 공원 및 녹지대의 전기시설물 이상발생시 즉각조치

### 추진방향

- 노후된 공원등 및 분전함 개량
- 부점등 처리 및 전기시설 안전점검하여 공원이용객 편의제공

### 추진실적

- 공원등 부점등 민원처리
  - 부점등 처리 93등
  - 기타 전기시설 보수 1식

### 향후 추진계획

- 6월 ~ 12월 : 유지관리 시행

### 기대효과

- 즉각적인 민원처리에 따른 공원이용객 편의제공

### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
35,000천원 (구비)	26,550천원 (구비)	76%

## 7 대림로 가로수 바꿔심기사업

대림로의 가로수 바꿔심기 사업을 통하여 쾌적한 가로환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 대림로(대림3동 빗물펌프장~대림어린이공원)
- 규 모 : 297주(제거 147주, 식재 150주)
- 기 간 : 2013. 1 ~ 5월
- 내 용 : 버즘나무 147주 제거, 가로수 150주 식재  
(왕벚 127주, 이팝 23주 식재, 가로수보호판 150조 설치)

### □ 추진방향

- 영등포구 가로수 조성·관리 기본계획에 의거 가로수 바꿔심기 추진

### □ 추진실적

- 2012. 04. 24 ~ 6. 28 : 공사시행  
[버즘 226주 제거, 왕벚 84주, 이팝 142주(이식포함) 식재]
- 2013. 2. 01 : 계약심사 및 일상감사 의뢰
- 2013. 2. 18 : 공사 발주
- 2013. 3. 18 : 공사 착공
- 2013. 5. 26 : 공사 준공  
[버즘 147주 제거, 왕벚 127주, 이팝 23주 식재(이식포함), 보호판 150조 설치]

### □ 기대효과

- 가로경관 향상으로 지역 이미지 제고
- 가로수 수종 바꿔심기에 대한 주민민원 해소

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
300,000천원 (구비)	273,148천원	91%

## 8 가로변 녹지량 확충사업

차량 통행이 빈번한 영등포로 영등포로터리 사면 및 서부간선도로 사면에 꽃과 단풍이 아름다운 다양한 수목을 식재하여 녹지량을 확충하고 쾌적한 가로경관을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포동 영등포로 영등포로터리 사면(신길역 방향), 양평2동 서부간선도로 사면(양평교 ~ 성산대교구간 방향)
- 규 모 : 3,900 $m^2$ (영등포로 1,100 $m^2$  / 서부간선도로 2,800 $m^2$ )
- 기 간 : 2013. 1 ~ 7월
- 내 용 : 콘크리트 구조물 철거(영등포로), 수목 및 초화류 식재 등

### □ 추진방향

- 다양한 수목, 초화류 식재를 통한 가로변 녹지량 확충으로 녹시율 향상

### □ 추진실적

- 2013. 1 ~ 4월 : 실시설계, 설계심의(서울시 조경과), 계약심사
- 2013. 4. 18 : 공사 발주
- 2013. 5. 16 : 공사 계약
- 2013. 5. 20 : 공사 착공
  - 영등포로 사면 콘크리트 구조물 철거 및 옹벽 설치, 수목 식재 중

### □ 향후 추진계획

- 2013. 7. 18 : 공사 준공

### □ 기대효과

- 소음, 진동 등 각종 공해 차단 및 완화로 쾌적한 생활환경조성

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
300,000천원 (시비)	14,950천원 (시비)	5%

## 9

## 가로수 생육환경 개선사업

가로수의 근본적인 생육환경을 개선하고 띠녹지 보식 및 정비를 통하여 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

 사업개요

- 위 치 : 국회대로, 여의서로, 여의동로, 당산로
- 규 모 : 1,610 $m^2$
- 기 간 : 2013. 1 ~ 10월
- 내 용 : 레인가든 조성, 가로수보호관 설치, 가로수 및 띠녹지 보식 등

 추진방향

- 띠녹지 내 레인가든 조성 및 토양, 기후, 위치에 적합한 수목식재

 추진실적

- 2013. 3. 11 : 실시설계용역 발주
- 2013. 3. 27 : 실시설계용역 착수
- 2013. 4. 11 : 설계심의
- 2013. 5. 09 : 용역 준공
- 2013. 6. 03 : 발주 전 사전검토 요청

 향후 추진계획

- 2013. 7월 : 계약심사 및 예산배정 요청
- 2013. 8월 : 공사 시행
- 2013. 10월 : 공사 준공

 기대효과

- 띠녹지 내 레인가든(빗물유입 화단)을 조성하여 효율적인 빗물관리 및 가뭄 시 수목 고사율 감소

 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
400,000천원 (시비)	13,332천원 (시비)	4%



우리구 대표노선으로 선정된 국회대로의 화단에 다양한 꽃을 식재하여 아름다운 경관을 연출하고자 함

### 사업개요

- 위 치 : 국회대로(여의동 국회의사당 앞 화단, LG트윈타워 앞 화단)
- 규 모 : 660 $m^2$
- 기 간 : 2013. 3 ~ 6월
- 내 용 : 봄철·여름철 꽃묘 식재 75,000본

### 추진방향

- 도시가로경관에 조화로운 형태·색상의 식물 도입

### 추진실적

- 2013. 3. 20 : 봄철 테마화단 꽃묘 식재(팬지 등 37,750본)

### 향후 추진계획

- 2013. 6. 11 ~ 12 : 여름철 테마화단 꽃묘 식재(메리골드 등 37,595본)

### 기대효과

- 테마화단에 꽃을 식재하여 아름다운 경관 연출
- 보행자 및 운전자들에게 시각적 아름다움 제공

### 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
31,000천원 (시비)	15,262천원 (시비)	49%

## 11 도시구조물 벽면녹화사업

도시미관을 저해하는 콘크리트 담장에 녹화사업을 시행하여 도시미관 향상 및 쾌적한 가로경관을 도모하고자 함

### 사업개요

- 위 치 : 대림동 우성2차아파트 담장(대림동 697),  
당산2동 당서초등학교 방음벽(당산동5가 4-9)  
국립농산물품질관리원 시험연구소(당산동3가 560-2)
- 규 모 : 402m
- 기 간 : 2013. 1 ~ 7월
- 내 용 : 식재기반조성 후 관목류 및 덩굴식물 식재

### 추진방향

- 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성
- 도심미관 및 가로녹시율 향상을 위한 녹지 확충

### 추진실적

- 2013. 5. 2 : 시 설계심의(서울시 조경과)
- 2013. 5. 20 : 계약심사 및 일상감사 요청

### 향후 추진계획

- 2013. 6. 10 : 공사 발주
- 2013. 6. 21 : 공사 착공
- 2013. 7. 20 : 공사 준공

### 기대효과

- 도심미관 향상 및 쾌적한 가로경관 조성

### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000천원 (시비)	1,496천원 (시비)	2%

별도의 토지 보상 없이 공공기관 옥상의 빈 공간을 이용하여 녹화를 함으로 도심지내 녹지 및 생물서식공간 확보, 대기질 개선, 에너지 절약 등 쾌적한 도심환경에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포동 서울시 근로자복지관(영등포동7가 57)
- 규 모 : 154.8m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 1 ~ 7월
- 내 용 : 구조안전진단, 옥상방수·방근처리, 수목 및 초화류 식재 등

### □ 추진방향

- 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성
- 도심열섬현상 완화 및 휴게쉼터 조성

### □ 추진실적

- 2013. 3. 18 : 구조안전진단용역 시행
- 2013. 4. 17 : 실시설계용역 시행
- 2013. 5. 8 : 시 설계심의(서울시 조경과)
- 2013. 5. 27 : 계약심사 및 일상감사 요청

### □ 향후 추진계획

- 2013. 6. 10 : 공사 발주
- 2013. 6. 21 : 공사 착공
- 2013. 7. 16 : 공사 준공

### □ 기대효과

- 냉난방 에너지 절약, 대기질 개선 등 환경개선에 기여
- 소규모 생물서식공간 확보

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
58,000천원 (시비)	6,145천원 (시비)	11%

관내 가로수 결주지에 수목식재 및 보행에 지장을 주는 저축 수목을 정비하여 쾌적한 보행환경 조성하고 도림로의 가로수를 정비하여 민원해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 도림로 등 관내 11개 노선
- 규 모 : 134주(보식 27주, 바뀌심기 107주)
- 기 간 : 2013. 2 ~ 10월
- 내 용 : 가로수 보식 27주, 도림로 가로수 바뀌심기(회화→왕벚) 107주

### □ 추진방향

- 횡단보도 저축목 정비 및 가로수 공분에 보식하여 가로변 녹지량 확충
- 도림로 가로수 수종변경을 아름답고 쾌적한 가로경관 조성 및 민원해소

### □ 추진실적

#### ● 가로수 보식 및 정비공사

- 2013. 2. 7 ~ 3. 8 : 실시설계용역 시행
- 2013. 4. 19 : 공사발주
- 2013. 5. 08 : 공사착공

#### ● 도림로 가로수 바뀌심기사업

- 2013. 3. 28 : 서울시 도시공원위원회 심의 상정
- 2013. 3. 29 : 예산배정요구
- 2013. 5. 01 : 도시공원위원회 심의
- 2013. 5. 09 : 심의결과시달 - 부결
- 2013. 5. 14 : 도시공원위원회 심의 재상정
- 2013. 5. 28 : 서울시 조경과 회신-심의 부결시 2년동안 재상정 불가

### □ 향후 추진계획(문제점)

- 2013. 7. 16 : 가로수 보식 및 정비공사 준공
- 도림로 가로수 바뀌심기가 도공위 심의 부결로 2년동안 상정이 불가하여 구비 확보 예산을 가지치기 및 병해충방제 예산으로 시행 검토 필요

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
270,000천원 (시 150,000, 구비 120,000)	36,500 (시비 0, 구비 36,500)	30% (구비 기준)

※ 도시공원위원회 심의 부결로 시비 150,000천원 확보 불가

체계적인 가로수 수형관리 및 태풍 등 재난에 대한 예방으로 안전하고 쾌적한 가로경관 조성

사업개요

- 위 치 : 문래북로 등 관내 14개 노선
- 규 모 : 980주
- 기 간 : 2013. 1 ~ 12월(연간단가)
- 내 용 : 버즘나무 등 3종 980주 가지치기

추진방향

- 노선별로 수관의 형태와 크기가 일정하도록 통일성 확보

추진실적

- 2013. 1. 18 : 공사 발주
- 2013. 2. 01 : 공사 착공

향후 추진계획

- 2013. 12. 31 : 공사 준공

기대효과

- 관내 가로수 가지치기를 통하여 가로수의 생육을 개선
- 쾌적한 가로환경 조성

소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
70,000천원 (구비)	14,000천원 (구비)	20%

보행자들이 많아 훼손이 심한 상가 앞 띠녹지를 철거하고 수목을 관내 띠녹지로 이식하여 쾌적한 가로환경을 조성하고 주민민원을 해소하고자 함

### 사업개요

- 위 치 : 신길로, 가마산로, 문래로
- 규 모 : 350m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 2 ~ 7월
- 내 용 : 띠녹지 철거, 수목 이식 및 보식 5,000주

### 추진방향

- 훼손이 심한 상가 앞 띠녹지 철거 및 기존 띠녹지 정비

### 추진실적

- 2013. 1. 31 : 실시설계용역 발주
- 2013. 2. 07 : 용역 착수
- 2013. 3. 08 : 용역 준공
- 2013. 4. 04 : 계약심사 요청
- 2013. 4. 22 : 공사발주
- 2013. 5. 09 : 공사착공

### 향후 추진계획

- 2013. 7. 02 : 공사 준공

### 기대효과

- 훼손이 심한 띠녹지 철거를 통한 주민민원 해소
- 띠녹지 내 수목이식·보식을 통한 쾌적한 가로환경 조성

### 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,000천원 (구비)	12,396천원 (구비)	25%

녹지대 및 도로 주변의 위험수목을 사전에 정비하여 태풍, 폭우 등 기상 이변으로 인한 녹지대 수목의 쓰러짐을 예방하여 안전하고 쾌적한 녹지대 환경을 조성하고자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 양평2동 경인고속도로 입구, 당산2동 노들로 주변 등 관내 녹지
- 규 모 : 200주
- 기 간 : 2013. 1 ~ 11월(연간단가)
- 내 용 : 위험수목 제거 및 가지치기

### □ 추진방향

- 녹지대 내 수목으로 인한 위험요소 사전 해소
- 안전하고 쾌적한 녹지환경 조성

### □ 추진실적

- 2013. 1. 22 : 설계 및 공사 발주
- 2013. 2. 18 : 공사 계약
- 2013. 2. 19 : 공사 착공
- 2013. 3. 19 : 1차 기성 준공(1주 제거, 가지치기 153주)

### □ 향후 추진계획

- 2013. 6. 10 : 2차 기성 준공(10주 제거, 가지치기 32주)
- 2013. 11. 30 : 공사 준공 예정

### □ 기대효과

- 태풍, 폭우 등 기상이변시 안전사고 예방

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
75,000천원 (구비)	27,096천원 (구비)	36%

## 17 생활주변 자투리땅 녹화사업

도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고  
 구민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시를 조성하기 위함

### □ 사업개요

- 위 치 : 양평2동 당산초등학교 옆(양평동4가 323-2) 등 5개소  
 당산2동 강마을 삼성아파트 입구, 신길로 우성아파트 담장길,  
 신길6동 남서울교회 앞, 신길1동 동산선원 앞
- 규 모 : 400㎡
- 기 간 : 2013. 1 ~ 6월
- 내 용 : 바닥테크 철거 및 점토블럭 포장, 수목 이식 및 식재 등

### □ 추진방향

- 도심지 생활주변 자투리 공간 녹화로 생활환경 개선
- 지속적인 자투리땅 발굴로 도심 내 녹지량 확충

### □ 추진실적

- 1차 공사 : 신길6동 남서울교회 앞 외 3개소
  - 2013. 3. 18 : 공사 발주
  - 2013. 3. 25 : 공사 착공
  - 2013. 4. 19 : 공사 준공
- 2차 공사 : 양평2동 당산초교
  - 2013. 5. 03 : 공사 발주
  - 2013. 5. 09 : 공사 착공

### □ 향후 추진계획

- 2013. 6. 05 : 2차 공사 준공

### □ 기대효과

- 생활주변 녹지량 확충 및 민원해소
- 생활주변 녹지조성으로 주민의 삶의 질 향상

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,000천원 (구비)	45,760천원 (구비)	92%



관내 가로변 녹지대에 설치된 친수공간의 수경시설이 노후되어 사전 정비하여 누수 및 전기 안전사고 등을 예방하고자 함

### 사업개요

- 위 치 : 당산1동 영등포구청역 앞 분수대(당산동3가 370-3) 등 7개소
- 규 모 : 513 $m^2$
- 기 간 : 2013. 4 ~ 7월
- 내 용 : 수경시설 시설물 및 시스템 정비 등

### 추진방향

- 주기적인 청소 및 수질검사 등으로 안전하고 쾌적한 수경시설 유지관리 시행
- 믿고 안심할 수 있는 수질 및 안전, 시설관리 추진

### 추진실적

- 2013. 4월 : 시스템 점검 및 자체설계

### 향후 추진계획

- 2013. 6. 12 : 공사 발주
- 2013. 6. 17 : 공사 착공
- 2013. 7. 01 : 공사 준공

### 기대효과

- 여름철 청량감 제공 및 쾌적한 수경시설 환경 유지
- 안전사고 예방 및 시민 건강상의 위해요인 제거

### 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
15,000천원 (구비)	6,500천원 (구비)	43%

양평유수지의 저수기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 오염토양치환, 토양정화 수생초화류 및 수목식재, 시설보완을 통해 유수지 악취를 저감하고 자연생태를 복원하여 주민휴식공간으로 재조성.

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평1동 양평동3가 57일대 양평제1유수지
- 공사기간 : 2012. 11. 28 ~ 2013. 5. 15
- 공사내용
  - 토목공사 : 토양치환 1,400 $m^2$ (T30cm),
  - 시설공사 : 연못조성 500 $m^2$ , 분수 2기, 상수도인입 1식, CCTV 3대, 보행데크 난간보수 1,258경간, 태양광정원등 62개소, 수목터널 4개소, 화단 8개소, 등의자 10개소 설치 등
  - 식재공사 : 교목 낙우송 등 4종 125주, 관목 갯버들 등 3종 5,500본, 초화류 창포 등 9종 36,450본, 덩굴식물 덩굴장미 등 3종 180본

### □ 추진실적

- ' 12.02.03~03.28 : 기술용역타당성심사, 설계용역비재배정
- ' 12.03.28~09.17 : 설계용역시행, 주민설명회, 설계심의, 계약심사
- ' 12.11.28 : 공사착공
- ' 13.05.15 : 준공

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
627,000천원 (시비 전액)	503,581천원 (시비 전액)	80.3%

안양천 제방사면의 환상덩굴, 쇠뜨기 등 생태계 교란·유해식물제거, 다양한 초화류 및 화목류 식재를 통해 자연생태를 복원하고 하천경관을 향상시켜 자연과 사람이 어우러지는 산책로를 조성.

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평2동 안양천 우안 제방사면 목동교~양평교
- 공사기간 : 2012. 11. 21 ~ 2013. 06. 14
- 공사내용
  - 철거공사 : 호안블록면정리 5,646 $m^2$ , 콘크리트경계석철거 205m
  - 토 공 사 : 외부토사운반 1,412 $m^3$ , 성토 1,412 $m^3$ , 성토면고르기 5,646 $m^2$
  - 식재공사 : 금계국 등 5종 식물매트식재 5,574 $m^2$ , 조팝나무 2,200주, 줄사철 240본, 버드나무전정 278주, 버드나무벌목 25주
  - 시설물공 : 식재기반조성 5,646 $m^2$ , 쏘라블록 110개소, 종합안내판 1개소
  - 포장공사 : 탄성포장 2,950 $m^2$ , 화강석경계석 1,023m
  - 우배수공 : 배수관설치 유공관 1,017m, PVC관 589m
  - 관수공사 : 옥외관로배관공사 1식, 펌프설치 1식 등

### □ 추진실적

- ' 12.01.30~02.21 : 기술용역타당성심사, 설계용역비재배정
- ' 12.03.05~08.28 : 설계용역시행, 주민설명회, 설계심의, 계약심사
- ' 12.08.24~10.19 : 서울지방국토관리청 하천점용허가
- ' 12.11.21 : 공사착공
- ' 13.06.14 : 준공

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
950,000천원 (시비 전액)	800,722천원 (시비 전액)	84.3%

## 21 마을단위 야외체육시설 설치

늘어나는 웰빙인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 생활권 녹지대, 근린공원, 어린이공원 등에 야외체육시설을 설치하고 노후화된 시설물을 새롭게 정비하여 구민건강 증진 및 생활체육 활성화에 기여코자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 거성체련장 외 4개소
- 규 모 : 5,500 $m^2$
- 사업기간 : 2013. 4 ~ 5
- 내 용 : 공원, 녹지대 등 야외운동기구 설치 및 정비

### □ 추진방향

- 공원 및 생활권 녹지대 등에 야외체육시설 설치로 웰빙인구 수용 충족
- 노후화된 야외체육시설 정비로 주민 만족도 향상

### □ 추진실적

- 2013. 4 : 대상지 조사
- 2013. 5 : 설치공사 시행(부분준공)

### □ 향후 추진계획

- 2013. 6~10 : 잔여예산 활용 하반기 체육시설 유지보수 시행

### □ 기대효과

- 구민의 건전한 여가선용 및 생활체육을 통한 삶의 질 향상
- 생활주변의 체육시설 설치로 구민건강 증진 및 체육인구 저변 확대

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
50,000천원 (구비)	38,000천원 (구비)	76%

노쇠한 왕벚나무를 외과수술 등을 통하여 건강한 생육여건 조성하고 한강 여의도 봄꽃축제의 기반을 마련코자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 여의동·서로, 안양천 제방, 신길6동 벚꽃길 등
- 규 모 : 왕벚나무 2,000주
- 사업기간 : 2013. 3. 6 ~ 3. 29
- 내 용 : 외과수술 및 생리증진제 처리

### □ 추진방향

- 노쇠한 왕벚나무 위주로 순차적으로 추진

### □ 추진실적

- 2013. 3. 8 : 공사계약 및 착공
- 2013. 3. 29 : 사업시행 및 준공

### □ 기대효과

- 외과수술 및 병해충방제 등을 통한 건강한 생육여건 조성
- 왕벚나무의 체계적 관리로 아름다운 가로경관 조성

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
20,000천원 (구비)	18,000천원 (구비)	90%

주민들이 즐겨 찾는 생태하천인 안양·도림천에 계절별 꽃묘를 식재하여 볼거리 제공 및 하천경관 미화 등 아름다운 하천으로 유지관리

### 사업개요

- 위 치 : 안양·도림천 자전거도로변 화단 및 화분
- 규 모 : 팬지 등 약 10만본
- 기 간 : 2013. 3 ~ 11월
- 내 용 : 자전거도로변 화단 및 화분 꽃묘 식재

### 추진방향

- 자전거도로변 화단 및 화분 등에 계절감 있는 꽃묘 식재

### 추진실적

- 2013. 03. 29 : 봄철 꽃묘 식재 완료  
- 팬지 20,000본, 비올라 10,000본

### 향후 추진계획

- 2013. 06 : 여름철 꽃묘 식재 (관급자재 구매)
- 2013. 09 : 가을철 꽃묘 식재 (관급자재 구매)
- 2013. 11 : 겨울철 꽃묘 식재 (관급자재 구매)

### 기대효과

- 계절감 있는 꽃묘 식재로 이용주민에게 볼거리 제공

### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
25,000천원 (구비 25,000)	10,657천원 (구비 10,657)	43%

### Ⅲ. 신규·주요 투자사업 실적

#### 1 마을마당 재정비 사업 --- 〈신규사업〉

시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 찾고 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소인 마을마당이 조성된 지 오랜 시간 경과하여 노후된 상태로 수목보식 및 편의시설 등을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소로 제공하고자 함

**사업개요**

- 위    치 : 분수마을마당(양평2동 3가 97-2) 등 2개소  
           - 나루마을마당(당산2동 121-101)
- 규    모 : 마을마당 2개소 시설 정비
- 사업기간 : 2013. 3 ~ 2013. 6
- 내    용 : 수목보식 및 노후 시설물 정비 등

**추진방향**

- 지역 커뮤니티 공간 및 녹음이 있는 쾌적한 마을쉼터로 보수정비

**추진실적**

- 2013. 04. 04 : 자체설계 완료
- 2013. 04. 18 : 공사 발주
- 2013. 04. 29 : 공사 착공

**향후 추진계획**

- 2013. 06. 12 : 공사 준공

**기대효과**

- 이용주민의 불편 해소 및 민원 해결
- 도시미관 개선 및 쾌적한 휴식공간 제공

**소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000천원 (시비)	92,399천원	92%

## 2 문래동 게이트볼장 조성사업 --- <신규사업>

문래동에 노년층이 쉽게 이용할 수 있는 게이트볼장을 조성하여 이용객의 건강 및 여가생활 공간을 확보코자 함

### 사업개요

- 위 치 : 문래동 3가 98
- 규 모 : 500m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 7
- 내 용 : 게이트볼장 조성 1식

### 추진방향

- 유휴공간을 활용한 게이트볼장 공간 확보

### 추진실적

- 2013. 1~6 : 대상지 확보를 위한 협의

### 향후 추진계획

- 2013. 7 : 실시설계용역 시행
- 2013. 8 : 계약 심사 및 공사 발주
- 2013. 9 : 공사 준공

### 기대효과

- 게이트볼장 조성으로 이용객의 건강 및 여가생활 공간 확보
- 생활체육 활성화로 지역주민 삶의 질 향상

### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000천원 (구비)	0천원 (구비)	0%



### 3 녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사 --- 〈신규사업〉

가뭄 등 기상이변으로 인하여 고사한 녹지대 수목을 연중 수시로 보식하고 노후 시설물을 정비하여 아름답고 쾌적한 녹지대 환경을 조성하고자 함

#### □ 사업개요

- 위 치 : 여의동 여의대로중앙분리녹지, 양평2동 양평가로녹지 등 관내 녹지대
- 규 모 : 300m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 1 ~ 11월
- 내 용 : 녹지대 수목 보식 300m<sup>2</sup>, 노후 시설물 정비 등 수시 시행

#### □ 추진방향

- 녹지대 수목 보식을 통한 아름다운 가로경관 조성
- 노후 시설물 정비를 통한 안전하고 쾌적한 녹지환경 조성

#### □ 추진실적

- 구비 예산 여건을 고려하여 시비로 추진중인 ‘가로변 녹지량 확충사업’에 양평2동 양평가로녹지 목재 계단 정비 및 철쭉류 보식을 공사내역에 반영함

#### □ 향후 추진계획

- 2013. 9월 : 설계 및 공사 발주
- 2013. 10 ~ 11월 : 공사 시행

#### □ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 녹지환경 조성으로 주민 민원 해소

#### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
30,000천원 (구비)	8,500천원 (구비)	28%

## 4 | **나라꽃 무궁화 보급·확대사업 --- <신규사업>**

나라꽃 무궁화를 심어 무궁화동산을 조성함으로써 나라꽃에 대한 소중함과 애국심을 고취하고 가로경관 향상에 기여하고자 함

### **사업개요**

- 위 치 : 여의동 국회의사당 앞 녹지대(여의도동 1-6)
- 규 모 : 200m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 1 ~ 5월
- 내 용 : 무궁화 158주 식재 및 한반도 모양 무궁화동산 조성

### **추진방향**

- 시민들로부터 사랑받는 나라꽃으로 자리매김 할 수 있는 여건 마련
- 무궁화 꽃을 생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 계기 마련

### **추진실적**

- 2013. 1 ~ 3월 : 실시설계, 설계심의(서울시 조경과), 계약심사
- 2013. 4. 01 : 공사 발주
- 2013. 4. 19 : 공사 계약
- 2013. 4. 22 : 공사 착공
- 2013. 5. 16 : 공사 준공

### **기대효과**

- 나라꽃에 대한 소중함과 애국심 고취에 기여
- 나라꽃 무궁화 식재를 통한 가로경관 향상

### **소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
30,000천원 (시비)	26,077천원 (시비)	87%

## 5 당산동 지정보호수 쉼터 조성사업 --- <신규사업>

보호수의 건전한 성장을 위한 생육환경개선 및 쾌적하고 편안한 주민휴게 공간을 제공하기 위함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 당산2동 강마을공원(당산동6가 10-7) - 은행나무  
양평동 양평교회(양평동4가 184) - 둥근잎느티나무
- 규 모 : 270㎡, 2주
- 기 간 : 2013. 2 ~ 7월
- 내 용 : 지정보호수 쉼터조성 및 생육환경개선

### □ 추진방향

- 주민들에게 쾌적하고 편안하게 쉴 수 있는 쉼터공간 제공
- 보호수의 건전한 성장을 위한 생육환경개선

### □ 추진실적

- 2013. 1 : 사업추진계획시달, 기술용역타당성심사의뢰
- 2013. 2 : 설계용역부적정통보, 자체설계시행시달
- 2013. 3 : 실시설계 도면실비로 의뢰
- 2013. 4 : 설계심의 및 심의결과반영
- 2013. 5 : 일상감사 및 계약심사요청
- 2013. 6 : 심사결과시달 및 공사비 예산재배정 요청

### □ 향후 추진계획

- 2013. 6 : 공사발주
- 2013. 7 : 공사준공

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
75,500천원 (시비 전액)	990천원 (시비 전액)	1.3%

## 6 우리 골목길, 우리 손으로 가꾸기사업 --- 〈신규사업〉

생활주변 마을 골목길을 주민들 스스로 꽃과 나무를 심고 가꾸어 골목길의 환경을 개선하고 생활주변을 녹화하여 이웃간의 만남과 소통의 공간을 마련코자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 신길동 170-2번지
- 규 모 : 140 $m^2$
- 기 간 : 2013. 2 ~ 12월
- 내 용 : 식재기반조성공사, 주민참여 수목식재 및 유지관리

### □ 추진방향

- 관주도가 아닌 주민공동체에 의한 꽃과 나무를 심고 가꾸는 분위기 조성
- 낙후된 생활 주변 마을 골목길을 주민들 스스로 생활환경 개선에 참여

### □ 추진실적

- 2013. 2월 : 골목길가꾸기 대상지 선정(서울시 조경과)
- 2013. 4월 : 골목길가꾸기 보조금 지급(서울시 조경과)
- 2013. 5월 : 골목길가꾸기사업 추진계획 수립

### □ 향후 추진계획

- 2013. 6월 ~ 7월 : 식재기반 조성공사 및 수목식재 완료
- 2013. 7월 ~ 12월 : 주민참여 유지관리

### □ 기대효과

- 주민들에게 쾌적한 생활환경 제공
- 생활주변 녹지량 확충 및 불법주차 관련 민원해소

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
30,000천원(시비)	-	0%

※ 「주민참여 동네숲 가꾸기사업」에서 명칭변경

## 7 도림천 음수대 설치공사 --- 〈신규사업〉

도림천내 음수대 신설로 도림천 이용객의 편의 증진 및 음수환경 개선

### 사업개요

- 위 치 : 도림천 도림교 인근
- 규 모 : 2m단면음수대 1개소
- 기 간 : 2013. 4 ~ 5월
- 내 용 : 도림천 음수대 1개소 신설

### 추진방향

- 음수대 시설이 없는 도림천내에 음수대 신설

### 추진실적

- 2013. 4. 17 : 공사 발주
- 2013. 4. 24 : 공사 착공
- 2013. 5. 18 : 공사 준공

### 향후 추진계획

- 기존음수대와 함께 자체인력으로 유지관리

### 기대효과

- 도림천 음수대 신설로 이용객 편의 증진

### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
12,000천원 (구비 12,000)	9,100천원 (구비 9,100)	76%

안양천 제방산책로에 왕벚나무를 보식하여 관내 걷고싶은길 명소로 조성

### 사업개요

- 위 치 : 안양천 제방산책로(신정교~오목교 구간)
- 규 모 : 왕벚나무 16주(B15)
- 기 간 : 2013. 4 ~ 5월
- 내 용 : 왕벚나무 보식

### 추진방향

- 안양천 제방산책로 수목간격이 넓은 구간에 왕벚나무 보식

### 추진실적

- 2013. 4. 25 : 계약 심사
- 2013. 5. 02 : 공사 발주
- 2013. 5. 09 : 공사 착공
- 2013. 5. 29 : 공사 준공

### 향후 추진계획

- 미보식 구간(오목교~양화교 사이)은 예산 반영후 순차적 보식 계획

### 기대효과

- 제방산책로 왕벚나무 보식으로 보행환경 개선 및 가로경관 향상

### 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
20,000천원 (구비 20,000)	14,850천원 (구비 14,850)	74%

## 9

# 영등포공원 시설 정비사업 --- 〈신규사업〉

공원내 노후된 음악분수 및 생태개울 등의 수경시설을 새롭게 정비하고 잔디 광장에 수목과 잔디를 식재하여 주민들의 활용도 높은 공원으로 조성코자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포동 582-3 영등포공원 일대
- 규 모 : 3,700 $m^2$
- 사업기간 : 2013. 2 ~ 7
- 내 용 : 음악분수대 및 생태개울 정비, 잔디광장 수목 식재 등

### □ 추진방향

- 공원내 아름답고 풍성한 볼거리를 제공할 수 있도록 기존 시설을 정비
- 공원 인근 주민들의 이용율을 높일 수 있도록 수경 시설을 개선

### □ 추진실적

- 2013. 2. 26 : 기술용역 타당성 심사
- 2013. 3. 18 : 실시설계 용역계약
- 2013. 5. 06 : 서울시 설계심의(공원녹지정책과)
- 2013. 5. 21 : 계약심사 및 일상감사
- 2013. 6. 14 : 공사발주

### □ 향후 추진계획

- 2013. 7 : 공사계약 및 착공
- 2013. 7 ~ 8 : 공사 준공

### □ 기대효과

- 노후된 수경시설을 정비하여 주민들에게 볼거리를 지속적으로 제공
- 공원이용 활성화로 지역 주민 삶의 질 향상

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
150,000천원 (시 150,000)	7,258천원 (시 7,258)	4.8%

영등포공원 이용객의 다수를 차지하고 있는 청·장년층을 배려한 배드민턴장의 노후 시설을 개선하여 이용주민에게 편의제공 및 공원이용 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포동 582-3 배드민턴장
- 규 모 : 1,200 $m^2$
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 5
- 내 용 : 배드민턴장 라인벨트 및 폴대 교체, 물품보관함 설치 등

### □ 추진방향

- 영등포공원 이용주민들의 운동욕구를 충족해 줄 수 있는 운동 공간의 확보
- 편리하고 주민 이용율이 높은 배드민턴장으로 새롭게 정비

### □ 추진실적

- 2013. 1. 30 : 추진계획 수립
- 2013. 3. 15 : 서울시 설계심의(공원녹지정책과)
- 2013. 3. 26 : 계약심사
- 2013. 4. 08 : 공사착공
- 2013. 5. 02 : 공사준공

### □ 향후 추진계획

- “사 업 완 료”

### □ 기대효과

- 공원 체육시설의 정비로 이용객의 건강 및 여가생활 공간 확보
- 공원이용 활성화로 지역주민들의 건강한 삶의 질 향상

### □ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
20,000천원 (시 20,000)	18,384천원 (시 18,384)	92%

※ 낙찰차액



## 11 시공원 보수정비사업 --- <신규사업>

시공원(영등포공원)의 게이트볼장에 인조잔디를 설치하고 원형광장 표지석을 정비하며, 배드민턴장 옆에 방풍용 수목을 식재하고 공원 전기시설을 정비코자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포동 582-3 영등포공원 일대
- 규 모 : 8,000㎡
- 사업기간 : 2013. 5 ~ 9
- 내 용 : 게이트볼장 인조잔디 설치, 원형광장 시설 정비, 수목식재 등

### □ 추진방향

- 기존 게이트볼장의 인조잔디를 설치하여 이용자들의 불편을 해소
- 배드민턴장의 방풍효과를 위한 키 큰 나무 식재 등

### □ 추진실적

- 2013. 5. 16 : 추진계획 수립
- 2013. 5. 28 : 기술용역타당성심사(기술심사담당관)
- 2013. 6. 04 : 계약심사 요청
- 2013. 6. 13 : 실시설계용역 발주

### □ 향후 추진계획

- 2013. 6 ~ 7 : 서울시 설계심의
- 2013. 7 ~ 8 : 실시설계용역 준공 및 계약심사
- 2013. 8 ~ 9 : 공사 착공 및 준공

### □ 기대효과

- 기존의 시설을 새롭게 개선함으로써 공원 이용 활성화에 기여
- 공원내 수목 보식으로 인한 전제 녹지량 확충 및 공원경관 향상

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000천원 (시 100,000)	5,319천원 (시 5,319)	5.3%

한강, 샛강 등 기 조성된 하천의 산책로를 활용하여 구민건강 걷기코스로 재조성하고, 산책로, 도로변 녹지 등을 연계하여 걷기코스 발굴 및 테마가 있는 도심속 올레길 조성.

### □ 사업개요

- 위 치 : 한강, 샛강, 여의도공원, 선유도공원 등
- 사업내용 : 특화된 안내체계 도입, 편의시설 설치, 노면불량구간 정비, 단절된 산책로 연결, 쉼터 및 전망대 조성
- 사업기간 : 2013. 2 ~ 10

### □ 추진방향

- 우리 구 외곽의 양호한 수자원 환경과 지역적 특성을 살려 쾌적하고 아름다운 도시 영등포구 조성
- 생활주변 건강 산책로 및 테마거리 조성으로 삶의 질 향상

### □ 추진실적

- 2013. 02. 06 : 계약심사 의뢰(감사담당관)
- 2013. 02. 15 : 실시설계용역 시행(02.21~06.10)

### □ 향후 추진계획

- 2013. 06. 14 : 실시설계용역 준공
- 2013. 06. 20 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2013. 07. 15 : 공사착공 및 준공(07.15~10.15)

### □ 기대효과

- 한강, 샛강의 하천녹지와 도심 외곽의 단절된 산책로 및 녹지를 연결하여 녹지가 풍부한 생태도시 조성으로 주민 건강 증진
- 생활주변 건강산책로 조성으로 주민의 여가생활 증진 및 삶의 질 향상

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
320,000천원 (구비)	15,345천원 (구비)	5%

도심내 접근이 편리하고 다양한 계층이 이용 가능한 친수시설을 도입함으로써 가족과 함께 여가를 즐기고 사계절 활용이 가능한 물놀이장을 조성하여 주민들의 화합하는 커뮤니티 공동체 형성

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 문래동 3가 94-1번지(문래 목화마을마당)
- 사업내용 : 기반조성공사(구체, 마감, 포장), 물놀이 시설공사(설비), 물놀이 시설 등, 철거공사, 녹지정비 및 포장공사 등
- 규 모 : 3,311㎡(물놀이장 조성 500㎡)
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 7

### □ 추진방향

- 어린이들의 놀이공간 시설이 부족한 지역에 가족 및 이웃 등 다양한 계층이 생활의 쉼터로 찾아 이용할 수 있는 물놀이 테마공원조성

### □ 추진실적

- 2013. 01.15~03.25 : 실시설계용역 시행
- 2013. 03. 26 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2013. 04. 19 : 공사착공

### □ 향후 추진계획

- 2013. 07. 10 : 공사준공
- 2013. 07. 15 ~ 08.31 : 물놀이장 운영 및 유지관리

### □ 기대효과

- 물놀이 테마공원 조성으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
550,000천원 (구비)	224,000천원 (구비)	41%

### ※ 문래공원내 물놀이장 조성 변경

- 구청장 동 신년인사회(2013.01.28)시 주민반대 및 재검토요구
- 주민의견반영 및 위치변경  
(당초: 문래공원 → 변경: 문래 목화마을마당)

양평동 2가 41-5일대는 노후불량주택 밀집지역으로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성함으로써 주민에게 쾌적한 녹지환경 제공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동2가 41-5번지 외 31필지
- 규 모 : 1,109.5 $m^2$
- 사업기간 : 2009. 4 ~ 2013. 10
- 내 용 : 불량주택 밀집지역 내 토지보상 및 마을마당 조성

#### □ 추진방향

- 불량주택 밀집지역 도시경관 향상 및 공원녹지 확충에 기여

#### □ 추진실적

- 2009. 04. 29 : 영등포구 투자사업 결정
- 2009. 09. 07 : 도시계획시설(공공공지)결정 및 지적고시
- 2011. 10. 06 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획 인가고시
- 2012. 12. 24 : 양평동 불량주택 밀집지역 공원화사업 조경공사 착공
- 2013. 03. 25 : 토지, 지장물, 영업권 등 보상 완료
- 2013. 05. 22 : 양평동 공원화사업 지장물 철거공사 착공

#### □ 향후 추진계획

- 2013. 08. 19 : 양평동 공원화사업 지장물 철거공사 준공
- 2013. 10. 31 : 시설공사 준공(조경, 전기, 통신)

#### □ 기대효과

- 공원·녹지가 부족한 불량주택(판자촌) 밀집지역에 주민들의 숙원사업인 공원을 조성하여 시민의 여가 및 휴식 공간 제공

#### □ 소요예산 : 3,959백만원(특별교부금 93%, 구비 7%)

- 2012년 : 사고이월 737백만원(공사비 339, 보상비 392, 시설부대비 6)
- 2013년 : 250백만원(철거공사 및 전신주 이설)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
3,959,000천원 (특별교부금3,700, 구비259)	3,114,586천원 (구비)	79%

장기미집행 도시계획시설인 경부제3녹지에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 녹지 기능을 회복시킴으로써 철도변 소음, 진동 등 공해를 완화하고 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 경부제3녹지(신길1동 68-3번지 일대 대방역 ~ 신길역 구간)
- 규 모 : 7,912 $m^2$
- 기 간 : 2007. 11. 15 ~ 2013. 12. 31.(계속사업)
- 내 용 : 소나무, 철쭉 등 26종 20,594주 식재(교목 1,744주 / 관목 18,850주), 성토 8,163 $m^3$ , 집수정 4개소, 배수로 688m 등

### □ 추진방향

- 미철거 건물 3동 철거 및 폐기물처리, 녹지조성 7,912 $m^2$

### □ 추진실적

- 2013. 1 ~ 3월 : 실시설계, 설계심의(서울시 조경과), 계약심사
- 2013. 3. 22 : 공사 발주
- 2013. 4. 12 : 공사 계약
- 2013. 4. 15 : 공사 착공
  - 텃밭 조성, 수목식재, 배수로 설치 중

### □ 향후 추진계획

- 2013. 12. 31 : 공사 준공 예정

### □ 기대효과

- 소음, 진동 등 각종 공해 차단 및 완화로 쾌적한 생활환경조성

### □ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
988,000천원 (시비 도시개발특별회계)	381,700천원 (시비 도시개발특별회계)	39%

아파트 담장을 철거하고 부족한 생활권 녹지를 확충하여 녹시율을 높이고 쾌적한 생활환경을 조성하여 주민 만족도를 향상하고자 함

### 사업개요

- 위 치 : 문래동 유원아파트(문래동6가 11-1)
- 규 모 : 370 $m^2$
- 기 간 : 2013. 1 ~ 5월
- 내 용 : 담장 철거 100m, 수목 및 초화류 식재 등

### 추진방향

- 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성
- 사유녹지를 활용하여 부족한 생활권녹지 확충

### 추진실적

- 2013. 1. 28 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2013. 2. 14 : 공사 발주
- 2013. 3. 07 : 공사 착공
- 2013. 5. 05 : 공사 준공

### 기대효과

- 녹지의 확보가 어려운 도심생활권에 사유지를 활용한 녹지 확충
- 가로변 녹시율 증진 및 쾌적한 주거환경 조성

### 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
90,000천원 (구비)	74,960천원 (구비)	83%

안양천 제방사면 양평교~한강합류부 구간에 대하여 기조성된 그린웨이 1~4차 구간과 연계하여 생태계 교란·유해식물제거, 기존수목보존, 다양한 초화류 및 화목류 식재 등을 통해 자연생태복원 및 하천경관향상.

**□ 사업개요**

- 위 치 : 영등포구 양평2동 안양천 우안 제방사면 목동교~양평교
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 12
- 사업금액 : [시비] 금286,000천원
- 공사내용 : 유해식물제거, 기존식생보존, 식생기반조성, 식재공사 등

**□ 추진방향**

- 하천 유수소통에 저해되지 않는 범위 내에서 하천생태복원.
- 하천생태계 보전에 적합한 초종을 식재하여 계절별 다양한 꽃이 피는 아름다운 하천경관조성.

**□ 추진실적**

- ' 13.01.14 : 사업추진계획수립
- ' 13.01~03 : 기술용역타당성심사, 설계용역비재배정
- ' 13.04 : 실시설계용역시행 중

**□ 향후 추진계획**

- ' 13.06 : 용역보고, 자문회의, 주민설명회, 설계심의
- ' 13.07 : 설계용역완료, 계약심사, 하천점용허가
- ' 13.08 : 시비예산 재배정, 공사발주 및 계약
- ' 13.09~11 : 공사시행

**□ 소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
286,000천원 (시비 전액)	0천원 (시비 전액)	0%
