

제201회 구의회 제1차 정례회

2017. 6. 15. ~ 6. 27.

청림 영등포

국 별

# 2017년 주요업무 보고



## 안전건설국

# 보고 순서

I . 일반 현황 . . . 1

II . 주요업무 추진실적 . . . 6

III . 중점사업 추진실적 . . . 25

# I . 일 반 현 황

## 1 조 직

### 안전건설국 - (6)과 (26)개팀



## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직 · 임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	194	1	6	42	63	53	18	1	3	3	0	1	1	1	1
현 원	194	1	6	47	60	27	34	1	13	0	0	1	1	1	2
과부족	0	0	0	△5	3	26	△16	0	△10	3	0	0	0	0	△1

### 3

## 주요시설 및 장비

### 도시안전과

구분	명칭	현황	비고
시	재난위험 시설	21개소	- D급 21
	U- 영등포 통합관제센터	영등포보건소지하1층/1개소	- 관제실, 회의실, 장비실
설	CCTV	918개소/1,568대	- 방법 : 798개소 1,180대 - 교통단속 : 118개소 386대 - 시설안전 : 2개소 2대
장비	민방위6종장비 (지역대+지원대+직장대)	2,706개	- 전자메기폰 566, 지휘용 앰프 83, 응급처치 세트 374, 한자용 들것 326, 휴대용조명등764, 교통신호봉 593
	영상관제시스템	79대	- 서버, 영상저장장치, 보안시스템, 관제용PC
	통신장비	6대	- 자가정보통신망, 네트워크 장비
	영향음향시스템	1식	- 모니터 등

### 건설관리과

#### □ 가로 시설물 현황

보도상 영업시설물			광고물 시설물		
소계	가로 판매대	구두 수선대	소계	현수막 게시대	시민게시판
146개소	73	73	71개소	39	32

#### □ 옥외광고물 관리 현황

계	옥상	돌출	지주	가로형	세로형	기타
5,407개소	51	1,522	151	3,343	62	278

## 도 로 과

도로현황 : 주요간선도로(경인로 외 27개 노선)

연장 390.6km		도 로 율
시도 76.0km	구도 314.6km	23.4% (서울시 : 22.42%)

시설물 현황

계	교 량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	입체교차로
53개소	21	6	12	1	8	5

조명시설

가 로 등	보 안 등
9,157등 (LED1,020등)	9,838등 (LED1,688등)

## 치 수 과

시설물 현황

구 분	빗물펌프장	간이펌프장	수 문	원격감시시설	하수관거	하천
시 설 개 요	8개소	7개소	23개소 (59문)	26개소	473,220m	4개소 (16.96km)

## 교통행정과

교통시설물 현황

계	도로안내표지	보행자안내표지	도로반사경	자전거보관대	무인자전거시설
988개소	536	57	261	132 (3,817대)	2 (264대)

건설기계 등록

계	영업용	자가용	관 용	비 고
18,363대	16,540	1,810	13	서울시 전체(48,277대)38%

자동차 등록 현황

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	이륜자동차
162,081대	117,667	6,119	20,506	1,104	16,685

**주차문화과**

주차장 현황

구분	계	노상주차장				노외주차장				건축물 부설주차장				
		소계	가주차 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일반 건축물
개소	13,343	5,436	5,389	39	8	65	29	3	33	7,842	1,700	3,100	1,299	1,743
면수	170,609	6,545	5,389	938	218	5,882	2,721	1,181	1,980	158,182	2,866	7,039	73,219	75,058

무인단속시스템(CCTV) 현황

계	불법 지정차 단속용	그린파킹 계도용
210대	118	92

## 4

## 예산 현황

(단위: 천원)

부서명	예산액	집행액	집행율(%)
계	43,931,824	18,824,992	42.8
도시안전과	4,237,899	2,102,409	47.4
건설관리과	826,787	330,846	40.0
도로과	6,723,534	2,352,819	35.0
치수과	5,082,785	2,453,121	48.2
교통행정과	1,055,850	360,568	34.1
주차문화과	26,004,969	11,225,229	43.2

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	선제적 안전관리 체계 구축 .....	7
②	행정재산(도로·하천 등) 관리의 내실화 .....	9
③	보행로 확보를 위한 가로정비 추진 .....	10
④	광고물의 효율적 관리로 쾌적한 가로환경 구축 .....	11
⑤	도림동 286-11 ~ 187-39간 도로개설공사 .....	12
⑥	도로 및 도로시설물 정비공사 .....	14
⑦	LED 도로조명 설치(개량)공사 .....	15
⑧	도림2유수지 복개 공사 .....	17
⑨	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 .....	18
⑩	하수관로 개량공사 .....	19
⑪	더 안전한 교통시설물 관리 .....	21
⑫	교통혼잡 완화를 위한 기업체 교통수요관리 활성화 .....	23
⑬	주차장 확보 및 건축물 부설주차장 개방 추진 .....	24



분야별 철저한 안전관리와 위험시설 등을 보강하고 유관기관 및 관련 부서간 협조체계를 강화하여 효율적인 재난예방 및 대응·복구체계를 구축하고자 함

## □ 사업개요

- 재난 유형별 안전관리 계획 수립
- 안전문화운동 확산 및 안전교육강화
- 재난취약시설(특정관리시설, 어린이 놀이시설, 재난취약가구 등)정기 안전점검
- 재난 대응능력 강화를 위한 재난 훈련 실시

## □ 주요 추진실적

- 한파 종합대책 추진: 2016.11.15 ~ 2017. 3.15.
  - 노숙인, 독거어르신 등 취약계층 보호활동 및 가스 등 취약시설물 안전점검 (한파 피해 없음)
- 지진대피소 추가지정: 5개소
  - 40개소: 실내구호소 6개소(교회 등), 옥외대피소 34개소(운동장29, 공원 5)
- 공무원 및 공사관계자 재난안전 교육 실시: 2회 604명
  - 해빙기 대비 안전대책, 재난발생 사례, 재난상황보고 및 전파체계 등
- 2016년도 재난관리 실태 공시: 구보 및 홈페이지(3.30)
  - 2016년도 재난 발생 및 수습 현황 등
- 영등포구 안전관리계획 수립 및 책자 제작 배포: 100부
  - 자연재난, 사회재난 안전관리분야에 대한 단계별 대책
- 해빙기 주요시설 안점점검: 780개소
  - 위험관리대상시설(옹벽, 공사장, 노후주택 등) 선정 집중점검: 90개소
  - 점검결과: 시정조치 38개소, 보수보강 14개소

- 어린이 놀이시설 안전점검
  - 대 상: 338개소(공원32, 어린이집61, 공동주택238, 실내놀이터 등 7)
  - 점검결과: 시정조치 23개소, 보수보강 5개소
- 재난취약가구 안전점검 및 시설개선 지원가구 선정: 451가구
  - 시설개선 : 874건(전기 289, 가스 317, 소화기 205, 기타 63)
- 재난현장 통합지원본부 운영 물품 확보
  - 캐노피 천막, 접이식 테이블, 발전장비 등 20종
- 재난위험시설 해소
  - 붕괴우려 석축(축대) 보수: 신길동 1-2 주변 일대
    - 정비내용: 하수관 비굴착 전체 보수, 가정관 인입공사 및 맨홀 개량 등
  - 재난위험시설물(D급) 해제: 신길동 노후주택 3개소 철거완료

## □ 향후계획

- 폭염 및 한파대책 추진
  - 폭염: 5. 20 ~ 9. 30, 한파:11.15~익년 3.15
- 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 정비(15종): 6월
- 풍·수해보험 가입추진(300가구): 6~7월
- 지진대피소 추가 지정 및 안내판 설치: 7월
- 부모와 함께하는 어린이 안전교육 뮤지컬 실시(2회): 7월12일, 9월5일
- 어린이집 순회안전교육 실시(60개소): 8~9월
- 특정관리시설물 및 취약시설 안전점검: 9월
- 어린이 놀이시설 하반기 안전점검: 9월
- 재난대응 및 예방을 위한 「재난대응 안전한국 훈련」 실시: 10~11월

## □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
209,795 (시비 104,404 구비 105,391)	116,380 (시비 76,041 구비40,399)	55.5

국·공유 행정재산 사용자에게 대한 사용료 부과와 무단사용자에 대해 권리 보존 및 변상금을 부과하고 세원 발굴을 통한 세입 증대 및 체계적인 행정재산 관리에 만전을 기하고자 함

### □ 사업개요

- 대 상: 공공용지 4,667필지, 5,242,814 $m^2$
- 내 용: 행정재산 실태조사, 점용허가 및 점용료·변상금 부과

### □ 주요 추진실적

- 2017년 부과·징수 목표 (단위 : 천원)

구분	계	도로사용료	변상금	과 태 료	징수교부금	가로판매사용료	징수율
부과	6,789,548	3,791,049	965,929	66,842	1,925,535	40,193	96.4%
징수	6,546,349	3,601,497	917,633	63,500	1,925,535	38,184	

- 2017년 부과·징수 현황 (단위 : 천원)

구분	목표	부과	징수	달성률(%)	징수율(%)
'17.5.31. 현재	6,546,349	3,860,030	3,818,939	58.3	98.9
'16.5.31. 현재	6,527,871	3,717,261	3,664,330	56.1	98.5

### □ 향후계획

- 차량출입시설 전수조사: 6~9월
- 공유재산 정기 실태 조사: 6~10월
- 변상금 부과대상에 대한 조사 및 부과: 10~12월

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
72,314 (구비 72,314)	29,179 (구비 29,179)	40.3

거리가게 및 노상적치물에 대한 효율적인 정비로 도로기능을 회복, 시민의 통행안전과 보행로를 확보하여 주민불편 사항을 최소화하고 안전한 가로환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간: 2017. 1. 1.~12. 31.
- 정비대상: 거리가게 및 노상적치물
- 정비인력 및 장비: 21명(직원 11, 용역 10), 차량3대

### □ 주요 추진실적

- 특별 가로정비
  - 신학기 학교주변 이동정비 113건: 2.21. ~ 3.10.
  - 여의도 봄꽃축제 정비 1,247건: 3.31. ~ 4.14.  
(강제수거 326건, 이동정비 921건)
  - 영일마늘시장 이동정비 209건: 5.20. ~ 6.16.
  - 공휴일 · 야간 정비: 32회
- 정비실적
  - 거리가게 및 노상적치물 정비: 11,896건
  - 강제수거: 568건(거리가게 410건, 노상적치물 158건)
  - 행정처분: 75건, 35,140천원

### □ 향후계획

- 아크로타워스퀘어 주변 상가 앞 적치물 특별정비
  - 영등포전통시장, 영등포기계공구상가 인도상 점포 180여개소
- 여의나루역 주변 노점상 특별정비
  - 서울밤도깨비 야시장 개장 운영일(금요일, 토요일)

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
359,477 (구비 359,477)	151,044 (구비 151,044)	42

## 4

# 광고물의 효율적 관리로 쾌적한 가로환경 구축    건설관리과

난립되는 각종 광고물에 대해 효율적 관리체계를 도입하고 효과적인 정비활동을 실시하여 무질서한 광고문화 개선과 불법 광고주의 행태변화를 유도하여 보다 쾌적하고 질서 있는 도시환경 구축에 기여코자 함

### □ 사업개요

- 광고물 관리체계 개선과 효과적 정비체계 도입으로 불법광고 정비율 향상
- 불법광고물 주민불편사항 해소 중점추진으로 쾌적한 주거환경 조성

### □ 주요 추진실적

- 광고물 경유제(상담제) 실시: 신규·폐업 업소 광고물 상담 582건 실시
- 수거보상제 확대추진 및 불법광고 정비 강화

구분	수거 실적(매)			과태료 부과(천원)		
	계	벽보	현수막	계	벽보	현수막
2017년 (1~5월)	<b>804,024</b>	770,088	33,936	<b>857,522</b>	102,786	754,736
2016년	30,089		30,089	668,481	20,855	647,626

- 광고물365감시반 운영 불법광고물 관리 및 정비시간 연장(21시까지)
- 불법광고물로 오염된 가로시설물 흔적지우기 추진: 2개조 일일 순회정비
- 가로시설물 불법광고 부착방지 패드 설치: 신길로, 도림로 7.5km 603개소

### □ 향후계획

- 광고물 경유제(상담제)의 지속적인 실시를 통한 올바른 광고문화 정착
- 풍수해 대비 옥외간판 안전도검사 실시 주민 안전사고 사전예방(6월중)
- 불법광고물 집중 정비구간(대림역 주변) 고정광고물 특별정비 추진

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
415,669 (시 118,900, 구비 65,030, 가금 231,739)	145,022 (시 25,473, 구비 10,445, 가금 109,104)	35

신도림역을 이용하는 영등포동, 도림동 구민의 통행불편을 해소하고 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 추진으로 지역균형발전에 기여

## □ 사업개요

- 위 치: 도림동 286-11~187-39간
- 규 모: 폭 6m, 연장 265m(보상: 토지 37필지 1,603 $m^2$ )
  - 2017년 공사개요
    - 위 치: 도림동 187-17 ~ 200-16
    - 규 모: 도로개설 6m, 공사 L=90m(보상; 토지 1필지 91 $m^2$ )
- 사업기간: 2010~2018년
- 총사업비: 4,903백만원(구비: 보상비3,750, 공사비1,103, 설계비50)  
(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2015	2016	2017	장 래	비 고
총사업비	4,903	350		1,000	730	2,823	
설 계 비	50	50					
보 상 비	3,750	300		1,000	350	2,100	
공 사 비	1,103				380	723	

## □ 주요 추진실적

- '64.01.24.: 도시계획시설(도로) 결정 (건설교통부고시 제768호)
- '10.05.27.: 일부보상시행[토지2필지(54 $m^2$ ), 건물1개동](L=10m)
- '10.07.05.: 도시계획시설(도로) 변경결정 (구고시 제39호)
- '10.11.08.: 실시설계용역
- '16.09.01.: 도시계획시설(도로) 선형변경 고시
- '16.10.20.: 실시계획인가 고시 및 보상의뢰
- '16.11.~ : '16년도 구간 보상시행
  - ┌ 보상대상: 토지7필지(260 $m^2$ ), 건물8개동
  - └ 보상완료: 토지5필지(170 $m^2$ ), 건물5개동

- '17.02.23.: '17년도 구간 실시계획인가 고시
- '17.03.29.: '16년도 구간 서울지방토지수용위원회 수용재결 요청
  - 재결신청대상: 토지 2필지 90㎡, 건물3개동
- '17.04.06.: '17년도 구간 보상계획 열람공고
- '17.05.23.: '17년도 구간 보상구간 감정평가 시행
  - 보상대상: 토지 1필지 91㎡, 건물2개동

**□ 향후계획**

- '17. 6.: 보상시행(거주자 이주) 및 공사설계
- '17. 7.: 공사발주 및 착공
- '17.12.: 공사준공

**□ 소요예산**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
730,000 (구비 730,000)	2,500 (구비 2,500)	1

**□ 위치도**



## 6 도로 및 도로시설물 정비공사

도로과

주민 생활에 불편을 주는 노후·파손된 도로 및 도로시설물을 신속히 정비하여 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

### □ 사업개요 및 추진실적

세부사업명	규모	사업내용	추진실적	예산 (천원)
포장도로정비 등 소파보수공사 (연간단가)	아스팔트정비 175a, 콘크리트정비 10a, 보도정비 10a	노후·파손된 도로 포장 정비 응답소, 민원상담, 순찰 등 각종 도로관련 민원처리 및 유지보수	아스팔트정비 73a, 보도정비 3.6a	1,302,500 (구비)
도로시설물 설치 및 보수공사 (연간단가)	볼라드 정비 및 설치 200개, 안전펜스 설치 및 보수 300m, 과속방지턱 설치 및 보수 300m, 과속방지턱 도색 4,000㎡ 등	볼라드, 안전펜스, 과속방지턱, 지하보도, 보도육교 등 도로시설물 유지관리	볼라드 정비 152개, 과속방지턱 설치 및 보수 67m, 과속방지턱 도색 93㎡	500,800 (구비)
보도정비공사 (연간단가)	보도블록 정비 32a	노후보도 (평탄성불량, 참하 등) 정비	보도블록 정비 24a	130,700 (구비)
사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사 (연간단가)	보도 턱낮춤 정비 50개소 등	사회적약자의 보행환경 개선 (보도 턱낮춤, 잡지블록 정비 등)	보도 턱낮춤 34개소	60,000 (구비)
포장도로 굴착복구 공사 (연간단가)	아스팔트 정비 180a, 보도블록 정비 60a	굴착 원안(구경복구)의뢰 시 포장, 잦은 굴착으로 인한 노후 불량 도로 정비	아스팔트 포장 70a	1,713,000 (기금)
불량맨홀 정비공사 (연간단가)	불량맨홀 정비 300개소	도로면과 맨홀뚜껑면 불일치로 인한 불량 맨홀 주변 정비	불량맨홀 정비 150개소	200,000 (기금)
보도환경개선공사 (시주민참여)	노후 보도 정비 3개소 27a	○ 사업위치 - 대신시장 앞대 일부 (신길동) - 산길리57~산길리205(산길동) - 대림86~시흥대교41(대림동) ○ 사업기간 : '17. 2 ~ 6.	대신시장외 2개소 노후보도 정비 27a 완료	312,500 (시주민참여)

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
4,219,500 (시 312,500, 구비 1,994,000, 기금 1,913,000)	1,291,059 (시 88,999, 구비 570,067, 기금 631,993)	30.6



내구연한이 경과된 노후 가로등 및 보안등을 빛공해가 적고 전기에너지 효율이 좋은 LED등으로 개량하여, 야간 교통 환경을 개선 및 이용편의 제공

### □ 사업개요 및 추진실적 등





구분	위 치	규 모	사업기간	추진실적 및 계획	예 산 (천원)
가 로 등	복음길 (KBS본관~ 여의도지구대)	LED가로등 (100W) 68등	'17. 3. ~ '17. 10.	'17. 3. : 계약심사 '17. 3. : 공사발주 '17. 4. : 공사착공 '17.10. : 공사준공	420,000 (시비)
보 안 등	문래동 (예술창작촌)	LED보안등 (50W) 118등	'17. 3. ~ '17. 6.	'17. 3. : 계약심사 '17. 3. : 공사발주 '17. 4. : 공사착공 '17. 6. : 공사준공	132,000 (시 주민 참여예산)
	신길6동 일대	LED보안등 (50W) 90등	'17. 3. ~ '17. 6.	'17. 3. : 계약심사 '17. 3. : 공사발주 '17. 4. : 공사착공 '17. 6. : 공사준공	97,000 (시비 27,000 구비 70,000)
지하 보도	여의도동 여의초교앞 지하보도내	LED실내등 (10~40W) 138등	'17. 3. ~ '17. 4.	'17. 4. : 공사준공	40,000 (구 주민 참여예산)
합 계		414등			689,000

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
689,000 (시579,000 구비110,000)	299,351 (시212,243 구비 87,108)	43.4

□ 위 치 도

구분	위 치	위 치 도
가로등	복음길 (KBS본관~ 여의도자구대)	
보안등	문래동 (예술창작촌)	
지하 보도	신길6동 일대	
지하 보도	여의도동 여의초교앞 지하보도내	

최근 늘어나는 배드민턴 수요의 증가로 365일 이용가능한 실내 배드민턴장을 건립하여 국민의 건강증진 욕구 및 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 254번지(도림유수지 내)
- 기 간 : '17. 2. ~ '17.07.27.
- 사업규모 : 유수지 일부복개 3,900㎡  
- 체육시설 정비(육상트랙 및 농구장 등)

■ 유수지 현황

- 저수용량 : 31,000㎥
- 유역면적 : 1,504㎢(도림동,신길동)
- 수혜세대 : 12,300세대

□ 주요 추진실적

- '17. 2.~4. : 바닥 및 기둥 콘크리트 타설 완료

□ 향후계획


- '17. 6. : 상부 슬라브 콘크리트 타설 및 양생
- '17. 7. : 공사준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
4,100,000 (시4,100,000)	2,243,704 (시 2,243,704)	55

□ 위 치 도

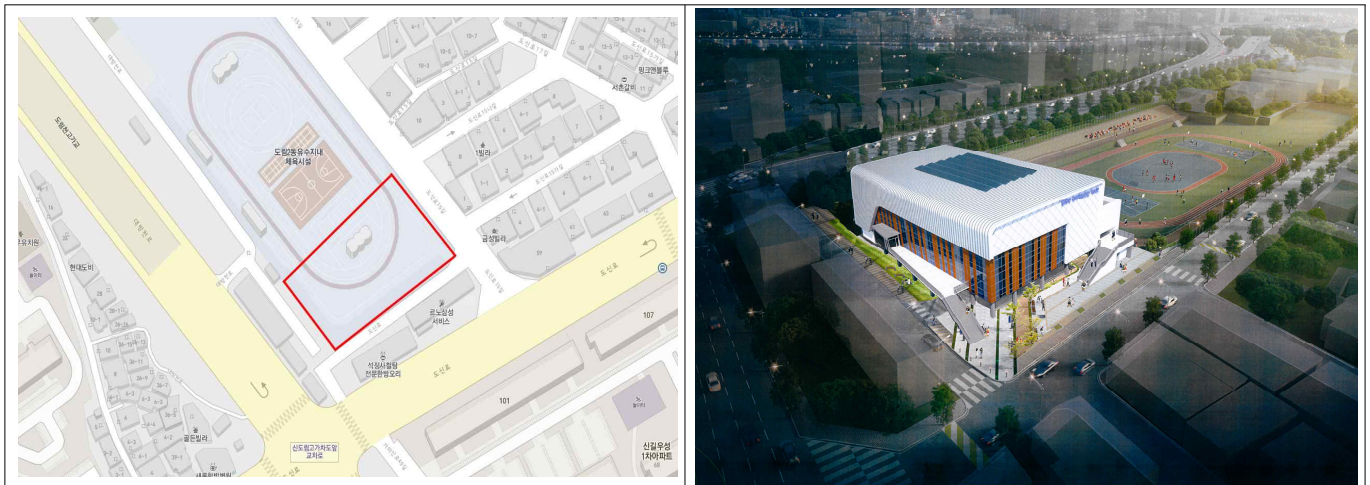

방류 후 잔류수가 처리되지 않아 인근 주민들에게 악취로 인한 혐오 시설로 인식되고 있어 유수지 지하에는 저류조 설치, 지상에는 생태공원 및 체육공간을 조성하여 악취저감 및 안양천 등 공공수역 수질개선을 통하여 쾌적한 생활공간 제공

### □ 사업개요

- 위치 : 양평1빗물펌프장(양평유수지 내)
- 기간 : '17. 3. ~ '18.12.
- 사업규모 :
  - 지하 저류조 46,000 $m^3$
  - 상부체육시설(축구장) 1식
- 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부 방재시설부 환경시설과

#### ■ 유수지 현황

- 저수용량 : 115,000 $m^3$
- 유역면적 : 4.525 $km^2$ (양평동, 당산동, 문래동, 영등포본동, 영등포동)
- 수혜세대 : 41,000세대

### □ 주요 추진실적

- '17. 3.02. : 공사착공
- '18.5.30. : CIP 파일 202공 완료 및 슈트파일 588중/343공 완료

### □ 향후계획

- '17. 6.~ '18. 6. : 터파기 및 구조물공사
- '18.12. : 준공

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
32,086,000 (시 16,043,000, 국비16,043,000)	1,550,000 (시1,550,000)	4.8

### □ 위치도



우리 구 관내 노후된 하수관로를 정비하여 도로함몰 등 안전사고를 예방하고 내구성 향상 및 원활한 배수처리로 수해예방에 기여

**□ 당산동4가 38-1~80주변 하수관로 개량공사**

- 사업기간: '17. 4. ~ 11.
- 사업비: 600,000천원
- 규모: 하수관로 개량 D=600~1,200mm, L=410m
- 세부 추진계획 및 일정
  - '17. 5.~6. : 실시설계 용역시행
  - '17. 7. : 공사계약 및 착공
  - '17. 11. : 공사 준공

**□ 신길동 362-22~276-77주변 하수관로 개량공사**

- 사업기간: '17. 4. ~ 11.
- 사업비: 900,000천원
- 규모: 하수관로 개량 D=600~1,500mm, L=700m
- 세부 추진계획 및 일정
  - '17. 5.~6. : 실시설계 용역시행
  - '17. 7. : 공사계약 및 착공
  - '17. 11. : 공사 준공

**□ 도신로60길1(대신시장)주변 하수관로 개량공사**

- 사업기간: '17. 3. ~ 5.
- 사업비: 150,000천원
- 규모: 하수관로 개량 D=450mm, L=200m, 보도정비 6.8@
- 추진실적
  - '17. 3.~ 4. : 공사계약 및 착공
  - '17. 5. : 공사 준공

**□ 소요예산**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,650,000천원 (시1,500,000 구비 150,000)	0	0

□ 위치도



교통안전시설물 및 편의시설물 중, 노후·파손된 시설은 즉시 정비하고 각종 필요시에 신규로 추가 설치함으로써 시설을 이용하는 주민들에게 편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 교통시설물 신설 및 유지관리 실시

□ 주요 추진실적

- 옐로카펫 설치사업(영림초교, 대동초교) : 5월 조성완료
- 영원초등학교 과속경보시스템 설치



- 교차로 신설 및 횡단보도 설치
  - 3월 : 신길7동 여의대방로 공군회관 앞
  - 4월 : 대영초교 앞
  - 5월 : 경인로 하나은행앞, 경부 제3녹지 공영주차장
- 교통시설물 유지관리 정비공사 추진
  - 시선유도봉 신설(14개), 재설치(14개), 철거(14개)
  - 도로반사경 신설(5개), 교체(1개), 각도조정(15개), 볼라드 8개 설치
- 보행자안내표지판 정비공사 실시 : 주변지역 안내지도 교체 20면

○ 버스승차대 신설

- 역상형(4.0m) : 거성파스텔(19-541), 선유도역 롯데홈쇼핑(19-765)
- 일반형(4.5m) : 여의도역(19-156)



○ 버스승차대 유지관리 정비공사 추진

- 버스승차대 침지물 제거(4개소), 승차대 재설치(대림역)
- 승차대 철거(3개소), 대기 의자 설치(3조), 대기 의자 정비(1조)

○ 도로안내표지판 정비공사 실시 : 표지판 지주 도색 41개소, 문안정비 17건



□ 향후계획

- 2017. 6월 : 무인과속단속카메라 설치

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
243,500 (구비)	84,724 (구비)	34.8



## 12 교통혼잡 완화를 위한 기업체 교통수요관리 활성화 교통행정과

도심속 교통혼잡 완화대책의 일환으로 교통유발시설물에 교통유발부담금을 부과하여 도시교통 개선에 필요한 재원으로 활용하고, 교통량 감축 프로그램에 참여한 기업체에는 부담금을 경감함으로써 저탄소 녹색교통 실현

### □ 사업개요

- 교통유발부담금 부과·징수(연 1회, 10월 정기부과)
  - 부과대상 : 연면적 1,000㎡ 이상인 시설물 (주택용도 제외)
  - 부담금산정 : 바닥면적 합계 × 단위부담금 × 교통유발계수
- 기업체 교통수요관리: 총 772개소 (민간기업: 740, 공공기관: 32)
  - 감축 프로그램 : 승용차부제운영, 주차장 유료화, 나눔카 이용 등 11개

### □ 주요 추진실적

- 교통유발부담금 정기분 부과를 위한 자료 정비
  - 소유권 · 건축물 변경내역(신축, 변경, 멸실 등) 정비 및 전산입력
  - 부과대상 : 6,125건, 비부과 : 12,033건(주거용 등)
- 교통유발부담금 체납관리
  - 체납고지서 우편발송: 3회 (739건), 압류조치 : 153건 (시설물, 자동차 등)
  - 체납징수 : 187건 (241백만원)
- 기업체 교통수요 관리
  - 2017년 기업체 교통수요관리 운영계획 수립 : 3. 15
  - 대중교통 이용의 날 및 민관거버넌스 캠페인 실시 : 6회
  - 기업체교통수요관리 프로그램 이행점검 실시(2분기, 3분기)

### □ 향후계획

- 시설물 현장조사 및 미사용(공실 등) 신고 접수 : 6 ~ 9월
- 2018년 교통량감축 프로그램 참여 접수 : 7. 31까지
- 교통량 감축프로그램 이행실적에 따른 부담금 경감심의 : 9월
- 교통유발부담금 정기분 부과·징수 : 10월(납부기한: 10.31)

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
106,195 (구비)	12,301 (구비)	11.6

주택 밀집지역에 공영주차장 건설, 그린파킹사업으로 주차장 조성 및 부설주차장 개방을 지속적으로 추진함으로써 부족한 주차공간을 확보하여 주민에게 쾌적한 주차환경을 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 사업대상: 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 추진내용
  - 주택 밀집지역 내 주차장 부지 확보 및 건설
  - 주택의 담장과 대문 철거 후 주차장 조성 및 건축물 부설주차장 개방

### □ 주요 추진실적

- 양평2동 공공복합청사 지하공영주차장 건설
  - 위치및규모: 양평동4가 96 / 지하 3개층 93면(4,270.4㎡)
  - 사업기간: '14. 7. ~ '18.12.
  - 공사착공: '16.12. 5.
- 그린파킹사업
  - 사업내용: 공사 가능 주택에 가구당 1면 기준 850만원을 지원하여 담장 및 대문 철거 후 주차장 건설과 무인방범시스템 설치
  - 사업실적: 9가구 16면 조성, 무인자가방범시스템 9대 설치
- 건축물 부설주차장 개방
  - 개방면수: 총 1개소 20면
  - 개방기간: '17. 5.15. ~ '19. 5.14.
- 거주자(상근자) 우선 주차장 신설
  - 신설현황: 5개소 74면(롯데제과 담장쪽 17면, 신도림고가차도하부 20면 등)

### □ 향후계획

- 양평2동 공공복합청사 지하공영주차장 준공: '18.12. 4.
- 그린파킹사업 및 건축물 부설주차장 개방사업: 연중 접수 및 시행

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
7,421,213 (사비 117,000, 구비 7,304,213)	91,875 (사비 40,500, 구비 51,375)	1.2

### Ⅲ . 중점사업 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	방법용 CCTV 신규 및 성능개선 사업 .....	26
②	영등포로 에너지절약형 LED간판 개선사업 .....	27
③	주민과 함께, 불법광고물 수거보상제 확대 .....	28
④	도림로 확장공사 .....	29
⑤	도시경관 개선사업 .....	31
⑥	도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(3구역) .....	33
⑦	교통사고 예방 안전대책 .....	35
⑧	양산로 자전거도로 정비사업 .....	37

# 1 방법용 CCTV 신규 및 성능개선 사업

도시안전과

방법 CCTV 신규 설치 및 저화질(41만화소) CCTV와 구형(아날로그) 비상벨 성능을 개선하여 긴급 상황 대응 등 운영업무의 효율성 제고

## □ 사업개요

- 사업기간: 3 ~ 8월
- 소요예산: 710,000천원
- 사업내용

구분	사업내용	소요예산 (단위: 천 원)		비고
		국비	구비	
계		500,000	210,000	
신규설치	- 범죄취약지 20개소(국비) - 주민참여 선정 장소 4개소(구비)	400,000	80,000	
성능 개선	CCTV - 내구연한 경과 41만 화소 40대 (국비: 20대, 구비: 20대)	100,000	100,000	
	비상벨 - 아날로그 비상벨 20대 (구비: 20대)		30,000	

※ 화소별 CCTV 현황 (2017.5.31. 현재)

구분	합계	41만 화소	130만 화소	200만 화소	비고
CCTV	1,568대	180대	360대	1,028대	'17년도 40대 성능개선 예정

- 41만 화소 CCTV 성능개선 : '15년 18% → '16년 12% → '17년 목표 : 9%

※ 비상벨 현황 (2017.5.31. 현재)

구분	합계	아날로그	디지털	비고
비상벨	791대	36대	755대	'17년 20대 성능개선 예정

- 아날로그 비상벨 성능개선 : '15년 51% → '16년 5.5% → '17년 목표 : 2%

## □ 주요 추진실적

- 신년인사 주민건의 사항 등 동별 수요조사(1~2월)
- 구 위치선정위원회 구성 및 심의(2월)
- 각 동별 설치동의서 징구 및 행정예고(2~3월)
- 현장조사(설계) 및 조달청 발주(3~4월)

## □ 향후계획

- 계약 및 착공 : 6월
- 준공 및 검수 : 8월

## □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
710,000 (국 500,000, 구 210,000)	53,748 (구 53,748)	7.6

무질서하게 난립되어 있는 불법간판을 정비하고, 아름답게 디자인된 에너지 절약형 LED간판으로 교체 설치함으로써 사람중심의 안전하고 쾌적한 거리를 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2017. 5월 ~ 11월
- 사업구간: 신길역 앞 ~ 대방역 사거리 앞(양쪽 약 1.7km, 一자형)



### □ 주요 추진실적

- '17. 3.~4.: 사업 조사지구 현황 조사(구간 내 개선간판 물량 파악)

행정동	총 계	영등포본동	신길1동	신길7동
개선간판 수	212개	24개	153개	35개

- '17. 4.~6.: 간판개선사업 추진계획 수립 및 주민 공람, 행정예고 실시

### □ 향후계획

- '17. 6.: 간판개선주민위원회 구성 및 區와 주민위원회 간 사업추진 협약 체결
- '17. 7.~8.: 간판디자인·제작업체 공고 및 제안서평가, 협상적격자 선정
- '17. 8.~11.: 사업지구 동의서 징구, 간판 시공 및 사후 정산

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
534,750 【간판개선사업 우수구 인센티브】 (사비 159,750, 구비 375,000)	0	0

도로변에 무단으로 게첨·부착되는 불법 현수막과 벽보에 대해 주민들이 함께 수거보상원으로 참여하여 정비활동을 펼침으로써 불법 행태 개선의 필요성을 함께 인식하고 협력 추진하여 불법광고물 퇴치에 효율성을 기하고자 함

### □ 사업개요

- 정비대상: 현수막, 벽보, 첩지물, 전단지, 명함 등 가로변 첩부 유동 광고물

### □ 주요 추진실적

- 수거보상원 참여인원: 총 43명(현수막 17명, 벽보 26명)
- 불법 현수막(벽보) 수거 및 과태료 부과 실적

(단위: 매/천원)

구분	수거실적(수거보상원)				과태료 부과					
	계	벽보		현수막		계	벽보		현수막	
		매수	보상금	매수	보상금		매수	금액	매수	금액
2017년 (1~5월)	804,024매 97,052천원	770,088	44,032	33,936	53,020	5,221매 857,522천원	1,764	102,786	3,457	754,736
2016년	30,089매 43,161천원	-	-	30,089	43,161	4,872매 668,481천원	605	20,855	4,267	647,626

### □ 향후계획

- 수거보상제 지속적 보완으로 가로변 불법광고물 신속 정비체계 유지
- 불법광고물 부착 흔적지우기 병행 집중 추진 보도환경 개선
- 옥외광고물 일일 감시체계 보강으로 불법광고 풍토 근절

### □ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
205,639 (시 33,900, 가금 171,739)	74,598 (시 25,473, 가금 49,125)	36

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위 치: 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~신길동421-16간(신길광장)
- 규 모: 도로확장 B=25→35m L=1,150m(양측)
- 사업기간: 1997년 ~ 2018년
- 사업비: 50,150백만원 (시비: 보상비 44,100,공사비 5,900,설계비150)
- ※ 2017년 공사개요
  - 위 치: 신길동 420-193 ~ 432-10
  - 규 모: B=30→35m, (공사 L=107m, 토지보상 6필지 287㎡)
  - 사업비: 2,600백만원(시비: 보상비 2,200, 공사비 400)
- 연차별 투자계획 (단위:백만원)

구 분	총 사업비	기투자	2015	2016	2017	2018	비고
계	50,150	36,550	1,000	2,000	2,600	8,000	
보 상 비	44,100	32,600	500	1,400	2,200	7,400	
공 사 비	5,900	3,800	500	600	400	600	
설 계 비	150	150	-	-	-	-	

□ 주요 추진실적

- '17.03.16. : 도시계획시설(도로) 실시계획 인가 고시
- '17.04. : 보상물건 조사 및 보상계획 열람공고
- '17.05. : 감정평가 의뢰

□ 향후계획

- '17. 6. : 보상시행 및 공사 발주
- '17. 7. : 공사 착공
- '17.12. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,600,000 (시비 2,600,000)	3,500 (시비 3,500)	0.1

□ 위치도





경관 취약 지역의 생활환경 개선을 통해 노후 도로수준의 향상 및 보행편의를 제공하여 쾌적하고 안전한 도시경관 조성

□ 사업개요

- 위 치: 문래동 선유로9길 일대(선유서로31~선유로37)  
양평동 영등포로11길 12 일대(양평동1가 211-1)
- 규 모
  - 선유로9길 일대
    - 보도 확장 및 도로정비 B=8~10m, L=970m
    - 가로등 정비 : 55본(NH250W→LED75W)
  - 영등포로11길 12 일대
    - 도로정비 및 골목길 포장 B=2~8m, L=810m
- 사업기간: '17. 2. ~ 12.
- 사 업 비: 총 1,000백만원(시비 500, 구비 500)
- 연차별 투자계획 (단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년	2018년 이후
계	1,000		1,000	
보 상 비	-		-	
공 사 비	960		960	
설 계 비	40		40	

□ 주요 추진실적

- '17. 1. 6.: 2017년 경관개선사업 사업계획서 및 구비 확보 현황 제출 (서울시→구)
- '17. 1.16.: 구청장 방침수립 『2017년 도시경관사업 추진 계획』
- '17. 3. ~ : 설계용역 착공

□ **향후계획**


- '17. 8. : 용역 준공 및 공사 발주
- '17. 9. ~ 12.: 공사 시행 및 준공

□ **소요예산**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,000,000 (시 500,000 구비 500,000)	34,524 (시비 34,524)	3.5

□ **위치도 및 현황사진**

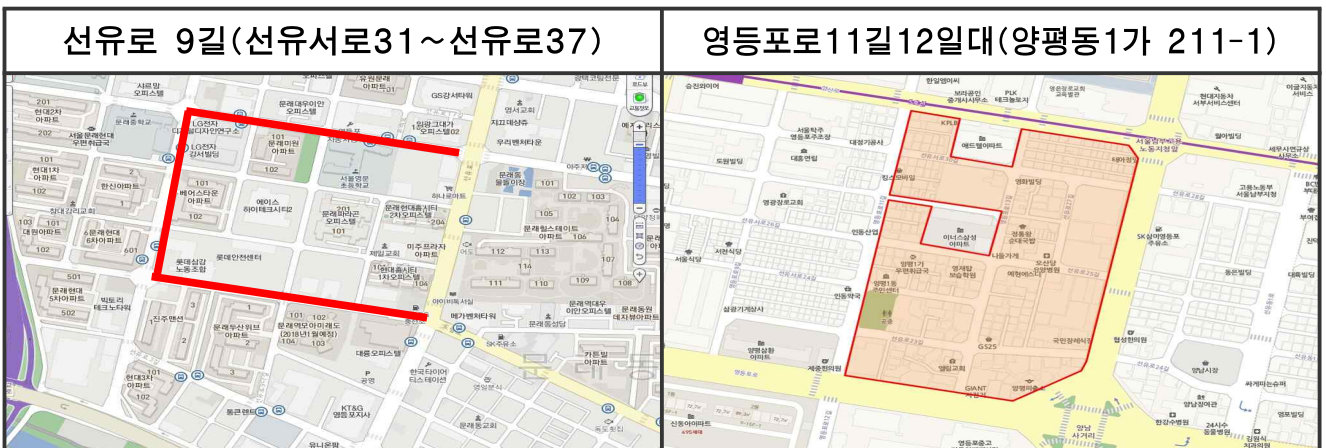

**선유로9길 현장사진**



**영등포로11길 12 일대 현장사진**



## 6 도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(3구역) 치 수 과

도림1배수분구의 노후 및 불량 하수관로를 개량하는 등 종합계획에 의한 정비를 함으로써 통수능 확보와 수해 예방 및 효율적인 하수처리로 수질 개선에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 사업위치 : 대림1동 일대(면적:22.0ha)
- 사업규모 : 하수관로 종합정비 D300~D1,500mm, L=4,9Km,
- 사업기간 : '16.12.29.~'17.12.10.
- 도 급 자 : 경동산업(주), 에이치알티에스(주)

### □ 주요 추진실적

- '17. 2. 16 : 공사계약(차수계약)
- '17. 3.~12 : 공사시행 및 준공

### □ 향후계획


- '18. 1.~2 : 설계 및 계약(2차분)
- '18. 3.~12 : 공사시행 및 준공(2차분)

### □ 소요예산


(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
4,800,000 (시 4,800,000)	503,491 (시 503,491)	10

### □ 위치도

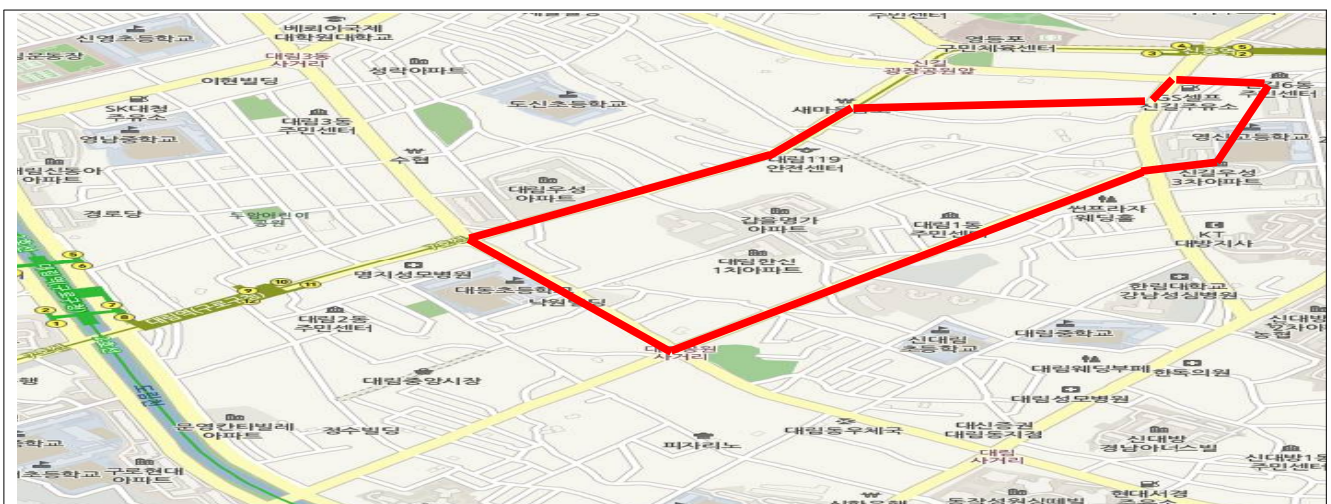

□ 단계별 사업계획(도림1배수분구)

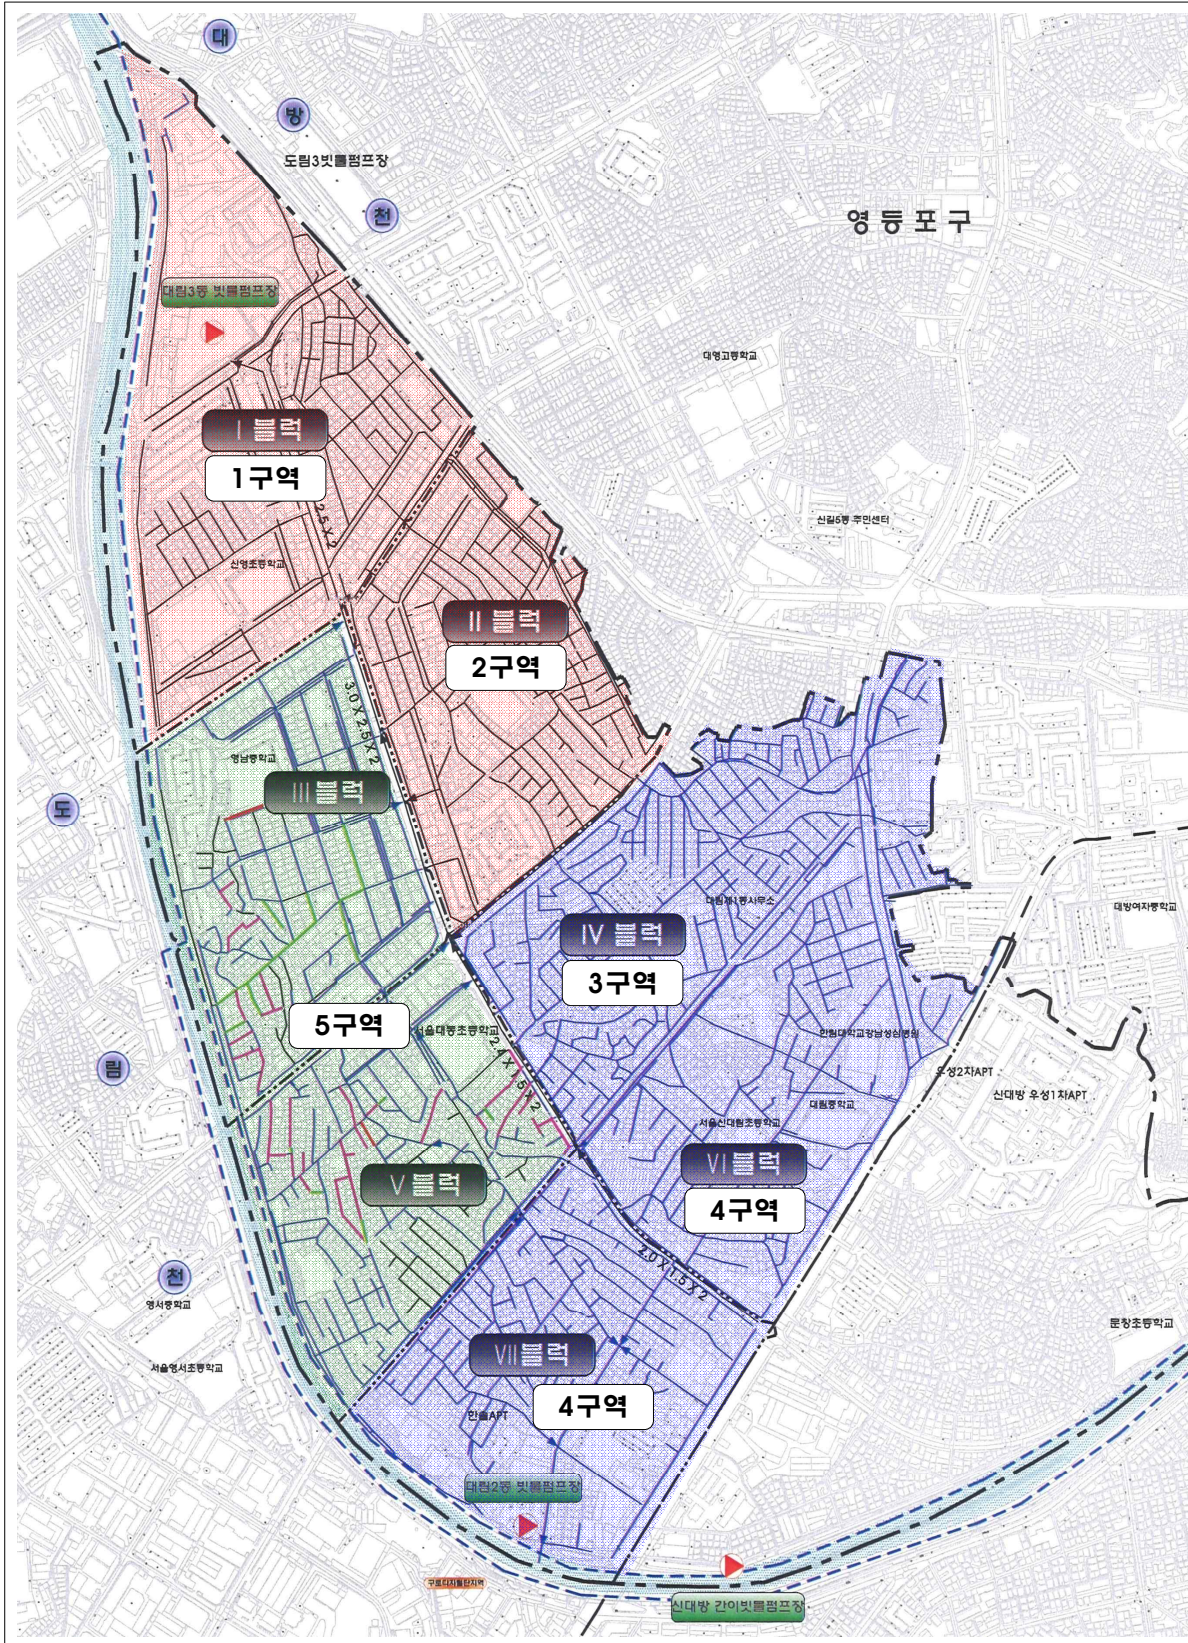

우리구 교통사고 예방을 위해 시설개선 등 다양한 분야별 세부사업들을 정상적으로 추진함으로써 교통사고를 예방하여 구민의 재산과 인명을 보호하고자 함

**□ 사업개요**

- 목 표 : 2017년도 교통사고 사망자수 10% 감소 (22명→20명)
- 사망사고 발생현황(17. 5월 기준) : 9명
- 사업규모 : 총 15개사업 783백만원

**□ 주요 추진실적**

**① 중점사업**

- 차없는거리 사업추진 : 경찰 규제 완료(17.2.22)

도로명	구간	규 모	비 고
신길로37길	신길로157~신길로39길 1	B=3.5~5.0m L=90m	사리가시장측 원인자사업 으로 6월중으로 완료예정
가마산로69가길	가마산로69가길 17~13	B=7m L=60m	

- 양산로 자전거도로 시설개선 : 완료
- 자전거이용활성화 조례 개정 (구의회 200회 임시회 의결)

**② 일반·계속사업**

- 여의대방로 공군회관 앞 교차로 신설 : 3월 설치완료
- 대영초교 앞 횡단보도 신설 : 4월 설치완료
- 옐로카펫 설치사업 (영림초교, 대동초교) : 5월 설치완료
- 경인로 하나은행앞 교차로 신설 : 5월 공사완료
- 경부제3녹지 공영주차장 앞 횡단보도 신설 : 5월 설치완료

- 교통안전 및 편의시설물 설치·유지관리
  - 대 상 : 반사경, 시선유도봉, 안전표지 및 노면표시 등
  - 내 역 : 시선유도봉 42개, 반사경 21개, 보행자안내표지판 지도교체 20개, 도로안내표지판 58건 정비, 안전표지 24건 및 노면표시 16,072m 설치
- 보호구역 개선사업 추진 및 CCTV 설치 : 선재어린이집, 영중초교 설치완료
- 과속경보시스템 설치 : 영원초교 주변 신규 1개 설치완료
- 어린이 등하교 교통안전지도사업(워킹스쿨) : 우신초교 등 8개교, 교통안전지도사 10명
- 교통사망 사고지점 TFT 운영
  - 참여기관 : 구청, 경찰서, 서울시, 도로교통공단
  - 운영횟수 : 6회 실시
- 교통안전체험장 정상 추진 : 30회 675명 교육
- 보호구역 캠페인 년중 추진

## □ 향후계획

### ① 중점사업

- 교통법규위반 CCTV 설치 (국회의사당 삼거리 1개소) : 7월중 완료예정
- 차없는거리 조성사업 : 6월중으로 시설물 설치 완료 예정

### ② 일반·계속사업

- 교통안전 및 편의시설물 설치·유지관리 정상 지속 추진
  - 대 상 : 교통시설물(반사경, 시선유도봉, 안전표지 및 노면표시 등)
- 보호구역 개선사업 (선재어린이집)
  - 6월중 실시설계완료 및 7월 예산 확보후 공사추진 예정
- 기타 관련사업 정상 추진
  - 대 상 : 사망사고 TFT, 교통안전지도사업, 교통안전체험장, 캠페인 등

## □ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
783,400 (국6,500, 시431,300, 구비 345,600)	215,400 (사비 52,400, 구비 163,000)	27.5

자전거도로 구분시설(도로경계석)로 인한 사고다발 구간인 양산로를 자전거 우선도로로 변경하여 사고예방하고, 2016년 시행한 양산로 자전거 우선도로 조성구간과 연계하여 안전하고 쾌적한 자전거 이용환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 양산로111(주차문화과앞) ~ 선유로126(오성상사앞), [L=490m]

□ 주요 추진실적

- 편측 자전거 전용도로 철거 및 양측 자전거 우선도로 신설
  - 아스팔트 재포장(A=4,905㎡), 구분시설(경계석) 철거: 120개
  - 자전거 우선도로 노면표시(차선도색: 4,915m, 자전거마크: 16개) 등



□ 향후계획

- 2017년 하반기 자전거 우선도로 신설(예산 확보후)
  - 위치 : 영은교회 ~ 안양천 보행육교 (연장=670m)
  - 아스팔트 재포장(A=6,700㎡), 구분시설(경계석) 철거: 165개
  - 자전거 우선도로 노면표시(차선도색: 6,720m, 자전거마크: 22개) 등

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000 (구비)	89,042 (구비)	89.1
