

제170회 구의회 임시회

2012.09.07 ~ 00.00

부과 zero 청렴 UP

행복중심 영등포

2012년 주요업무 보고



건 설 국

보 고 순 서

I. 일 반 현 황 1

1. 인력
2. 조직
3. 주요시설 및 장비
4. 예산 현황

II. 주요업무 추진실적 및 계획 .. 4

I. 일반 현황


1

인 력

구 분	계	일 반 직						기 능 직				별정· 계약직	
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급		
정 원	187	1	5	24	42	39	10	6	13	35	8	183	4
현 원	184	1	4	28	49	20	17	4	20	32	5	180	4
과부족	△3	-	△1	4	7	△19	7	△2	7	△3	△3		-

2

조 직

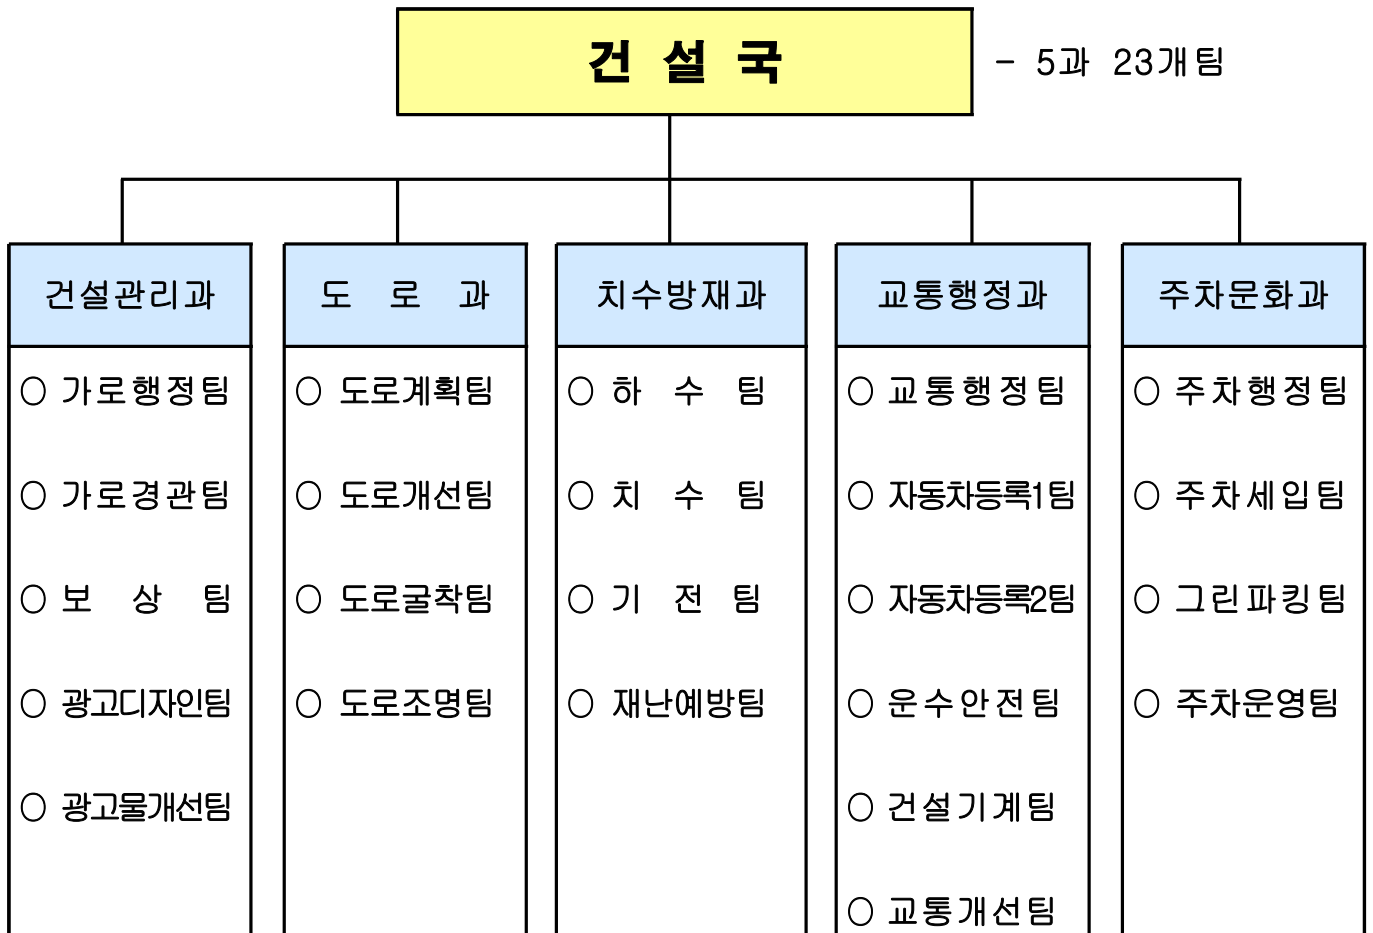

3

주요시설 및 장비

가로시설물 현황 ----- (건설관리과)

○ 가로판매대 81, 구두수선대 79, 노점상 단속초소 4개소

도로시설물 현황 ----- (도 로 과)

○ 도로(경인로 외 27개 노선)

연장 387km		도로율	포장율
시도76km	구도 311km	23.32% (서울시 :22.02%)	100%

○ 시설물 : 44개소 (교량14 고가차도6 보도육교6 지하차도12 지하보도1 입체교차로5)

○ 가로등 : 8,620등

○ 보안등 : 10,095등

하수도시설 현황 ----- (치수방재과)

○ 하수관거 456,499m, 맨홀 8,914개소, 빗물받이 21,412개소, 횡단하수거 407개소

빗물펌프장 : 8개소 펌프 54대(영등포, 양평1·2, 문래, 도림2, 신길, 대림2·3)

간이펌프장 : 7개소 펌프 16대

하천 현황 : 4개소 16.94km (한강, 안양천, 도림천, 대방천)

자동차 등록 ----- (교통행정과)

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차
137,126	105,414	7,409	23,785	518

건설기계 등록

계	영업용	자가용	관용	비고
17,195	15,683	1,499	13	서울시 전체(45,577대)의 36.9%

주차장 현황 : 10,835개소 154,743면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	10,835	69	18	41	10	129	26	2	101	10,637	1,583	2,194	2,897	3,963
면수	154,743	7,029	5,661	921	447	9,777	2,526	430	6,821	137,937	2,674	3,403	55,722	76,138

CCTV 현황 : 199대

○ 불법 주·정차 단속용 : 107대 ○ 그린파킹 감시용 : 92대

4

예산 현황

□ 부서별 예산 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산액	집행액	집행율(%)
계	70,931,427	21,946,462	30.94
건설관리과	850,608	353,918	41.61
도로과	15,051,255	6,905,623	45.88
치수방재과	7,306,110	3,038,096	41.58
교통행정과	1,068,139	434,518	40.68
주차문화과	46,655,315	11,214,307	24.04

□ 주요 사업예산 현황

(단위 : 천원)

정책사업	예산액	집행액	집행율(%)
계	70,931,427	21,946,462	30.94
공공용지 효율적 운용	134,988	33,543	24.85
쾌적하고 편리한 가로환경 조성	457,749	182,227	39.81
공익사업 수행을 위한 보상	2,905	760	26.16
행정운영경비(건설관리과)	254,966	137,388	53.88
쾌적한 도로환경 조성	6,597,206	3,983,439	60.38
안전한 도로유지 관리	7,593,734	2,601,314	34.26
행정운영경비(도로과)	652,914	320,870	49.14
재무활동(도로과)[시도비 보조금 반환]	207,401	0	0.00
하수시설물의 효율적 관리	4,178,999	1,306,167	31.26
하천 및 수방시설의 효율적 관리	1,880,667	863,645	45.92
재해 및 재난예방	98,412	8,001	8.13
행정운영경비(치수방재과)	548,032	260,283	47.49
재무활동(치수방재과)	600,000	600,000	100.00
고객중심의 쾌적한 교통환경 조성	519,958	149,849	28.82
행정운영경비(교통행정과)	548,181	284,669	51.93
주차수요관리강화 및 주차문화개선	45,938,068	10,988,863	23.92
행정운영경비(주차문화과)	717,247	225,444	31.43

II. 주요업무 추진실적 및 계획

연번	사 업 명	쪽	부 서 명
1	건전제정 확립을 위한 세외수입 증대	5	건설관리과
2	노점 및 노상적치물 등 관리 및 정비	6	“
3	당산로 「간판이 아름다운 거리」 조성사업	7	“
4	불법 옥외광고물 정비 및 수준향상	8	“
5	도림로 확장공사	9	도 로 과
6	대방천변 도로개설공사	11	“
7	금연보도판 설치로 연기없는 행복한 거리조성 ..	13	“
8	주민이 참여하는 보안등 야간순찰	14	“
9	LED보안등 설치	15	“
10	수방대책 추진	16	치수방제과
11	빗물펌프장 수방시설 유지관리	18	“
12	재난관리기금 운용	19	“
13	도림1배수분구 하수관거 종합정비	20	“
14	대림3 빗물펌프장 증설 공사	22	“
15	경부선(국철1호) 지하화 사업 용역 추진	24	교통행정과
16	교통량 감축을 위한 기업체 교통수요관리 추진 ...	25	“
17	버스승차대 설치 및 유지 관리	26	“
18	무인자전거 이용시설 보안시스템 구축	27	“
19	공영주차장 건설 사업 추진	28	주차문화과
20	주차장 운영 및 관리	29	“
21	주차질서 확립	30	“
22	불법 주·정차 단속 CCTV(방범검용) 구축	31	“

1 건전재정 확립을 위한 세외수입 증대 - 비예산

□ 사업목표

- 국·공유 행정재산 무단 점용자 적극 발굴로 신규 세원 확보
- 고액 및 상습체납자에 대한 체계적인 관리로 세외수입 증대
- 징수목표 (단위:천원)

계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	공유재산임대등	징수교부금
7,267,098	5,341,603	169,980	79,100	40,915	1,635,500

- 국·공유지 무단점용 전수조사를 통한 신규세원 발굴
- 고액 및 상습체납자 특별관리로 징수율 제고 등

□ 추진실적(총5,327,731천원)

- 도로 사용료 : 1,473건, 3,763,477천원
- 하천 사용료 : 2건, 11,009천원
- 과 태 료 : 47건, 10,320천원
- 공유재산임대 등 : 80건, 40,915천원
- 징수 교부금 : 1,548,289천원

※ 병무청부지 도로변상금 부과(총 658,176천원)

- 기 간 : 2007. 3 ~ 2012. 2(5년분 소급부과)
- 위 치 : 신길동 1200, 1191번지(3,015㎡)
- 내 용 : 병무청 부지 일부가 구유지 도로를 무단점유하고 있는 사실이 확인되어 2012. 4.13 변상금 부과
- 행정소송 : 서울지방병무청에서는 변상금 부과처분에 대하여 2012.5.31 서울행정법원에 집행정지 및 부과처분 취소소송 제기 (2012.8.14. 1차 변론 실시)

□ 향후 추진계획

- 공공용지의 엄정한 법 집행으로 행정재산의 체계적인 유지관리
- 체납자의 철저한 관리로 징수율을 극대화하여 세외수입 증대

□ 사업개요

- 추진기간 : 1. 1 ~ 12. 31(12개월)
- 추진방향
 - 관내 산재하고 있는 노점(450여 개소 상당)에 대한 정비 방법을 세분화하여 점용면적의 축소 등 선별적·탄력적으로 정비
 - 도로변 점포의 인도 무단 점유(상품적치 등)에 대한 제도·단속
 - 반복적·상습적 무단점유·적치 행위에 대한 중점 정비로 시민보행권 확보

□ 추진실적

- 도로법 위반자 조치
 - 고발 조치 : 3건
 - 과태료부과 : 76건 25,440천원
 - 현장정비 : 10,665건 (강제수거 : 581건, 이동조치 10,084건)
- 보도상 영업시설물 관리
 - 점 용 료 부과 : 165건 53,838천원(징수 145건 46,245천원)
 - 시설 대부료 부과 : 159건 81,280천원(징수 141건 71,932천원)

□ 향후 추진계획

- 영등포역 주변 노점(약 80개소)은 전국 노점상 연합회에 가입하여 정비시 집단적이고 강력한 저항 초래 ⇒ 도시미관 및 시민보행권 확보를 위한 규모 축소와 디자인 개선 등을 위해 지속적인 제도 및 정비 유도
- 보도상 영업시설물 관리
 - 위치 부적정 시설물 등 이전정비 : 2012. 8 ~ 12월
 - 시설물 세척 등 청결상태 유지 : 2012. 1 ~ 12월
 - 시설물 운영자 특별교육 실시 : 2012. 12월

□ 예산현황

- 예산액 : 415,541천원
- 집행액 : 319,438천원

□ 사업 개요

- 추진기간 : 3월 ~ 11월(10개월)
- 대상구간 : 당산로(영등포구청 사거리~선유역 사거리)
- 소요예산 : 597,500천원{시비(60%), 구비(40%)}
- ※ 실태조사 결과 : 239개소
 - 개선대상 간판 : 89개소(금년도 신규 설치 디자인간판 제외 : 150개소)

□ 추진실적

- 2012. 3 : 당산(양평)로 간판이 아름다운 거리 사업 추진(기본) 계획수립
- 2012. 3 : 기본계획 열람공고
- 2012. 5 : 간판개선주민위원회와 추진협약체결
- 2012. 6 : 당산(양평)로 간판이 아름다운 거리 조성사업 주민설명회 개최
- 2012. 7 : 서울시에 광고물 디자인 심의 요청

□ 향후 추진계획

- 2012. 8 ~ 11 : 간판디자인 제작 및 설치
- 2012. 11 : 조성사업 완료

□ 예산 현황

- 예산액 : 597,500천원(시비 : 358,500천원, 구비: 239,000천원)
- 집행액 : 없음

□ 사업개요

○ 기 간 : 1. 1 ~ 12. 31(12개월)

○ 목 표 (단위 : 건)

구 분	정비물량	정비대상	비고
고정 광고물	5,000	무허가 (신고), 표시위반 광고물	
유동 광고물	12,000	불법현수막, 벽보, 에어라이트 등	

□ 추진실적

○ 불법광고물 정비실적 : 9,492건

- 가로형간판 등(142건), 현수막(8,562건), 입간판(301)
풍선광고(127건), 전단지·벽보 등(150건)

- 학교주변(양화중학교 등 14개) 특별정비 : 18회 210건

○ 공공근로자 활용 불법 첩지류 등 정비실적

- 전단지 30,560건, 벽보 24,569건

○ 행정 처 분 : 819건 / 268,035천원

- 이행강제금 : 12건 / 7,950천원

- 과 태 료 : 807건 / 260,085천원

□ 향후 추진계획

○ 야간, 주말불법광고물 특별 정비 : 취약시간대(새벽, 야간, 주말 등) 정비

○ 불법광고물 제거 용역 : 8~11월

○ 광고물 사전 안내제 실시 : 인허가 부서와 연계 추진

○ 학교주변 특별정비 : 청소년 유해 광고물 등 집중정비

○ 불법광고물 및 광고주에 대한 행정처분 확행으로 불법행위 근절

□ 예산 현황

○ 예산액 : 70,000천원

○ 집행액 : 8~11월 집행완료 예정

□ 사업개요

- 추진기간 : 2009년 ~ 2014년(장기집행계속사업)
- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - ┌ 특별회계 : 우측 L= 500m(금회공사구간)
 - └ 일반회계 : 좌측 L= 800m
- 총사업비 : 44,550백만원(보상비 39,700 공사비 4,700 설계비 150)
 - ┌ 특별회계 : 15,350(보상비 13,700 공사비 1,500 설계비 150)
 - └ 일반회계 : 29,200(보상비 26,000 공사비 3,200)
- 2012년 사업비 : 3,609백만원(본예산 + 2011년 이월예산)

□ 추진실적

- '97~'99 : 일부구간 확장완료(도림고가남단~도림사거리 L=350m)
- '09.03.~'10.02. : 실시계획인가(일반회계 L=433m)-보상완료
- '10.03.~'10.12. : 기본 및 실시설계용역 시행
- '10.05.27 : 실시계획인가(특별회계 L=220m)-보상완료
- '11.02.17 : 실시계획인가(일반회계 L=50m)-보상완료
- '11.03.17 : 실시계획인가(특별회계 L=280m)-보상완료
- '12.06.28 : 공사계약
- '12.07.~08. : 지장물 이설관련 유관기관 협의 및
사업구간 내 교통신호기, 가로등 이설사업 발주

□ 향후 추진계획


- 2012년 8월중 : 공사 시행
- 2013. 4. 27 : 공사 준공 예정(1차 구간 L=202m)
- 2014. 4. 27 : 공사 준공 예정(2차 구간 L=298m)

□ 2012년도 예산 집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산	집행액	집행잔액	집행내역
합 계		3,609	2,997	612	
특별회계	소 계	3,509	2,900	609	
	보상비 (이월예산)	2,849	2,795	54	특별회계(L=280m)구간 중 2011년 미협의를 된 토지 7필지 337㎡, 물건 4건, 영업권 1건 보상
	공사비 (본예산)	660	105	555	선금 지급
일반회계	보상비 (본예산)	100	97	3	일반회계구간(L=50m) 중 예산부족으로 보상비완료 되지 않은 토지 보상비 지급

위 치 도

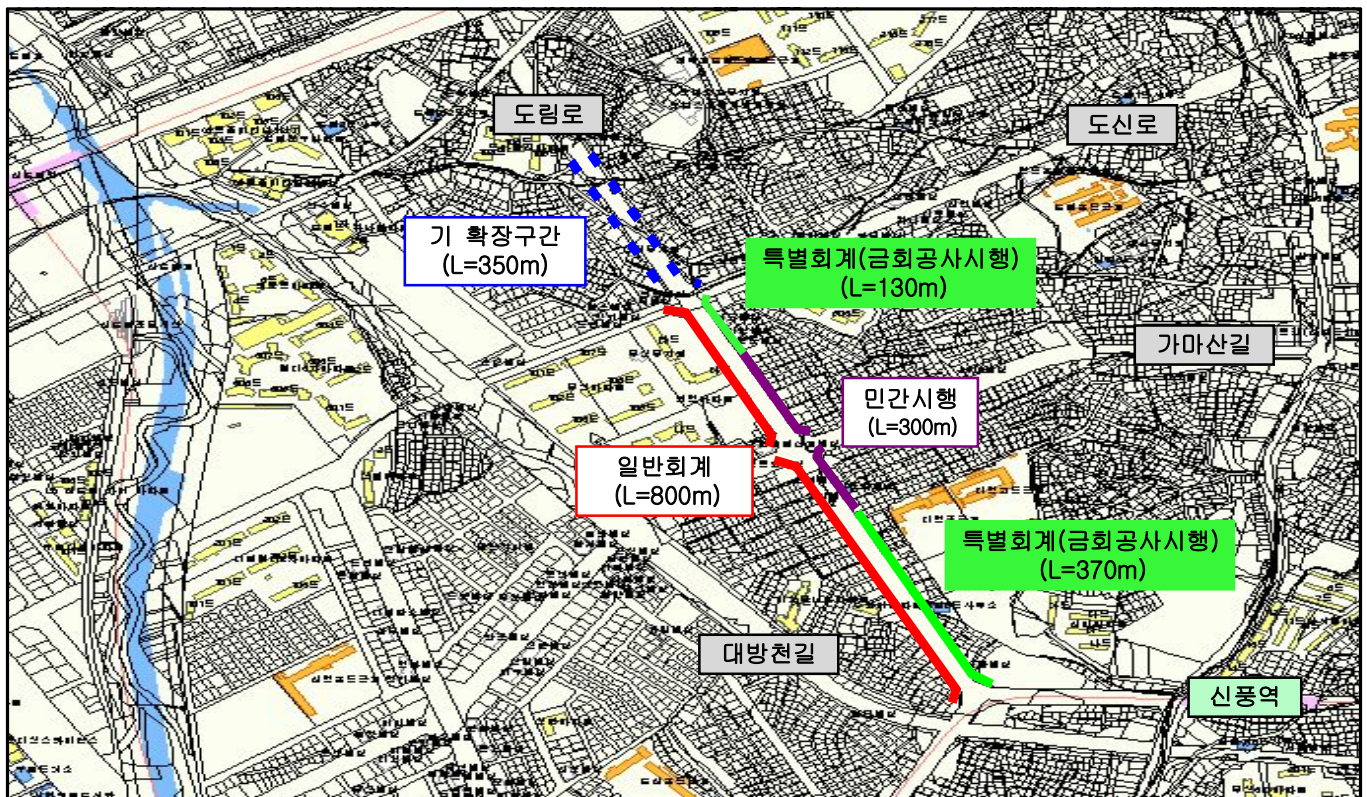

6

대방천변 도로개설공사 - 시비100%

□ 사업개요

- 추진기간 : 1998년 ~ 2012년(장기집행계속사업)
- 위 치 : 신길동 381-9 ~ 455-19간
- 규 모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - ┆ 기개설 : 660m(1998년 ~ 2001년)
 - ┆ 미개설 : 420m
- 총사업비 : 13,250백만원(보상비 10,593, 공사비 2,607, 설계비 50)
- 2012년 사업비 : 2,669백만원(2011년 이월예산)

□ 추진실적

- '09.01. ~ 05. : 기본 및 실시설계용역 시행
- '10.11. : 1차구간 보상완료
- '11.02.22 : 공사발주(장기계속공사)
- '12.02.02 : 1차구간 준공(L=292m)
- '12.04.02 : 2차구간 발주(L=128m)
- '12.06.15 : 2차구간 보상완료
- '12.08월 현재 : 2차구간 공사시행

□ 향후 추진계획


- 2012.12.17 : 2차구간 준공 예정

□ 2012년도 예산 집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산	집행액	집행잔액	집행내역
합 계	2,669	1,061	1,608	
보상비 (이월예산)	1,077	754	323	2차구간 중 예산부족으로 2011년 보상완료 되지 않은 토지1필지 245㎡, 물건2건 보상
공사비 (이월예산)	1,592	307	1,285	1차구간 준공금(207백만원) 2차구간 선 금(100백만원)

위 치 도

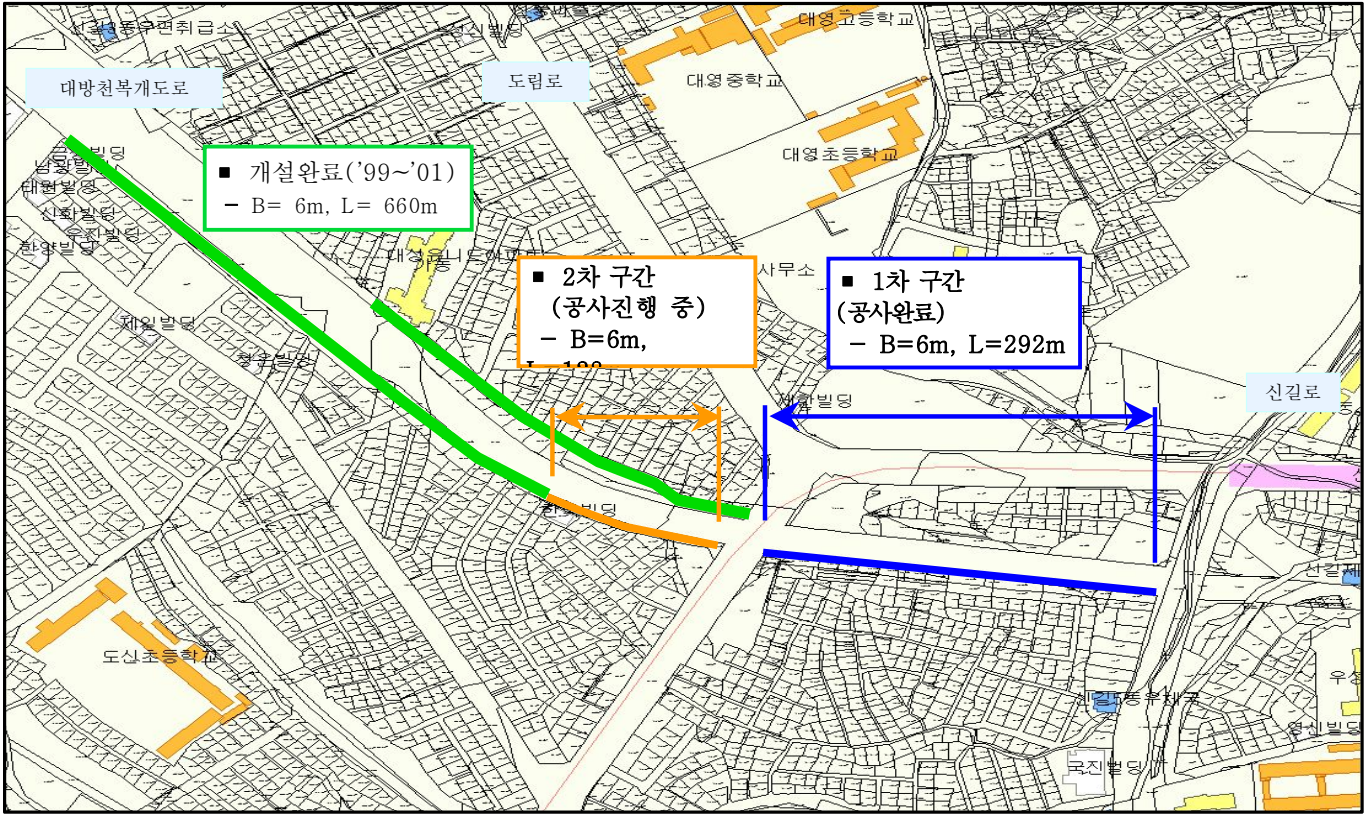

□ 사업개요

- 추진기간 : 3월 ~ 9월(7개월)
- 대상노선 : 영등포로(영등포유통상가 앞 사거리 ~ 오목교 입구 간)
- 적용위치 : 가로변 버스정류장, 공원입구 등
- 사업규모 : N=10개소 , 금연판(석재류) $b \times l \times t(300 \times 300 \times 60)$

□ 추진실적

- '12. 7월 : 금연 표지판제작 구매 심사요청
- '12. 8.22 : 물품구매계약체결(7,587천원)

□ 향후 추진계획

- '12. 9월 : 공사시행 및 준공처리

□ 예산현황

- 예산액 : 소과 보수 예산의 일부 (자재 및 시공비 20,000천원 상당)

□ 위치도

위 치 도	연번	위 치	수량	방향
	1	당산동 진로아파트	1	오목교 방향
	2	SK텔레콤	1	
	3	양남동 로터리	1	
	4	영등포 기계상가	1	
	5	관악 고등학교 앞	1	영등포 로터리 방향
	6	관악 고등학교 앞	1	
	7	영등포 기계상가	1	
	8	교보생명 앞	1	
	9	진로아파트 앞	1	
	10	하이마트 앞	1	

□ 사업개요

- 추진기간 : 3. 16 ~ 11. 14(제설기간 제외)
- 순찰일시 : 매주 화·목 19:30 ~ 22:00
- 순찰조 편성
 - 구성인원 : 관할동장, 도로과장 외 10명, 주민(통장 등)
 - 조 편 성 : 2인 9개조(조원 : 도로조명팀1, 희망주민1)
- 운영방법
 - 주민참여 순찰 : 매주 목요일 주민 추천지역 위주 순찰
 - 도로과 자체순찰 : 매주 화요일 1~2개동 취약지역 순찰
 - ※ 동장, 과장 순찰은 매월 1회 시행(주민참여 순찰 시)
- 순찰결과 : 적출사항에 대하여 1~2일내 정비완료

□ 추진실적

- 순찰실적 : 매주 2회 34회 실시(주민참여 17회, 자체순찰 17회)
- 참여인원 : 총 445명(지역주민 127명, 구공무원 282명, 동사무소직원 36명)
- 조치실적 : 적출된 고장등 498건 보수완료

□ 향후 추진계획

- 주민참여 순찰시 야간 조명취약지역 의견 수렴 실시
- 제설기간 도래 전까지 주2회 보안등 야간 순찰 지속 추진

□ 예산현황 : 비예산

9 LED보안등 설치 - 국50, 구50

□ 사업개요

- 추진기간 : 8월 ~ 12월(5개월)
- 위 치 : 당산동·양평동지역 중 도로폭 6m이상인 골목
- 추진내용 : LED52W보안등 478등 설치
- 사 업 비 : 400,000천원

□ 추진실적

- '12. 7월 : 1차 추경예산확보 200,000천원
- '12. 8.6 : LED 자재 구매를 위한 업체 선정
(조달청 제3자 단가계약자중에서 2단계 경쟁을 통한 최저가격 제안자)
- '12. 8.16 : 공사 발주
- '12. 8.28 : 낙찰자 결정(콤위즈, 89백만원)

□ 향후 추진계획

- '12. 9월중 : 공사착공
- '12. 12. 31 : 공사준공

□ 예산현황

- 예산액 : 400,000천원(국 200,000, 구 200,000)
※ 시비 260,000천원은 향후 예산 확보후 교부 예정

□ 위치도



우리나라 재해의 대부분을 차지하고 있는 여름철 풍수해에 효율적이고 체계적인 대응관리 및 복구체계를 구축하여 국민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 현 황

○ 지역여건 및 방재시설 현황

- 4개 하천(한강, 안양천, 도림천, 대방천)이 합류하는 저지대
- 25개구 중 세 번째로 많은 수방시설을 보유
 - 하천제방 : 11.54km/ 수문 21개소 57문/ 빗물펌프장 8개소 54대
 - 하수시설 : 456.49km/ 빗물받이 22,000개소

□ 추진실적

○ 수방대비 사전준비 완료(하수,치수분야)

- 재해취약시설분야 점검·정비 완료
 - 추진기간 : 3. 1 ~ 4. 30.
 - 대 상 : 대형 및 일반공사장, 도로시설물(옹벽, 축대, 지하차도), 옥외광고물, 하천 등
- 하천시설물 및 유수지, 저류조 점검·정비 완료
 - 하 천 : 하천제방 11.54km(안양천, 도림천), 수문 21개소(57문)
 - 유수지 : 대림3, 도림2, 신길유수지(3개소)
 - 저류조 : 대림1어린이공원내(1개소)
- 모래마대 및 수방자재 배치완료
 - 추진기간 : 5. 4 ~ 5. 14.
 - 배치장소 : 18개동 45개소(15,070개), 펌프장 8개소(30,000개)
- 하수관 준설 및 빗물받이 준설 실시(계속)
 - 추진기간 : 2012. 3. 27 ~ 12 .31.(공정율 60%)
 - 대 상 : 상습 침수 취약지역(대림동 1,2,3동) 및 관내 하수관
- 침수지역 역지변 및 차수관 설치
 - 추진기간 : 2012. 3. 27 ~ 12.31.
 - 2012 설치현황 : 역지변 1,655개소, 차수관 281개소

- 수해취약지역 모의훈련 실시 및 주민설명회 개최
 - 일 시 : 2012. 4. 23(월) 15:30~18:00
 - 대 상 : 침수취약가구(대림1,2,3동 주민)
 - 내 용 : 모의훈련(모래마대 쌓기, 차수관 설치, 양수기 작동요령 등)
주민설명회(서울시 수해안전망 개선대책 보고)
- 수방대비 사전준비 완료(기전·재난 분야)
 - 빗물펌프장 수문·기전시설 제작사 점검완료
 - 대 상 : 빗물펌프장, 수문, 수방 기전시설 기능 및 작동상태 점검
 - 빗물펌프장·수문 시운전 점검완료
 - 기계분야 : 모터펌프(3대), 제진기(2대), 수문(2개소)
양수기 정비 및 자동 시운전 완료
 - 전기분야 : 수배전반, cctv, 수위계 정비 및 자동 시운전 완료
 - 수방용 양수기 사용법 교육 실시
 - 교육일시 : 4. 23.
 - 교육장소 : 대림3동 주민센터
 - 교육대상 : 동 주민센터 수방담당 및 관련직원
 - 교육내용 : 엔진양수기, 수중펌프 사용방법 및 실습
 - 재난대비 특정관리시설분야 순찰 점검
 - 순찰점검 : 4회실시(재난등급변경관리 1개소(양남시장))
 - 기 타
 - 안전관리활동 홍보추진 : 2회(매월4일 정기활동 추진)
 - 풍수해대책 본부요원 및 동 주민센터 집합교육 완료
 - 지하주택, 통·반장, 건축공사장, 자율방재단 비상연락망 구축완료
 - 침수취약가구 공무원 돌봄서비스(1가구 1담당제) 점검 및 시행
- 재난안전대책(풍수해)본부 상황실 구축 운영(본부장-구청장)
 - 기간 : 2012. 5. 15 ~ 10. 15 (5개월간)
 - 조직구성 : 구청 - 8개반 104명
동주민센터 - 3개반 15명(18개동)

□ 예산현황

- 예산액 : 182백만원(구비)
- 집행액 : 115백만원(구비)

빗물펌프장 및 수문 등 수방시설에 대한 점검·정비를 수방기간 전에 완료하여 수방준비 및 사전 재해예방에 만전을 기함

□ 사업목표

- 노후된 빗물펌프장 및 수문 시설 예방정비로 사전 수해예방
- 수방기간 전 점검·정비 완료하여 수방준비에 철저

□ 사업개요

- 추진기간 : '12. 1. 1 ~ '12. 5. 31(5개월)
- 추진대상 : 빗물펌프장 (8개소), 수문 (21개소), 간이펌프장 (7개소)

□ 추진실적

- 빗물펌프장 모터펌프 보수 (5.2 완료)
 - 모터펌프 3대(양평1 : 630HP 1대, 대방천 간이펌프 40HP 2대)
- 수문 정밀점검 용역 (6.6 완료)
 - 정밀점검 7개소
(도림2동, 대림2동, 대림3동, 문래, 대방, 양평1배수문, 여의도수문, 안양천제방)
- 빗물펌프장 노후시설 정비 (5.11 완료)
 - 문래펌프장 옥상 및 벽체 방수
- 수방용 양수기 점검·정비 (5.30 구, 주민센터 보관분 정비완료)
 - 수방용양수기 2,254대 (구:230대, 동주민센터:2,024대)

□ 향후 추진계획

- 수방기간 중 수방설비 작동상태 점검
- 노후 시설 우선 정비후 연차적으로 개량추진

□ 예산현황

- 예산액 : 240백만원(구비)
- 집행액 : 197백만원(구비)

□ 설치근거

- 재난 및 안전관리기본법 제67조, 제68조
- 서울특별시 영등포구 재난관리기금의 설치·운용조례

□ 재원조성 및 용도

- 재원조성 : 구 일반회계 출연금(전입금), 운용 수익 및 기타
 - ※ 전입금 : 최근 3년동안 지방세법에 의한 보통세(면허세·재산세 등)의 수입결산액 평균연액의 1/100의 금액
- 기금의 용도
 - 재난대비 보수, 정비사업 및 재난발생시 재난피해시설의 복구사업 등
 - 재해 지역 등 강제 퇴거 주민 이주 지원 주택 임차 비용 용자 등

□ 기금의 조성 및 운용 현황 (7. 31일 현재)

(단위 : 천원)

구 분	총 액	기금 적립 현황		수입내역	지출 예정액
		공금예금	정기예금		
재난관리기금	3,002,246	215,246	2,787,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦잔년도이월액 : 2,331,094 ◦전입금 : 600,000 ◦이자수입 : 71,152 	<ul style="list-style-type: none"> ◦저지대 지하주택 침수예방사업 : 235,000

□ 향후 추진계획

- 각종 재난대비 홍보물 제작 : 8월~11월
- 저지대 지하주택 침수피해예방을 위한 물막이판, 옥내역지변 설치공사 : 8월~10월

□ 예산현황

- 예산액 : 303,520천원(구기금)
- 집행액 : 560천원(구기금)

노후 하수관거의 구간별 단위개량사업만으로는 하수관거의 기능유지에 어려움이 있어 배수분구별 종합계획을 수립 정비함으로서, 하수관거의 통수능 확보는 물론 수해예방에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림1·2·3동
- 규 모 - 하수관 신설및개량 : D300~D1500mm, L=47.1km
 - 하수암거 신설 : ■1.5×1.5m, L=2.1km
 - 하수암거 보수보강 : ■1.0×1.0~■2.4×2.4m, L=3.2km
- 사업기간 : '10. 8. ~ '14. 12.
- 시 공 사 : 흥익산업개발(주), 매일종합건설(주)
- 총사업비 : 66,707백만원 (시비)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2012년	장 래
계	66,707	10,197	9,000	47,510
실시설계비	1,897	1,897	-	-
시 설 비	62,732	7,880	8,500	46,352
감 리 비	2,078	420	500	1,158

□ 추진실적

- '08. 10~'08. 12 : 서울시 예산투자심사 등 각종 사전심사
- '09. 2 ~ '10. 2 : 실시설계 시행
- '10. 3 ~ '10. 6 : 공사계약심사 등 각종 발주전 심사
- '10. 8월 : 공사 착공
 - 하수암거 보수·보강 : 완료(3.2km)
 - 하수관 신설 및 개량 : 7.5km 완료

□ 향후 추진계획


- '13. 8. : 현재 시행중인 1,2구역 준공
- 잔여구역 : 장기계속사업으로 계속 추진

□ 예산현황

- 예산액 : 66,707백만원(시비)
- 집행액 : 11,226백만원(시비)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림1배수분구 하수관거 종합정비

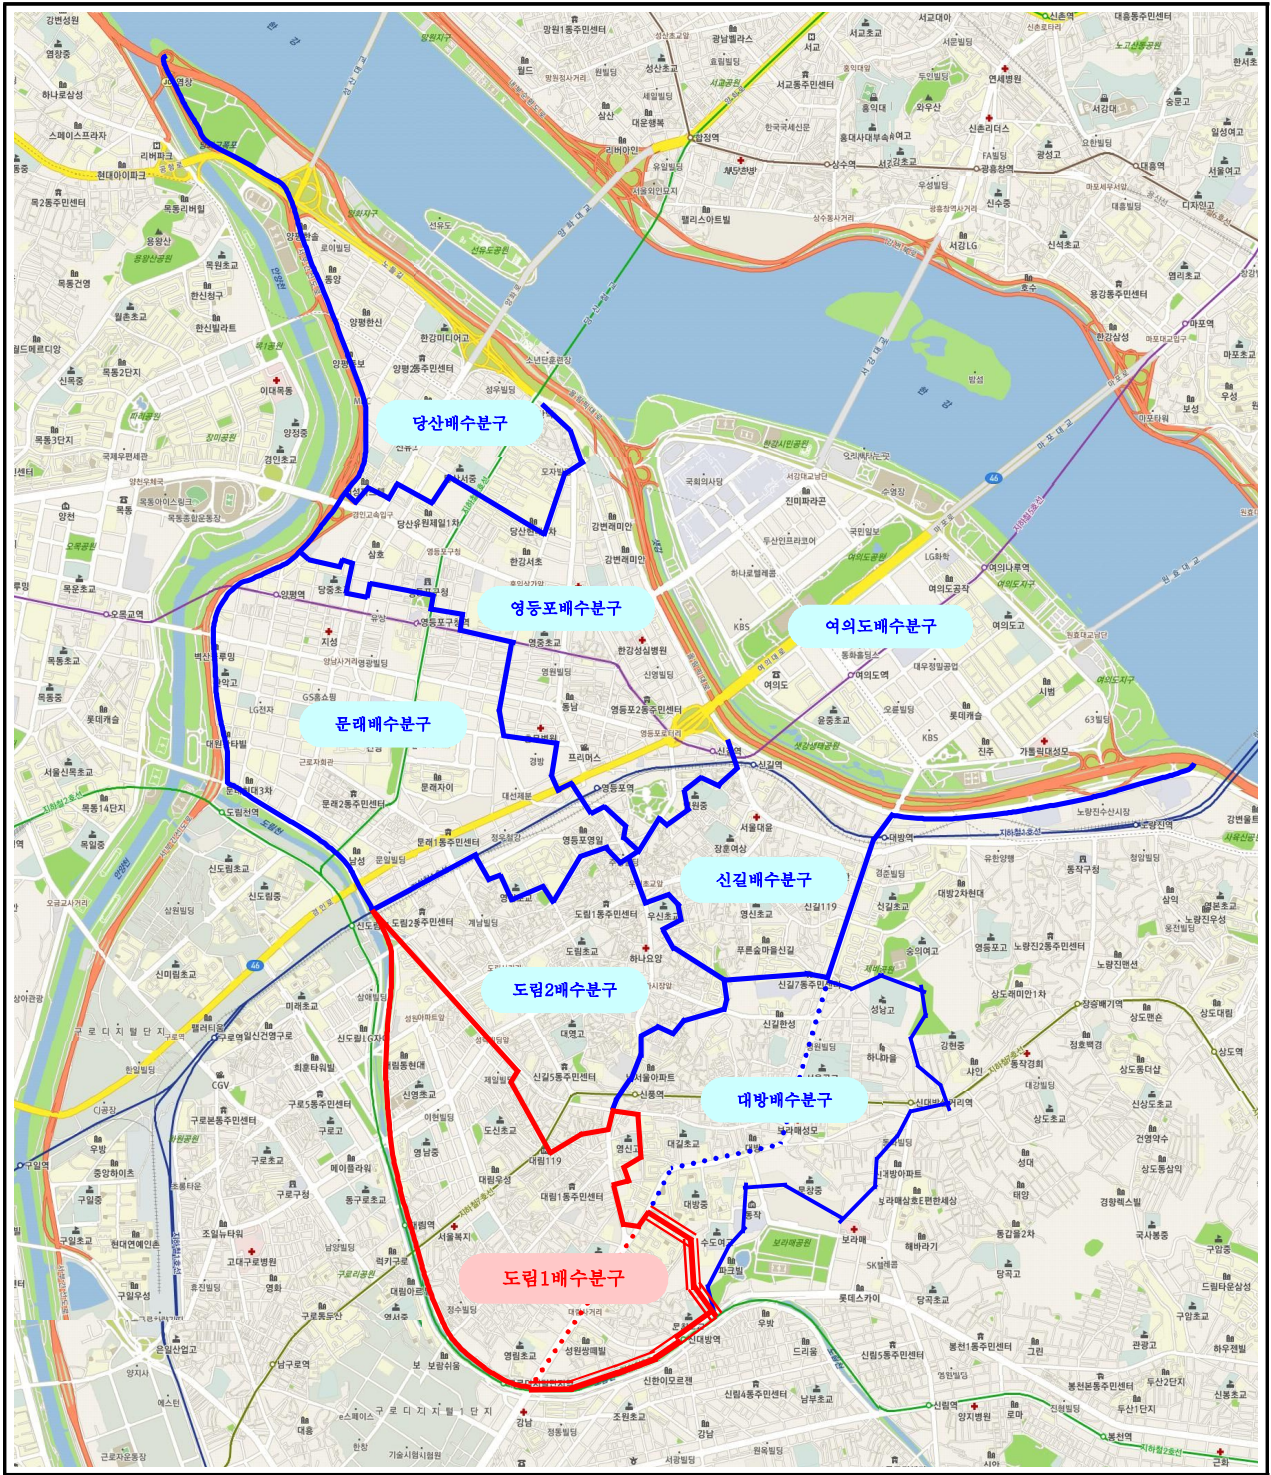

『기상이변을 대비한 빗물펌프장 배수처리능력 향상』을 위해 빗물펌프장의 용량을 증설하여 집중호우시 침수피해 최소화

□ 사업개요

- 위 치 : 대림동 611번지
- 사업규모
 - 펌프용량 증대 : 기정 550HP×7대, 500HP×3대
 준치 550HP×7대, 교체 600HP×2대, 400HP×1대
 신설 1,500HP×2대(계:12대)
- 사업기간 : '11. 2. ~ '12. 9. 28.
- 시 공 사 : 보훈종합건설(주)
- 감 리 단 : 동명기술공단(주) 외 1개사
- 총사업비 : 10,560백만원(시기금, 2012년도 5,594백만원)

□ 추진실적

- '09.12.~'10.11 : 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
- '10.11.27 : 빗물펌프장 증설공사(3차) 발주시행 통보(서울시)
- '11.02.07 : 공사착공
- '11.04.30 : 토출관 추진완료(D=2,800mm, L=35m)
- '11.05.30 : 증설동 건축완료
- '12.08.현재 : 펌프설치 완료(신설 1,500HP×2대) 및 가동중


□ 향후 추진계획

- '12.09. : 공사 준공 예정

□ 예산현황

- 예산액 : 10,560백만원(시기금)
- 집행액 : 6,047백만원(시기금)

위치도 및 현황사진

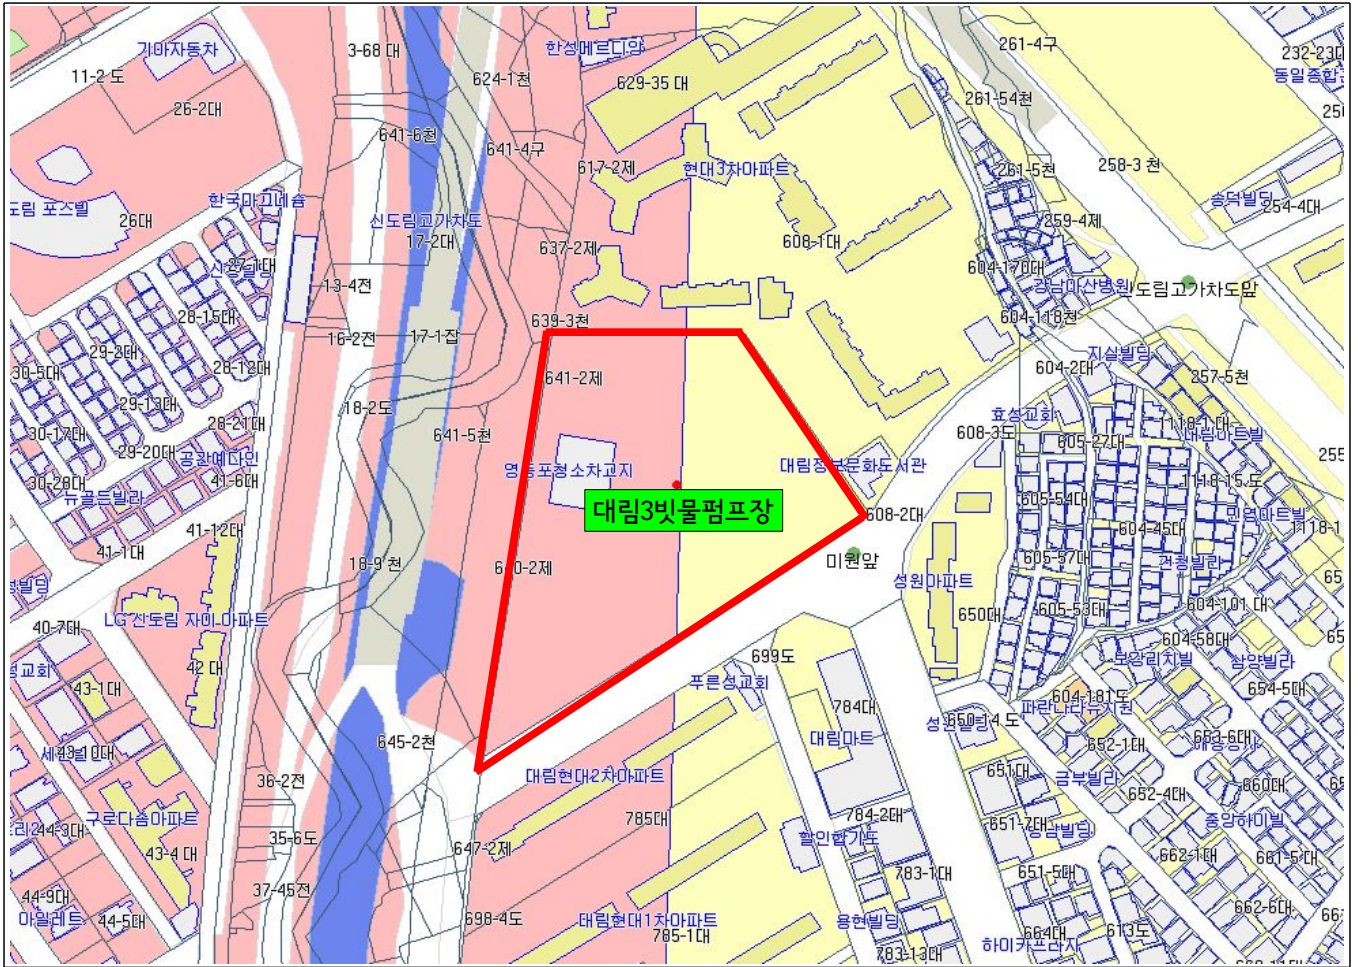

□ 사업개요

- 추진 배경 : 경부선(국철1호)으로 인해 생활권의 불균형을 극복하고자 6개 지자체가 공동으로 협약을 체결하여 중앙정부의 국책 사업으로 추진하도록 건의
- 사업 기간 : '12.5월 ~
- 참여지자체 : 영등포구, 구로구, 금천구, 동작구, 안양시, 군포시
- 사업 구간 : 동작구~군포시(L=26km), 우리구(신도림역~대방역 L=3.3km)

□ 추진실적

- 경부선(국철1호) 지하화 공동협약식 개최('12.5.3)
- 용역 협약 및 규약 체결('12.7.20)
 - 협약 및 규약 체결사유 : 지하화 기본구상 공동용역 추진(용역비부담)
 - 6개 지자체별 공동용역비('13년 추진) 부담액

구 분	계	안양시	구로구	동작구	영등포구	군포시	금천구
철도연장(km)	26.2	7.5	3.1	1.4	3.3	5.3	5.6
용역비(백만원)	700	200	83	37	88	142	150

※ 철도연장을 기준으로 참여 지자체별 용역비 부담액을 결정함

□ 향후 추진계획

- 2012. 9월 : 협의회 규약 체결
- 2012.12월 : 용역비 부담금 예산 확보
- 2013. 1월 : 기본구상 용역 발주
- 2013. 2월 : 국책사업으로 추진토록 중앙정부에 건의(공동)

교통유발부담금 부과대상 시설물 소유자에게 교통량 감축 프로그램을 이행할 경우 교통유발부담금을 경감해 줌으로써 승용차 이용을 억제하여 대중교통이용 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간 : '11.08 ~ '12. 07.(12개월)
- 추진범위
 - 대상 시설물 : 1,000㎡이상 시설물
(총850개소 : 민간 814, 공공 36)
- 추진분야 : 승용차 요일제 등 19개 프로그램 분야
- 추진주체 : 구청 / 기업체, 공공기관

□ 추진실적

- 기업체교통수요관리 사업 추진계획('12.03.14)
 - 기업체교통수요관리 참여율 제고 : 공한문, 실적제출, 참여 안내문 각1회
 - 교통수요관리 이행점검 : 총3회(분기별 1회 실시)
 - 기업체참여프로그램 이행실적 제출 및 감축프로그램 신청업체 점검
 - 교통수요관리 홍보 : 전체설명회 1회, 대형시설물담당 간담회 2회 실시

□ 향후 추진계획

- 교통유발부담금 경감심위위원회 개최 : 9월
 - 경감율 결정 및 기업체 통보 : 결정일로부터 7일 이내
- 대형시설물 담당 간담회 개최 : 8 ~ 9월

□ 예산현황

- 예산액 : 96,834천원
- 집행액 : 29,867천원

□ 사업개요

- 공사위치 : 관내 버스승차대 92개소
- 공사기간 : 4월 ~ 12월
- 공사내용
 - 버스승차대 유지보수 : 연간단가 계약체결을 통한 버스승차대 유지보수 (버스승차대 세척, 재도색, 문안 및 도안 보수 등)
 - 버스승차대 제작·설치 및 정비 : 2개소

□ 추진실적

- 4월 : 버스승차대 유지관리 정비공사(연간단가) 계약
 - ▮ 2012.4.9 : 버스승차대 유지관리정비 용역
 - ▮ 계약업체 : (주)태성 트라텍
 - ▮ 계약금액 : 13백만원
- 4월 ~ 6월 : 관내 버스승차대 현장조사 실시
- 8월 : 버스승차대 유지관리 정비공사 1차 작업완료
 - 불법부착물제거 38개소, 승차대 지주교체 1개소
 - 강화유리교체 2개, Roof 교체 1개소, 승차대 기초재설치 1개소

□ 향후 추진계획

- 9월 : 버스승차대 유지관리 정비공사 2차 작업실시
 - 불법부착물제거, 버스승차대 문안 및 도안 보수 등
- 10월 : 버스승차대 제작·설치 대상 선정 및 공사시행

□ 예산현황

- 예산액 : 50,000천원
- 집행액 : 미집행

□ 사업개요

- 추진배경 : 개인정보보호법 시행으로 보안시스템 구축 추진
- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 추진절차 (단위:천원)

구분	추진일정	추진내용	소요예산
1단계	3월 ~ 7월	구청 주차타워 및 당산대여소 보안 및 고도화시스템 구축	55,500
2단계	7월 ~ 8월	영등포역 보안 및 고도화시스템 구축	10,000
3단계	9월 ~ 10월	웹빙화벽 및 IPS보안관제 서비스 추진	4,500
4단계	10월 ~ 12월	DB 암호화 솔루션 구매후 운영프로그램에 장착	19,500

□ 추진실적

- 1단계 사업완료 (3.22 ~ 7.20)
 - 주민등록번호 등 개인정보 삭제(운영 DB 변경) 등 보안시스템 구축
 - 핸드폰, 비밀번호 인증 및 입력정보 변경
 - 10일이상 방치자전거 1일간 주차금지 및 대여자전거 10시간내 미반납자 패널티(횃수별 사용금지일 차등추진) 부여 등 고도화시스템 구축
- 2단계 추진중(7.23 ~ 8.21)
 - 개인정보 DB 변경에 따른 운영시스템 변경 구축

□ 향후 추진계획

- 3단계, 4단계에 대한 사업 정상추진 완료 예정

□ 예산현황

- 예산액 : 85,500천원
- 집행액 : 24,950천원

□ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 사업위치 : 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 추진내용
 - 주택 밀집 지역내 주차장 건설부지 확보, 기존 공영주차장 증축

□ 추진실적

- 신길5동 공영(노외)주차장 건설 추진 중
 - 위치 : 신길5동 400-1외 3필지
 - 면적 : 775㎡(234평)
 - 주차장 건축 형태 : 평면식(자주식) 29면
 - 현재까지 추진일정

· 주차장 건설부지 매입 방침 결정	:	2.14
· 부지매입 동의서 징구	:	2.20
· 공유재산 심의(재무과) - 적정	:	3.20
· 투자심사 심의(기획예산과) - 적정	:	5. 4
· 공유재산 관리계획 심의(구의회) - 가결	:	5. 7

□ 향후 추진계획

- 도시계획시설(주차장) 변경결정에 따른 자문 및 심의관련 자료 준비
- 지구단위계획 변경에 따른 주민의견 청취
- 도시계획위원회 자문
- 지구단위계획 변경결정 신청

□ 예산현황

- 예산액 : 4,797,600천원 (구비)

□ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 사업내용
 - 주차장 본래의 기능유지를 위한 운영관리시스템 수시 점검 및 정비
 - 주차환경 변화에 따른 거주자 주차구획선 의 신설 및 삭제
 - 공영주차장 이용고객을 위한 시설물 정비

□ 추진실적

- 공영주차장 시설물 정비

정비 내용	목표 물량	추진실적
주차구획선 정비	5,000면	2,846면
주차장 안내표지판 설치 및 보수	500개소	280개소
주차장 관제시스템 설치	6개소	설치 중
공영주차장 추락방지시설 설치	4개소	공사 중

- 건축물 부설주차장 점검실시
 - 점검대상 : 9,215개소 (부설주차장 9,054, 방법설비 161)
 - 점검실적 : 1,874개소 (부설주차장)
 - 적출내역 : 176개소 (용도변경 49, 기능미유지 127)

□ 향후 추진계획

- 공영주차장 관제시스템 설치 추진 : 9. 30
- 공영주차장 추락방지시설 설치공사 : 10.10
- 주차구획선 정비공사 추진 : 12.31
- 주차장 안내표지판 설치 추진 : 11.30
- 부설주차장 점검결과 사후처리(시정지시 등) : 12.31

□ 예산현황

- 예산액 : 908,516천원
- 집행액 : 351,749천원

□ 추진개요

- 단속지역 : 영등포구 관내 전역
- 단속인원 : 25명(현장단속 10조, CCTV 단속 2조)
- 단속방향 : 제도 원칙으로 하되, 차량소통에 지장을 초래하는 경우 단속
- 사업내용
 - 불법주차 단속조별 책임구역제 및 단속요원 직무와 친절교육 강화
 - 제도 위주의 탄력적인 지도·단속으로 주차질서 확립
 - 주민불편 및 민원사항 적극적 해소와 시민편익 우선 고려

□ 추진실적

- 추진기간 : 1. 1 ~ 7.31
 - 단속실적 : 83,249건(제도 21,392건, 과태료 61,857건)
 - 주차단속공무원 직무 및 친절교육 : 7회
 - 견인대행업체 지도관리
 - * 종사자 직무 및 친절교육 : 1회(2개 업체 9명)

□ 향후 추진계획

- 불법주차 단속조별 책임구역제 실시로 지역교통 전문성 제고
- 단속 취약지역 발굴, 중점 단속지역 확대 실시로 시민 만족도 향상

□ 예산현황

- 예산액 : 1,850,943천원 (구비)
- 집행액 : 711,901천원 (구비)

□ 사업개요

- 공사내역 : 총 21대(방범겸용 무인자동단속시스템)
- 사업기간 : 1월~ 9월 중
- 설치장소 : 영등포 푸르지오 외 20개소

□ 사업추진 현황

- 사업계획 방침 수립 : 3. 8
- 조달입찰구매 의뢰 : 3.12
- 최종기술협상 결과 (주)KSI 선정 및 계약 : 5.18
- 준공 : 9월중

□ CCTV 보유현황

구 분	2012년	2011년	2010년	2007년	2006년	비고
총107대	21	2	4	60	20	
운영방식	자동 : 21대	자동 : 2대	반자동 : 4대	자 동 : 8대 반자동 : 52대	자 동 : 3대 반자동 : 17대	

□ 기대효과

- 불법주정차 단속 CCTV 기능에 방범용 기능을 추가하여 근무시간외, 휴무일 등 단속 공백을 없애고, 24시간 무인자동단속 시스템을 운영하여 주정차 단속 및 범죄예방 활동 강화
- 주변환경에 맞게 시간대별 운영시간을 탄력적으로 운영하여 민원발생을 최소화

□ 예산현황

- 예산액 : 820,000천원(구비)
- 집행액 : 563,628천원(구비)
