

『교육 복지 사람중심 새 영등포』 실현을 위한

---

---

# 주요 업무 보고

---

---



푸른도시과

# 순 서

- 일반 현황 ..... 1
- 2010 주요업무 추진실적 ..... 3
- 2011 주요 업무보고 ..... 16
- 공 약 사 업 ..... 24

# I. 일반 현황

## 1 인 력

구분	계	일반직						기능직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정원	25		1	4	4	4	5		2	2	3
현원	30		1	5	5	5	3	1	1	7	2
과부족	5			1	1	1	-2	1	-1	5	-1

## 2 조 직

### 푸른도시과

공원팀	조경녹지팀	자연생태팀	안양천관리팀	영등포공원관리팀
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시공원조성계획 입안</li> <li>○ 공원증장기 개발계획 수립</li> <li>○ 공원 점·사용 허가</li> <li>○ 어린이공원조성·유지관리</li> <li>○ 근린공원 조성·유지관리</li> <li>○ 마을마당 조성·유지관리</li> <li>○ 공원세외수입·변상금 관리</li> <li>○ 공유재산관리(공원)</li> <li>○ 학교공원화사업</li> <li>○ 시설이적대상지 공원화사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로녹지대조성·유지관리</li> <li>○ 수림대·시설녹지조성</li> <li>○ 꽃길조성 및 화분관리</li> <li>○ 공유재산관리(녹지, 임야)</li> <li>○ 가로수 식재·유지관리</li> <li>○ 푸른서울가꾸기</li> <li>○ 옥상 및 벽면녹화</li> <li>○ 자투리땅 녹지조성</li> <li>○ 공동주택 조경협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연환경·생태복원사업</li> <li>○ 유수지 생태복원 및 관리</li> <li>○ 하천생태복원 및녹화사업</li> <li>○ 안양천 포쇄이조성(생태복원)</li> <li>○ 야생동·식물 수출입허가</li> <li>○ 야생동물구조.치료시설지정</li> <li>○ 수목 병·해충방제</li> <li>○ 수목 병·해충방제 (공원 및 녹지대 가로수등)</li> <li>○ 야외체육시설 설치, 유지관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안양천·도림천 특화사업</li> <li>○ 안양·도림천 생태조성 및 편익시설 설치 관리</li> <li>○ 자연하천 조성 및 관리</li> <li>○ 안양천 방문자 안내센터 및 프로그램 운영</li> <li>○ 안양·도림천 통합관리 사무소 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영등포공원 수목관리</li> <li>○ 영등포공원 체육시설 설치 및 관리</li> <li>○ 영등포공원 시설물설치 및 유지관리</li> <li>○ 영등포공원 수목식재 및 꽃길조성</li> <li>○ 영등포공원 내 자연학습장 조성 및 유지관리</li> <li>○ 영등포공원 점용 및 사용허가</li> </ul>

**3**

**주요시설 및 장비**

구분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근 린			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	34	10	6	4	19	5	29	143	54개 노선	2종	23개소
면적 (㎡)	606,711	543,463	135,517	407,946	55,702	7,545	15,151	581,482	15,976주	2주	16종 171점

**4**

**예산 현황**

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	11,406,986	9,122,721	80
공원녹지관리 수준향상	4,331,015	3,049,633	71
아름다운 환경 및 편리한 시설 만들기	5,474,071	4,805,617	88
안양천, 도림천 특화사업	733,261	584,841	80
행정운영경비	868,639	682,630	79

## Ⅱ. 2010. 주요업무 추진실적

구분	사 업 명	쪽
①	아파트 열린녹지 조성사업(시비, 구비) .....	4
②	가로수 유지관리사업(시비, 구비) .....	6
③	열린학교(학교공원) 조성사업(시비) .....	8
④	원지상상어린이공원 조성사업(시비, 구비) .....	9
⑤	경부 제3녹지 보상 및 녹지조성(시비) .....	10
⑥	당산공원 관리사무소 및 공원화장실 신축 .....	11
⑦	물을 이용한 친수공간 조성사업(시비) .....	12
⑧	안양천 그린웨이 조성사업(시비) .....	13
⑨	영등포공원 시설개선 및 정비사업(시비, 구비) .....	14
⑩	대림운동장 생태연못 조성사업(시비) .....	15

# 1

## 아파트 열린녹지 조성사업(시비, 구비)

아파트 담장을 허문 후 단지내 녹지를 개방하여 인근주민에게 휴식처 제공 및 가로녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 주민의 삶의 질 향상

### □ 추진목표

- 부족한 녹지공간을 확보하여 푸른 도시환경을 조성

### □ 추진방향


- 도로변 아파트 담장개방 및 녹지조성을 통한 단지간 녹지연결
- 녹지량 확충을 위한 수목 식재 최대화 및 시설물 설치 최소화
- 열린녹지로 조성하여 인근 주민의 휴식처 제공

### □ 추진개요

- 위 치 : 문래동 현대1차아파트 외 5개소(문래 현대1차, 문래 현대2차, 문래 현대3차, 신길 우성1차, 양평동 삼성, 양평동 삼호 한솔)
- 규 모 : 녹지조성 10,606 $m^2$
- 사업기간 : 1 ~ 7월
- 사업내용 : 담장철거 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 1,462백만원

### □ 추진실적

- 1월 : 2010 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 수립
- 1 ~ 3월 : 기술용역 타당성 심의 및 설계용역 시행
- 4 ~ 5월 : 공사발주 및 착공
- 7월 : 공사준공 (7월18일)

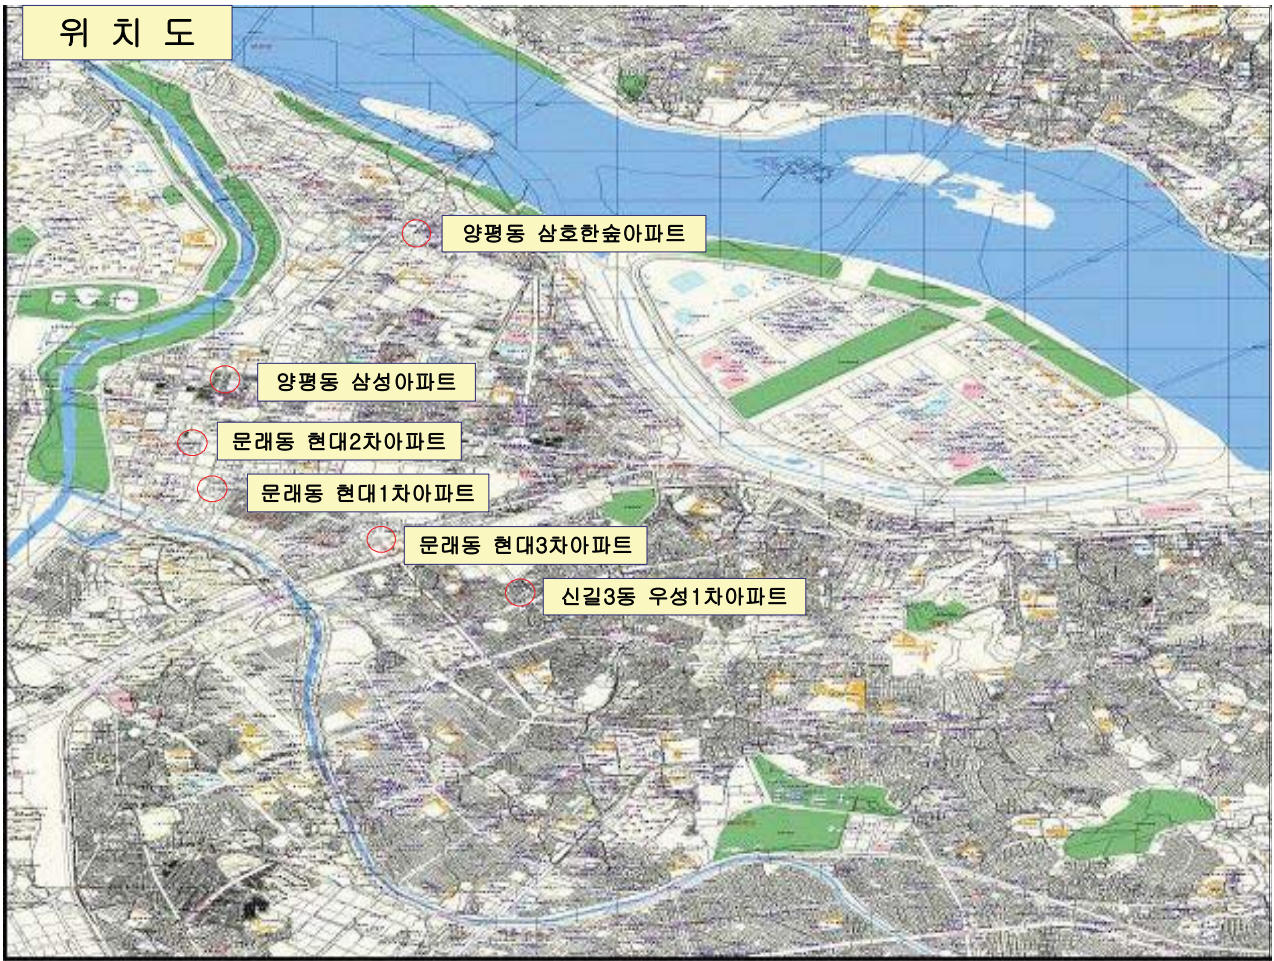

## 2 가로수 유지관리사업(시비, 구비)

가로수는 도시미관을 형성하는 주요 녹화자원으로 가로수 가지치기, 가로수 보식, 왕벚나무 수세회복사업 등을 실시하여 쾌적한 보행공간 조성 및 도시미관 향상에 기여

### □ 추진목표

- 가로수의 도시림 기능 확대로 도시 녹지축 구현

### □ 추진방향

- 가로수의 건강한 생육 도모 및 쾌적한 가로경관 형성
- 가로 선형녹지 확대를 위한 다층구조의 떠녹지 조성을 중점 추진
- 가로수의 체계적 관리로 수준향상 도모

### □ 추진개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업기간 : 1. ~ 12월.
- 총사업비 : 373백만원(시비 95백만원, 구비 281백만원)

### □ 추진실적

#### [가로수 가지치기]

- 세부위치 : 대방로, 당산로, 양평로, 영등포로, 경인로, 버드나룻길  
도림천로, 선유로, 노량진로, 대방천길, 문래로, 성원마을길~당중길
- 사업내용 : 양버즘나무, 은단풍 등 1,090주 전지
- 사업비 : 195백만원(시비 95백만원, 구비 100백만원)
- 준공일 : 3. 10

#### [왕벚나무 수세회복]

- 세부위치 : 안양천 뚝방, 신길6동 벚꽃길
- 사업내용 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충방제
- 사업비 : 50백만원(구비)
- 준공일 : 5. 6



### [가로수 보식 및 식재]

- 세부위치 : 강나리길~삼천리길, 한어울길~풍요길
- 사업내용 : 고사목 제거 및 가로수 12주 식재
- 사업비 : 13백만원(구비)
- 준공일 : 6. 28

### □ 향후계획

#### [가로수 생육환경 개선사업]

- 세부위치 : 선유로, 영등포 고가로, 여의대로, 버드나룻길
- 공사내용 : 떠눅지 조성
- 공사기간 : 7. 6 ~ 12. 2 ※ 공정률 50%
- 사업비 : 400 백만원 (시비 400백만원)

#### [가로수 보식]

- 세부위치 : 영등포로 등 관내 52개 노선
- 사업내용 : 가로수 133주 식재
- 공사기간 : 7. 8 ~ 12. 4 ※ 공정률 90%
- 사업비 : 200백만원(시비)



### 3

## 열린학교(학교공원) 조성사업(시비)

학교담장을 허물고 운동장 주변과 공지에 녹지를 조성하여 학생들의 정서순화 및 자연 교육여건을 개선하는 등 지역주민을 생활거점 공원으로 조성

### □ 추진목표

- 학교담장을 개방·녹화하여 지역 공원화 및 녹지 거점화
- 지역주민을 위한 생활체육시설 등 설치하여 지역사회의 웰빙공간 제공

### □ 추진방향

- 운동장 자투리땅 녹화 등 큰나무 위주의 녹지공간 확대
- 녹지공간 확보 및 수준 높은 공원시설 확충
- 지속적인 모니터링 및 사후 유지관리 지원으로 학교·주민 만족도 향상

### □ 추진개요

- 위 치 : 대림중학교, 대길초등학교
- 면 적 : 3,440 $m^2$
- 사업기간 : 2009. 11~2010. 4. 30
- 총사업비 : 479백만원(시비)

### □ 추진실적

- 2009. 11월 : 기술용역타당성 검토
- 2009. 12 ~ 2010. 1월 : 실시설계 시행
- 2010. 3~4. 30. :공사시행 및 준공



## 4

# 원지 상상어린이공원 조성사업(시비, 구비)

10년이상 노후된 어린이공원을 재정비하여 공원의 질적 수준을 향상하고 어린이와 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 놀이 및 휴게공간으로 재조성

### □ 추진목표

- 조성된 지 10년 이상 노후된 어린이공원을 현대화하여 시설의 질적 수준향상

### □ 추진개요

- 위 치 : 대림동 690 원지어린이공원
- 면 적 : 4,845.1㎡
- 공사기간 : 5. 1 ~ 8. 31.
- 총사업비 : 896백만원(시비 448, 구비 448)
- 시 공 사 : 북창건설 대표 김 추

### □ 추진경과

- 2009. 7. 17 실시설계용역 시행(원지공원 외 1개소)
- 2009. 9. 8 / 10. 6 주민의견수렴 및 주민설명회 개최
- 2010. 5. 1 ~ 8. 31공사시행
- 2010. 8. 31 : 공사준공

원지어린이공원



원지어린이공원



## 5 | **경부 제3녹지 보상 및 녹지조성(시비)**

장기미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 민원해소 및 녹지의 기능 회복을 통하여 주거환경 개선 및 도시경관 향상에 기여코자 함

### □ 추진목표

- 생활권 녹지 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상
- 장기미집행 도시계획시설(녹지) 보상으로 민원 해소

### □ 추진개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 규 모 : 7,912㎡(토지 28필지, 지장물 25, 영업권 49)
- 총사업비 : 22,388백만원 (보상 및 녹지 조성)

(단위:백만원)

계	2007	2008	2009	2010	2011이후
22,388	2,500	4,000	4,000	4,300	7,828

### □ 추진경과

- 보상실적 : 토지 13필지 , 지장물 25건 완료, 영업권 49건 완료
- 지장물 철거 : 건물 25동 중 6동 철거(미철거 19동)

### □ 문제점

- 예산부족으로 보상지연
- 예산확보 : 시비 추경 및 2011년 예산 확보 추진

### □ 향후대책

- 2011. 2 ~ 2012. 12 : 투자사업 계획에 의거 보상 추진
- 2013. 3 ~ 6 : 기본 및 실시설계 용역
- 2013. 7 ~ 12 : 녹지조성(공사 및 준공)



## 6

# 당산공원 관리사무소 및 공중화장실 신축

공원 내 노후 된 기존 건물을 철거하고 관리사무실 및 공중화장실을 신축하여 이용시민의 편의제공 및 효율적인 공원관리

### □ 추진목표

- 공원과 조화되는 친환경 건축물을 신축하여 경관향상 및 편의제공

### □ 추진개요

- 위 치 : 영등포구 당산동 3가 385
- 면 적 : 건축연면적 259.22㎡(지하1층, 지상1층)
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 2011.6
- 공사금액 : 815백만원(확보예산: 465백만원)
- 공사내역 : 관리사무소, 수유실, 화장실, 인부대기실, 중수처리시설 등

### □ 추진경과

- 2010.4.1 : 실시설계용역 착수
- 2010.9.1 : 서울시 도시공원위원회 심의(조건부 가결)
  - 관리실 및 화장실 출입구 구분, 지붕 및 벽면녹화 등
- 2010.10.20 : 실시설계용역 준공
- 2010.10. : 2011년 본예산 확보 요청(부족예산 350백만원)

### □ 향후계획

- 2010.12 ~ 2011.1 : 공사발주 및 시공사 선정
- 2011.1 ~ 2011.6 : 공사착공 및 준공 예정

조감도



관리사무소



## 7

## 물을 이용한 친수공간 조성사업(시비)

시민과 차량 통행이 많은 가로변에 물을 이용한 분수, 계류, 벽천 등의 친수공간을 조성하여 볼거리 제공과 쾌적한 경관 조성

## □ 추진목표

- 수변공간을 겸한 쉼터조성

## □ 추진개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동2가 174-1일대(영등포로터리)
- 규 모 : 1,014㎡(L78m, W8~25m)
- 사업기간 : 2 ~ 12월
- 사업내용 : 바닥분수 및 쉼터, 수목식재, 경관조명 등
- 총사업비 : 427백만원(시비)

## □ 추진경과

- 실시설계용역 : 4. 3 ~ 7. 1
- 서울시디자인심의 : 6. 9.(수) (결과 : 수정시설 장소 부적정)
- 서울시 도시 디자인 조례 개정 : 2010. 7. 15
  - 자치구에서 시행하는 5억원 이하 사업은 구 디자인 심의 대상
- 구 디자인심의 : 9. 1 ~ 10. 22 (결과 : 보완통과)
- 서울시 설계심의 및 계약심사 : 2010. 10. 4 ~ 11. 1
- 공사발주 : 2010. 11. 5

## □ 향후대책

- 공사착공 : 2010. 11. 17
- 지하구조물공사 : 2010. 12. 15
- 공사준공 : 2011. 2. 28



## 8

# 안양천 그린웨이 조성사업(시비)

환삼덩쿨, 돼지풀 등 경관을 저해하고 생태계를 교란시키는 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 제방사면을 다양한 화목류와 초종이 자라는 생태경관 지역으로 개선하고 걷고 싶은 그린웨이로 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안(오목교 ~ 목동교) 제방사면
- 규 모 : 15,656 $m^2$ (L=약1km)
- 공사기간 : 2010. 8. 18 ~ 12. 25
- 총사업비 : 1,794,000천원(시비)

### □ 추진실적

- 기술용역타당성 심의 : 2. 5
  - 용역보고 및 자문회의 : 4. 3
  - 서울시 설계심의(자연생태과) : 5. 10
  - 국토관리청 하천점용허가 협의 : 7. 14
  - 시설공사 착공 : 8. 18
    - 뚝방 상단 사면 및 하단의 잡초, 고사목 제거 8,000 $m^2$
    - 기존 식생 보존을 위한 초화류(원추리 및 억새 등) 이식 1,500 $m^2$
    - 뚝방 사면의 배수관 및 경계석 설치 2,500m
    - 산책로 콘크리트 포장(3,011 $m^2$ ) 및 부직포 설치 등
- ※ 전체 공정율 : 60%

### □ 향후계획

- 시설공사 준공 : 12. 25(예정)



## 9

# 영등포공원 시설개선 및 정비사업(시비, 구비)

영등포공원이 우리구로 관리·운영권이 이관됨에 따라 주민욕구에 부응할 수 있도록 시설개선 및 운영계획을 수립하여 공원 공원이용 활성화에 기여코자 함

### □ 추진목표

- 공원 시설개선 및 편의시설 확충을 통한 주민욕구 충족 및 민원 해소
- 영등포공원 운영계획을 수립하여 공원이용 활성화에 기여

### □ 추진개요

- 위 치 : 영등포동 582-3
- 규 모 : 61,544 $m^2$

※공원 인수 연월일 : 2009년 7월 29일

#### ○ 사업내용

##### 【영등포공원 시설개선 기본계획 용역 사업】

- 사업비 : 25백만원(구비) - 용역기간 : 3. 10 ~ 7. 15

##### 【영등포공원 관리사무소 리모델링】

- 규 모 : 48,264 $m^2$ (1층 241.32 ,2층 241.32), 철근콘크리트
- 사업비 : 390백만원(시비)

##### 【영등포공원 산책로 탄성포장 공사】

- 규 모 : 3,242 $m^2$ (L748m×W4.33m)
- 사업비 : 400백만원(시비)

### □ 추진실적

- 영등포 공원 시설개선 기본계획 용역 사업 : 3. 9
- 영등포 공원 시설정비사업 실시 설계비 재배정 : 3. 15
- 영등포 공원 시설정비사업비 재배정 : 5. 19
- 산책로 탄성포장공사 발주 : 6. 16
- 산책로 탄성포장공사 준공 : 10. 30
- 공원관리사무실 리모델링 사업 계약 : 11. 1

### □ 향후계획

- 12월 : 공원관리사무실 리모델링 사업 준공



대림운동장 녹지대에 생물다양성 증진을 위한 생태연못, 계류 등을 설치하여 주변여건과 조화되는 소규모 생물서식 공간으로 생태계를 복원하여 사람과 자연이 어우러지는 자연친화적 생태학습 공간으로 조성하고자 함

#### □ 사업개요

- 위 치 : 대림3동 780번지 (대림운동장 : 16,498 $m^2$ )
- 규 모 : 1,200 $m^2$ (110m×11m)
- 공사기간 : 2010. 7. 7 ~ 12. 3
- 총사업비 : 530,000천원(시비)

#### □ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 : 1. 26
- 기술용역타당성 심의 : 1. 27
- 용역보고 및 자문회의 : 4. 14
- 주민설명회 : 4. 20
- 서울시 설계심의(자연생태과) : 5. 3
- 시설공사 계약 : 7. 6
- 시설공사 착공 : 7. 7
  - 연못 계류 및 도섭지 설치 103 $m^2$  및 경계석 설치 213m
  - 정화연못, 연지 설치 59 $m^2$  및 조경석 쌓기 34ton
  - 산책로 점토블럭 165 $m^2$  및 고무칩 90 $m^2$  포장
- ※ 전체 공정율 : 70%

#### □ 향후계획

- 시설공사 준공 : 12. 3(예정)



### Ⅲ. 2011. 주요 업무계획

구분	사 업 명	쪽
①	양평동 불량주택 밀집지역 공원화사업(국·시·구비)	.....
②	당산공원 관리사무소 및 공원화장실 신축(구비)	.....
③	공원 내 CCTV 구축(구비)	.....
④	차없는 문화거리 조성공사(구비,시비)	.....
⑤	경부제3녹지 보상 및 녹지조성(시비)	.....
⑥	안양천 그린웨이 조성사업(4차, 시비)	.....
⑦	마을단위 야외체육시설 설치공사(구비)	.....

# 1

## 양평동 불량주택 밀집지역 공원화사업(국·시·구비)

양평동 2가 41-5일대는 노후불량주택 밀집지역으로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성함으로써 주민에게 쾌적한 녹지환경 제공

### □ 사업목표

- 도시경관 향상 및 쾌적한 주거환경 조성

### □ 추진방향

- 도시경관 향상 및 공원녹지 확충
- 저지대 노후 불량주택지를 개량함으로써 침수 피해 예방 효과

### □ 세부추진계획

- 위치 : 영등포구 양평동 2가 41-5번지 일대
- 면적 : 1,109.5  $m^2$
- 사업기간 : 2009. 7월 ~ 2011. 12월
  - 2011. 1 ~ 2 : 도시계획시설(공공공지) 실시계획 인가 고시
  - 2011. 1 ~ 12 : 보상완료 및 마을마당 조성
- 총사업비 : 4,900백만원 (국·시·구비)



## 2

# 당산공원 관리사무소 및 공원화장실 신축(구비)

공원 내 노후된 기존 건물을 철거하고 관리사무실 및 공중화장실을 신축하여 이용시민의 편의제공 및 효율적인 공원관리

### □ 사업목표

- 노후 건물을 철거하고 공원과 조화되는 친환경 건축물 신축

### □ 추진방향

- 위 치 : 영등포구 당산동 3가 385
- 면 적 : 건축연면적 259.22㎡(지하1층, 지상1층)
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 2011.6
- 공사금액 : 815백만원(기확보예산: 465백만원)
- 공사내역 : 관리사무소, 수유실, 화장실, 인부대기실, 중수처리시설 등

### □ 세부 추진계획

- 2010.12 ~ 2011.1 : 공사발주 및 시공사 선정
- 2011.1 ~ 2011.6 : 공사착공 및 준공 예정



### 3 | 공원 내 CCTV 구축(구비)

어린이 성범죄 등 각종 범죄예방 및 공원시설물 파손 등을 사전에 예방하고자 공원 내 CCTV 시스템을 구축하여 안전한 공원환경을 조성

#### □ 사업목표

- 공원 내 CCTV를 설치하여 어린이 성범죄 사전예방
- 공원시설물 파손 예방으로 쾌적하고 안전한 공원 관리

#### □ 추진방향

- 공원 내 CCTV를 설치하여 어린이 대상의 각종 범죄 예방 및 시설물 파손을 예방하여 안전한 공원환경 조성

#### □ 세부 추진계획

- 대상지 : 문래공원 등 20개소
- CCTV 구축계획

구분	C C T V(개소)			
	계	기 설치	2011대상지	장래 설치
공원	60	5	10	45
CCTV	98	19	22	57

- 사업기간 : 2011. 3월~12월
  - 2011. 3월 : 계획 수립
  - 2011. 4~5월 : 실시설계용역 시행
  - 2011. 6~9월 : 공사시행
- 총사업비 : 208백만원

고추말공원



서강공원



## 4

# 차없는 문화거리 조성공사(구비,시비)

아파트에 연접한 차량통행이 적은 도로의 차량통행을 차단하고 아파트와 아파트 사이 담장을 허물어 수목식재, 화단조성 및 주민편의 시설을 설치하는 차없는 문화거리로 조성하여 지역 주민의 부족한 녹지확충 및 쉼터 제공

### □ 사업목표

- 생활권 녹지 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상

### □ 추진방향

- 도로변 아파트 담장개방 및 녹지조성을 통한 단기간 녹지연결
- 녹지량 확충을 위한 수목 식재 최대화 및 시설물 설치 최소화
- 열린녹지로 조성하여 인근 주민의 휴식처 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 문래동 5가 13-3, 22-3(두래아파트~진주아파트 사이)
- 규 모 : 면적 1,220㎡(연장152m, 폭8m)
- 사업비 : 520백만원(시비50%, 구비50%)

### □ 세부 추진계획

- 2010. 10. 12 : 기본 및 실시설계 기 완료 (2010년도 예산)
- 2011. 2 : 계약심사
- 2011. 3 : 시설공사 발주
- 2011. 4 ~ 6 : 사업 시행 및 준공



## 5 경부제3녹지 보상 및 녹지조성(시비)

장기미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 민원해소 및 녹지의 기능 회복을 통하여 주거환경 개선 및 도시경관 향상에 기여코자 함

### □ 사업목표

- 생활권 녹지 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상
- 장기미집행 도시계획시설(녹지) 보상으로 민원 해소

### □ 추진개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 규 모 : 7,912㎡(토지 28필지, 지장물 25, 영업권 49)
- 총사업비 : 22,388백만원 (보상 및 녹지 조성)

(단위:백만원)

계	2007	2008	2009	2010	2011	2012이후
22,388	2,500	4,000	4,000	4,300	4,000	3,828

### □ 추진경과

- 보상실적 : 토지 13필지 , 지장물 25건 완료, 영업권 49건 완료
- 지장물 철거 : 건물 25동 중 6동 철거(미철거 19동)

### □ 문제점

- 예산부족으로 보상지연
- 예산확보 : 시비 추경 및 2012년 예산 확보 추진

### □ 향후대책

- 2011. 2 ~ 2012. 12 : 투자사업 계획에 의거 보상 추진
- 2013. 3 ~ 6 : 기본 및 실시설계 용역
- 2013. 7 ~ 12 : 녹지조성(공사 및 준공)



## 6

# 안양천 그린웨이 조성사업(4차, 시비)

환삼덩굴, 돼지풀 등 제방 경관을 저해하고 생태계를 교란시키는 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 제방사면을 환경친화적인 화목류와 초종이 자라는 생태 경관 지역으로 개선하여 걷고 싶은 그린웨이로 조성하고자 함

### □ 사업목표

- 목동교~양평교 구간의 안양천 제방사면을 녹화
- 하천제방 환경개선 및 녹지량 확충으로 계절별 꽃이 피는 하천경관 조성

### □ 추진방향

- 호안블럭으로 덮여있는 안양천 제방사면을 생태복원(식재기반조성, 초화류 식재) 및 녹화하여 서울의 대표적인 Green Way로 조성
- 다양한 식생으로 하천생태계 복원 및 청소년들의 자연학습장 제공
- 안양천 주변 환경개선 및 휴식시설 설치 등 시민 봉사행정 실현

### □ 세부 추진계획

- 위 치 : 안양천 우안(목동교 ~ 양평교) 제방사면
- 규 모 : 15,682 $m^2$ (L=약1km)
- 사업기간 : 2011년 1월 ~ 12월
- 총사업비 : 2,700,000천원(시비)

구분	소요예산 (백만원)	위치(구간)	거리(m)	면적( $m^2$ )	비고
계	7,954		3,500	49,599	
2008년	2,000	오목교~신정교	800	10,579	1차
2009년	1,460	양화교~양평교	600	8,933	2차
2010년	1,794	목동교~오목교	1,075	14,405	3차
2011년	2,700	양평교~목동교	1,025	15,682	4차



## 7 마을단위 야외체육시설 설치공사(구비)

체육활동 인구증가에 대비하고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 마을단위 야외 체육시설을 설치하여 구민 건강을 증진하고 체육인구 저변 확대에 기여하고자 함

### □ 추진방향

- 생활주변 체육시설 증대로 삶의 질 향상
- 체육인구 저변확대로 생활 체육 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 도림동 체육시설 외 6개소  
- 대방천·안양천변, 신길1동 체련장, 신안인스빌소공원, 목화마을마당, 여의도 등
- 사업내용  
- 도림 게이트볼장 및 배드민턴장 정비  
- 관내 체육시설 정비(체련장, 소공원 등)
- 사업기간 : 2011. 1. ~ 2011. 8.
- 총사업비 : 204백만원(구비)

### □ 추진계획

- 2011. 2. : 사업대상지 현지조사
- 2011. 4. : 실시설계 발주 및 용역시행
- 2011. 5. : 일상감사 및 공사발주
- 2011. 8. : 공사준공



## IV. 공 약 사 업

### 1 영등포구 올레길 조성사업(구비)

안양천, 한강, 샛강 등 기 조성된 하천의 산책로 활용 및 구민건강 걷기 코스로 재조성하고 기존의 공원, 하천, 산책로 등을 연계하여 걷기코스 발굴 및 테마가 있는 도심속 올레길 조성

#### □ 사업목표

- 안양천, 도림천, 한강의 하천녹지와 도심 외곽의 단절된 녹지를 연결하여 녹지가 풍부한 생태도시 조성 및 주민 건강 증진

#### □ 추진방향

- 우리 구 외곽의 양호한 수자원 환경과 지역적 특성을 살려 쾌적하고 아름다운 도시 영등포구 조성
- 생활주변 건강 산책로 및 테마거리 조성으로 삶의 질 향상

#### □ 세부 추진계획

- 위 치 : 안양천, 도림천, 한강, 샛강, 대방천, 대방로, 시흥대로 등
- 규 모 : 총길이 40.2km(도시생태 탐방로 9.1km, 역사·문화 탐방로 9.2km, 건강 산책로 21.9km)
- 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2014년 12월
- 총사업비 : 2,635백만원(구비)

구분	소요예산	위치(구간)	거리(km)	비고
계	2,635	3개지역	40.2	
2011년	35	-	-	실시설계 용역
2012년	800	당산동부군당~구민회관	9.2	역사문화 탐방로
2013년	800	윤중로~샛강~당산공원	9.1	도시생태 탐방로
2014년	1,000	한강~안양천~시흥대로	21.9	건강 산책로

## □ 현황사진



## □ 위치도

