

제197회 구의회 임시회

2016.10.19. ~ 10.26.

청림 명동포구

2016년 주요업무 보고




건축과

보고 순서

I . 일반 현황	•••	1
II . 주요업무 추진 실적	•••	4
III . 중점사업 실적	•••	22

I. 일반 현황

1 조직

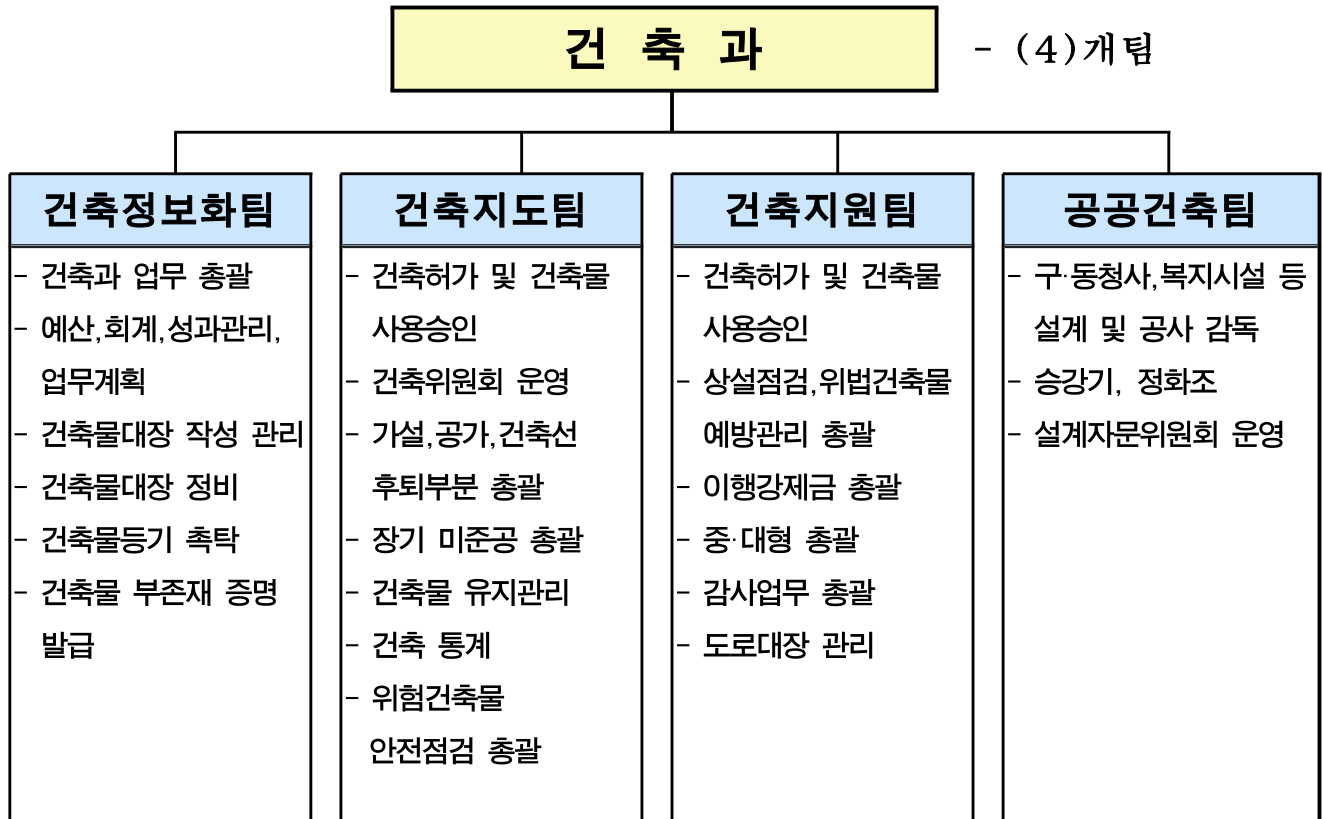

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제				
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	27	0	1	4	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
현 원	25	0	1	5	13	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
과부족	△2	0	0	1	5	△7	△1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

□ 장비

구분	차종	차명	차량등록번호	연식	용도
장비	중형승용	쏘울	58하2318	2015	건축현장 점검 등 업무용

4

예산 현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	292,665	244,911	83.7
품격있는 건축물 조성 및 관리	168,106	144,724	86.1
기본경비	122,540	98,170	80.1
보전지출	2,019	2,017	99.9

5

건축허가 및 사용승인 현황

□ 2016년 허가 및 사용승인 현황('16.9.30현재)

(단위 : 건)

구분	총계	신축	증축	대수선	용도변경
허가	352	234	20	14	84
사용승인	297	187	42	11	57

□ 최근 3년간(2013~2015년) 허가 및 사용승인 현황

(단위 : 건)

구분 \ 연도	2013	2014	2015
허가	457	473	576
사용승인	325	525	521

6

각종 민원(진정,청원,기타) 접수처리 현황

□ 2016년 각종 민원 접수처리 현황('16.9.30현재)

(단위 : 건)

구분	접수	처리	진행중	미처리	비고
계	276	276	-	-	
진정(고충)민원	59	59	-	-	
청원민원	52	52	-	-	
기타민원 (새울 등)	165	165	-	-	

Ⅱ . 주요업무 추진 실적

연번	사 업 명	쪽
①	안전도시 구축을 위한 시설물 관리	5
②	일반지역 내 공가 점검 및 관리	7
③	건축허가전 합리적인 의견수렴제도 운영	8
④	건축 전문상담실 운영	10
⑤	위법건축물 예방 활동	11
⑥	구민 복리증진을 위한 친환경 공공건축물 건립	13

「재난 및 안전관리기본법」 과 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 에 의거 현장중심의 시설물 안전점검과 건축물 유지관리 적정 여부 점검으로 사전에 재난사고 발생을 예방하여 안전도시를 만들고자 함

□ 사업개요

- 대 상 : 특정관리대상시설 및 대형건축물(1·2종 시설) 외
- 기 간 : 1. 1 ~ 12. 31
- 내 용 : 현장 중심의 안전점검 실시로 재난위험요인 사전 파악 및 효과적인 재난 예방대책 강구

□ 주요 추진실적(9.30현재 총1,155개소 점검 실시)

구 분	점검기간	점검대상	점검결과	비 고	
1	설명절 대비 안전점검	1.11 ~ 1.27	45개소	이상 없음	외부전문가 합동점검 실시
2	해빙기 대비 안전점검	2.26 ~ 3.20	41개소	경미한 사항 시정조치 및 점검결과 통보	외부전문가 합동점검 실시
3	2016 상반기 특정관리대상시설 안전점검	2.24 ~ 4.30	454개소	특이사항 없음	
4	노후조적조 건축물 안전점검	4.1 ~ 4.14	362개소	대체로 양호하며 구조적 문제 없음	
5	여름철 대비 재난취약시설 안전점검	5.16 ~ 5.27	43개소	이상 없음	
6	장마대비 굴토공사장 긴급점검	6.21 ~ 6.23	14개소	이상 없음	
7	재난취약시설 긴급안전점검	7.7	5개소	위험요인 진행등의 특이사항 없음	
8	폭염대비 공사장 안전점검	8.4 ~ 8.17	33개소	현장관리 이상없음	
9	추석대비 안전점검	8.25 ~ 9.12	39개소	경미한 사항 시정조치	외부전문가 합동점검 실시

※ 기타 계절별 . 시기별 필요시 안전점검 추진실적 : 119개소

주) 특정관리대상시설 : 연립주택, 집회시설, 종교시설, 대형건축물, 대형건축공사장 등
 시특별대상 건축물 : 연면적 3만 m^2 이상 또는 16층 이상 건축물, 다중이용건축물 등

□ **향후계획**

- 2016. 10. : 특정관리대상시설 하반기 일제조사 및 안전점검 실시
 - 점검 완료 후 점검결과에 따라 등급 조정
 - 점검결과는 재난관리시스템에 입력·관리
- 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 대상시설 안전관리
 - FMS시스템 지속 확인·점검하여 안전점검 미실시 시설에 대하여 관리주체에 안전점검 실시토록 지속 독려
- 중·대형 건축공사장 및 재난위험시설 안전관리
 - 재난발생 위험이 높은 건축공사장 및 재난위험시설(D·E등급)에 대하여 월 1회 이상 안전점검 실시
 - 계절별 중점 점검 실시
 - 추진시기 : 겨울철 대비(11월), 동절기 화재대비(12월) 등

□ **소요예산**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
70,524 (시비53,643,구비16,881)	59,566	84.5

2 일반지역 내 공가 점검 및 관리

건축지도팀

장기간 방치로 인해 각종 범죄 및 화재발생 가능성이 크고, 쓰레기 방치 및 무단투기로 오염이 심각해지는 공가지역에 대한 점검을 실시하여 범죄 발생을 억제하고 재난안전사고가 발생치 않도록 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 점검대상 : 영등포동8가 46 등 32개소('16.9.30 기준) (단위 : 개소)

계	영등포동	영등포본동 /도림동	당산동	대림동	신길동	양평동
32	1	7/2	4	3	12	3

- 점검방법
 - 공가 출입문 폐쇄 여부 점검 및 육안 안전점검 실시
 - 건축물별 공가 안내표지판 부착 및 공가 관리카드 작성

□ 주요 추진실적

- 총 32개소 관리(1/4~2/4분기 점검완료)
 - 점검제외: 7개소(철거 5개소, 거주 2개소), 신발생: 3개소
- 공가 안전관리(61건) 및 보수·보강(7건) 소유자에게 공문 발송

□ 점검 사진



□ 향후계획

- 2016. 10월중 : 3/4분기 공가점검 예정
- 2016. 12월중 : 4/4분기 공가점검 예정

□ 소요예산 : 비예산

품격 있는 건축물 건립을 유도하기 위한 건축위원회, 집단 민원이 예상되는 건축물에 대해 이해관계인의 합리적이고 타당성 있는 의견을 건축계획에 반영하기 위한 건축허가 사전알리미 및 민원조정협의회를 내실있게 운영하여 건축행정의 신뢰도를 높이고자 함

[건축 위원회]

□ 사업개요

- 심의대상
 - 건축위원회 : 다중이용건축물, 분양대상건축물, 20m 이상의 도로변에 접한 건축물로서 연면적 3,000㎡이상 건축물
 - 굴토분야 : 지하2층 이상 또는 굴토 깊이 10미터 이상 굴토 공사장
 - 구조안전분야 : 다중이용건축물 및 특수구조건축물의 구조 안전
 - 계획분야 : 경관지구 건축 및 반지하 주택 건축
- 심의내용 : 경관개선을 위한 친환경 디자인, 색채 등을 가미한 품격 있고 안전한 건축물 건립 유도
- 개최시기 : 매월 각 1회 이상 개최

□ 주요 추진실적

- 건축(소)위원회 개최 : 16회 , 183건 심의

□ 향후계획

- 건축물의 경관적 배치, 기능적 요소, 시공 안전성 확보를 위한 구조적인 부분 및 공공성 확보에 대하여 집중 심의

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
20,816	6,599	31.7
(구비 포괄18,816, 일반 2,000)	(구비 6,599)	

[건축허가 사전알리미]

□ 사업개요

- 대 상 : 집단민원이 예상되는 건축물에 대해 인접 주민 등 이해관계인의 의견을 수렴하여 합리적이고 타당성 있는 의견에 대하여 건축 계획에 반영토록 유도하여 집단민원 사전 예방
- 절 차 : 건축허가(심의)접수 ⇒ 사전알리미 시행

□ 주요 추진실적

- 사전알리미 시행 : 5회
 - 양평동5가51외 1필지, 기간:'16.02.15~22(7일간), 일조권.조망권 등
 - 양평동3가 56-5외 1필지, 기간 : '16.05.09~16(7일간), 일조권.통풍권 등
 - 영등포동1가 94-2외 1필지, 기간 : '16.07.25~31(7일간), 교통영향.주차장설치관련 등
 - 양평동2가 37-3, 기간:'16.08.01~08(7일간), 일조권.조망권 등
 - 양평동3가 70-1, 기간:'16.08.08~15(7일간), 일조권.조망권 등

□ 향후계획

- 사전알리미로 인하여 민원처리가 지연되지 않도록 신속·정확하게 시행 하고 소음·분진 및 일조권 피해등에 대해서는 구제방법(환경분쟁조정 위원회의 조정 신청) 안내
- 건축관계자(설계자 등)가 직접 주민에게 건축개요 등을 안내 및 협의 할 수 있는 사전협의제를 통한 주민 소통 강화

□ 소요예산 : 비예산

[민원조정협의회]

□ 사업개요

- 대 상 : 주민 기피시설 등에 대한 건축주와 인근 주민 간의 협의가 되지 않아 민원이 발생하는 현장의 인접 주민 등 이해관계인의 의견 수렴
- 절 차 : 건축허가(심의)접수 ⇒ 사전알리미 시행 ⇒ 민원조정협의회

□ 주요 추진실적 : 미개최

□ 향후계획

- 건축허가 사전알리미의 실효성을 통한 협의회 안건 최소화 추진

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,550 (구비 포괄1,050, 일반 500)	-	-

구민들이 궁금해 하는 건축 인허가 등 제반사항에 대해 구 건축사회와 MOU를 체결하여 관내 건축사 20명으로 구성된 상담인원이 체계적이고 전문적인 상담으로 고객 감동행정서비스를 실현하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 주요내용
 - 상담인원 : 20명(1일 2인)
 - 상담시간 : 매일 09:30~17:00(토,일,공휴일 제외)
 - 상담내용 : 건축법 및 건축 설계·시공 등 건축 전반
 - 상담장소 : 건축과 내 “소통마루”
 - 동주민센터 요청 시 찾아가는 서비스 제공
- 상담실 운영 사진



□ 주요 추진실적 : 186회, 470건 운영

□ 향후계획

- 주요민원 현장 확인 및 긴급 안전점검 수행
- 건축물의 안전과 관련된 사례는 필요시 상담건축사가 현장 확인·지도

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
13,600 (구비 13,600)	5,192	38.2

관내 소·중·대형 건축물 및 가설건축물, 장기미사용승인 건축물 등에 대한 지속적인 점검을 통해 위법건축물 발생을 사전 예방하고, 미시정 위반 건축물에 대해 이행강제금 부과 등 행정처분을 시행코자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 주요내용
 - 대 상 : 소·중·대형 건축물, 열린공간, 중점관리건축물, 신고건축물
 - 방 법 : 건축행정 종합관리계획 및 서울시 교차점검계획에 따라 건축물 점검
 - 절 차 : 건축물 점검 ⇒ 시정(1,2차) ⇒ 이행강제금 부과예고 ⇒ 부과

□ '16년 이행강제금(과태료) 부과·징수 현황

(단위: 건/천원, 2016.09.30 기준)

구 분	부 과		징 수		체 납		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
합 계	80	437,290	66	248,292	14	188,998	56.78
이행강제금	42	426,370	34	239,172	8	187,198	
건축과태료	38	10,920	32	9,120	6	1,800	

※ 체납액 중 1건이 120,705천원으로 수탁자와 위탁자의 신탁계약 관계로 체납중 '16.8.23 집합건물 압류조치함. 향후 지속적인 납부 독려

- 이행강제금 징수율 제고
 - 동별 담당이 현장조사시 면담 진행 및 이행강제금 납부 독려
 - 고액 체납자인 경우 납부자의 소득순위에 따른 분납 유도
 - 체납자 재산압류 조치

□ 향후계획

점검대상	점검기준	점검시기	진행상황
소형건축물	연면적 2,000㎡미만	연4회 (분기별)	1분기 점검 52건 중 적발 3건 (행정조치 2건, 이첩 1건)
			2분기 점검 73건 중 적발 4건 (행정조치 1건, 이첩 3건)
중형건축물	연면적 2,000㎡~10,000㎡ 미만	연1회 (6월)	점검중 (대상 495건)
대형건축물	10,000㎡이상	연1회 (5월)	점검중 (대상 263건)
열린공간	공개공지	상반기 (6월)	위반사항 재확인중 (대상 123건중 위반 43건)
		하반기 (10월)	점검기간 미도래
	건축선후퇴부문	연1회 (9월)	점검중 (대상 2,214건)
중점관리대상	장기미사용승인	연1회 (4월)	점검 중 (대상 308건)
신고 건축물	건축신고, 가설건축물신고 등	연중관리	점검 중 (대상 46건)

□ 소요예산 : 비예산

구민복지 향상을 위해 건립되는 공공건축물에 친환경 및 고효율 건축자재 사용 등 환경 친화적 건축물을 건립하여 수요자 중심의 공공시설을 건립코자 함

■ 2016년 공사 추진현황

❖ 2016년 공공건축물 건립추진사업【10개사업 , 총사업비 45,059백만원】

- 재원구성 : 국비974백만원, 시비18,724백만원, 구비25,361백만원

(단위 : 백만원)

연번	사업명	위 치	규 모	주요시설	공사기간	총사업비
1	양평2동 공공복합시설 (신축)	양평동4가 96	지하3층/ 지상4층 연면적 7,029.11㎡	주차장, 주민센터, 어린이집 등	'16. 11 ~ '18. 11	17,704
2	구의회 시설 일부 개·보수 (증축 및 리모델링)	당산동3가 3	지상 3층 내부 연면적 1,321㎡ (증축 38㎡)	의정연구실, 위원회사무실 등	'16. 7 ~ '16. 10	1,371
3	영등포 노인케어센터 (증축 및 리모델링)	문래동3가 76-2	지하1층/지상3층 3,052㎡ (증축 1,488㎡)	요양실, 프로그램실 등	'17. 1 ~ '18. 1	3,993
4	도림동 복합 어르신복지센터 (증축 및 리모델링)	도림동205-23 외 2필지	지상4층 650㎡ (증축 242㎡)	소규모 노인복지관, 노인정, 데이케어센터	'16. 5 ~ '17. 1	2,023
5	당산2동 제2어린이집 (신축)	당산동6가 110-43,44	지상 3층 연면적 309㎡	보육실, 교재교구실 등	'15. 12 ~ '16. 8	2,066
6	대림3동 제2어린이집 (신축)	대림3동 712	지하1층/ 지상3층 연면적 477㎡	보육실, 교재교구실 등	'16. 11 ~ '17. 6	2,833
7	신길1동 제2어린이집 (신축)	신길1동 117-25	지상 3층 연면적 286㎡	보육실, 교재교구실 등	'16. 10 ~ '17. 4	1,704
8	신길5동 제2어린이집 (신축)	신길5동 402-34	지상 3층 연면적 272㎡	보육실, 교재교구실 등	'16. 9 ~ '17. 3	1,552
9	도림동 배드민턴 전용 실내체육관 (신축)	도림동 254	지상3층 연면적 2,855㎡	배드민턴장	'17. 4 ~ '18. 4	6,429
10	별관청사 부속건물 (신축)	당산동3가 560	지하1층/ 지상5층 연면적 2,042㎡	사무실, 강당 등	'17. 3 ~ '18. 3	5,384

[양평2동 공공복합시설 (신축)]

□ 사업개요

- 대지위치 : 양평동4가 96 (1,804.6 m^2)
- 건립규모 : 지하3층/지상4층, 연면적 7,029.11 m^2
- 주요시설 : 주차장, 주민센터, 어린이집 등

□ 주요 추진실적 및 일정

- 2016. 06월 : 설계용역 준공
- 2016. 10월 : 계약심사 및 공사발주 예정
- 2016. 11월 : 공사착공 예정
- 2018. 11월 : 공사준공 예정(24개월)

□ 조감도 및 현장사진



조감도

현장사진

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
17,704,000 (사비 7,639,000, 구비 10,065,000)	582,800 (구비 582,800)	3.3

[구의회 시설 일부 개·보수(증축 및 리모델링)]

□ 사업개요

- 대지위치 : 당산동3가 3 (7,075 m^2)
- 건립규모 : 지상 3층 내부, 1,321 m^2 (증축 38 m^2)
- 주요시설 : 구의회 청사 (의정연구실, 위원회 사무실 등)

주요 추진실적 및 일정

- 2016. 5월 : 설계용역 완료
- 2016. 7월 : 공사착공
- 2016. 10월 : 공사준공 예정(4개월)

내부전경



소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,371,000 (구비 1,371,000)	233,648 (구비 233,648)	17

[영등포 노인케어센터 (증축 및 리모델링)]

사업개요

- 대지위치 : 문래동3가 76-2 (2,669 m^2)
- 기존건물 : 지하1층/지상3층, 연면적 3,052 m^2
(증축 : 지상 2~5층, 1,488 m^2 내외)
- 주요시설 : 노인케어센터 (요양실, 프로그램실 등)

주요 추진실적 및 일정

- 2016. 5월 : 설계용역 완료
- 2017. 1월 : 공사착공 예정
 - 도림북합어르신복지센터 공사완료 시점에 시설을 일부 이전후 착공예정
- 2018. 1월 : 공사준공 예정(12개월)

조감도 및 현장사진



소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
3,993,109 (국비 974,634, 시비974,634, 구비 2,043,841)	141,130 (구비 141,130)	3.5

(도림동 복합 어르신복지센터 (증축 및 리모델링))

사업개요

- 대지위치 : 도림동 205-23외 2필지 (378 m^2)
- 기존건물 : 지상4층 650 m^2
(증축 : 지상 4~6층, 242 m^2)
- 주요시설 : 소규모 노인복지관, 데이케어센터, 경로당

주요 추진실적 및 일정

- 2016. 3월 : 설계용역 완료
- 2016. 5월 : 공사착공
- 2017. 1월 : 공사준공 예정(8개월)

조감도 및 현장사진



□ **소요예산**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
2,023,986 (시비 2,000,000, 구비 23,986)	425,451 (시비 404,881, 구비 20,570)	21

[당산2동 제2어린이집 (신축)]

□ **사업개요**

- 대지위치 : 당산동6가 110-43,44 (195 m^2)
- 건립규모 : 지상 3층, 연면적 309.11 m^2
- 주요시설 : 보육실, 원장실, 교재교구실 등
- 시 공 사 : 흥익산업개발(주) 대표 정연용
- 감 리 자 : 모퉁이돌 건축사사무소 대표 구춘희

□ **주요 추진실적 및 일정**

- 2015. 12월 : 공사착공
- 2016. 08월 : 공사준공

□ **현장사진**



□ **소요예산**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
2,066,000 (시비 1,653,000, 구비 413,000)	2,066,000 (시비 1,653,000, 구비 413,000)	100

[대림3동 제2어린이집 (신축)]

□ 사업개요

- 대지위치 : 대림3동 712 (261.2 m^2)
- 건립규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 477.82 m^2
- 주요시설 : 보육실, 원장실, 교재교구실 등

□ 주요 추진실적 및 일정

- 2016. 2월 ~ 3월 : 설계공모(당선작 결정)
- 2016. 5월 ~ 10월 : 설계용역 착수 및 준공(5개월)
- 2016. 10월 : 기존건축물 철거 완료 예정
- 2016. 11월 : 공사착공 예정
- 2017. 6월 : 공사준공 예정(7개월)

□ 조감도 및 현장사진



조감도



현장사진

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,833,000 (사비 2,267,000, 구비 566,000)	1,516,000 (사비 1,516,000)	53.5

[신길1동 제2어린이집 (신축)]

□ 사업개요

- 대지위치 : 신길1동 117-25 (168 m^2)
- 건립규모 : 지상 3층, 연면적 286.71 m^2
- 주요시설 : 보육실, 원장실, 교재교구실 등

□ 주요 추진실적 및 일정

- 2016. 2월 ~ 3월 : 설계공모(당선작 결정)
- 2016. 4월 ~ 7월 : 설계용역 착수 및 준공 (3개월)
- 2016. 10월 : 공사착공
- 2017. 04월 : 공사준공 예정(6개월)

□ 조감도 및 현장사진



조감도



현장사진

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,704,000 (사비 1,448,000, 구비 256,000)	912,886 (사비 912,886)	53.6

[신길5동 제2어린이집 (신축)]

□ 사업개요

- 대지위치 : 신길5동 402-34 (165㎡)
- 건립규모 : 지상 3층, 연면적 272.58㎡
- 주요시설 : 보육실, 원장실, 교재교구실 등

□ 주요 추진실적 및 일정

- 2016. 2월 ~ 3월 : 설계공모 (당선작 결정)
- 2016. 4월 ~ 7월 : 설계용역 착수 및 준공 (3개월)
- 2016. 9월 : 공사착공
- 2017. 3월 : 공사준공 예정(6개월)

□ 조감도 및 현장사진



조감도



현장사진

소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,552,000 (사비 1,242,000, 구비 310,000)	790,383 (사비 790,383)	50.9

[도림동 배드민턴전용 실내체육관 (신축)]

사업개요

- 대지위치 : 도림동 254(복개면적 2,881 m^2)
- 건립규모 : 지상 3층, 연면적 2,855 m^2
- 주요시설 : 실내체육관(배드민턴장)

주요 추진실적 및 일정

- 2016. 4월 ~ 6월 : 설계공모 (6월 당선작 결정)
- 2016. 7월 ~ 12월 : 설계용역 착수 및 준공 (4개월)
- 2017. 4월 : 건축공사 착공 예정 (건축과)
 - 복개공사 완료시점에 건축공사 착공예정
- 2018. 4월 : 건축공사 준공 예정 (건축과) (12개월)

위치도 및 현장사진



위치도



현장사진

□ **소요예산**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
6,429,420 (사비 1,500,000, 구비 4,929,420)	75,291 (사비 75,291)	1.17

[별관청사 부속건물 (신축)]

□ **사업개요**

- 대지위치 : 당산동3가 560 (대지면적 8,730.5㎡)
- 건립규모 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,042.38㎡
- 주요시설 : 사무실, 강당 등

□ **주요 추진실적 및 일정**

- 2016. 6월 ~ 8월 : 설계공모(8월 당선작 결정)
- 2016. 9월 ~ 12월 : 설계용역 착수 및 준공(4개월)
- 2017. 3월 ~ 2018. 3월 : 공사착공 및 준공(12개월)

□ **위치도 및 현장사진**



□ **소요예산**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
5,384,000 (구비 5,384,000)	110,000 (구비 110,000)	2


Ⅲ . 중점사업 실적

1 청렴실천 나눔공사장 인증제

건축지원팀

건설공사장의 비리관행과 공사장 안전사고를 예방하고자 『청렴실천 나눔 공사장 인증제』를 도입하여 건설비리에 대한 일방적인 감시 적발에서 벗어나 건설사·공무원·주민이 소통하는 청렴문화를 조성하고자 함

□ 사업개요

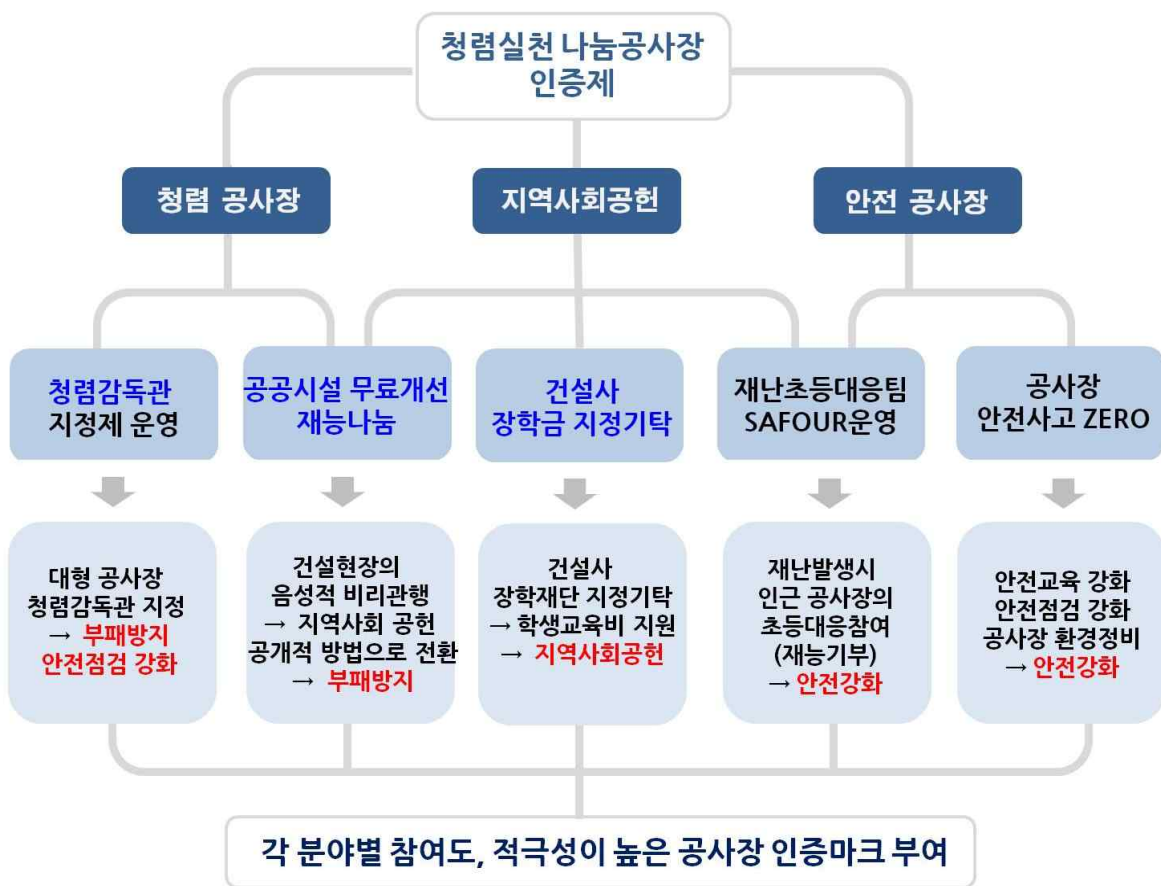

□ 주요 추진실적

- 2016. 9월 : 청렴감독관 관내 민간 대형공사장 안전점검 실시
청렴실천 나눔 인증공사장 5개 선정

□ 향후계획

- 2016. 10월 : 인증마크 배부 및 부착

□ 소요예산 : 비예산
