

제146회 영등포구의회
2009년도 제1차 정례회

'09. 7.1 ~ 7.14



2009년도

주요업무추진현황



공원녹지과

순 서

● 일반 현황 1

● 정책 목표와 방향 2

● 주요업무 추진실적 및 계획 3


I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직					기 능 직			
		5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급	10급
정 원	29	1	4	5	4	5	0	2	3	5
현 원	28	1	4	5	4	4		7	3	
과부족	-1					-1		5		-5

2 조 직

공원녹지과

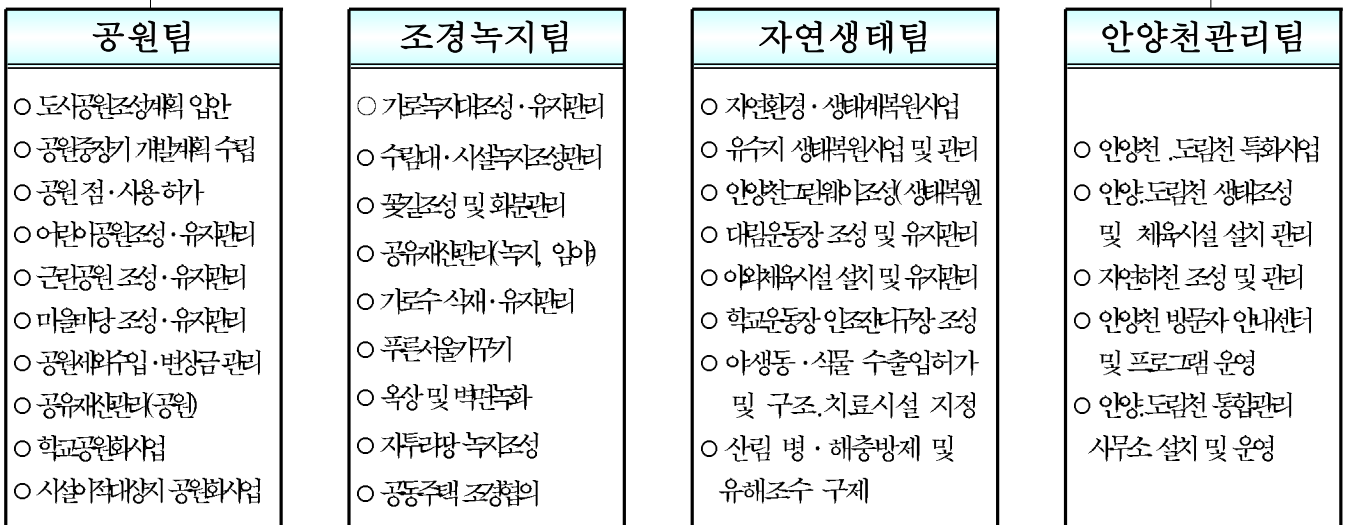

3

주요시설 및 장비

구분	도 시 공 원					마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근 린 공 원			어린이					
		계	구공원	시공원						
개소수	28	10	6	4	18	26	104	54개 노선	2종	14개소
면 적 (㎡)	1,141,009.8	543,463.9	135,517.9	407.946	54,082.9	18,059.4	488,814	15,976 주	2주	16종 158점

4


예 산 현 황

예 산 현 황

(단위:천원)

단위사업명	예 산 액	집행액	집행율(%)
계	7,674,998	6,594,179	85.9
공원녹지 관리 수준향상	2,741,306	2,467,175	90
아름다운환경 및 편리한세상 만들기	2,649,288	2,357,866	89
안양 .도림천 특화	713,265	606,275	60
푸른공간늘리기	506,000	506,000	100
행정운영경비	1,065,139	656,863	61

II. 정책목표와 방향



III 주요업무 추진실적

푸른공간 늘리기

1 신길근린공원 시설개선공사 (구비)

□ 사업개요

- 현 황 : 시설이 노후되고 경사면의 토사유실 및 나대지로 노출되어 있는 신길공원을 시설개선, 수목재배치등을 통하여 구민이 즐겨찾는 쾌적한 공원으로 조성
- 위 치 : 신길동 341-3일대
- 사업내용
 - 자연학습장 1개소
 - 철쭉동산 조성
 - 팔각정 1개소
 - 황토 경화포장 231㎡
- 면 적 : 19,782㎡
- 사업기간 : 2009.1~2009.6
- 사업비 : 638백만원

□ 추진실적

- 2009.1.16~3.7 : 기본 및 실시설계
- 2009.4.8 : 공사착공

□ 향후 추진계획

- 2009.6.30 : 공사 준공



2 공원시설물 정비(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 원지어린이공원 외 14개소
- 사업내용
 - 게이트볼장 조성 1개소
 - 의자39개소, 파고라보수
 - 운동시설추가 설치
- 사업기간 : 2009. 2월 ~ 2009. 4.30.
- 사업예산 : 174,826천원(구비)

□ 추진실적

- 2009. 1. 9 ~ 2. 6. : 실시설계 용역
- 2009. 3. 2 ~ 4.30. : 어린이공원 및 마을마당 시설물 정비공사
- 2009. 1월 ~ 6월 : 공원 시설물 점검 및 안전검사 실시

□ 향후 추진계획

- 2009. 7월 : 하반기 공원시설물 정비공사 실시설계
- 2009. 9월~10월 : 하반기 공원시설물 정비공사 진행



3 공원내 가지치기 및 식재(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 문래공원 외 3개소
- 정비내용
 - 가지치기 : 문래공원 외 3개소 버즘나무 112주
 - 식 재 : 문래공원 경노당 주변 낙상홍 외 5종 820주, 잔디300㎡
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 2009. 2월
- 사업예산 : 38,140천원(구비)
- 공사완료 : 09. 2. 25

□ 추진실적

- 2009. 1월 : 가지치기 물량 조사 및 공사발주
- 2009. 2월 : 가지치기 준공 및 식재 공사 발주



4 문래동 차 없는 거리조성(구비)

□ 사업개요

- 현 황 : 공원과 학교사이 도로를 차 없는 거리로 조성하여 녹지 확충 및 안전 통학 길 확보
- 위 치 : 서울시 영등포구 문래동 6가 25-1(영문초등학교 앞)
- 규 모 : 696㎡(연장 87m/폭8m)
- 사업기간 : 2009. 06.8~07.18
- 소요예산 : 300백만원
- 주요공정 :감나무 등 9종 57주/ 시계탑1,안내판1/ 의자 등

□ 추진실적

- 2008.12.16 : 서울지방경찰청 교통심의 규제심의 승인
- 2009.04.03 : 주민설명회 개최
- 2009.06.08 : 착공

□ 향후 추진계획

- 2009.07.18 : 준공 예정



5 문화인도교 주변 녹지량확충 사업(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 23-3일대
- 규 모 : 5,300 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 산책로, 정자설치 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10
- 공사기간 : 2008. 12. 23 ~ 2009. 6. 30
- 공 사 비 : 376백만원

□ 추진실적 : 완료(09. 6. 20)

6 여의동서로 주변 녹지량 확충사업(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의동로, 여의서로 일대
- 규 모 : 10,000 m^2 (L3.4km), 화목류 식재, 나대지 및 호안녹화 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10
- 공사기간 : 2009. 1. 5 ~ 7. 4
- 공 사 비 : 619백만원

□ 추진실적 : 완료(09. 6. 20)



7 가로수 유지관리사업

[가로수 가지치기]

□ 사업내용

- 위 치 : 양평로, 성원마을길~당중길, 도림천로, 선유로, 양산로, 강나리길~삼천리길, 요람길~화합길, 영등포역고가로, 은행길, 중마루길, 문래로, 대방천가로녹지, 복음길
- 규 모 : 버즘나무 546주 전지
- 공사기간 : 2009. 02. 10 ~ 03. 24
- 공사준공 : 2009. 03. 24
- 공 사 비 : 86백만원 (구비 100%)

□ 추진실적 : 완료(09. 3. 24)



[가로수 수종갱신]

□ 사업내용

- 위 치 : 대방천길, 가마산길
- 규 모 : 버즘나무 119주 제거, 왕벚나무 125주, 은행나무 15주 식재
- 실시설계 : 2009. 02. 03 ~ 03. 19
- 공사기간 : 2009. 04. 24 ~ 06. 03
- 공사준공 : 2009. 06. 03
- 공 사 비 : 174백만원 (구비 100%)

□ 추진실적 : 완료(09. 6. 3)



8 대방로광장 친수공간 조성공사(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 4,302번지
- 규 모 : 340 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 포장, 수경시설, 파고라 등
- 디자인심의 및 실시설계 : 2008. 5 ~ 11
- 공사기간 : 2008. 11. 17 ~ 2009. 5. 16
- 공 사 비 : 486백만원

□ 추진실적 : 완료(09. 5. 16)



9 경부제3녹지 보상사업(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3일 일대
- 규 모 : 7,912 m^2 (국공유지 3,780 m^2 , 사유지 4,132 m^2)
(국공유지 19필지, 사유지 28필지, 건물 25동, 영업권 49건)
- 실시계획인가 : 2007. 11. 9(영등포구고시제2007-68호)
- 감정평가 : 2008. 6. 17
- 보상협의를 : 2008. 8 ~ 2009. 6
- 실시계획변경인가 : 2008. 10~28(영등포구고시제2008-62호)
- 보상실적 : 토지13필지, 건물 25동, 영업권 48건
- 보상비 : 9,147백만원 ※ 공정율 45%
- 향후계획 : 연차별 보상 추진

10 성산대교밑 청소차고지내 녹지량 확충사업(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동 성산대교밑 청소차고지
- 규 모 : 7,000 m^2 , 조경시설(화단,수목식재), 포장, 정자설치 등
- 실시설계 : 2009. 2 ~ 3
- 공사기간 : 2009. 4. 28 ~ 6. 20
- 공 사 비 : 790백만원

□ 추진실적 : 완료(09. 6. 20)

11 대방천 가로녹지 환경개선 사업(시비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 도림동 대방천 가로녹지
- 규 모 : 4,200 m^2 , 수목식재, 산책로조성, 정자, 체육시설 설치 등
- 실시설계 : 2008. 9 ~ 10(1차), 2009.1~3(2차)
- 공사기간 : 2008. 12 ~ 2009. 6. 20
- 공 사 비 : 1,396백만원('08 : 819, '09 : 577)

□ 추진실적 : 완료(09. 6. 20)

12 꽃담마을마당 토지보상(구비)

□ 사업개요

- 현 황 : 2005년 기 녹지조성된 꽃담 마을마당 (전 당산2공원)의 잔여 토지보상금 지급을 완료하여 행정의 신뢰성 확보
- 위 치 : 당산동5가 4-23일대
- 면 적 : 2,582.3 m^2
- 지급대상자 : (주)효성
- 보 상 기 간 : 2005. 6.15~2009.4.27
- 총 보상비 : 7,400백만원

※ 연도별 추진실적

- 2005.6.15 : 1차분 지급(2,388백만원)
- 2006.2.1 : 2차분 지급(1,500백만원)
- 2007.4.13 : 3차분 지급(700백만원)
- 2009.2.17 : 4차분 지급(500백만원)
- 2009.2.27 : 5차분 지급(500백만원)
- 2009.4.27 : 6차분 지급(1,812백만원) ※ 보상완료



13 생활권주변 자투리땅 녹화사업(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림제1동 주민센터 등 4개소
- 규 모 : 녹지조성 2,222㎡
- 실시설계 : 2009. 02. 06 ~ 03. 06
- 공사기간 : 2009. 03. 23 ~ 04. 30
- 공 사 비 : 186백만원 (구비 100%)

□ 추진실적 : 완료(09. 4. 30)

대림제1동 주민센터(공사전)	대림제1동 주민센터(공사후)	문래동3가 54-2(공사후)
		

14 안양천 그린웨이 조성사업(시비)

□ 사업내용

- 위 치 : 영등포구 안양천 제방사면(오목교~신정교)
- 양평동, 문래동
- 규 모 : 안양천 범면녹화 약0.8km(9,966㎡)
- 실시설계 : 2008. 4. 21 ~ 11. 30
- 공사기간 : 2008. 12. 26 ~ 2009. 6. 24
- 공사준공 : 2009. 6. 24
- 공 사 비 : 1,653백만원 (시비 100%)

□ 추진실적 : 완료(09. 6. 24)



15 대림운동장 인조잔디구장 조성 및 정비(구, 시, 국비)

□ 사업개요

- 위 치 : 대림3동 780번지(대림운동장)
- 도시계획 : 주차장, 체육시설(지목 : 체육용지)
- 규 모 : 면적 16,498 m^2
- 사업내역
 - 인조잔디구장
 - 축구장 1면 5,208 m^2 (T60), 게이트볼장 1면 601 m^2 (T20)
 - 우레탄구장
 - 족구장 1면 729 m^2 (T12), 농구장 1면 476 m^2 (T12)
 - 산책로조성 : 고무칩포장 777 m^2 (T13), 점토브릭포장 1,210 m^2
 - 어린이놀이터 : 고무매트포장 139 m^2 (T50)
 - 관리사무실(화장실) 1동 161 m^2
- 설계용역 : 2006. 11. 6 ~ 2007. 11. 10
- 공사기간 : 2007. 12. 15 ~ 2009. 2. 20
- 공 사 비 : 1,135백만원(구비200, 시비150, 국비 785)
(구비 18%, 시비 13%, 국비 69%)

□ 추진실적

- 2009.2.20공사준공



16 2009 마을단위 체육시설 설치(구비)

□ 사업내용

- 위 치 : 영등포구 도림동 263번지(도림게이트볼장) 외 1개소
- 대림운동장(대림3동 780번지)
- 규 모 : 415 m^2
- 실시설계 : 2008. 4. 21 ~ 11. 30
- 공사기간 : 2009. 2. 9 ~ 4. 9
- 주요사업내용
 - 시 설 물 : 보강토 블록(옹벽) 85 m^2 , 메쉬헨스 20경간 라인벨트 25m, 막구조파고라(16×4)
 - 포장공사 : 마사토 포장 150 m^2
- 공사준공 : 2009. 4. 9
- 공 사 비 : 69백만원

□ 추진실적 : 완료(09. 4. 9)



IV 주요업무 추진계획

아름다운 환경 및 편리한 시설만들기

1 대림운동장 녹지대 정비사업(구비/추경)

다목적운동장으로 재탄생한 대림운동장에 식재보완을 통한 녹지율 향상 및 체육시설을 정비하여 지역주민의 건전한 여가선용은 물론 생활체육을 통한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업목표

- 녹지량 확충 및 체육인구 저변 확대
- 생활주변 체육시설 증대 및 여가활동을 통한 주민화합 실현

□ 추진방향

- 생활체육을 통한 삶의 질 향상에 기여
- 식재보완 및 체육시설 개선으로 시민 봉사행정 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림3동 780번지(대림운동장)
- 면 적 : 약1,200㎡
- 사업기간 : 2009. 4 ~ 8월
- 총사업비 : 120백만원(구비)
- 주요사업내용
 - 식재기반공사 : 853㎡, 시설물공사 - 등외자 외 20종
 - 포 장 공 사 : 고무칩탄성포장 100㎡

□ 세부 추진계획

- 2009.04.22 ~ 5. 6 : 실시설계용역 계약/준공
- 2009.05.12 : 시설공사 발주
- 2009.05.25 공사착공 및 준공 ※ 공정율 20



2 관악고등학교 인조잔디구장 조성사업(구비,국비)

학교운동장에 인조잔디구장 및 주변체육시설을 정비하여 청소년의
인성발달과 지역주민의 건전한 여가선용은 물론 생활체육을 통한 삶
의 질 향상에 기여

□ 사업목표

- 학교운동장내 인조잔디구장 조성 및 육상트랙 등 체육시설 정비
- 지역주민의 체육활동공간 활용으로 지역사회 체육발전에 기여

□ 추진방향

- 학교운동장 정비로 청소년의 정서순화 및 교육여건개선
- 학교 환경개선 및 시민 봉사행정 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동2가 24번지 외 3필지
- 면 적 : 약9,000 m^2 (학교면적:16,858 m^2)
- 도시계획 : 도시지역, 준공업지역, 학교(지목 : 학교용지)
- 사업기간 : 2009. 6월 ~ 11월
- 총사업비 : 910백만원 (구비, 국비)
- 주요사업내용
 - 인조잔디운동장 6,000 m^2 , 기반조성(토공 및 배수공) 9,000 m^2
 - 육상트랙, 농구장, 배구장, 조명시설 등 학교체육시설 정비

□ 세부 추진계획

- 2009.06.11 ~ 2009.07.10 : 실시설계용역 계약/준공
- 2009.07.10 : 시설공사 발주
- 2009.07.27 : 시설공사 계약/적격심사
- 2009.08 ~ 11 : 공사착공 및 준공



3 양평 제1유수지 생태습지 조성공사(시비)

생태공원으로 조성한 양평 제1유수지내 수생식물을 보완식재하고 지속적인 관리를 통하여 사람과 자연이 어우러지는 아름다운 생태공원으로 조성하고자 함.

□ 사업목표

- 기존 식생의 다양화를 통한 수질정화와 다양한 습지식물을 보완 식재하여 청소년의 자연학습공간으로 활용하고 지역주민이 공유할 수 있는 시설조성

□ 추진방향

- 유수지에 지피류 등 수질정화 식물을 식재하여 생태복원 및 수질오염 예방
- 다양한 식생으로 생태습지 및 청소년들의 자연학습장 제공
- 유수지 주변 환경개선 및 녹지량 확충에 대한 욕구 충족

□ 사업개요

- 위치 : 영등포구 양평동 3가 57번지 일대(양평 제1유수지)
- 면적 : 30,200 m^2
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 10월
- 총사업비 : 420백만원(시비)
- 주요사업내용
 - 식재공사 : 덩굴장미 외 3종 1,943주
 - 교목 : 메타세콰이아 51주, 관목 : 줄사철 외 2종 1,892주
 - 식생매트 : 바늘꽃 외 1종 573 m^2 , 잔디 : 1,650 m^2
 - 시설물 : 데크로드 110m, 태양광 등 외 8종
 - 지하수 관로공사 - 지하수 심정 1식, STS강관부설 160m

□ 세부 추진계획

- 2009. 1 ~ 3 : 실시설계 용역 발주 및 시행
- 2009. 4 ~ 10 : 공사시행 및 준공 ※ 공정율 10%



4 상상어린이공원 조성공사(시비, 구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영일공원(영등포동 647-3)
- 면 적 : 5,413.3 m^2
- 사업기간 : 2008. 11월 ~ 2009. 6.11.
- 사업예산 : 1,010천원(시비, 구비)

□ 추진실적

- 2008. 11월~2009.01.15 실시설계 및 공원조성(변경) 심의(서울시)
- 2009. 2월 영일어린이공원 공사 발주
- 2009. 3. 3 ~ 6.11. : 공사진행
- 영일공원 조성내용 : 소나무 외 12종 14,570주, 잔디식재,
콩나물놀이대 외 20종, 포장 및 우배수 등

□ 향후 추진계획

- 2009. 6월 25일 : 준공행사



5 **공원녹지 확충을 위한 기본계획 수립 학술용역(구비)**

□ **사업개요**

- 현 황 : 영등포구 『녹색벨트 조성 및 공원녹지 중·장기 발전을 위한』 기본계획을 수립하고 공원·녹지 확충사업을 체계적으로 추진코자 함
- 대 상 : 영등포구 전지역(24.56 km^2)
- 용역기간 : 2009. 3.2. ~ 11.27
- 사업예산 : 118백만원

□ **추진실적**

- 2009.03.02: 학술용역 계약
- 2009.03.19: 학술용역 착수보고회

※ 주요사항

- 영등포구 녹지축 조성 및 공원녹지 중·장기 발전을 위한 기본구상 설정
- 기존 공원녹지의 현황분석을 통한 체계적인 녹지축의 연결과 생물서식 공간 확충방안 제시
- 영등포구 도시 관리계획 및 도시개발계획과 연계한 녹지축 조성 방안 제시
- 안양천 도림천의 보존 및 개발(이용)방안 제시
- 가로수 관리 및 녹지 등의 체계적인 방향 설정 제시

□ **향후 추진계획**

- 2009.08: 중간보고
- 2009.10: 최종보고
- 2009.11.27: 준공

6 **공원 내 우리 꽃 · 농작물 전시(구비)**

사업개요

- 현 황 : 공원에 농작물, 우리 꽃, 허브 등을 전시하여 볼거리를 제공하여 공원수준 향상
- 위 치 : 당산공원, 문래공원
- 전시품목 : 도라지, 두메부추, 수국 등 30종
- 소요예산 : 58백만원(집행예산: 33백만원)

추진실적

- 2009.05.14: 화분구매
- 2009.06.05: 식물구매 전시(당산공원)
- 2009.06.15: 식물구매 전시(문래공원)

향후 추진계획

- 2009.08 : 목화 식재 및 식물교체 전시 등

7 영등포역 동부광장 외 1개소 정비사업(구비추경)

영등포역 동부광장의 노점 및 무질서한 물건적치 등으로 보행불편 및 환경저해 요인이 되고 있어 녹지조성으로 불량환경을 개선하고, 도림천 주변 녹화로 쾌적한 생태하천 및 주거환경 조성에 기여

□ **사업목표** : 불량한 환경 정비와 녹지량확충으로 주거환경 개선

□ **추진방향**

- 화단 조성으로 노점 및 물건적치 예방
- 주변 경관과 어울리는 조경기법 도입 쾌적한 가로경관 조성

□ **사업개요**

- 위 치 : 영등포구 영등포역 동부광장, 도림2동 도림천변(쌍용플래티늄앞)
- 규 모 : 840 m^2 (동부광장 200 m^2 , 도림천주변 640 m^2)
- 사업기간 : 2009. 4 ~ 9
- 사업내용 : 플랜터 조성, 수목(소나무, 화관목, 지피류) 식재, 체육시설 등
- 총사업비 : 250백만원 (구비-추경)

□ **추진실적**

- 2009. 4. 22 ~ 2009. 5. 30: 실시설계용역

□ **세부 추진계획**

- 2009. 6 : 공사발주
- 2009. 9 : 공사준공



8 안양천 그린웨이 2차 조경사업(시비)

환삼덩굴 등 하천경관을 저해하고 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 하천제방 비탈면을 다양한 화목류와 초종이 생육할 수 있는 생태환경 복원사업을 시행하여 사람과 자연이 어우러지는 생태하천으로 조성

□ 사업목표

- 양화교~양평교 구간의 안양천 제방비탈면을 녹화
- 하천제방 환경개선 및 녹지량 확충으로 계절별 꽃이피는 하천경관 조성

□ 추진방향

- 다양한 식생으로 하천생태계 보전 및 청소년들의 자연학습장 제공
- 안양천 주변 환경개선 및 휴식시설 설치 등 시민 봉사행정 실현

□ 사업개요

- 위치 : 영등포구 안양천 우안(양화교 ~ 양평교) 제방사면
- 면적 : $8,933m^2$ ($L=0.6km$)
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 11월
- 총사업비 : 1,460백만원 (시비)
- 주요사업내용
 - 식재기반조성 : $7,891m^2$, 시설물 : 진입계단, 휴게데크 설치 등
 - 포 장 공 사 : 산책로조성(탄성포장 $1,042m^2$)
 - 식 재 공 사 : 식생매트(물억새 외 3종), 수목 : 산철쭉 외 2종
 - 관 로 공 사 : U형측구 490M, 유공관 1,046M 등

□ 세부 추진계획

- 2009. 1 ~ 2 : 기술용역심의, 실시설계 용역 발주 및 시행
- 2009. 3 ~ 6 : 자문회의, 설계심의 및 기술심의, 계약심사
- 2009. 7 ~ 11 : 공사시행 및 준공

