


제172회 영등포구의의회

제 2 차 정 려 회

교육·복지·사람 중심 새 영등포 

2012년 주요업무 보고



도 로 과


보고 순서

I. 일반 현황	•••	1
II. 2012 주요업무 실적	•••	4
III. 2013 주요업무 계획	•••	25
IV. 특수 사업	•••	40

I. 일반 현황

1

조직

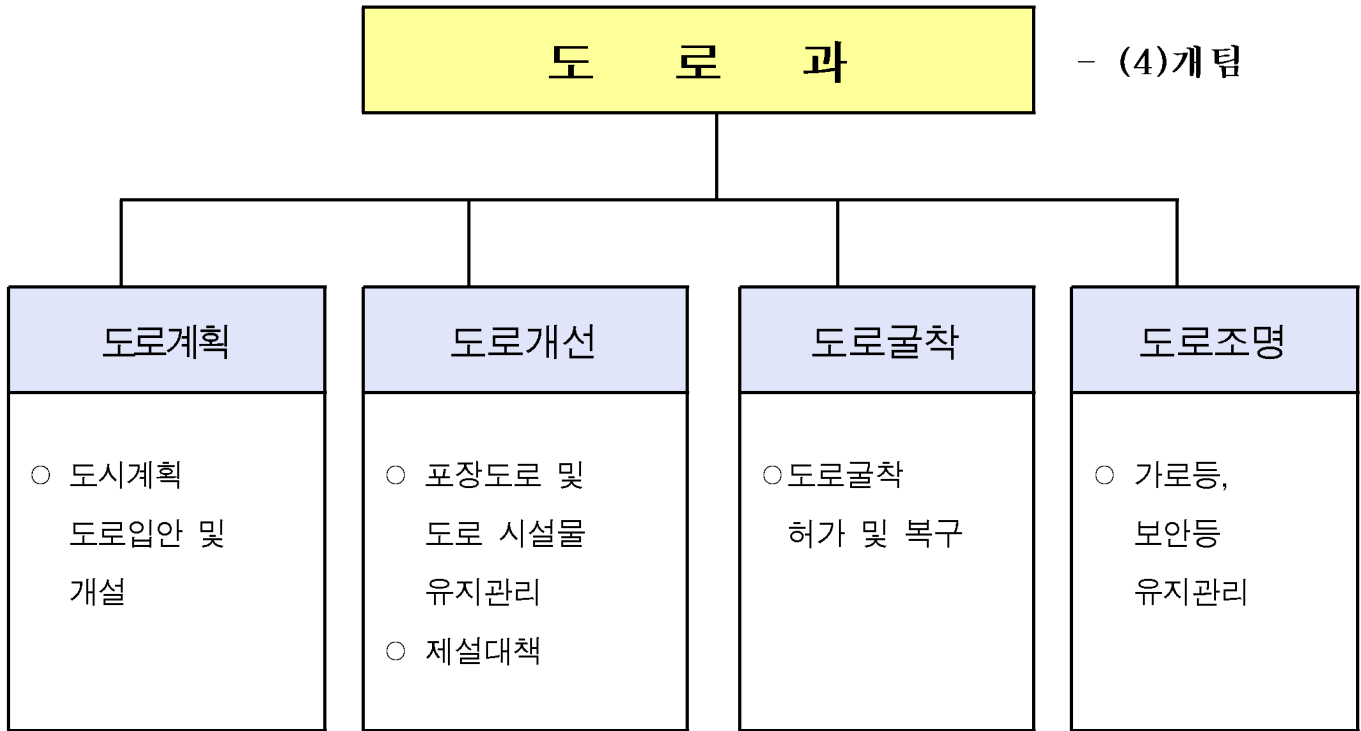

2

인력

구 분	계	일 반 직						기 능 직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	-	1	4	5	6	3	1	5	5	2
현 원	31	-	1	6	3	6	3	1	6	5	-
과부족	△1	-	-	2	△2	-	-	-	1	-	△2

3

주요시설 및 장비

□ 도로

- 주요간선도로 : 경인로 외 27개 노선
- 도로현황

연장 387.502km		도로율
시도 76.02km	구도 311.482km	23.33% (서울시 : 22.06%)

□ 교량 및 고가차도

교량(14개소)	고가차도(6개소)
양화교, 신정교, 양평교 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교	선유, 도림천, 영등포역, 보라매 도림, 신길

□ 지하차도 및 지하보도

지하차도(12개소)	지하보도(1개소)
국회앞, 여의2교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측, 노들길(서울교북단), 서울교 접속 지하차도, 영등포, 대방, 신길, 여의교	여의초교 앞

□ 보도육교 및 입체교차로

보도육교(6개소)	입체교차로(5개소)
우신초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포 수원지, 영등포역 횡단보도육교	영등포R, 여의하류, 여의상류 목동교 동측 IC, 염창 IC

□ 조명시설

가 로 등	보 안 등
8,620등	10,095등

4

예산 집행현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
계	15,222,318	9,252,085	60.7
도로개설 및 확장	6,734,549	4,158,500	61.7
도로개설지원	15,720	8,273	52.6
도로정비	3,807,342	2,756,071	72.3
도로관리	1,160,123	150,760	12.9
도로조명 시설정비	842,355	307,424	36.5
도로조명관리	1,801,914	1,207,350	67
인력운영비	484,052	325,036	67.1
기본경비	168,862	131,270	77.7
보전지출	207,401	207,401	100%

II. 2012 주요업무 실적

연 번	사 업 명	쪽
①	도림로 확장공사	5
②	대방천변 도로개설공사	7
③	대림동 812-12번지 도로개설공사	9
④	문래자이아파트주변 탄성포장공사	10
⑤	당산3가 81번지 주변 도로정비공사	11
⑥	신길동 233번지 주변 도로정비공사	12
⑦	도신로 17길 도로정비공사	13
⑧	양평동4가 주변 도로정비공사	14
⑨	신길5동 448-3번지 주변 도로정비공사	15
⑩	윤중중학교 앞 셋강길 보도폭 확장공사	16
⑪	도로포장 수준 향상으로 주민생활 환경개선	17
⑫	안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 및 장애인 편의시설 설치	18
⑬	금연보도판 설치로 연기 없는 행복한 거리조성	19
⑭	도로굴착복구 효율적 추진	20
⑮	노후 조명시설 연차적 개선추진	21
⑯	골목길 밝은 거리 조명환경 조성	22
⑰	주민이 참여하는 보안등 야간순찰	23
⑱	관내 LED보안등 설치	24

신길재정비촉진지구 활성화로 지역균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

- 추진기간 : 2009년 ~ 2014년(장기집행계속사업)
- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→ 35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - ┌ 특별회계 : 우측 L= 500m(금회공사구간)
 - └ 일반회계 : 좌측 L= 800m
- 총사업비 : 44,550백만원(보상비 39,700 공사비 4,700 설계비 150)
 - ┌ 특별회계 : 15,350(보상비 13,700 공사비 1,500 설계비 150)
 - └ 일반회계 : 29,200(보상비 26,000 공사비 3,200)
- 2012년 사업비 : 3,609백만원(본예산 + 2011년 이월예산)

□ 추진실적

- 1997~1999 : 일부구간 확장완료(도림고가남단~도림사거리 L=350m)
- 2009.3월~2010.2월 : 실시계획인가(일반회계 L=433m)-보상완료
- 2010. 3월~12월 : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2010. 5.27 : 실시계획인가(특별회계 L=220m)-보상완료
- 2011. 2.17 : 실시계획인가(일반회계 L=50m)-보상완료
- 2011. 3.17 : 실시계획인가(특별회계 L=280m)-보상완료
- 2012. 6. 8 : 공사발주
- 2012. 6.28 : 공사계약
- 2012. 7월~9월 : 지장물 이설관련 유관기관 협의 및
사업구간 내 교통신호기, 가로등 이설사업 발주
- 2012.10월~12월 : 사업구간 내 한전주 이설 및 기존가로수 제거

□ 향후 추진계획

- 2013. 4.27 : 공사 준공 예정(1차 구간 L=202m)
- 2014. 4.27 : 공사 준공 예정(2차 구간 L=298m)

□ 2012년도 예산집행 현황(시비)

(단위 : 백만원)

구 분	예산	집행액	집행잔액	집행내역	
합 계	3,609	3,001	605		
특별회계	소 계	3,509	2,904	605	
	보상비 (이월예산)	2,849	2,799	50	특별회계(L=280m)구간 중 2011년 미협의를 된 토지7필지 337㎡, 물건4건, 영업권1건 보상
	공사비 (본예산)	660	105	555	선금 지급
일반회계	보상비 (본예산)	100	97	3	일반회계구간(L=50m) 중 예산부족으로 보상비완료 되지 않은 토지 보상비 지급

□ 위 치 도



2 대방천변 도로개설공사

장기미집행 도시계획시설(도로)사업 시행으로 민원해소 및 주택가 통행 불편해소

□ 사업개요

- 추진기간 : 1998년 ~ 2012년(장기집행계속사업)
- 위 치 : 신길동 381-9 ~ 455-19간
- 규 모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - ┌ 기개설 : 660m(1998년 ~ 2001년)
 - └ 미개설 : 420m
- 총사업비 : 13,250백만원(보상비 10,593 공사비 2,607 설계비 50)
- 2012년 사업비 : 2,669백만원(2011년 이월예산)

□ 추진실적

- 2009. 1월~5월 : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2010.11월 : 1차 구간 보상완료
- 2011. 2.22 : 공사발주(장기계속공사)
- 2012. 2. 2 : 1차 구간 준공(L=292m)
- 2012. 4. 2 : 2차 구간 발주(L=128m)
- 2012. 6.15 : 2차 구간 보상완료
- 2012.10월 현재 : 2차 구간 공사시행

□ 2012년도 예산집행 현황(시비)


(단위 : 백만원)

구 분	예산	집행액	집행잔액	집행내역
합 계	2,669	1,082	1,587	
보상비 (이월예산)	1,077	766	311	2차구간 중 예산부족으로 2011년 보상완료 되지 않은 토지 1필지 245㎡, 물건 2건 보상
공사비 (이월예산)	1,592	316	1,276	1차구간 준공금(207백만원) 2차구간 선 금(100백만원) 2차구간 폐기물기성(9백만원)

□ 향후 추진계획

- 2012.12.17 : 2차 구간 준공 예정

□ 위치도

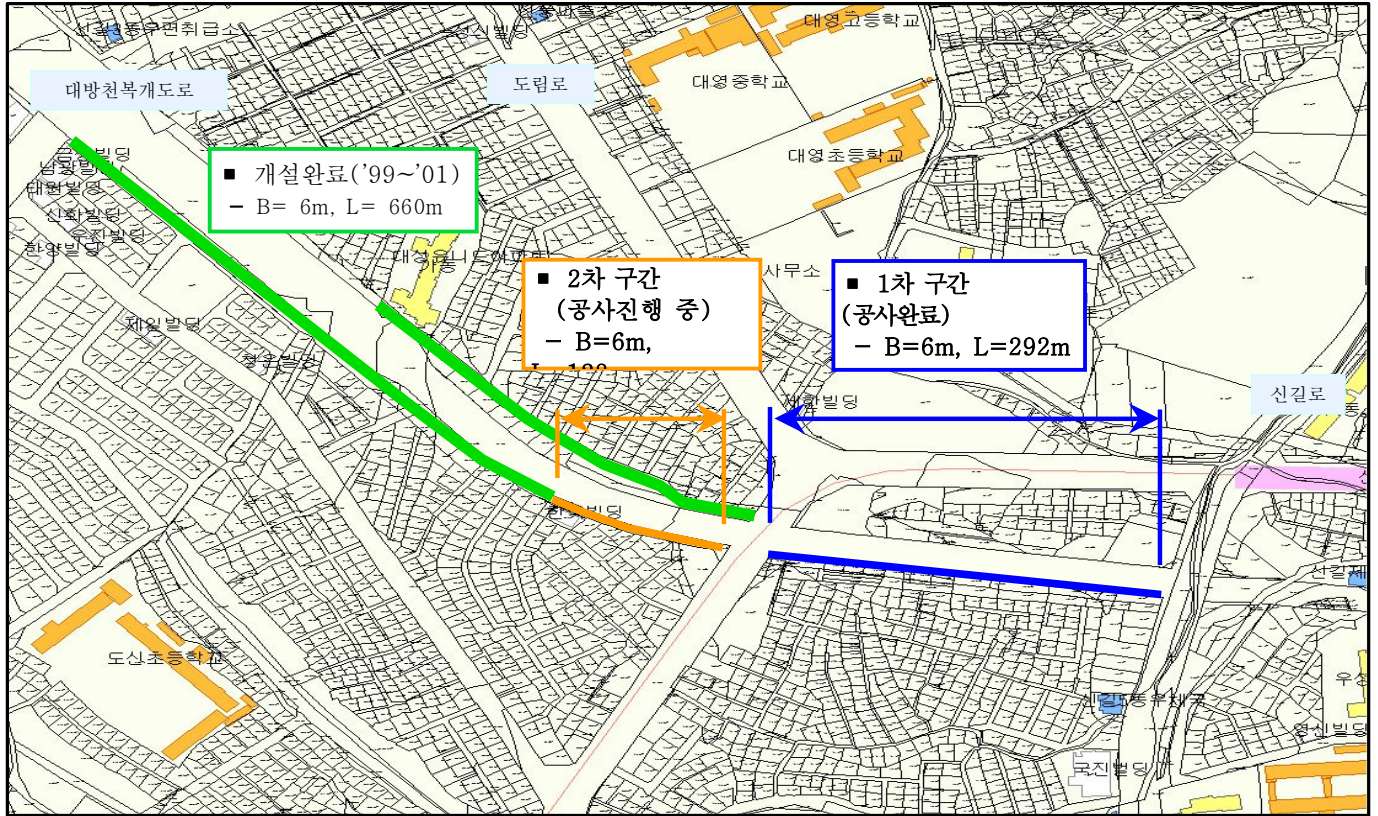

3 대림동 812-12번지 도로개설공사

□ 사업개요

- 추진기간 : 2012년 ~ 2013년
- 위 치 : 대림동 812-12번지
- 규 모 : 도로개설 B=6m, L=14m
- 총사업비 : 742,000천원(보상비 672 공사비 70)
- 2012년 사업비 : 100,000천원

□ 추진실적

- 2012. 6.21 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가고시
- 2012. 9.20 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가고시

□ 향후 추진계획


- 2012. 11월~12월 : 보상시행

□ 예산현황(구비)

(단위 : 백만원)

구 분	예산	집행액	집행잔액	집행내역
합 계	100	6	94	
보상비 (본예산)	100	6	94	측량비

□ 위치도

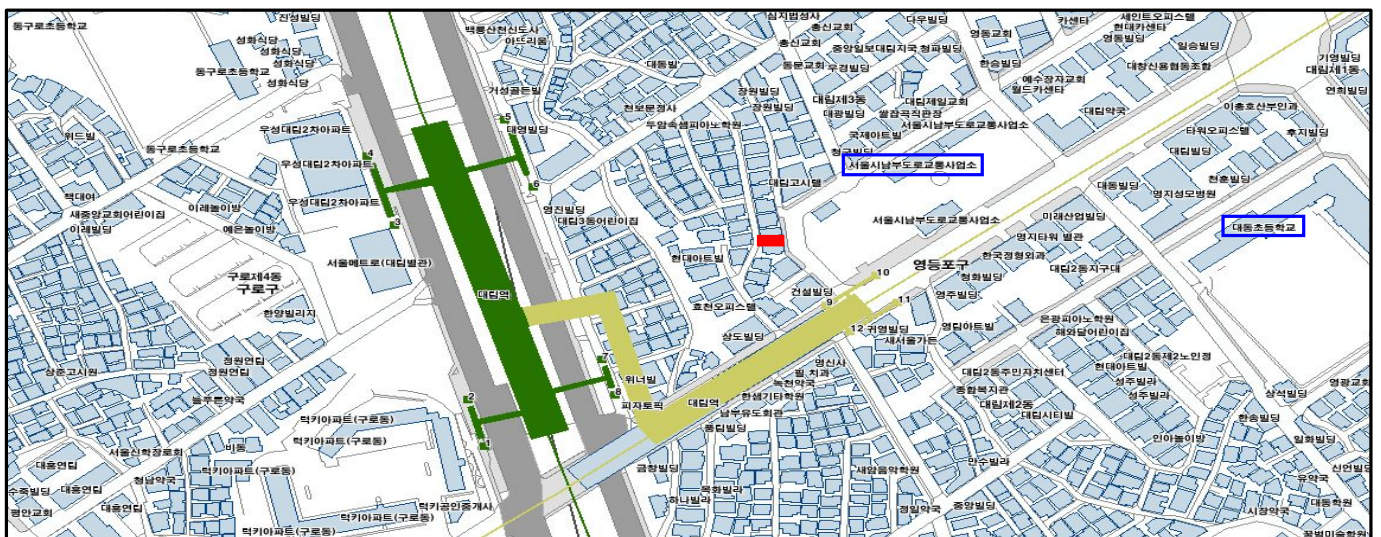

4

문래자이아파트 주변 탄성 포장공사

□ 사업개요

- 추진기간 : 3월 ~ 9. 15(6개월)
- 위 치 : 문래동 3가 54
- 규 모 : 탄성포장 B=2~3m L=1,060m


□ 추진실적

- 2012. 4. 19 : 계약 및 공사착공
- 2012. 5. 08 : 공사 시행에 따른 사전 주민설명회 개최
- 2012. 6. 12 : 탄성포장
- 2012. 9. 10 : 공사준공

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 302,700천원
- 집행액 : 221,814천원

□ 위 치 도

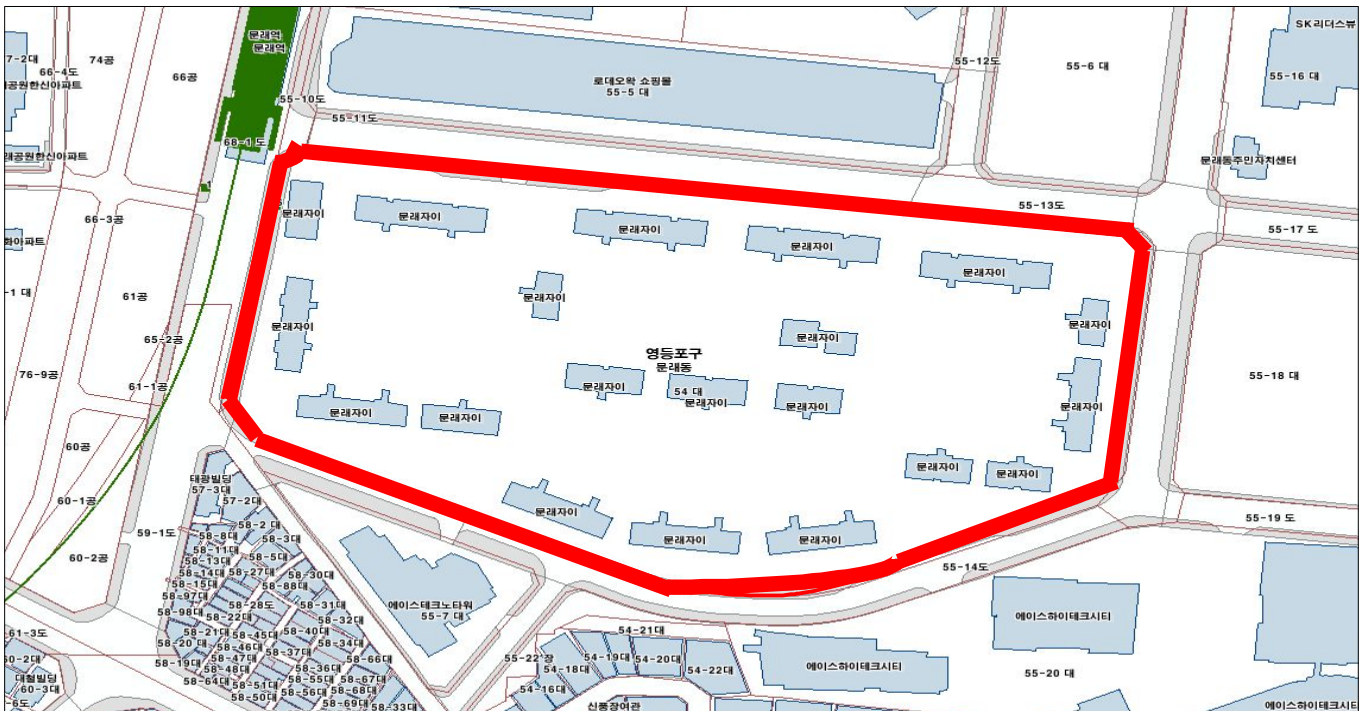

□ 사업개요

- 추진기간 : 3월 ~ 6. 30(4개월)
- 위 치 : 당산동 3가 81-14~5-1
- 규 모 : 아스콘 정비 B=9m L=250m


□ 추진실적

- 2012. 3. 20 : 계약 및 공사착공
- 2012. 4. 29 : 아스팔트포장
- 2012. 6. 27 : 공사준공

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 151,000천원
- 집행액 : 131,485천원

□ 위치도

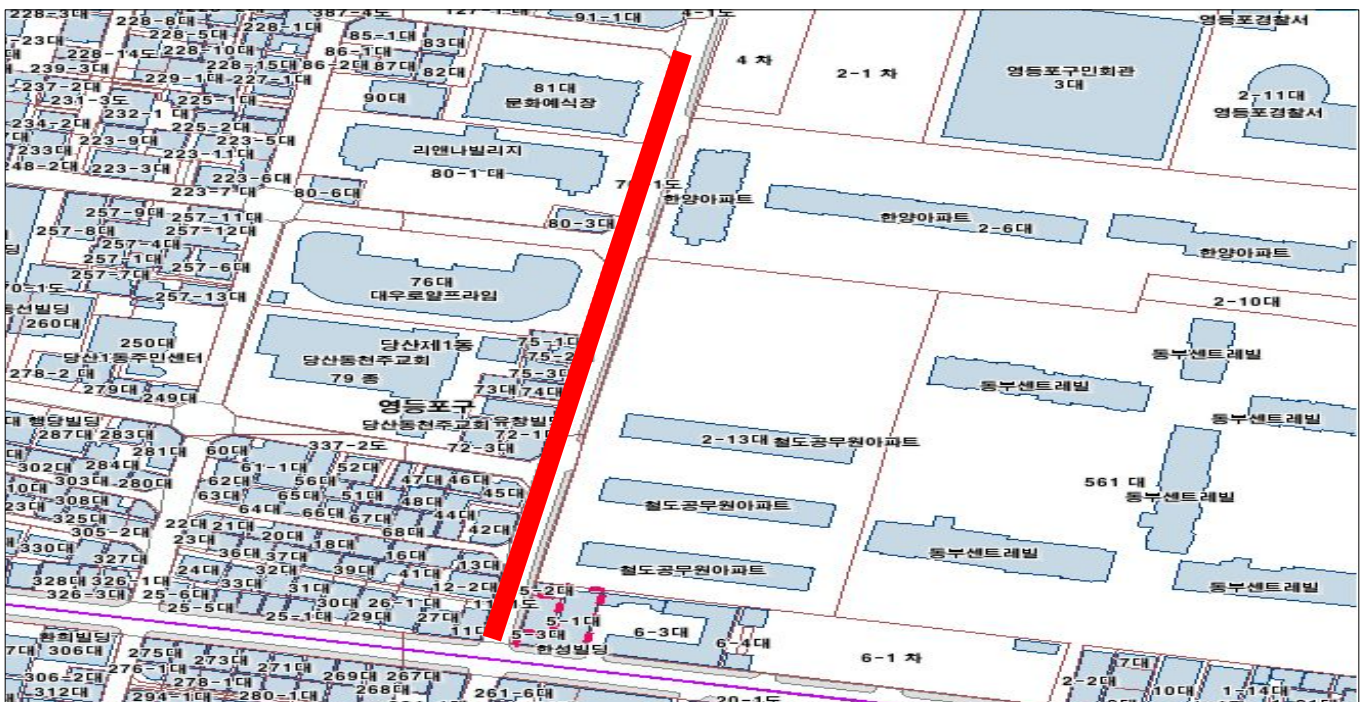

6

신길동 233번지 주변 도로정비공사

□ 사업개요

- 추진기간 : 8월 ~ 12. 31(5개월)
- 위 치 : 신길동 233번지 주변 외 1개소
- 규 모 : 도로정비 B=3~4 m L= 370 m

□ 추진실적

- 2012.10.18: 공사착공


□ 향후 추진계획

- 2012. 11월 : 아스팔트 포장 및 준공

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 130,936천원

□ 위치도

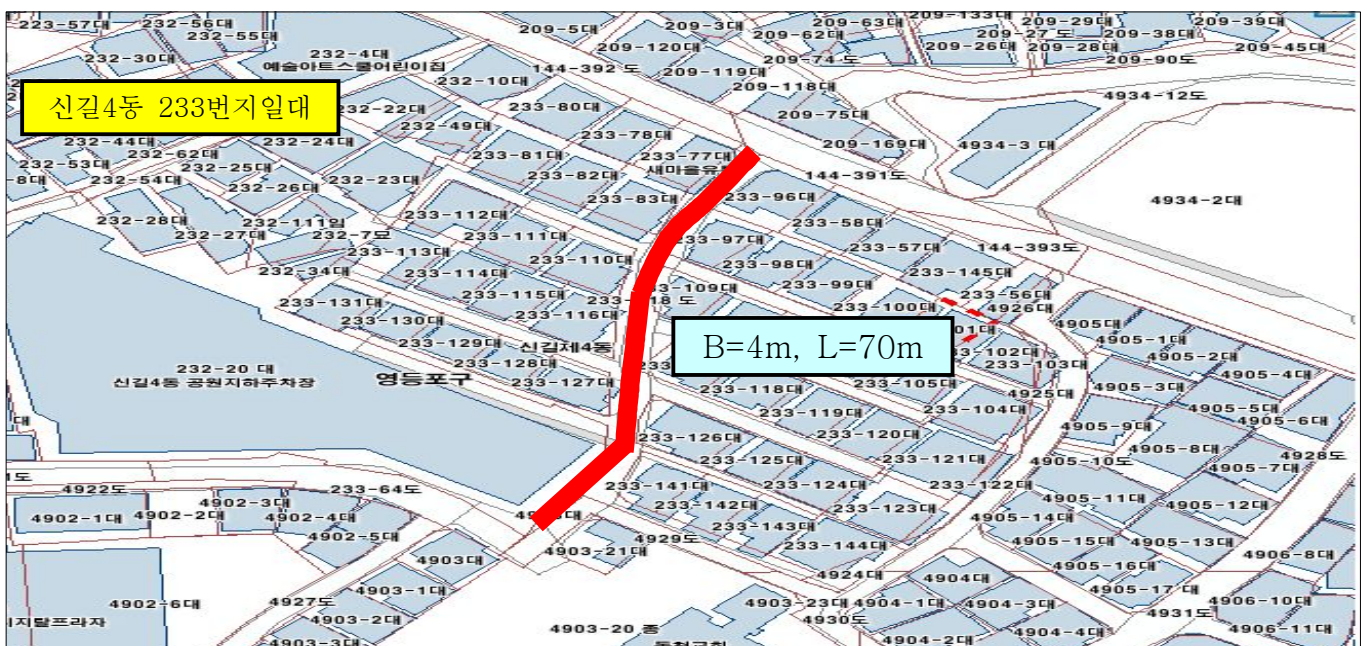

□ 사업개요

- 추진기간 : 3월 ~ 6. 30(4개월)
- 위 치 : 도신로 17길
- 규 모 : 도로정비 B=3~4 m L= 370 m


□ 추진실적

- 2012. 3. 20 : 계약 및 공사착공
- 2012. 5. 29 : 아스팔트포장
- 2012. 6. 27 : 공사준공

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 201,000천원
- 집행액 : 178,343천원

□ 위 치 도

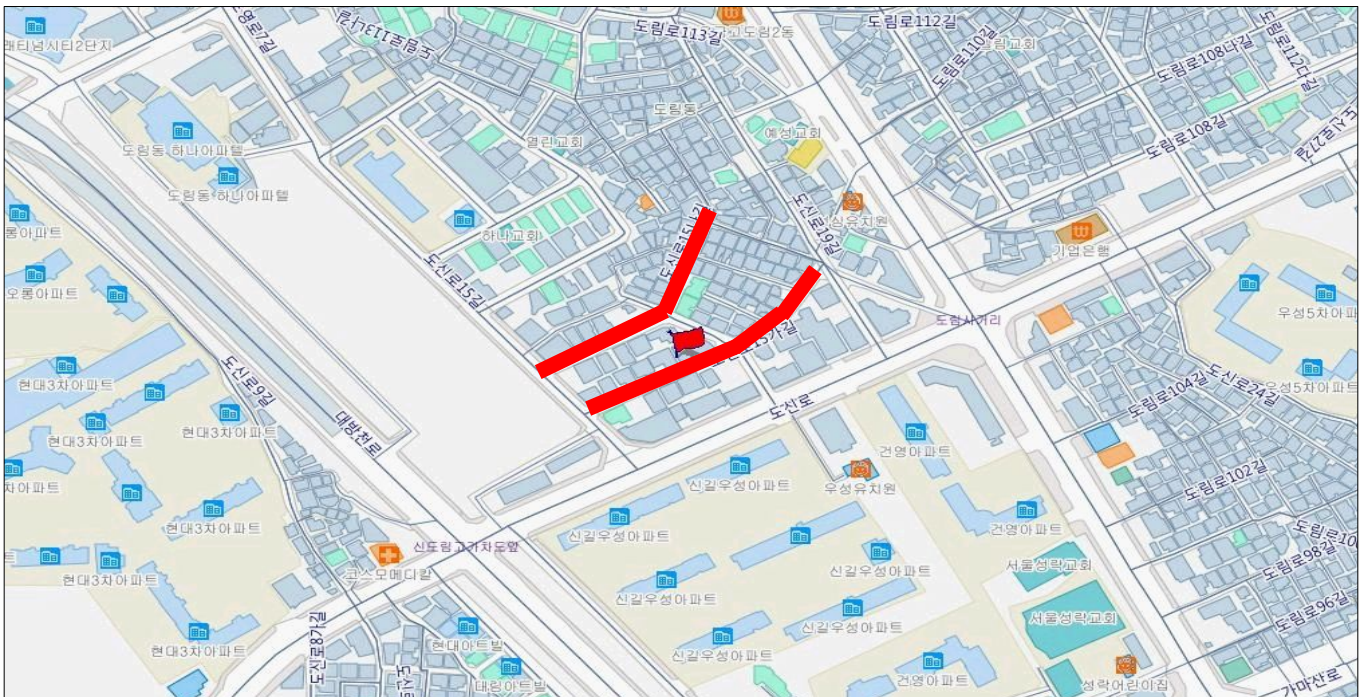

□ 사업개요

- 추진기간 : 3월 ~ 6. 30(4개월)
- 위 치 : 양평동4가 120번지 주변
- 규 모 : 도로정비 B=6 m L= 420 m


□ 추진실적

- 2012. 3. 20 : 계약 및 공사착공
- 2012. 4. 29 : 아스팔트 포장
- 2012. 6. 27 : 공사준공

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 151,000천원
- 집행액 : 124,382천원

□ 위 치 도

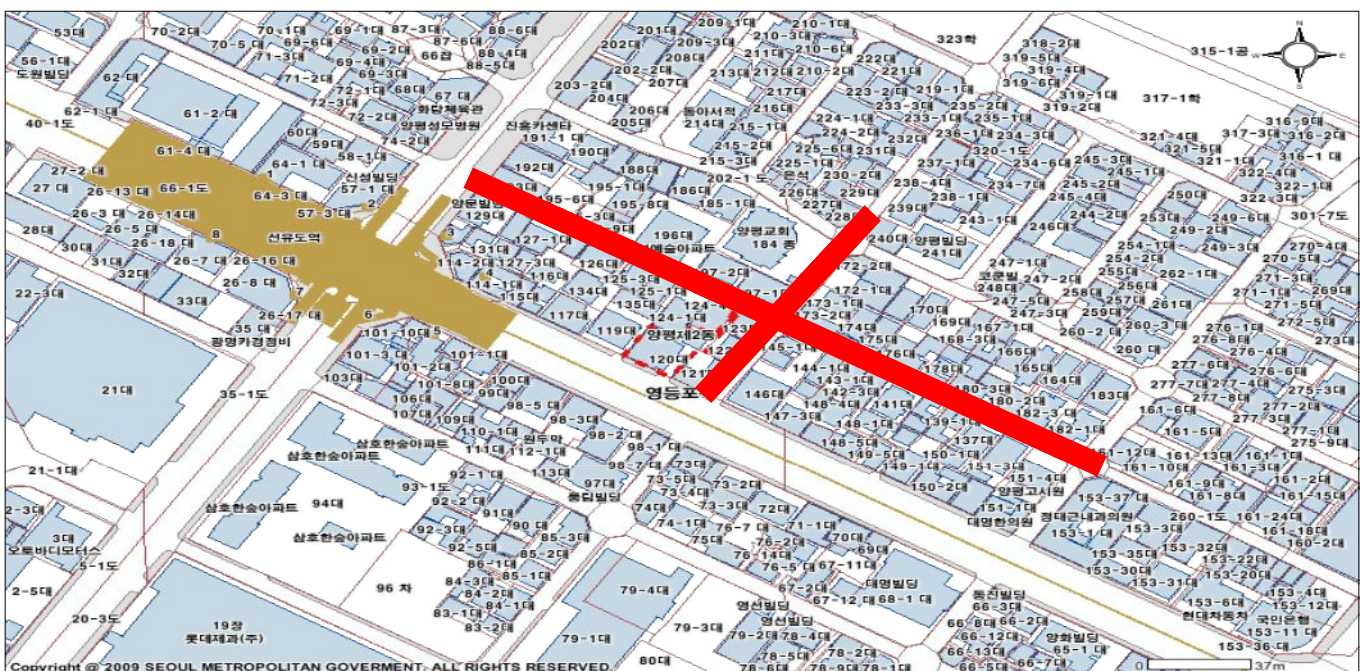

□ 사업개요

- 추진기간 : 3월 ~ 9. 15(6개월)
- 위 치 : 신길5동 448-3번지, 신길4동 410-123 ,4902번지
- 규 모 : 도로정비 B=6~6.5 m L= 100 m


□ 추진실적

- 2012. 4. 19 : 계약 및 공사착공
- 2012. 7. 9 : 아스팔트 포장
- 2012. 9. 10 : 공사준공

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 100,000천원
- 집행액 : 65,978천원

□ 위 치 도

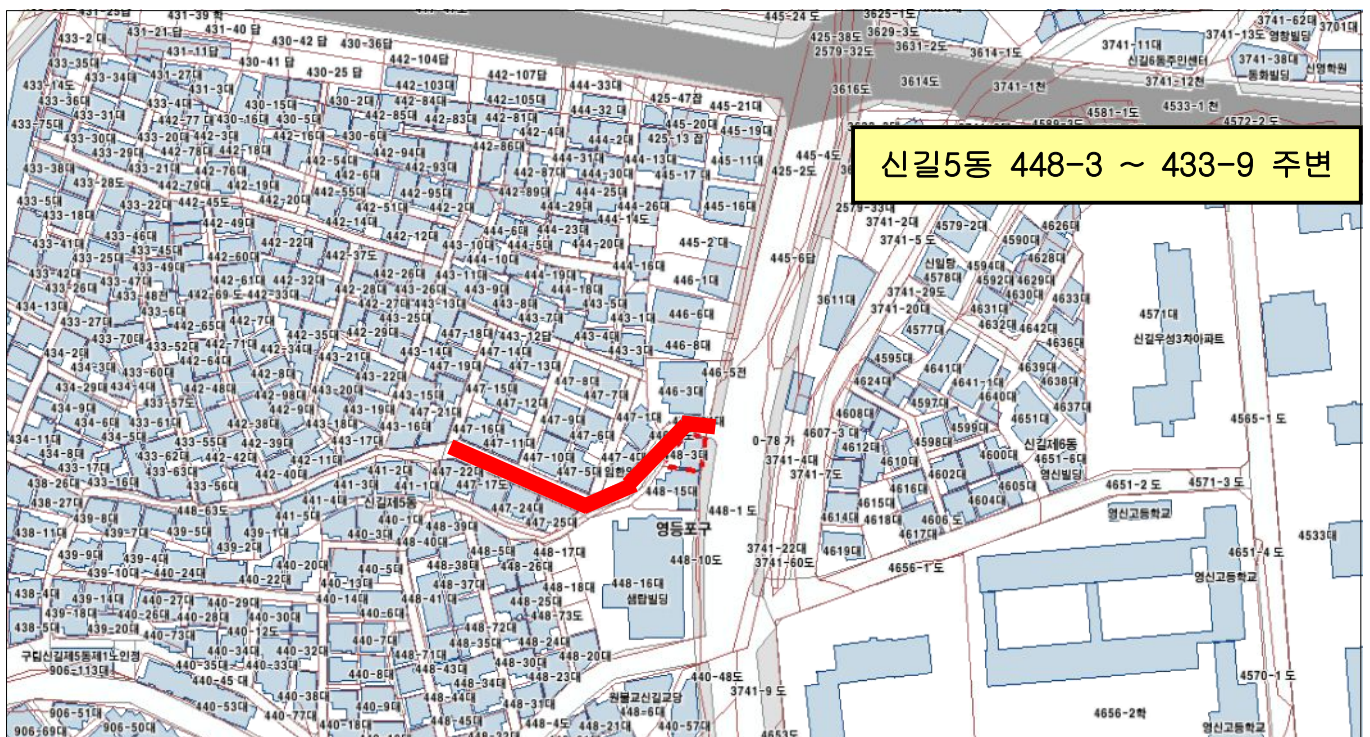

□ 사업개요

- 추진기간 : 5월 ~ 10. 28(6개월)
- 위 치 : 여의도동 3-8번지 (윤중중학교 주변)
- 규 모 : 보도확장 B= 2~4 m L= 170 m


□ 추진실적

- 2012. 5. 2 : 공사 착공
- 2012. 5월~6월 : 기초 및 장선 설치
- 2012. 6월~7월 : 합성목재 데크 설치
- 2012. 8월~9월 : 데크 및 난간 설치 완료
- 2012. 9. 24 : 공사 준공

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 231,000천원
- 집행액 : 217,798천원

□ 위치도

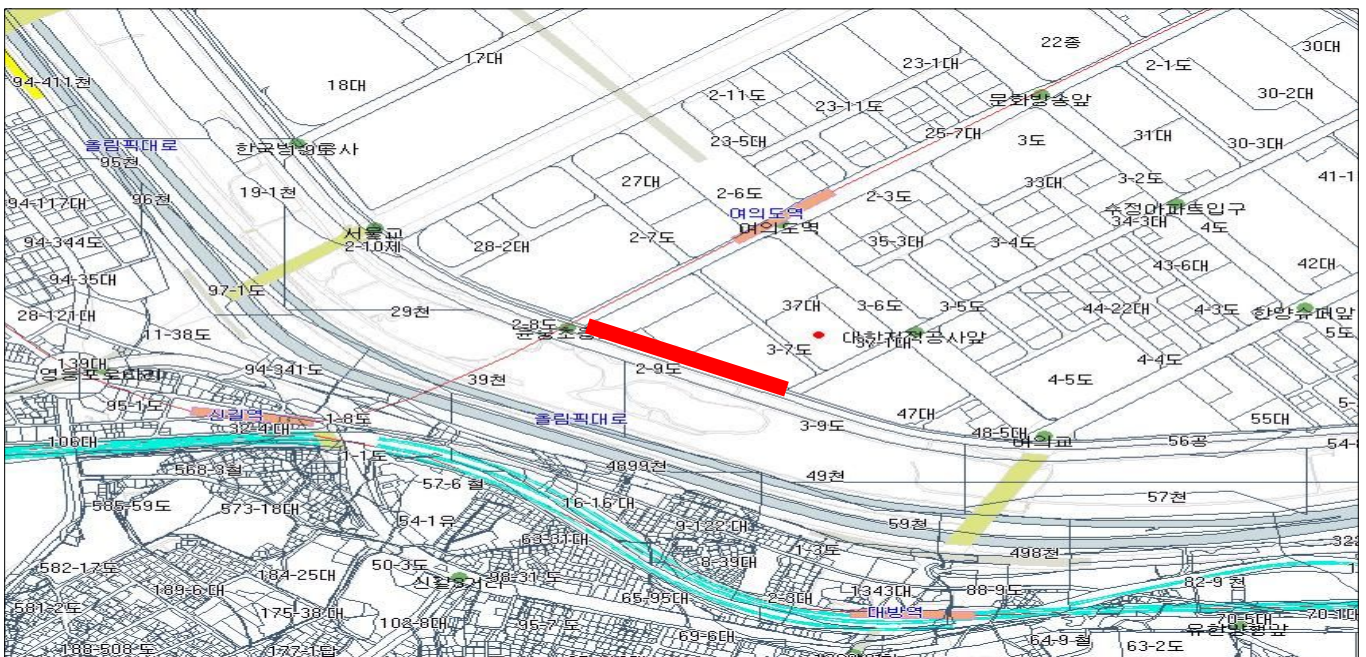

사업개요

- 추진기간 : 1월 ~ 12월(연중 계속사업)
- 정비대상 : 이면도로(구도로) 35,720m
- 사업규모 : 보도정비 A=100a, 아스팔트정비 A=200a, 콘크리트포장 A= 40a

 추진실적

- 2012. 3. 22 : 공사착공
- 2012. 6. 27 : 1차 변경계약
- 2012. 6. 28 : 1차 기성검사
- 2012. 9월중 : 2차 변경계약 및 기성검사
- 보도정비 A=30a, 아스팔트정비 A=180a, 콘크리트포장 A=16a

 향후 추진계획

- '12. 12월중 : 준공예정

 예산현황(구비)

- 예산액 : 1,603,000천원
- 집행액 : 1,397,429천원

□ 사업개요

- 추진기간 : 1월 ~ 12월(연중 계속사업)
- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업규모
 - 지하보도 1개소, 보도육교 6개소, 옹벽 및 석축 6개소
 - 난간·과속 방지턱 및 볼라드 설치 등 도로부속시설물
 - 영등포초교 방음벽 개량(시비 85,000천원)
 - 점자블록 및 보도턱 정비(시비 20,000천원)

□ 추진실적

- 2012. 3월~4월 : 여의초교 앞 지하보도 외 14개소 세척 9,596m²
- 2012. 4월 : 영등포수원지 앞 보도육교 외 14개소 도색 5,400m²
- 2012. 5월~6월 : 영원초등학교 앞 외 108개소 과속방지턱 도색 2,279m²
- 2012. 3월~7월 : 안전웬스설치 232m, 볼라드설치 76개
- 2012. 8월 : 영등포초등학교 방음벽 개량(H=8m, L=52m)
- 2012. 9월 : 점자블록 및 보도턱정비 22개소

□ 향후 추진계획

- 2012. 11월 : 공사준공

□ 예산현황(시비13, 구비87)

- 예산액 : 807,000천원(시 105,000, 구 702,000)
- 집행액 : 656,342천원(시 105,000, 구 551,342)

□ 사업개요

- 추진기간 : 3월 ~ 9월(7개월)
- 대상노선 : 영등포로(오목교 입구~영등포 유통상가 앞 사거리 간)
- 적용위치 : 가로변 버스정류장, 공원입구 등
- 사업규모 : N=90개(10곳), 금연판(석재류) $b \times l \times t(300 \times 300 \times 60)$

□ 추진실적

- 2012. 7월 : 금연 표지판제작 구매 심사요청
- 2012. 8월 : 표지판 제작 및 구매
- 2012. 9월 : 90개(10곳) 설치 완료(위치도 참조)

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 8,000천원(구비 소파 보수 예산 일부 사용)

□ 위치도

위 치 도	연번	위 치	수량	방향
	1	당산동 진로아파트	1	오목교 방향
	2	SK텔레콤	1	
	3	양남동 로터리	1	
	4	영등포 기계상가	1	
	5	관악 고등학교 앞	1	
	6	관악 고등학교 앞	1	영등포 로터리 방향
	7	영등포 기계상가	1	
	8	교보생명 앞	1	
	9	진로아파트 앞	1	
	10	하이마트 앞	1	

□ 사업개요

- 추진기간 : 1월 ~ 12월(연중 계속사업)
- 추진범위 : 관내 포장도로에 대하여 전기, 통신, 도시가스, 상수도 등 지하매설물 매설을 위한 굴착복구 및 수년간 잦은 굴착으로 인하여 노후한 불량 도로를 정비하여 도로 유지 관리
- 사업규모

구분	계	보도블럭포장	아스팔트포장	콘크리트포장
공사면적	175@	30@	125@	20@

□ 추진실적

- 불량도로정비 : 107개소 170@
 - 보도블럭포장 : A=20@
 - 아스팔트포장 : A=141@
- 도로복구 원인자부담금 372백만원 징수
- 2012. 5월 : 도로굴착복구공사 상반기 하자검사 적발 조치
 - 총 18건 (관리청4, 남부수도사업소8, 서울도시가스 2, 기타4)
- 2012. 9월 : 도로굴착복구공사 하반기 하자검사 적발 조치
 - 총 28건 (관리청4, 남부수도사업소13, 서울도시가스 5, 기타6)

□ 향후 추진계획

- 불량도로정비 : 20여 개소 30

□ 예산현황(구기금)

- 예산액 : 1,401,000천원
- 집행액 : 1,010,000천원

□ 사업개요

- 추진기간 : 2011년 ~ 2014년
- 추진범위 : 관내 전지역
- 2012년 계획

(단위 : 백만원)

대상노선		사업비	사업개요			
			가로등정비	글러브세척	기타 (케이블정비등)	
가로등	계	69개노선 8,620등	250	40본	3,000등	600m
	시도	26개 노선 5,620등	140	30본	2,000등	100m
	구도	43개 노선 3,000 등	110	10본	1,000등	500m

□ 추진실적

- 2012. 2월 : 가로등 시설물 보수 연간단가계약 체결 → 1개 업체
- 가로등정비 33본, 케이블정비 1,000m
- 글러브세척 및 교체 680/80등,
- 분전함 정비 등 기타 1식

□ 향후 추진계획

- 가로등 전기안전사고 예방을 위한 분전함 및 전원선로 정비 중점 추진
- 노후 가로등시설물 정비 지속 추진

□ 예산현황(구비)

- 예산액 : 253,855천원
- 집행액 : 118,382천원

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2011년 ~ 2014년

○ 추진범위 : 관내 전지역

○ 2012년 계획

(단위 : 백만원)

구 분	구 역 별					
	계		1 구 역 (영등포·당산·양평·문래·도림동)		2 구 역 (신길·대림동)	
	공사비	등수	공사비	등수	공사비	등수
계	360	6,280	180	3,121	180	3,159
보안등 신설·개량	27	40	14	21	13	19
보안등 유지 보수	333	6,240	166	3,100	167	3,140

□ 추진실적

○ 2012. 2월 : 보안등 시설물 보수 연간단가계약 체결 → 2개 업체

○ 보안등신설·개량 : 254등(1구역:114, 2구역:131)

○ 안정기·램프교체 등 유지보수 : 3,003등(1구역:1,454, 2구역 1,549)

□ 향후 추진계획

○ 주민이 참여하는 보안등 야간순찰과 연계하여 보안등 신설·개량 실시

○ 노후 및 고장 보안등 정비 지속 실시

□ 예산현황(구비)

○ 예산액 : 363,500천원

○ 집행액 : 165,940천원

□ 사업개요

- 추진기간 : 3. 16 ~ 11. 14(제설기간 제외)
- 순찰일시 : 매주 화·목 19:30 ~ 22:00
- 순찰조 편성
 - 구성인원 : 관할동장, 도로과장 외 10명, 주민(통장 등)
 - 조 편 성 : 2인 9개조(조원 : 도로조명팀1, 희망주민1)
- 운영방법
 - 주민참여 순찰 : 매주 목요일 주민 추천지역 위주 순찰
 - 도로과 자체순찰 : 매주 화요일 1~2개동 취약지역 순찰
 - ※ 동장, 과장 순찰은 매월 1회 시행(주민참여 순찰 시)
- 순찰결과 : 적출사항에 대하여 1~2일내 정비완료

□ 추진실적

- 순찰실적 : 매주 2회 64회 실시(주민참여 32회, 자체순찰 32회)
- 참여인원 : 총 875명(지역주민 224명, 구공무원 588명, 동사무소직원 63명)
- 적출건수 : 고장등 802건 적출
- 조치실적 : 적출된 802건 보수완료

□ 향후 추진계획

- 주민참여 순찰시 야간 조명취약지역 의견 수렴 실시
- 제설기간 도래 전까지 주2회 보안등 야간 순찰 지속 추진

□ 예산현황 : 비예산

국가에서 추진 중인 지역 에너지절약사업 및 빛 공해 방지사업 일환으로 관내 노후 NH 100W보안등을 LED 50W이하 보안등으로 교체 설치하여 전기 에너지 절약에 적극 동참하고 예산 절감에 이바지하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간 : 8월 ~ 12월(5개월)
- 위 치 : 당산동·양평동지역 중 도로폭 6m이상인 골목
- 추진내용 : LED52W보안등 480등 설치
- 사 업 비 : 400,000천원

□ 추진실적

- 2012. 7월 : 1차 추경예산확보 200,000천원
- 2012. 8. 6 : LED 자재 구매를 위한 업체 선정
(조달청 제3자 단가계약자중에서 2단계 경쟁을 통한 최저가격 제안자)
- 2012. 9. 7 : 공사계약 및 착공 (공정율 30%)

□ 향후 추진계획

- 2012. 12. 31 : 공사준공

□ 예산현황(국비50, 구비50)

- 예산액 : 400,000천원(국 200,000, 구 200,000)

□ 위 치 도



Ⅲ. 2013 주요업무 계획

연 번	사 업 명	쪽
①	도림로 확장공사	26
②	대림3동 812번지 도로개설공사	28
③	금연보도판 설치로 연기 없는 행복한 거리조성 지속추진	29
④	포장도로정비 등 소파보수공사	30
⑤	도로시설물 설치 및 보수공사	30
⑥	사회적 약자를 위한 도시환경개선	30
⑦	영등포본동 육교보수 및 계단추가	31
⑧	신길4동 214-8 주변 외 2건 도로정비공사	32
⑨	도로시설물 안전점검	33
⑩	주민과 함께하는 제설대책 추진	34
⑪	관내 불량맨홀 정비공사	36
⑫	가로등 시설물 정비공사	36
⑬	보안등 설치개량 및 유지보수공사	36
⑭	주민이 참여하는 야간 보안등 순찰 지속추진	37
⑮	여의도 봄꽃축제 경관조명 교체공사	38
⑯	2013년도 주요투자사업 현황	39

1 도림로 확장공사

신길재정비촉진지구 활성화로 지역균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길5동 421-16
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기 개설 350, 미 개설 800)
 - ┌ 특별회계 : 좌측 L= 500m(신길재정비촉진지구 내)
 - └ 일반회계 : 우측 L= 800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 총사업비 : 44,550백만원(보상비 39,700 공사비 4,700 설계비 150)
 - 특별회계 : 15,350백만원(보상비 13,700 공사비 1,500 설계비 150)
 - 일반회계 : 29,200백만원(보상비 26,000 공사비 3,200)

□ 추진계획



- 특별회계구간
 - 2013.01 : 1,2차 구간 공사진행
 - 2014.04 : 공사준공(예정)
- 일반회계구간
 - 2013.01 : 물건조사
 - 2013.02 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가
 - 2013.03 ~ 12 : 보상시행

□ 연차별 사업계획(시비)

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2012	2013	2014	장래
추진 내용	특별회계	보 상	13,700	13,700			
		공 사	1,500		660	840	
		용 역	150	150			
	일반회계	보 상	26,000	13,000	100	300	12,600
		공 사	3,200	1,200			2,000
총사업비		44,550	28,050	760	1,140	14,600	

□ 위치도

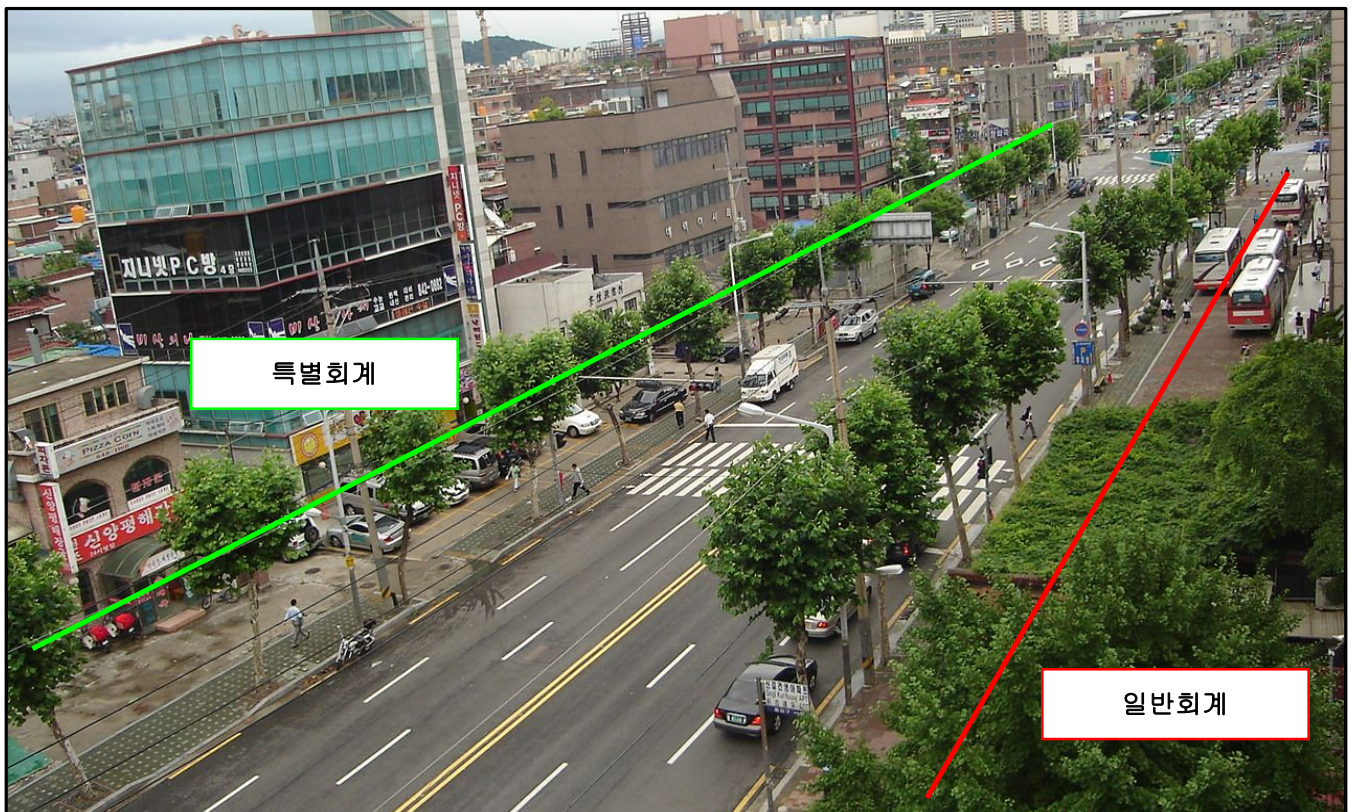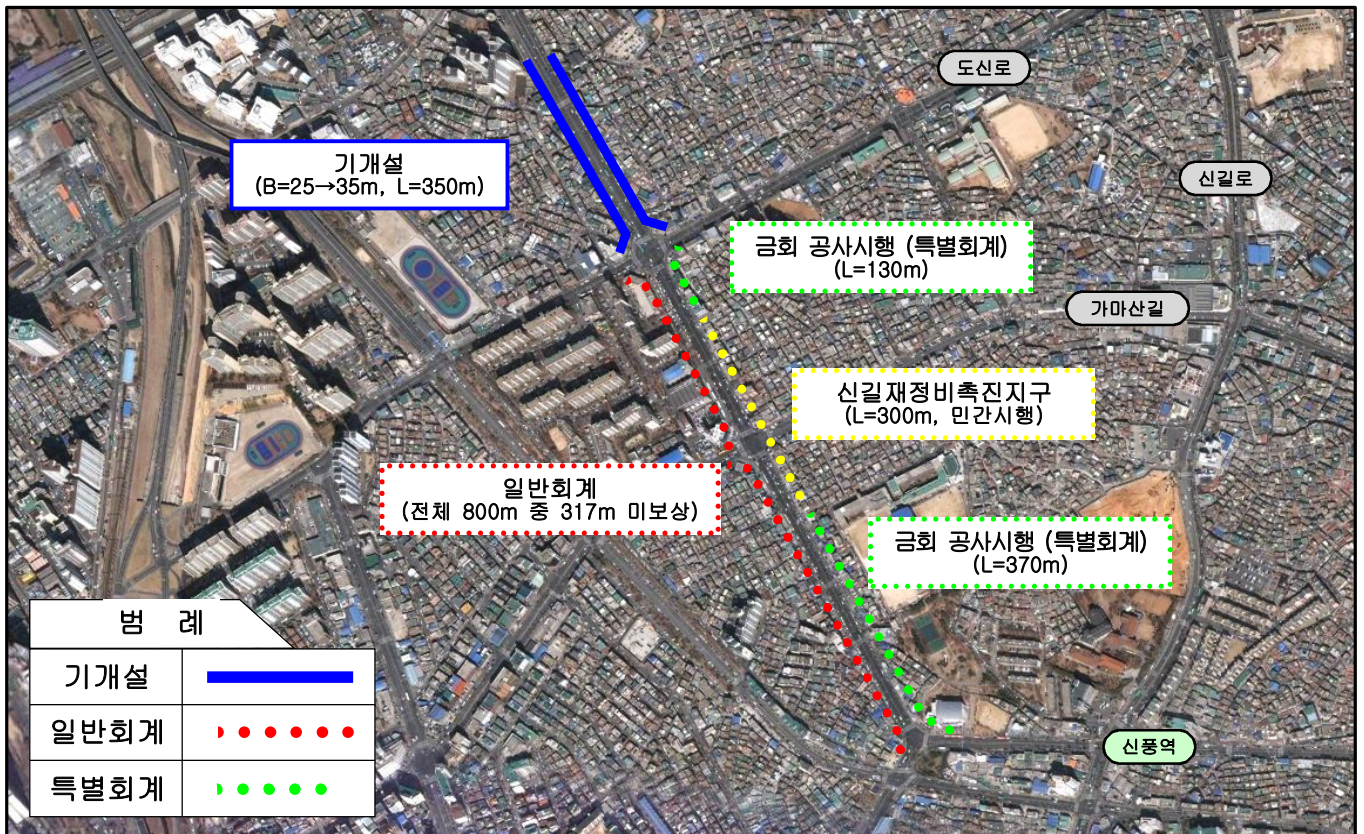

2 대림3동 812-12번지 도로개설공사

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 주민숙원사업 해소 및 주거환경개선

□ 사업개요

- 위치 : 대림동 812-12번지
- 규모 : 도로개설 B=6m, L= 14m
- 사업기간 : 2012년 ~ 2014년
- 총사업비 : 742,000천원(구비)

□ 추진계획


- 2013. 1월 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획변경인가
- 2013. 2월~12월 : 보상시행

□ 연차별 사업계획(구비)

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2012	2013	2014	장 래	비고
추진내용	용역						
	보상	672	100	100	472		
	공사	70			70		
총사업비	742		100	100	542		

□ 위치도

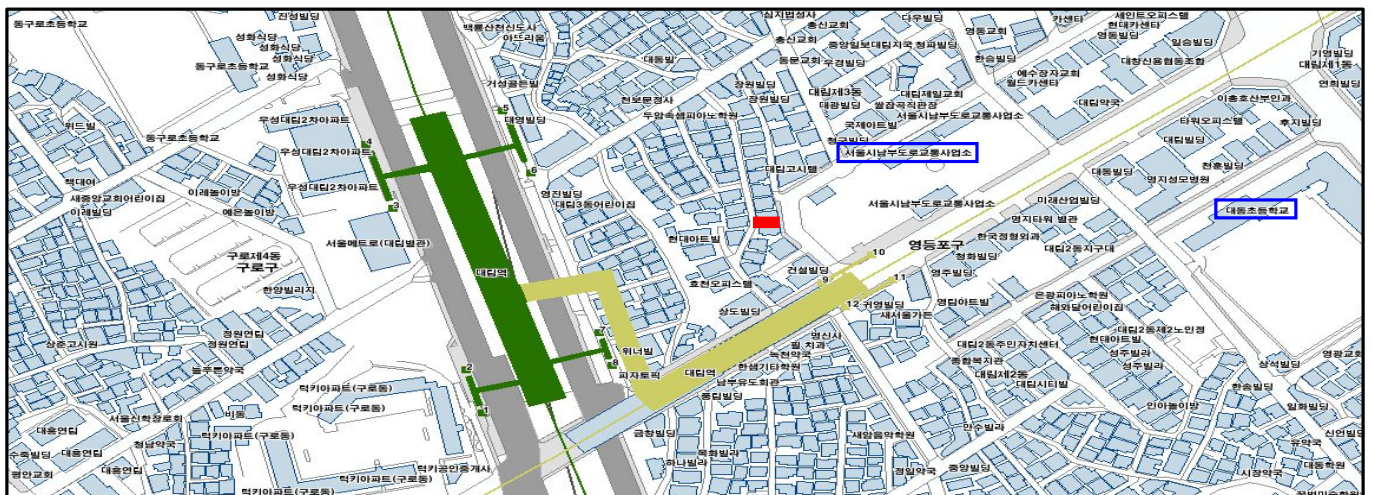

3 금연보도판 설치로 연기 없는 행복한 거리 조성 지속추진

쾌적한 보도환경 조성의 일환으로 구민건강을 위한 연기 없는 거리가 되도록 계획하여 사람중심의 행복한 문화도시를 건설토록 함

□ 사업개요

- 대상노선 : 영등포로(영등포유통상가 앞 사거리 ~ 영등포 로터리 간)
- 적용위치 : 가로변 버스정류장 등
- 시설규모 : N=10개소 × 9 = 90개, 석재류, 300×300×T50mm

□ 추진방향

- 금연 권장구역 내 동판이 설치되는 건강한 보도조성
- 구민 누구나가 공감하여 금연을 생각하는 공공장소 실현

□ 추진계획

- 2013. 3월~4월 : 대상노선 현장조사
- 2013. 6월~7월 : 금연 디자인 보도블록 제작
- 2013. 8월~9월 : 현장시공
- 2013.10월~ : 주민 여론조사 시행 및 확대여부 검토 결정

□ 2012년 추진현황

- 대상노선 : 영등포로(오목교 입구 간 ~ 영등포유통상가 앞 사거리)
- 시설규모 : N=10개소 × 9 = 90개, 석재류, 300×300×T50mm

□ 예산액 : 7,650천원(구비)



설치 전



설치 후

4 포장도로정비 등 소파보수공사

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 전 지역 도로(구도로) 67,600m
- 기 간 : 2013. 3 ~ 2013. 12
- 규 모 : 아스팔트정비 A=488a, 콘크리트정비 A=100a, 보도정비 A=338a

□ 예 산 액 : 1,552,700천원(구비)

5 도로시설물 설치 보수공사

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 과속방지턱 신설 및 보수 L=1,000m, 도색 A=20,000m²
난간 보수 및 설치 1500경간
- 기 간 : 2013. 3 ~ 2013. 12

□ 예 산 액 : 601,000천원(구비)

6 사회적 약자를 위한 도시환경개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 3 ~ 2013. 12
- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 보도정비 A=12@, 보도턱정비 150개소, 점자블럭정비 500개소
- 내 용 : 장애인, 노약자 등의 사회적 약자를 위한 도로시설물 정비

□ 예 산 액 : 95,000천원(구비)

7

영등포본동 육교보수 및 계단추가

□ 사업개요


- 위 치 : 영등포본동 618-6
- 규 모 : 계단설치 B=3.2m, L=38m, 보도신설 B=3.2m, L=40m, A=1.28@
- 기 간 : 2013. 3 ~ 2013. 11

□ 추진계획

- 2013. 1월~2월 : 현장조사
- 2013. 3월 : 영등포역 횡단 보도육교 개선공사 실시설계 타당성 검토의뢰(구 → 서울시)
- 2013. 4월~7월 : 실시설계용역 발주 시행
- 2013. 7월 : 영등포역 횡단 보도육교 개선공사 실시설계용역 준공

□ 예 산 액 : 50,000천원(구비)

□ 위 치 도

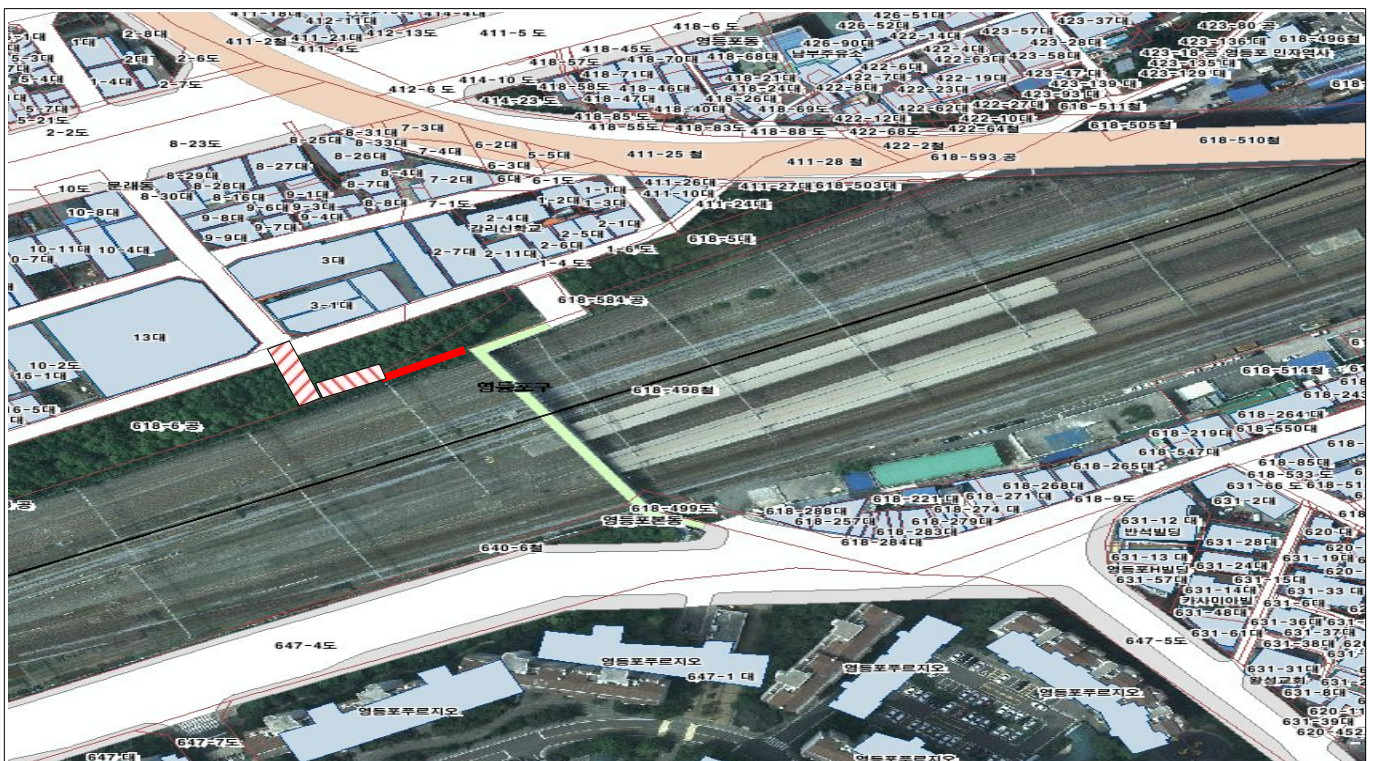

8 신길4동 214-8 주변 외 2건 도로정비공사

지속적인 도로 정비로 도로의 기능성 유지 및 안전사고를 사전에 예방하고 주민 통행불편을 해소하고자 함

□ 사업개요

(단위:천원)

위 치	규 모	기 간	소요예산	비 고
신길4동 214-8번지 주변	B=3~6m L=260m	2013. 3 ~ 2013. 9	137,000	
신길4동 4914 주변	B=4m L=280m		154,000	
신길4동 4917-9 주변	B=4m L=60m		74,000	



□ 추진계획

- 2013. 1월~2월 : 현장조사 및 설계
- 2013. 3월 : 공사계약 및 발주
- 2013. 4월 : 공사착공
- 2013. 9월 : 공사준공

□ 예 산 액 : 365,000천원(구비)

□ 위 치 도



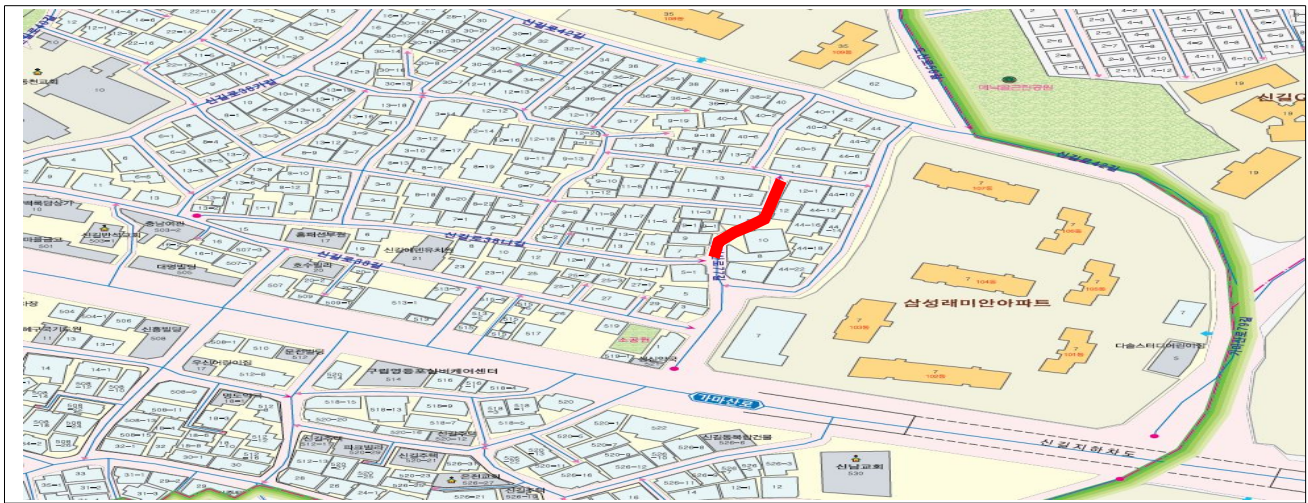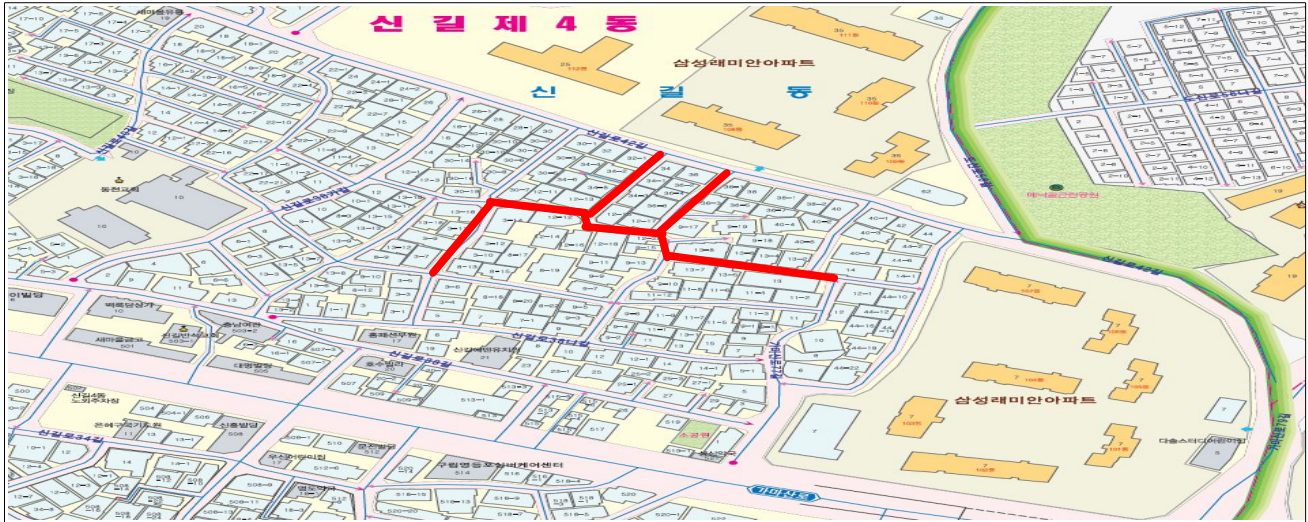

9 도로시설물 안전점검

관내 도로시설물의 노후 훼손 및 파손된 개소에 대한 신속한 보수로 시설물 이용 주민들의 안전사고 미연방지 및 도시미관 증진에 기여하고, 구조적인 결함을 조기에 발견하고자 안전점검을 실시하고자 함

□ 사업개요

- 위치 : 관내 도로시설물
- 대상 : 지하보도 1개소, 보도육교 6개소, 옹벽 5개소, 대형공사장 2개소
- 기 간 : 2013. 3 ~ 2013. 12

□ 예 산 액 : 10,000천원(구비)

다가오는 겨울철 강설에 대비하여 제설대책 준비에 만전을 기하여 강설시 원활한 교통소통 및 주민생활에 불편이 없도록 최선을 다하고자 함

□ 추진개요

- 추진기간 : 2012.11.15 ~ 2013.3.15(4개월)
- 제설구간 : 도로연장 382.10km
 - 당산로 외 51개 노선(12~20m 이상) L=89km
 - 이면도로(8m이하) 및 고갯길 등 L=293.10km

□ 추진방향

- 내 집 내 점포 앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상
- 폭설(적설량 10cm 이상)시 각 실과별 담당동 제설작업 지원 및 제설 민간 장비 업체를 동원 제설작업 시행, 민간장비 동원 시 각 실과별 담당지정 노선 책임 제설
- 이면도로(L=16km)에 대하여도 민간용역 제설 작업 확대시행

□ 추진계획

- 제설종합대책상황실 운영 : 2012.11.15 ~ 2013.3.15(4개월)
- 단계별 상황별 비상근무실시

단계 구분	평 시	보 강	1 단 계	2 단 계	3 단 계
내 용	일상예보 (강수확률30%미만 또는 2℃이상)	강설예보 (강수확률30%이상으로서 2℃미만)	강 설 예 보 (적설량 1~5cm미만 예보시)	대설주의보 (적설량 5cm이상 예보시)	대 설 경 보 (적설량 10cm이상 예보시)
근무기준	• 본부요원 2명 (도로과)	• 본부요원 4명 • 도로과 3명 • 동주민센터 1명	• 본부요원 1/4 • 동주민센터직원 1/4 • 작업요원 1/2 • 환경미화원 1/4	• 본부요원 1/2 • 동주민센터직원 1/2 • 작업요원 전원 • 환경미화원 1/2	• 본부요원 1/2 • 동주민센터 1/2 • 필요시 전직원

○ 재설장비 및 자재 확보

제 설 장 비 (대)							제 설 자 재 : 톤(포/25kg)		
소계	다목적 제설차	제설 삽날	염화칼슘 살포기			스키드 로더	소계	염화칼슘	소금
			대형	중형	소형				
49	3	11	3	4	26	2	1,180	690	490

○ 동 주민센터 제설작업 강화

- 기간제 근로자를 동별 1명씩 채용하여 제설함관리 및 취약지역 상시 순찰

○ CCTV 제설 현황과약 활용(방법용259대, 주차단속용107대)

- 자치행정과, 주차문화과와 협조하여 CCTV 관제센터 상황실 이용 현장확인

○ 내 집 앞, 내 점포 앞 눈치우기 집중 홍보활동 전개

- 강설 시 각 동 통장 및 직능단체에 제설 참여 독려 문자 메시지 발송

○ 인접 자치단체 경계지역 제설 공조체제 확립

- 제설작업 노선 중복 기관 : 3개 도로사업소, 4개구청
(강서·서부·남부도로사업소, 양천구청, 구로구청, 동작구청)
- 협약 체결 완료 : 2012.10.19.

○ 제설장비 관리 철저

- 제설작업 종료 후 염화칼슘 등 이물질에 대한 철저한 세척 관리
- 부식방지를 위한 윤활제 도포 및 장비별 보호덮개를 씌어 노후화 방지

□ 예 산 액 : 244,787천원(구비)

11 관내 불량맨홀 정비공사

□ 사업개요

- 기 간 : 1. 1 ~ 12. 31
- 대 상 : 상수도, 하수도, 통신 등 각종 불량맨홀
- 내 용 : 도로상 설치되어 있는 맨홀중의 포장면에 대한 평탄성을 유지함으로서 안전하고 쾌적한 통행 여건이 이루어질 수 있도록 도로 환경을 조성함

□ 예 산 액 : 100,800천원(구비)

12 가로등 시설물 정비공사

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 3. 1 ~ 2014. 2. 28
- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 방 법 : 전기설비 기술기준 및 판단기준에 따른 부적합 가로등 시설물과 사고주 및 부점등 등 수시 민원이 발생하는 노후 가로등시설물 유지보수 및 정비
- 규 모 : 가로등정비 30본, 분전함 정비 5면, 기타 정비 1식

□ 예 산 액 : 191,500천원(구비)

13 보안등 설치개량 및 유지보수공사

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 2월 ~ 2014. 2월
- 위 치 : 관내 전지역
- 방 법 : 야간 취약지역 보안등 신설 개량 및 부점등 등 유지 보수
- 규 모 : 보안등신설 10등, 개량 250등, 기타 고장 등 보수 1식

□ 예 산 액 : 251,700천원(구비)

'12년 주민이 참여하는 야간 보안등 순찰을 실시하여 현장 중심의 열린 행정을 구현하고 고장 보안등으로 인한 주민불편신고 민원이 감소하는 등 구정의 신뢰 향상에 기여함이 크므로 '13년도에도 지속 추진코자 함

□ 사업개요

- 추진기간 : 2013. 3. 16 ~ 2013. 11. 14(제설기간 제외)
- 추진지역 : 영등포동 18개 전동

□ 추진방향

- 고장 보안등 신속한 적출·정비로 민원예방 및 야간 통행 불편 해소
- 주민참여 보안등 순찰 실시로 현장 중심의 열린 행정 구현 및 신뢰향상
- 취약지역 야간순찰로 우범지역 사고예방 및 구민 의견 수렴

□ 추진계획

- 순찰일시 : 매주 화·목 19 : 30 ~ 22 : 00
- 순찰조
 - 구성인원 : 구청장, 동장, 도로과장 외 10명, 희망 주민(통장 등)
 - 조편성 : 2인 9개조(조원 : 도로조명팀 1, 희망주민 1)
- 운영방법
 - 주민참여순찰 : 매주 목요일 참여주민 추천 지역 위주 순찰
 - 부서자체순찰 : 매주 화요일 1~2개동 취약지역 순찰
 - ※ 구청장, 도로과장, 동장, 순찰은 매월 1회 시행(주민참여순찰시)
- 순찰결과에 따른 조치 : 적출사항 1~2일내 보수완료

□ 예산액 : 비예산

□ 기대효과

- 보안등으로 인한 주민불편 신고 민원 사전 예방
- 주민과 함께하는 현장중심의 열린 행정 구현 및 신뢰 향상
- ※ 2012년 순찰 실적 및 2011년 대비 민원감소 현황

2012년 순찰실적		2011년 대비 민원발생 건수 및 감소			
순찰횟수	적출건수	2011년	2012년	감소건수	감소율(%)
64회	802	1,852	1,467	385	20.8

한강 여의도 봄꽃축제의 노후 경관조명등을 선명한 칼라연출이 가능한 LED조명등으로 교체하여 야간 축제분위기 조성과 전기안전사고를 사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 여의서로(서강대교 ~ 여의2교)중 1.4Km
- 기 간 : 2013. 2월 ~ 5월
- 규 모 : LED 90W지중등 200등 설치, 기타 정비1식

□ 추진계획

- 2013. 1월 : 설계 및 발주
- 2013. 2월 : 공사계약 및 착공
- 2013. 5월 : 공사 준공

□ 예산액 : 300,000천원(구비)

□ 위치도



(단위:백만원)

연번	사업명	2013 예산				2012 예산(추경포함)				증감
		계	구비	시비	국비	계	구비	시비	국비	
	합 계	4,846	4,186	460	200	4,023	3,823	0	200	823
1	부당이득금반환 등 보상비지급	302	302	-	-	302	302	-	-	-
2	대림동 812-12번지 도로개설공사	100	100	-	-	100	100	-	-	-
3	포장도로정비 등 소파보수공사	1,553	1,553	-	-	1,604	1,604	-	-	△51
4	도로시설물설치 및 보수	601	601	-	-	702	702	-	-	△101
5	사회적 약자를 위한 도시환경개선공사	100	100	-	-	151	151	-	-	△51
6	신길4동 214-8 주변 도로정비공사	137	137	-	-	-	-	-	-	137
7	신길4동 4914 주변 도로정비공사	154	154	-	-	-	-	-	-	154
8	신길4동 4917-9 주변 도로정비공사	74	74	-	-	-	-	-	-	74
9	영등포본동 육교 보수 및 계단추가	50	50	-	-	-	-	-	-	50
10	도로시설물등 안점점검 및 긴급보수공사	10	10	-	-	20	20	-	-	△10
11	관내 불량맨홀 정비공사	101	101	-	-	126	126	-	-	△25
12	가로등시설물 정비공사	192	192	-	-	254	254	-	-	△62
13	보안등 설치 개량 및 유지보수 공사	252	252	-	-	364	364	-	-	△112
14	여의도 봄꽃축제 경관조명등 교체공사	300	300	-	-	-	-	-	-	300
15	관내 LED보안등 설치공사	920	260	460	200	400	200	-	200	520

IV. 특수사업

1 관내 LED보안등 설치공사

국가에서 추진 중인 지역 에너지절약사업 및 빛 공해 방지사업 일환으로 관내 노후 NH 100W보안등을 LED 50W이하 보안등으로 교체 설치하여 전기 에너지 절약에 적극 동참하고 예산 절감에 이바지하고자 함

□ 사업목표 : LED 50W이하 보안등 920등 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업규모 : LED 50W이하 보안등 920등 설치
- 추진기간 : 2013. 3 ~ 2013. 12

□ 추진방향

- 노후 보안등 우선하여 LED보안등으로 교체 설치 추진
- 빛 공해 발생 지역 우선 LED보안등 적용 추진
- NH100W를 LED50W이하 보안등으로 교체하여 에너지 절약 및 예산절감


□ 세부추진계획

- 2013. 5월 : 위치 및 대상 선정
- 2013. 6월 : 계약 심사 및 빛 공해 방지 심의
- 2013. 7월~12월 : 공사 발주 및 준공

□ 예 산 액 : 920,000천원

- 국 30%, 시 30%(과년도 260백만원 포함), 구비 40%

□ 위치도

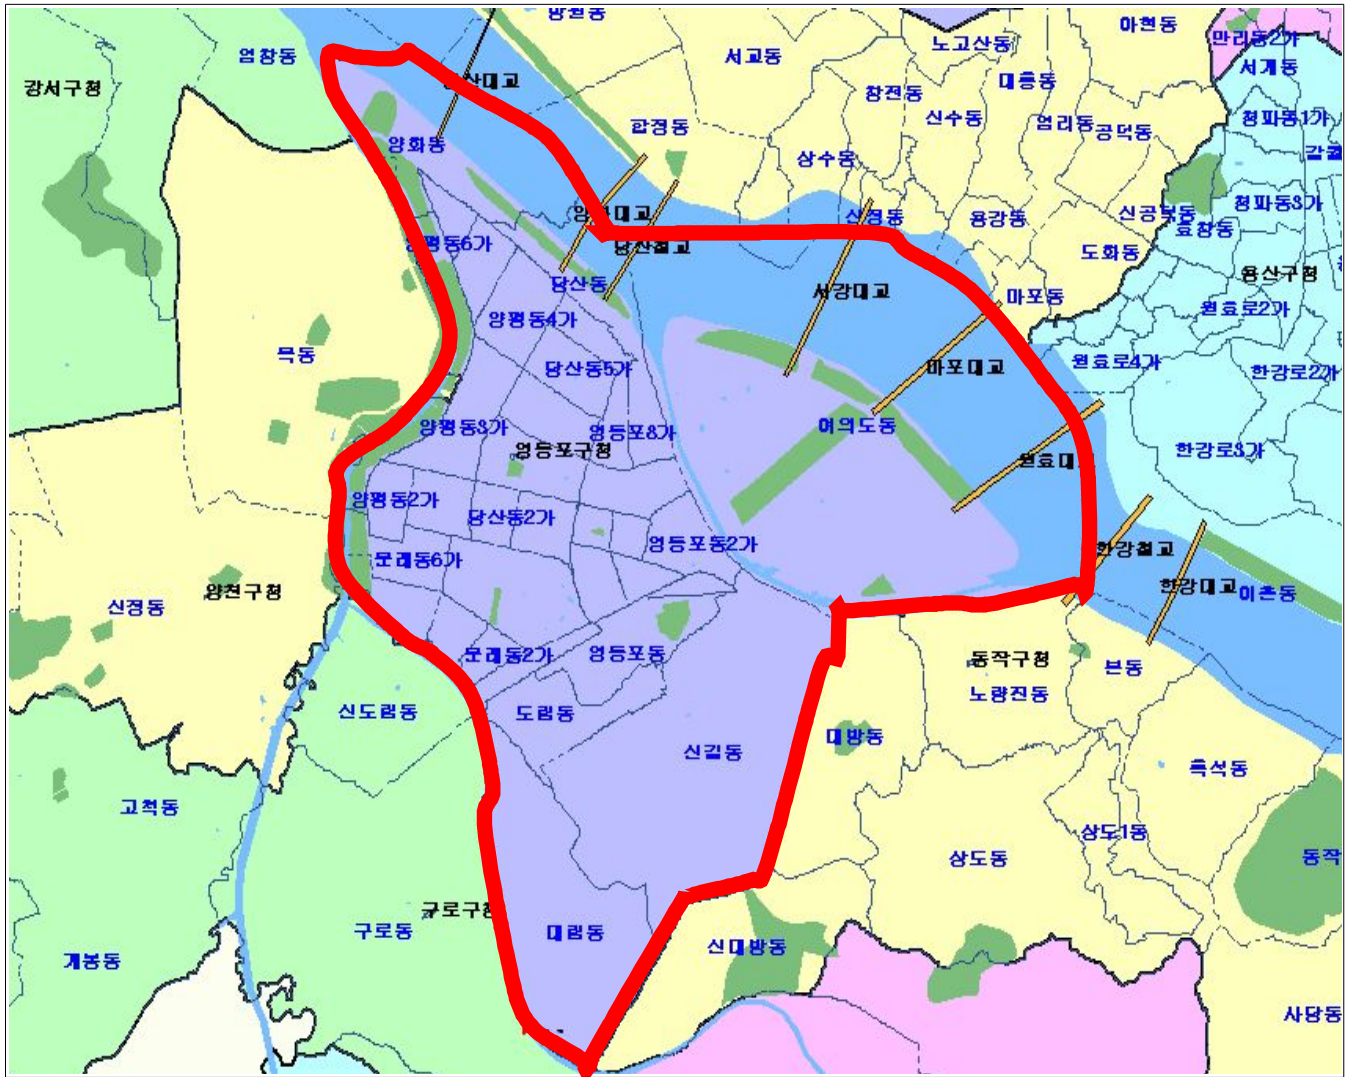

2 “찾아가는 도로현장 신문고” 실시

각 지역별 현안업무 관련 회의 시 도로 관련 민원을 사전에 파악 처리하여
구민의 만족도를 향상시키고 고객위주의 능동적인 행정을 추진하고자 함

□ 사업목표 : 도로관련 현장에서 사전 민원파악 후 신속처리

□ 추진방향

- 동별 통장회의 개최 시기에 맞춰 현장에서 직접 민원을 접수 신속처리
- 주요공사 진행 전 지역 주민들의 요구사항을 현장에서 의견청취 후
공사 진행시 민원이 발생하지 않도록 사전 반영

□ 세부 추진계획

- 운영기간 : 2013. 4월 ~ 10월(제설대책기간 제외)
- 운영방법 : 기간 중 매월 1~2개동을 선정 통장회의 시 직원 참석
- 참석직원 : 도로과장, 팀장, 담당직원
- 민원처리 : 현장에서 청취 된 민원사항은 대장 작성 후 팀별로 처리

□ 기대효과

- 사후 민원처리 과정에서 발생할 수 있는 주민들의 행정 불만족 감소
- 고객의 의견을 현장에서 직접 청취 후 신속히 처리하여 행정 만족도 향상

□ 예산액 : 비예산
