

2007. 제132회 임시회

2007. 11. 2 ~ 11. 12



2007년도

---

# 주요사업 추진실적



2007. 11.

공 원 녹 지 과

# 순서


- 일반현황 ..... 1
- 사업추진 개요 ..... 3
- 2007 사업추진 실적 ..... 4

# I. 일반 현황

## 1 인 력

구 분	계	일 반 직					기 능 직			
		5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	29	1	4	5	5	4		1	8	1
현 원	26	1	4	6	5	1	1	1	6	1
과부족	-3			+1	-	-3	+1		-2	

## 2 조 직

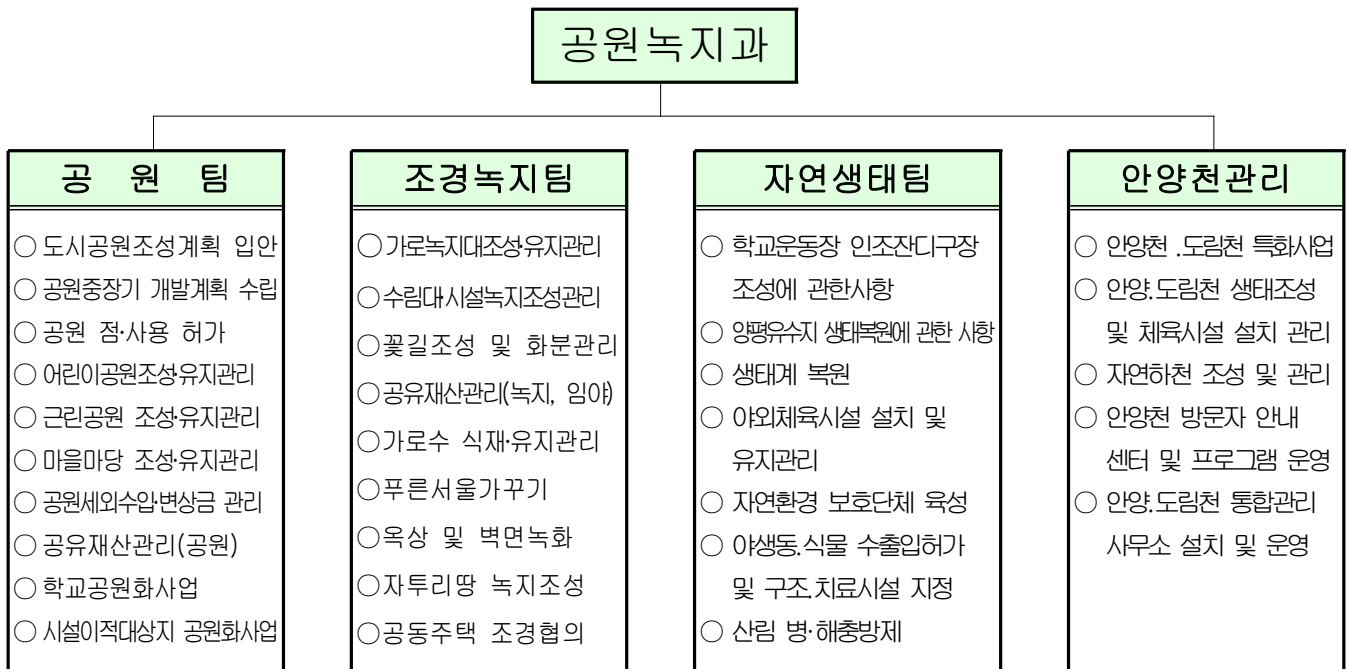

## 3 주요시설 및 장비

구 분	도 시 공 원					마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근 름			어린이					
		계	구공원	시공원						
개소수	29	11	7	4	18	23	104	54개 노선	2종	14개소
면 적 (㎡)	597,546.8	543,463.9	141,973.9	401,490	54,082.9	15,825.7	488,814	15,976 주	2주	16종 158점

**4 예산 현황**

**예산 현액**

(단위 : 천원)

구분	예산현액 (①+②)	①예산액		②이월액		비고
		당초예산	추경등	명시	사고	
계	13,048,231	8,732,751	1,479,812	1,566,808	1,268,860	
일반회계	13,048,231	8,732,751	1,479,812	1,566,808	1,268,860	
특별회계						
기금						


**집행 예상액**

(단위 : 천원)

구분	①예산현액	②집행액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집행액	집행예정액		
계	13,048,231	9,480,993	2,545,238	212,000	810,000
일반회계	13,048,231	9,480,993	1,890,430	212,000	810,000
특별회계					
기금					

## II. 사업추진 개요

**미션** 깨끗하고 푸른 녹색 도시

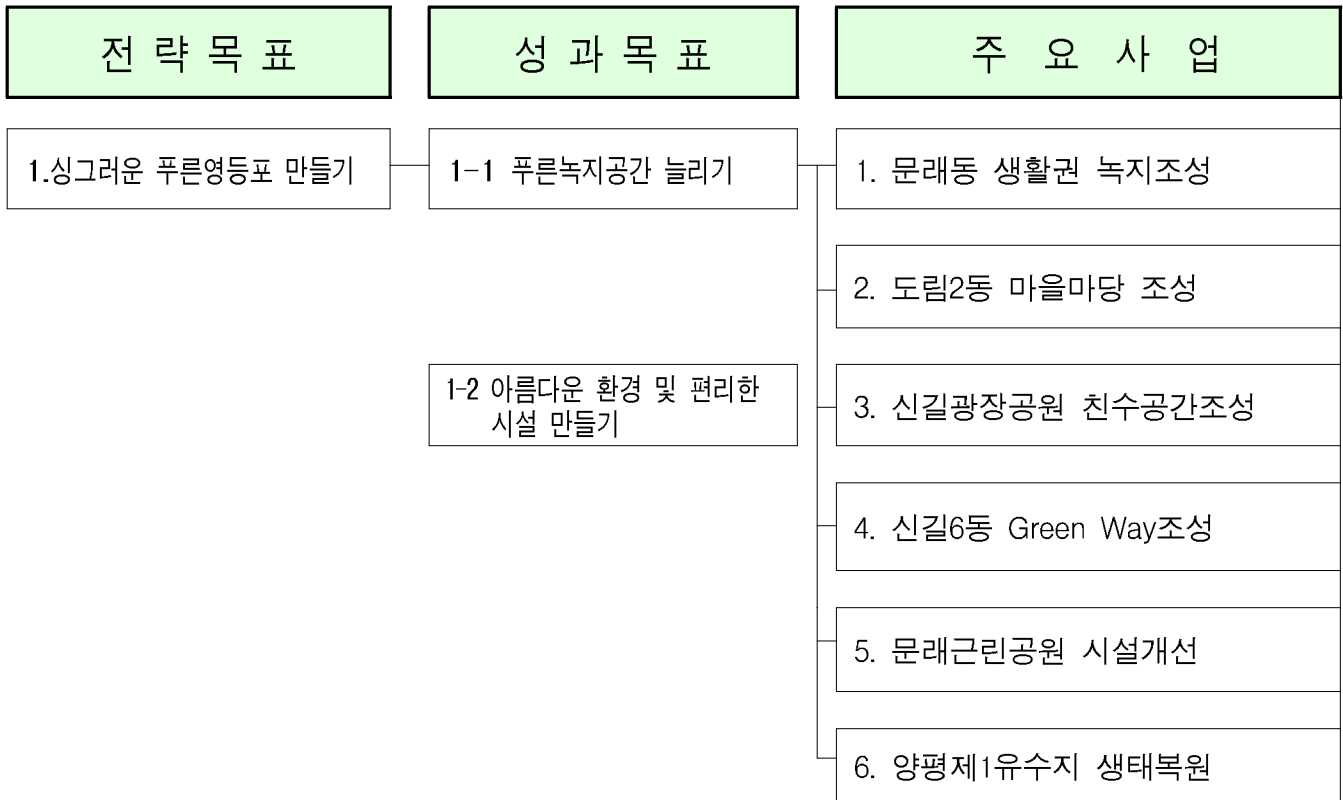

### 주요사업 추진 총괄

(단위 : 건)

구분	대상사업			추진 실적					
	당초 사업	2006년 이월사업	2007년 추가사업	계	완료 사업	추진중 사업	2008년 이월사업	취소 및 불가사업	기타
계	23	2	3	28	10	15	3	-	

### Ⅲ. 2007 사업추진 실적

#### 추진 현황

(단위 : 건)

구 분	계	완료사업	추진중인 사업	2008년 이월대상	취소(불가)사업
팀 별 계	28	10	15	3	
공 원 팀	10	5	5		
조경녹지팀	12	1	9	2	
자연생태팀	5	3	1	1	
안양천관리	1	1			

#### 완료사업 : 10 건

연 번	팀 별	사 업 명	예 산 액	집 행 액	비 고
합 계			2,192,000	2,078,039	
1	공 원	어린이공원 현대화	600,000	590,767	
2	공 원	공원시설물 정비	310,000	260,000	
3	공 원	마을마당 조성	100,000	100,000	
4	공 원	공원등(전기시설물) 개량	30,000	30,000	
5	공 원	공원화장실 리모델링	100,000	100,000	
6	조경녹지	왕벚나무 수세회복	50,000	44,272	
7	자연생태	마을단위 생활체육시설 설치	100,000	85,000	
8	"	현대식 화장실 설치	100,000	95,000	
9	"	학교운동장 인조잔디 조성	550,000	521,000	
10	안양천관리	안양천 생태운영센터 건립	252,000	252,000	이월사업

## 완료사업 내역

### 1. 어린이공원 현대화(구비)

#### □ 사업개요

- 위 치 : 2개소(여의도동 50-3 자유공원, 당산2동 6가10 강마을)
- 규 모 : 8,714m<sup>2</sup> (자유 5,385 / 강마을 3,329)
- 사업기간 : 2007. 5. 16 ~ 7. 14

#### □ 추진실적

- 수목식재 : 느티나무 등 11종 8,455주(교목35 / 관목 8,420)
- 시 설 물 : 조합놀이대, 파고라 등 10종 설치
- 예 산 액 : 600백만원 (집행액 : 591)

### 2. 공원시설물 정비(구비)

#### □ 사업개요

- 위 치 : 양남공원 등14개소, 109,991m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2007. 5. 31 ~ 7. 19

#### □ 추진실적

- 시 설 물 : 조합놀이대, 평의자, 고무블럭 등 17종 설치
- 예 산 액 : 310백만원 (집행액 : 260)

### 3. 공원 등(전기시설물) 개량(구비)

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 여의도동 50-3번지 자유공원외 1개소
- 사업규모 : 자유공원(공원등 15개소), 평화공원(공원등 8개소)
- 사업기간 : 2007. 5. 28 ~ 7. 26

#### □ 추진실적

- 공원등 23개소 개량 및 전기시설물 보완
- 예 산 액 : 30백만원 (집행액 : 30백만원)

## 4. 마을마당 조성(구비)

### □ 사업개요

- 위치 및 면적 : 영등포구 신길6동 4302번지, 183㎡
- 사업기간 : 2007. 4. 21 ~ 6. 19

### □ 추진실적

- 식재공사 : 소나무 등 교목 69주, 관목 1,090주
- 시설물공사 : 원형의자 등 4종시설, 목재데크 등 4종 포장
- 예산액 : 100백만원, (집행액 : 100)



## 5. 공원화장실 리모델링(구비)

### □ 사업개요

- 위 치 : 대림동 690번지(원지공원), 대림동 657번지(신우공원)
- 사업기간 : 2007. 5. 4 ~ 7. 2

### □ 추진실적

- 내 용 : 내부보수, 외부 마감보수, 스라브 보수·보강공사  
대·소변기 설치, 옥상 물탱크실 보수 및 설치
- 예산액 : 100백만원(집행액 : 100)





## 6. 왕벚나무 수세회복(구비)

### □ 사업개요

- 대 상 지 : 4개소(여의동·서로, 안양천변, 신길6동 벚꽃길, 도림동 고가주변)
- 사업내용 : 병해충 종합방제 2,805주, 외과수술 등
- 사업기간 : 2007. 2. 28 ~ 9. 19

### □ 추진실적

- 병해충 종합방제 2,805주, 외과수술 등
- 사 업 비 : 50백만원(집행액 : 44)



## 7. 마을단위 생활체육시설 설치(구비)

### □ 사업개요

- 위 치 : 3개소(대방천체련장, 메낙골공원, 양평동체련장)
- 사업기간 : 2007. 5. 22 ~ 6. 20

### □ 추진실적

- 신형 운동기구 11종 37점 설치
- 예산액 : 100백만원 (집행액 : 85)




## 8. 현대식 화장실 설치(구비)

### □ 사업개요

- 위 치 : 2개소( 안양천 문래동 1개소, 양평동 1개소)
- 사업기간 : 2007. 5. 28 ~ 6. 10

### □ 추진실적

- 현대식화장실 2기 설치
- 예산액 : 100백만원 (집행액: 95)

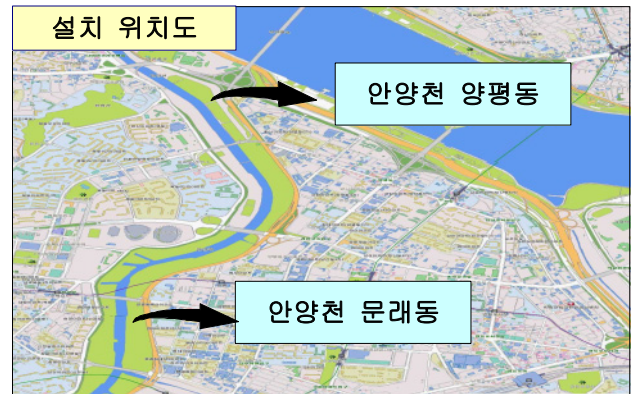

## 9. 학교운동장 인조잔디 조성(구비)

### □ 사업개요

- 위치 및 면적 : 문래1동 영등포초등학교, 6,174m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2007. 8. 7 ~ 9. 28

### □ 추진실적

- 인조잔디조성, 트랙조성, 점토블럭 포장, 고무칩 포장
- 예산액 : 550백만원 (집행액 : 521)




## 10. 안양천 생태운영센터 건립(구비)

### □ 사업개요

- 위 치 : 안양천 오목교 주변 제방상단
- 규 모 : 철근골조 지상1층, 건축면적:105m<sup>2</sup>
- 공사기간 : 2007. 6. 3 ~ 10. 31

### □ 추진실적

- 자연생태교실, 관리사무실, 인부대기실 ('07.11.12준공예정)
- 예산액 : 252백만원(사고이월, 집행액 : 252)

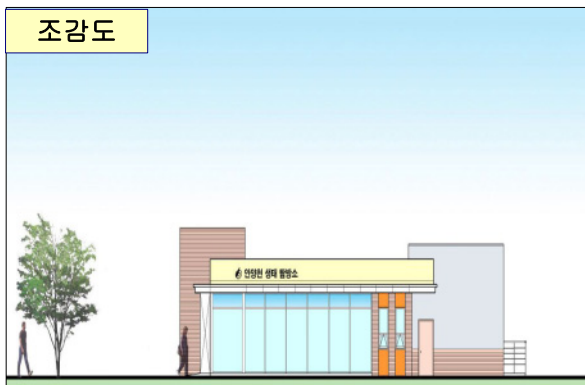

## 추진중인 사업 : 15 건

연번	팀 별	사 업 명	예산액	집행액	비고
합계			15,521,922	10,940,137	
1	공 원	마을마당 조성	100,000	5,000	구비
2	“	2007 학교공원화	1,000,000	46,034	시비
3	”	문래동 생활권 녹지조성	7,500,000	7,123,607	시.구비
4	”	당산근린공원 시설 개선	1,351,500	360,712	구비
5	”	문래근린공원 시설 개선	2,000,000	540,820	구비
6	조경녹지	꽃담 마을마당 토지보상	700,000	700,000	구비
7	”	신길광장공원 친수공간 조성	632,351	545,971	시비
8	”	여의대로 중앙분리 녹지대 정비	591,388	491,114	시비
9	”	양평 가로녹지 정비	446,112	382,850	시비
10	”	순국용사 위령탑 녹지 정비	100,000	5,210	시비
11	”	가로수 전지	130,000	67,916	구비
12	”	도시구조물 벽면녹화	37,000	32,362	시비
13	”	2007 아파트 열린녹지 조성	597,000	484,081	시비
14	”	자투리땅 녹화	335,000	153,860	구.시비
15	자연생태	양평제1유수지 생태복원	1,571	600	시비

## 추진중인 사업 내역

### 1. 도림2동 마을마당 조성(구비)

- 위치 및 면적 : 영등포구 도림2동 154-4번지의 2필지, 111m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2007. 9. 13 ~ 11. 11
- 사업내역 : 수목식재, 포장, 의자, 정자 등
- 공 정 율 : 40%(지장물 철거, 녹지조성, 포장, 휴식시설 등)
- 예 산 액 : 100백만원(집행액 : 5)



### 2. 2007 학교공원화(시비)

- 위치 및 규모 : 5개 학교(당산중, 영중초, 영신초, 영문초, 영림초), 8,228m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 12. 21
  - 당산중 : 담장철거 169m, 휴게시설 4종 16점, 녹지조성 1,771m<sup>2</sup>
  - 영중초 : 담장철거 208m, 휴게시설 4종 24점, 녹지조성 996m<sup>2</sup>
  - 영신초 : 담장철거 90m, 옥상녹화 270m<sup>2</sup>, 휴게시설 8종 13점
  - 영문초 : 옥상녹화 416m<sup>2</sup>, 휴게시설 7종 16점
  - 영림초 : 담장철거 44m, 휴게시설 7종 11점, 녹지조성 848m<sup>2</sup>
- 사업실적
  - 2007. 09. 17 : 당산중 공사 착공(공정율:20%) ※ 11.25 준공
  - 2007. 10. 08 : 영신초 공사 착공(공정율:10%) ※ 12.21 준공
  - 2007. 10. 11 : 영문초 공사 착공(공정율:10%) ※ 12.19 준공
  - 2007. 10. 12 : 영중초 공사 착공(공정율: 5%) ※ 12.20 준공
- 예 산 액 : 1,000백만원 (집행액 : 46)



## 5. 문래근린공원 시설 개선(구비)

- 위치 및 규모 : 영등포구 문래동 3가 66번지 일대, 23,661m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2006. 9 ~ 2008. 1. 2
- 공 정 율 : 85% (소나무동산,운동기구 8조, 벤치17개,막구조파고라,정자 등)
- 예 산 액 : 2,000 백만원 (집행액 : 541 )
- 향후계획 : 생태방지 및 개울, 물레조형물, 공원등, 수목식재, 체육시설 등



## 6. 꽃담 마을마당 토지보상(구비)

- 위치 및 규모 : 영등포구 당산동5가 4-23, 2,582.3m<sup>2</sup>
- 사 업 기 간 : 2005. 6 ~ 2008. 12
- 총 사 업 비 : 7,400백만원 (현재 보상율 62%)
- 2007 예산액 : 700백만원 (집행액 : 700)
- 향후 추진계획 : 2008년 토지보상 잔여분 지급( 2,812백만원)



## 7. 신길광장공원 친수공간 조성(시비)

- 대 상 지 : 신길5동 431-28 (구민체육센터 앞 신길광장공원)
- 사업내용 : 소나무(장송) 식재 및 조형분수 설치
- 사업기간 : 2007. 2. 12 ~ 11. 20
- 사 업 비 : 632백만원 (집행액 : 522)
- 공 정 율 : 80%(수목이식 및 식재, 분수구체 및 조형물설치 완료)

## 8. 여의대로 중앙분리 녹지대 정비(시비)

- 대 상 지 : 여의도동 2-11 (여의대로)
- 사업내용 : 수목식재(16,061주) 및 화강경계석 교체(1,325m) 등
- 사업기간 : 2007. 2. 13 ~ 11. 24
- 사 업 비 : 591백만원 (집행액 : 458)
- 공 정 율 : 50% (화강경계석 및 빗물받이 설치, 식재기반 조성 완료)

## 9. 양평 가로녹지대 정비(시비)

- 대 상 지 : 양평동 1-1일대 (양평동 노들길옆 가로녹지)
- 사업내용 : 수목식재(16,061주), 파고라 시설물 정비,  
산책로 정비(자연토복층포장) 등
- 사업기간 : 2007. 2. 13 ~ 12. 13
- 사 업 비 : 446백만원 (집행액 : 383)
- 공 정 율 : 20% (지장물 및 산책로 투수콘 철거 완료)

## 10. 신길동 순국용사 위령탑 주변 녹지 정비(시비)

- 대 상 지 : 신길동 20-4 일대 (신길동 노들길옆 가로녹지)
- 사업내용 : 잔디블럭포장, 위령탑 도색, 시설물 정비 등
- 사업기간 : 2007. 7. 13 ~ 12. 10
- 사 업 비 : 100백만원 (집행액 : 5, 실시설계 완료)
- 향후 추진계획
  - 2007.10.29 : 공사발주 및 시행
  - 2007.12.10 : 공사준공 예정



## 11. 가로수 전지(구비)

- 대 상 지 : 양평동 가로공원, 양화동 녹지대, 양평로, 여의도(목화아파트~여의도고등학교)
- 사업내용 : 버즘나무 등 2종 540주 전지
- 사업기간 : 2007. 1. 26 ~ 12월
- 사 업 비 : 130백만원 (집행액 : 68)
- 공 정 율 : 50% (1차 사업 완료)
- 향후 추진계획
  - 2007.11. 1 : 2차 전지공사 현장조사 및 설계
  - 2007.11.20 : 2차 전지공사 발주 및 시행

## 12. 2007 도시구조물 벽면녹화(시비)

- 대 상 지 : 2개소 (대림1동 929-1, 문래동 4-1번지)
- 사업내용 : 벽면녹화 140.2m
- 사업기간 : 2007. 5. 21 ~ 12월
- 사 업 비 : 92백만원 (집행액 : 32)
- 공 정 율 : 50% (1차사업 조성완료)
- 향후 추진계획 : 2007.10.29 일상감사 후 공사발주 및 시행

## 13. 2007 아파트 열린녹지 조성(시비)

- 대 상 지 : 양평동 동양아파트 외 3개소  
(문래2동 현대5차아파트, 당산2동 한강아파트, 문래2동 베어스타운)
- 사업내용 : 담장철거 및 녹지조성 3,250m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2007. 3. 2 ~ 12. 6
- 사 업 비 : 597백만원 (집행액 : 484)
- 공 정 율 : 15% (담장철거, 식재기반 조성)



## 14. 자투리땅 녹화(구.시비)

- 대 상 지 : 대림삼거리 등 교통섬 5개소(1차) - 완료  
신풍역 앞 녹지대 등 9개소(2차) - 진행중
- 사업내용 : 수목색재, 점토블럭포장, 사각정자 등 시설물 정비
- 사업기간 : 2007. 1. 22 ~ 12. 10
- 사 업 비 : 335백만원 (집행액 : 154)
- 공 정 율 : 50% (1차사업 조성 완료)
- 향후계획 : 2007.11.1 2차사업 계약 및 착공

## 15. 양평제1유수지 생태복원(시비)

- 위 치 : 영등포구 양평동 3가 57번지
- 조성면적 : 면적 32,236m<sup>2</sup> (복개구간 포함 면적 : 52,000m<sup>2</sup>)
- 공사기간 : 2007. 2. 28 ~ 2007. 11. 20
- 사업내용 : 도수로정비, 생태복원, 연못조성, 관찰데크설치 등
- 추진실적 : 공정률 70% (쉼터, 관찰데크, 연못, 도수로 조성)
- 예 산 액 : 1,571백만원 (시비)
- 향후계획 : 숙근초 및 습지식물 식재, 안내판 설치 등



## 2008년 이월대상 : 3 건

연번	팀 별	사 업 명	예산액	집행액	비고
합계			3,162,000	14,276	
1	조경녹지	아파트 열린녹지 조성	400,000	14,276	시비
2	“	신길6동 Green Way 조성	1,500,000	-	시비
3	자연생태	대림운동장재정비	1,262,000	-	국비 시비 구비

## 2008년 이월대상 사업 내역

### 1. 아파트 열린녹지 조성

아파트 담장을 허문 후 단지내 녹지를 개방하여 인근 주민에게 휴식처 제공 및 가로 녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 쾌적한 환경을 조성하여 구민의 삶의 질 향상에 기여

#### □ 사업개요

- 대상지 : 2개소(양평동 벽산아파트, 문래2동 현대2차아파트)
- 사업내용 : 담장철거 및 녹지조성 3,540m<sup>2</sup>

#### □ 추진경위

- 2007.8.24 : 서울시 사업계획 시달 및 설계비 배정
- 2007.8.24 : 벽산아파트 외 1개소 열린녹지 조성사업 추진계획 수립

#### □ 추진실적

- 2007.8.27~9.6 : 기술용역 타당성 검토
- 2007.10.4~11.2 : 실시설계용역 시행

#### □ 예산액 및 집행액

- 사업비 : 400백만원(시비)
  - 실시설계용역 : 14백만원

#### □ 이월사유 및 대책

- 시 추경예산의 확보된 사업으로 배정 지연에 따른 동절기 수목식재 부  
적정으로 공사시기 조정
- 공사시행 : 2007. 12~2008. 4

## 2. 신길6동 Green Way 조성

차량 위주의 도로를 보행자 중심의 도시구조로 개선하고 녹지량  
확충함으로써 가로경관 향상 및 쾌적한 보행환경 제공

### □ 사업개요

- 대 상 지 : 영등포구 신길6동 4561-1호 일대
- 사 업 내 용
  - 식 재 공 사 : 왕벚나무 등 20종
  - 시설물공사 : 벽천 설치 등 10종
  - 기 타 공 사 : 담장철거 및 식재기반 조성

### □ 추진경위

- 2007. 4. 2 : 서울시 사업계획 시달 및 설계비 배정

### □ 추진실적

- 2007. 4. 18 : 기술용역타당성심사 결과 통보
- 2007. 5. 22 : 일상감사 통보
- 2007. 5. 23 : 설계용역 발주
- 2007. 7. 26 : 1차 주민설명회
- 2007. 8. 8 : 2차 주민설명회
- 2007. 9. 14 : 교통규제심의위원회 심의결과 통보
- 2007. 9. 27 : 디자인·설계 심의
- 2007.10. 12 : 계약심사 의뢰(서울시)
- 2007.10. 15 : 설계용역 준공

### □ 예산액 및 집행액

- 예산액 : 1,500백만원(시비)
  - 실시설계용역 52백만원, 공사비 1,448백만원

### □ 이월사유 및 대책

- 그동안 용역타당성 심사 등 절차이행에 많은 시일이 소요되어 사고이월 불가피
- 공사시행 : 2007. 12~2008. 6

### 3. 대림운동장 재정비

대림운동장의 시설 노후 및 운동장(마사토)의 비산먼지 발생으로 민원이 계속 제기되어 인조잔디구장 조성 등 시설물을 재정비하여 민원을 해소하고 주민에게 쾌적한 체육·녹지공간으로 제공하고자 함.

#### □ 사업개요

- 용역기간 : 2006. 11. 6 ~ 2007. 10. 30
- 위     치 : 영등포구 대림동 780번지
- 조성면적 : 16,498㎡(4,990평)
- 사업내용 : 인조잔디구장 조성, 관리실·화장실 등 노후시설물 신축, 편익시설 정비 등

#### □ 추진경위 및 실적

- 2007. 2.       : 지하주차장 건설계획과 관련하여 설계용역 중단
- 2007. 8. 28 : 서울시 건설기술심의 (조건부 통과)
- 2007. 9.       : 용역설계 중(현 설계공정 90%)
- 2007. 12.     : 공사발주 예정(2008.12월 완공예정)

#### □ 예산액 및 집행액

#### □ 이월사유 및 대책

- 지하주차장 건설이 선행되어야 하므로 지하주차장 사업과 병행추진을 위해 사고이월 불가피

