

제149회 구의회 임시회

'09.10.23 ~ 11. 2



희망찬 행복도시 살기 좋은 새 영등포

## 2009년도 주요업무 추진현황



# 건설교통국

# 보고 순서

주요 업무	비고
1. 쾌적하고 편리한 가로경관 조성	1쪽
2. 영일시장 주변 정비	2쪽
3. 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진	3쪽
4. 도림로 도로 확장공사	4쪽
5. 영진시장~대신시장간 도로개설공사	6쪽
6. 용호로 및 여의동로 보행환경 개선공사	8쪽
7. 여의도 지하보도 보행환경 개선사업	10쪽
8. 노후 조명시설 개량공사	12쪽
9. 수방대책 추진	13쪽
10. 지역자율방재단 구성	14쪽
11. 도림천 생태하천 복원사업	15쪽
12. 도림1 배수분구 하수관거 종합정비	16쪽
13. 양평1 빗물펌프장 외 1개소 증설	17쪽
14. 불법자동차 단속	18쪽
15. 자전거도로 개설 사업	19쪽
16. 당산 자전거 무료대여소 설치 및 운영	21쪽
17. 어린이보호구역(School Zone) 환경 개선	22쪽
18. 부설주차장 및 학교운동장 야간개방	23쪽
19. 주차질서 확립으로 주민 불편 해소	24쪽
20. 어르신 주차질서 계도활동 사업	25쪽
21. 신길1동 주택가 공영주차장 건설	26쪽
22. Green Parking 사업	27쪽

투 자 사 업	비 고
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 대방천변도로 개설공사</li> <li>2. 신길동 4300-37~4326-2간 도로개설공사</li> <li>3. 대림동 1051-9~810-56간 도로개설공사</li> <li>4. 신길동 227-6~260-3간 도로개설공사</li> <li>5. 포장도로정비등 소파보수공사</li> <li>6. 도로시설물 보수공사 및 장애인 편의시설공사</li> <li>7. 사회적 약자를 위한 도시 환경 개선사업</li> <li>8. 신길동 2045~2075간외 3개소 도로정비사업</li> <li>9. 선유중학교 앞 방음벽개량공사</li> <li>10. 선유고등학교 앞 방음벽설치공사</li> <li>11. 선유도공원 진입로 도로정비공사</li> <li>12. 가로등시설물 정비공사</li> <li>13. 보안등 설치개량 및 유지보수공사</li> <li>14. 여의도 아파트(주거)지역 광원교체공사</li> <li>15. 용호로 가로등 개량공사</li> <li>16. 도림천로 가로등 개량공사</li> <li>17. 여의동로 가로등 개량공사</li> </ol>	28쪽

# 1. 쾌적하고 편리한 가로경관 조성

1

## 현황(개요)

### □ 사업 목표

- 도로 본래 기능 회복 및 시민 통행권 확보
- 신발생 노점 최대 억제 및 발생 즉시 강제수거

□ 정비 대상 : 총 2,096개소(노점상 516, 노상적치물 1,580)

2

## 추진 실적

- 도로법 위반 변상금 및 과태료 부과 (9.30현재)
  - 과태료 : 271건 48백만원
  - 변상금 : 183건 64백만원
- 강제 수거 : 1,060건
  - 노점상 : 1,832건
  - 노상적치물 : 759건
- 대형가로화분 설치 : 소요예산(37백만원)
  - 당산역 주변 : 23개(대형화분8, 소형화분15)
  - 두암어린이공원 주변 : 17개(대형화분)
- 버스승강장 확대설치 : 신세계백화점 건너편(5M → 15M)
- 고발 : 19건
- 안내문 배부 : 8,650매

3

## 향후 계획

- 시민불편 가중지역 노점상 중점 정비
  - 단속지역 : 지하철역, 버스정류장 주변 및 야간 여의도 포장마차 등
- 정비방법
  - 지하철역, 버스정류장 주변 : 매일 정비
  - 야간 포장마차 : 주1회 야간단속 실시
  - 강제정비 노점상은 과태료 부과 및 상습노점상은 고발 조치

## 2. 영일시장 주변 정비

1

### 현황(개요)

#### □ 사업 목표

- 영일시장 및 그 주변 정비를 통한 명품거리 조성

#### □ 정비대상

- SK뷰 ~ 타임스퀘어 간 횡단보도 접한 상가 : 16개소
- 영일시장 및 그 주변 정비 : 63개소

2

### 추진실적

- 1차정비 지역 16개소
  - 보도 폭 확장공사 : 기존 1.5m → 2m ~ 3m
- 2차정비 지역 63개소
  - 매일 정비 인력(단속반 2, 용역 6)상주시켜 지속적 정비

3

### 향후계획

- 정비구간 : 조광시장↔건양병원 앞↔SK뷰 빌딩 앞↔ 경인로
- 정비물량 : 350개소(영일시장 283, 조광시장 67)
- 정비인력 : 8명(공무원 2명, 용역원 6명)
- 정비내용
  - 전담 인력을 상주시켜 지속적으로 정비
  - 이중차광막 자진철거 및 상품적치규모 축소유도(불응시 강제정비)
  - 점포 앞 차양막은 2m이내, 오전9시 이후 보도에 상품적치물 정비
  - 무질서한 주차차량, 쓰레기 적치 등 필요시는 주차문화과, 청소과 합동 단속
  - 시민 불편을 초래하는 상품적치물은 우선적으로 정비

### 3. 공익사업의 효율적 수행을 위한 손실보상 추진

1

#### 현황(개요)

- 대상 사업 : 총 7개사업 (신규사업 4, 계속사업 3)
  - 도로개설 : 영진시장~대신시장 간 도로개설 외 3개소
    - 공원조성 : 신길동 68-3 일대(경부3녹지) 녹지조성 외 1개소
    - 주차장건설 : 신길동 120-82, 120-92(2필지)
- 대상 건수 : 238건 (토지 53, 지장물 67, 영업권 59, 주거이전비 59)
- 사업 예산 : 15,345백만원 (시비 5,760, 구비 9,585)

2

#### 추진 실적(보상완료 3, 협의중 4)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	보상예산	사업규모	보상대상/추진실적	비고
1	대림동 1051-9 ~ 810-56 간 도로개설	445	B: 6m L: 158m	- 토지 : 11/11 - 지장물 : 24/24 - 영업권 : 8/ 8	보상완료
2	꽃담 마을마당 조성	2,312	807.5㎡	- 토지 : 2/2	보상완료
3	영진시장~대신시장 간 도로개설	3,884	B: 15m L: 24m	- 토지 : 6/6 - 지장물 : 5/5	보상완료
4	신길동 227-6 ~ 260-3 간 도로개설	801	B: 8m L: 25m	- 토지 : 1/0 - 지장물 : 2/0	협의공문 발송
5	도림로 확장공사	2,000 (시비)	B: 35m L: 800m	- 토지 : 4/1 - 지장물 : 4/4	수용재결 진행중
6	신길동 68-3 일대 녹지조성	3,760 (시비)	A: 7,912㎡	- 토지 : 28/16 - 지장물 : 25/24 - 영업권 : 51/51 - 주거이전비 : 26/26	수용재결 진행중
7	신길1동 주택가 공영주차장건설	2,143	540㎡ 평면주차장 18면 조성	- 토지 : 2/0 - 지장물 : 7/0	협의공문 발송

3

#### 향후 계획

- 수용재결 중인 2개 사업은 결정에 따라 보상협의 (12월중 보상완료)

## 4. 도림로 도로 확장공사

### 1

#### 현황(개요)

- 목 적 : 신길재정비촉진지구 활성화로 지역 균형발전 및 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소
- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16(신길광장)
- 규 모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350m, 미개설 800m)
  - 특별회계 : 좌측 L=500m(신길재정비촉진지구내)
  - 일반회계 : 우측 L=800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : '09년 ~ '13년
- 총사업비 : 61,070백만원(보상비 56,720 공사비 4,200 설계비 150)
  - 특별회계 : 22,440백만원(보상비 21,440 공사비 1,000)
  - 일반회계 : 38,630백만원(보상비 35,280 공사비 3,200 설계비 150)
- ※ '09 보상비 : 2,000백만원(토지 4필지 275㎡)

### 2

#### 추진실적



- '78.12. 7 : 도시계획시설(도로)결정(건설부고시 제39호)
- 사업추진경위
  - '97~'99년 : 1차공사 완료(도림고가 남단~도림사거리, 연장 350m)
  - '08. 8 : 투·융자심사 요청
  - '08. 9 : 투자심사결과(적정)
  - '09. 3 : 사업인가고시(800m중 300m)
  - '09.10현재 : 보상협의 중

### 3

#### 향후계획

- '09.11말 : 수용 재결 협의 불응시 공탁 예정
- '10. 2 : 보상 및 실시설계 용역 시행
- '11~'13 : 공사 시행

# 위 치 도

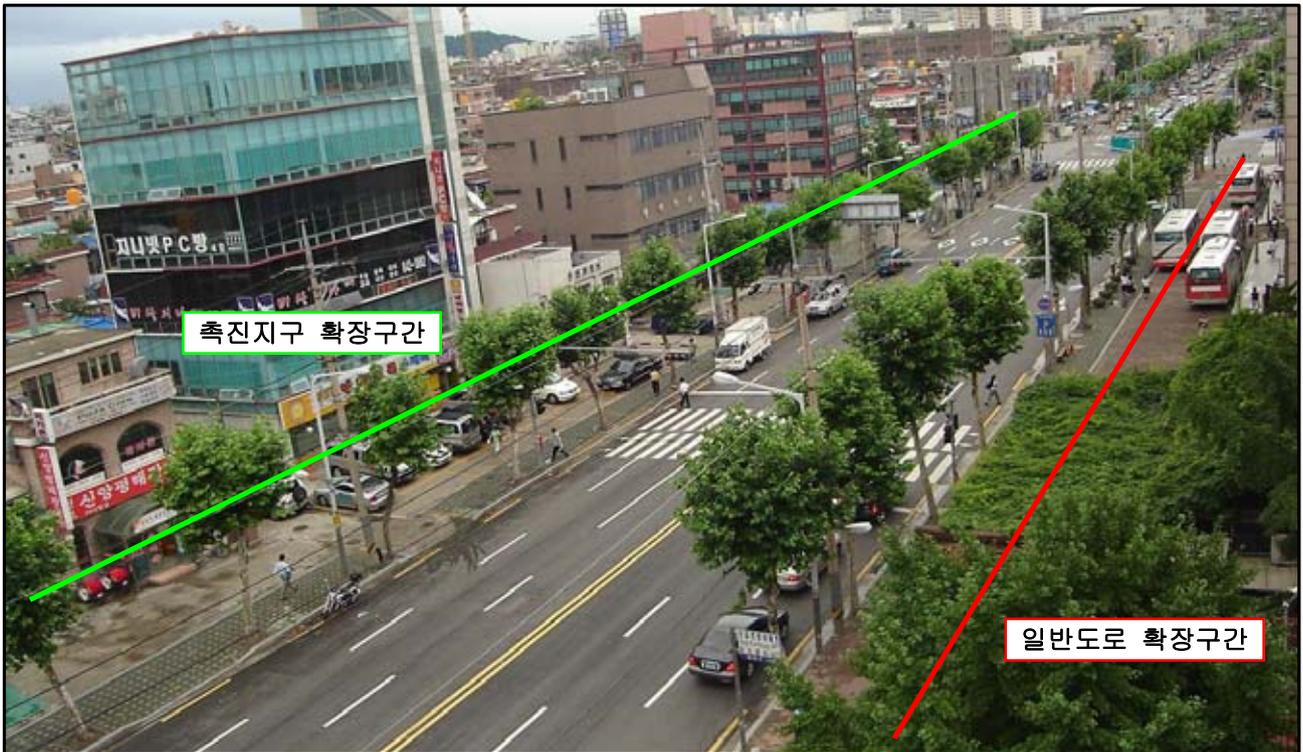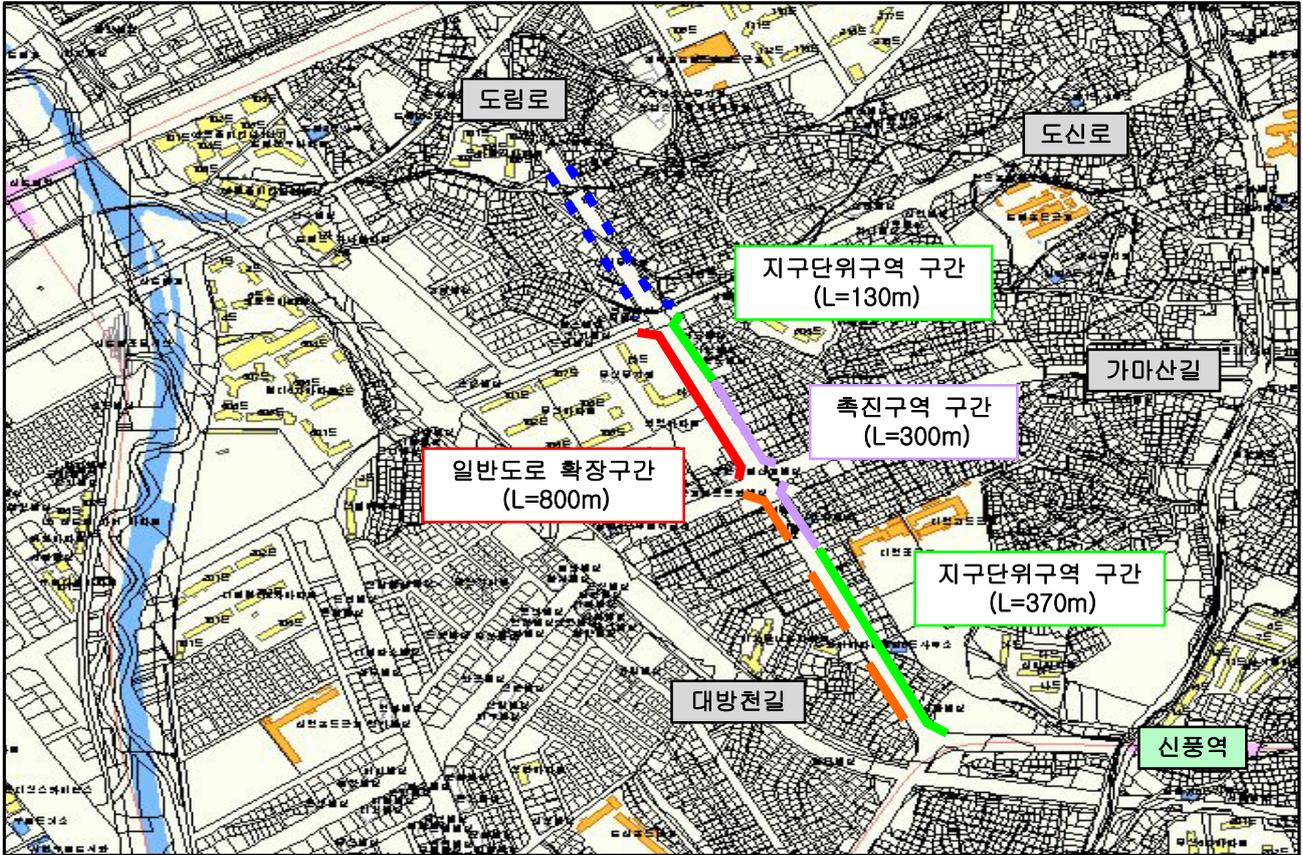

## 5. 영진시장~대신시장간 도로개설공사

1

### 현황(개요)

- 목 적 : '01년이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 완성하여 교통량 분산 및 지역균형발전 활성화
- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(기개설 1,130m, 미개설 140m)
- 사업기간 : '94년 ~ '10년
- 총사업비 : 24,210백만원
  - └ 1구간 : 16,410백만원
  - └ 2구간 : 7,800백만원 (보상비 7,400. 공사비 400)
- ※ '09 보상비 : 3,884백만원(토지 795㎡)

2

### 추진실적

- '36.12.26 : 도시계획시설(도로)결정(조선총독부공시 제722호)
- 사업추진경위
  - '94~'00년 : 일부구간 도로개설 완료(L=820m)
  - '00. 9 : 투자심사결과(적정)
  - '05. 1 ~ '09. 3 : 사업인가고시(미개설구간 450m)
  - '06. 9 : 실시설계용역 완료(미개설구간 450m)
  - '07. 9 : 공사계약(미개설 450m중 310m)
  - '09. 6 : 공사완료(미개설 450m중 310m)
  - '09.10 : 보상 협의중(공탁)



3

### 향후계획

- '10년 : 보상 실시(4,000백만원)
- '10. 12 : 공사 완료 (잔여구간 L=140m)

# 위 치 도

공사명 : 영진시장~대신시장간 도로개설공사

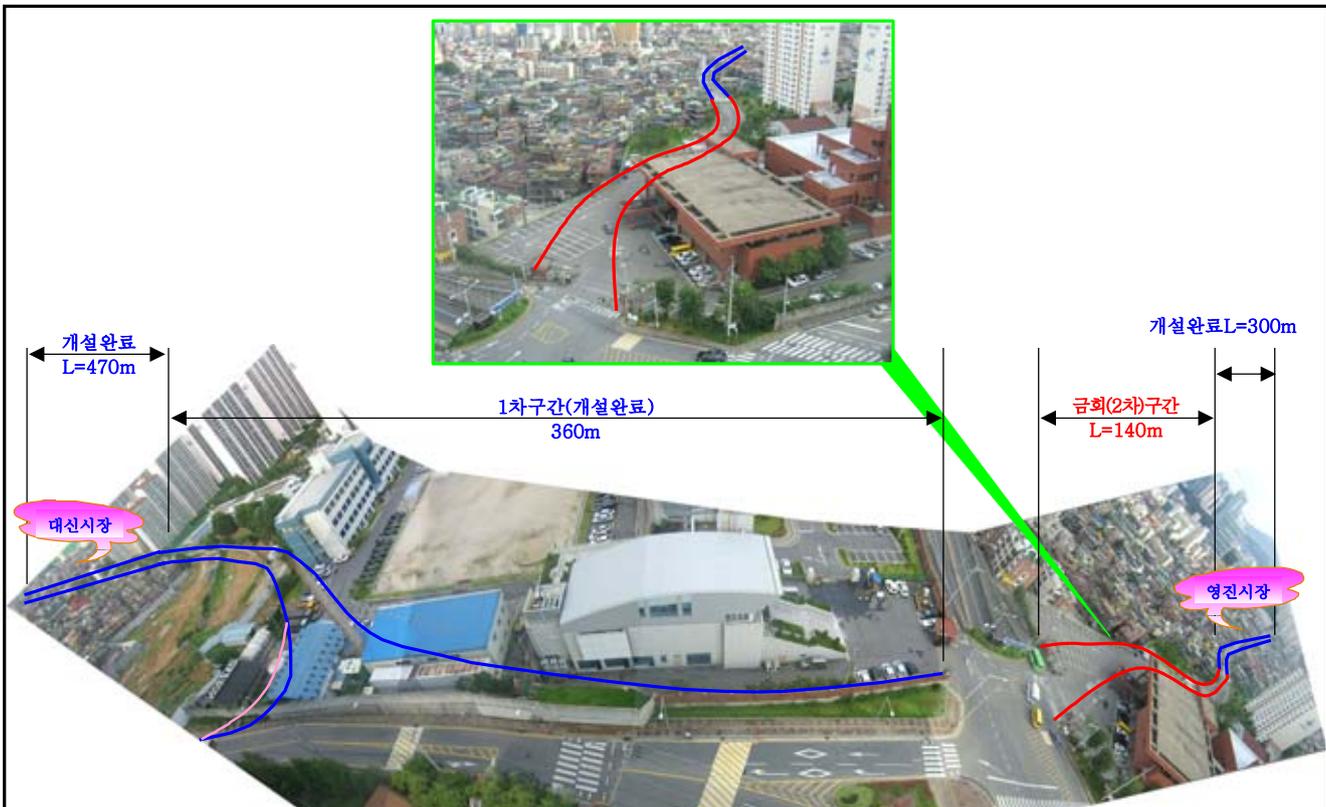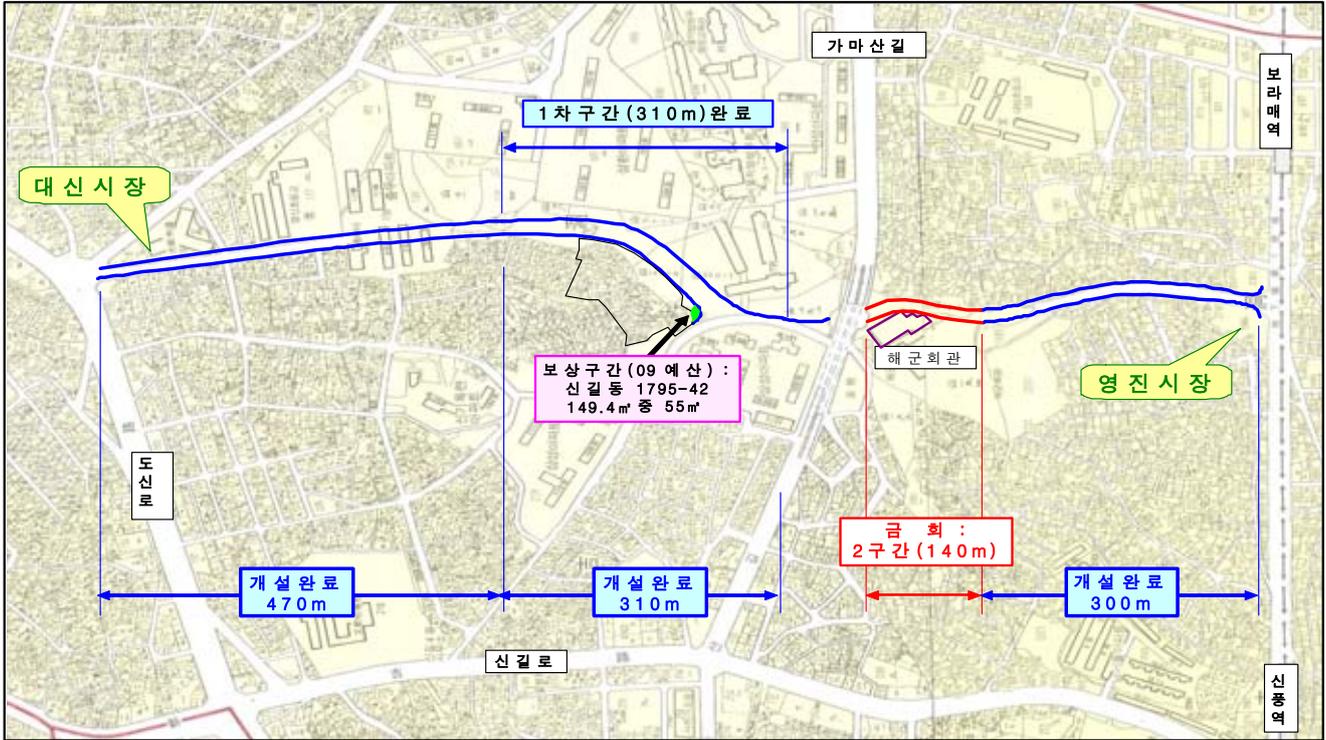

## 6. 용호로 및 여의동로 보행환경 개선공사

1

### 현황(개요)

- 목 적 : 노후화된 기존 보도를 정비하여 보행환경개선 및 도시미관을 제고하고 서울시에서 역점사업으로 추진중인 “서울거리 르네상스사업”과 연계하여 추진
- 사업위치 : 용호로(여의동 56~50-3), 여의동로(여의동 56~62)
- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1,700m
- 사업기간 : '09. 2.2~'09.11.9
- 총사업비 : 1,785백만원(시비 892, 구비 893)

2

### 추진실적

- 실시설계 계약 : '09. 02. 02
- 서울시 디자인심의 : '09. 04. 15
- 실시설계 용역완료 : '09. 04 .30
- 공사 시행 : '09.6.12 ~ '09.11.09


3

### 향후계획

- '09. 10. 31 : 공사준공 예정(현공정율 95%)

# 위 치 도

▶ 공사명 : 용호로 및 여의동로 보도환경 개선공사

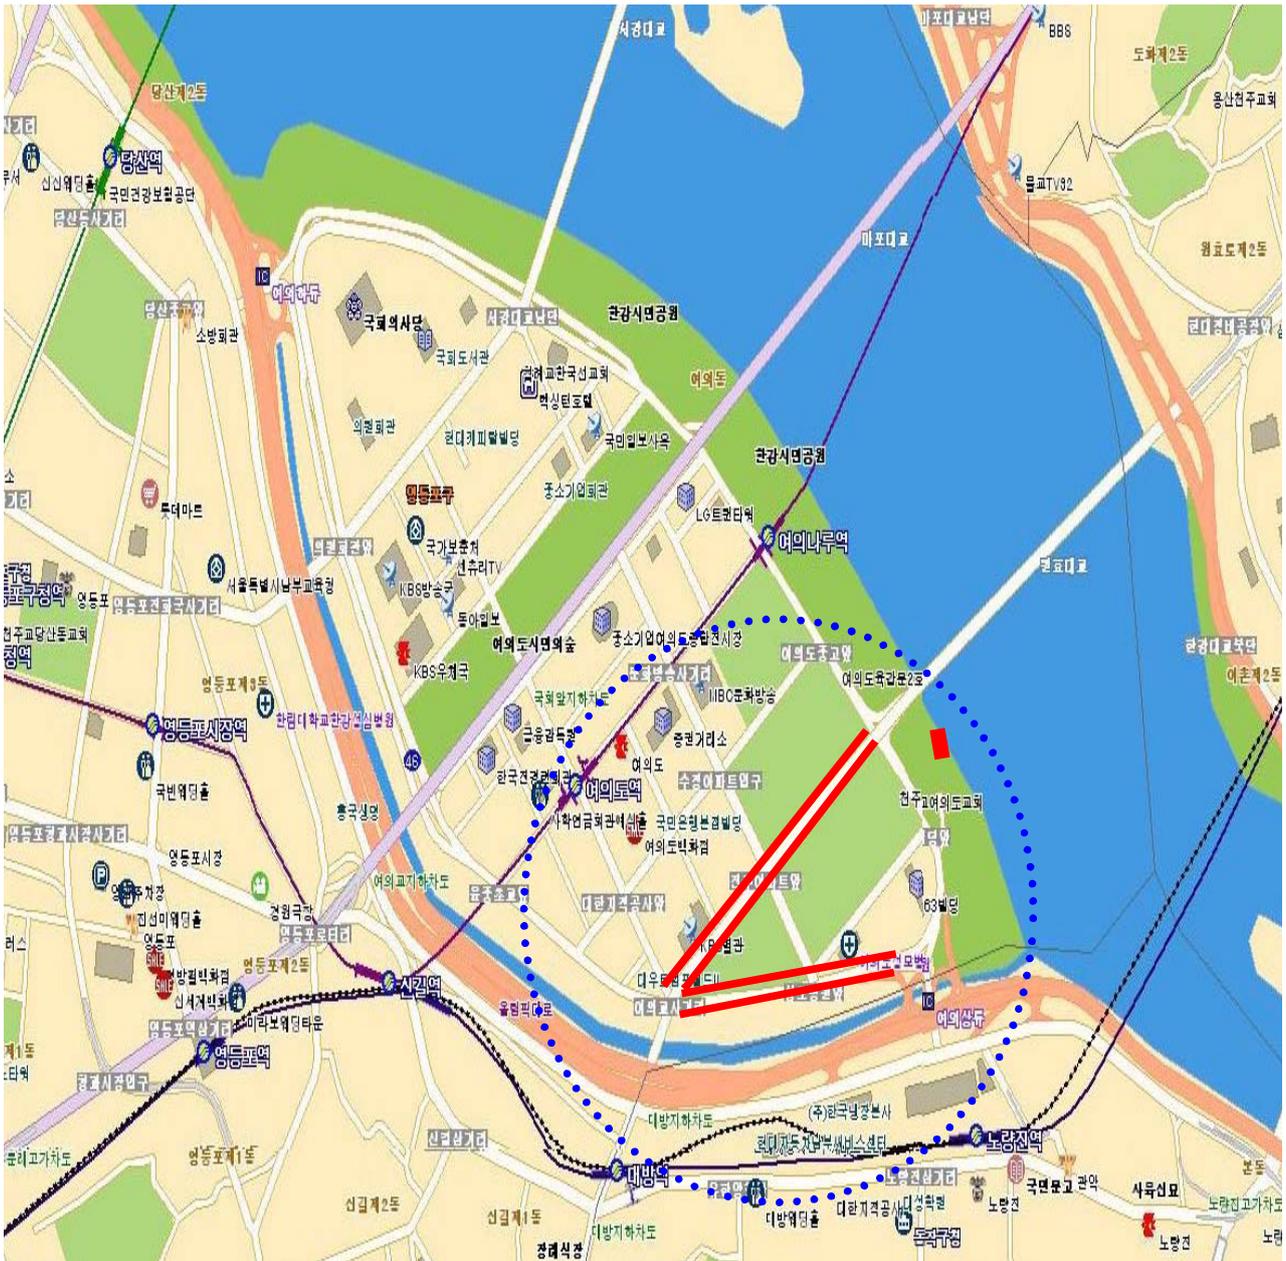

## 7. 여의도 지하보도 보행환경 개선사업

1

### 현황(개요)

- 사업위치 : 여의도 지하보도 3개소(여의초교 앞, 원효대교 앞, KBS별관 앞)
- 사업규모
  - 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기 설치 2개소
  - 지하보도 환경개선 1개소(바닥타일교체 A=160m<sup>2</sup>, 벽면타일교체 A=600m<sup>2</sup>, 천정판 교체 A=250m<sup>2</sup>, 계단보수 150m<sup>2</sup>, 캐노피교체 N=2개소)
- 사업기간 : '08. 3.~'10.10
- 총사업비 : 995백만원

2

### 추진실적

- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구분		계	2008	2009	2010	비고
추진 내용	실시설계용역	45	45			
	원효대교앞 지하보도	400		400		
	KBS별관앞 지하보도					
	여의초교앞 지하보도	550			550	
총사업비		995	45	400	550	

- 추진실적
  - 지하보도 폐쇄 : 2개소(원효대교앞, KBS별관앞) - 출입구 12개소
  - 총사업비 : 400백만원

3

### 향후계획

- '10. 1 : 공사발주(여의초교앞)
- '10. 3 : 공사착수('10. 10월 준공예정)

# 위 치 도

공사명 : 여의도 지하보도 보행환경 개선사업



## 8. 노후 조명시설 개량공사

1

### 현황(개요)

- 목 적 : 노후 가로등 개량으로 전기안전사고 예방과 밝고 쾌적한 도로 환경 개선
- 사업규모
  - 가로등 개량 250등 (도림천로99, 용호로55, 여의동로 96)
  - 여의도 주거지역 광원교체 132등
- 사업기간 : '09. 3 ~ '09. 10
- 총사업비 : 1,446백만원(시비 1,385. 구비 61)

2

### 추진실적

- '09.05 : 여의도 주거지역 광원교체 완료(100%)
- '09.09 : 도림천로 가로등 개량공사 (100%)

3

### 향후계획

- '09.10 : 용호로 및 여의동로 가로등 개량완료 예정(95%)

## 9. 수방대책 추진

최근 지구온난화 등에 따른 기상이변에, 효율적으로 대처하고 지역주민 스스로 대비할 수 있도록 홍보에 역점을 두어 수방대책을 사전 준비하여 자연 재해 걱정없는 영등포 건설에 기여코자 함.

### 1

#### 추진 방향

- 수방시설물 사전 점검·정비
- 수방자재 확보 및 저지대 침수지역 모래주머니 배치
- 주민 자발적 침수피해 예방지원
- 대시민 홍보시스템 강화

### 2

#### 추진 실적

- 저지대 및 지하주택 특별대책
  - 하수역류방지시설 설치 : 50세대(10월 현재)
  - 지하주택 사전대비 홍보 : 15회 / 4,100명
  - 수방용 모래주머니 배치 : 72개소 / 50,000매
- 수방시설 및 공사장 정비
  - 양평1빗물펌프장 외 1개소 증설
  - 하수시설 준설 및 하수관 개량
    - 하수관 개량 5,000m, 준설 5,200 $m^3$ , 빗물받이 준설 21,238개소
  - 하천시설물 정비 : 저수호안 291 $m^2$ , 하천시설물 정비 등
- 빗물펌프장 수문시설 보수·보강

### 3

#### 향후 계획

- 비 우기 수방대책 : 우기시 수방기간과 동일하게 상황실운영(10.16~11.15)

## 10. 지역자율방재단 구성

날로 대형화·복잡화 되어가는 자연재난을 행정의 역량만으로 대처하기에는 한계가 있으므로, 민간 전문 조직으로서의 지역자율방재단을 구성하여 재난에 상시 대처함으로써 안전하고 살기좋은 영등포 구현.

### 1

#### 개 요

- 방재단의 주요 임무 : 재난예찰, 재난복구, 이재민 구호활동 등
- 모집 예정인원 : 700명 (일반 540, 전문가 160)

### 2

#### 추진실적

- 지역자율방재단 조례제정 : '09. 6. 18
- 지역자율방재단원 모집 : '09. 9. 11 ~ 10. 31
  - 접수처 : 동 주민센터, 치수방재과
- 구 홈페이지, 현수막, 지역신문 등 홍보

### 3

#### 향후계획

- '09.11. 1~11.10 : 동 방재단 총회(대표선출)
- '09.11.11~11.20 : 구 방재단 임원선출 및 지역자율방재협의회 구성
- '10. 1월중 : 구 방재단 발대식

## 11. 도림천 생태하천 복원사업

건천화 되어가는 도림천을 친환경적인 자연하천으로 복원하여 주민들에게 자연생태가 살아있는 휴식공간 조성.

### 1

#### 개 요

- 위 치 : 구로디지털단지 ~ 안양천 합류부
- 규 모
  - 제방보축 : L=308m(H=0.3~2m)
  - 저수호안 정비 : L=4km
  - 자전거 및 산책로 조성 : L=3,788m
  - 쉼터 3개소, 진입로 2개소, 체육시설 등 설치
- 사업기간 : '08. 3. ~ '10. 5.
- 총사업비 : 7,192백만원(시비5,678 / 구비1,514)

### 2

#### 추진실적

- '06. 9 : 친환경적인 생태하천 복원계획 수립(서울시)
- '06.12 ~ '07.10 : 도림천 하천정비 설계용역(서울시)
- '08.10 : 공사착공
- '09.10 현재(공정율 : 80%)
  - 저수호안 L=4km 완료  
(조경석 쌓기 2,987m, 옹벽블럭 130m, 갈대매트 250m 설치 등)
  - 산책로(신설) 및 자전거도로 : 3,776m 완료

### 3

#### 향후계획

- '09. 10. ~ '10. 5. : 공사시행 및 준공

## 12. 도림1 배수분구 하수관거 종합정비

노후 하수관거의 구간별 단위개량사업만으로는 하수관거의 기능유지에 어려움이 있으므로 대단위의 배수분구별 종합계획을 수립 정비함으로서, 수해예방과 잦은 굴착으로 인한 주민불편 최소화

1

개 요

- 위 치 : 영등포구 대림1·2·3동, 동작구 신대방1동 지역
- 규 모
  - 면 적 : 3.24 $km^2$  (영등포구 2.71 / 동작구 0.53)
  - 하수관개량 : 41,350m(영등포구 33,810 / 동작구 7,540)
- 사업기간 : '09. 1 ~ '12. 12 (4년간)
- 총사업비 : 52,100백만원 (설계비 2,100 / 공사비 48,000 / 감리비 2,000)

2

추진실적

- '08. 7.31 : 하수관거 종합정비사업 추진계획 제출 (구 → 시)
- '08.10.23 : 서울시 기술용역 타당성 심사 (심사결과 : 적정)
- '08.10.27 : 서울시 예산투자심사 (심사결과 : 적정)
- '08.12.24 : 건설기술심의 (심사결과 : 적정)
- '09. 1 ~ '09. 11 : 실시설계용역 시행(현공정 95%)

3

향후계획

- '09. 11. : 설계완료
- '10. 1 ~ '12. 12 : 공사시행 (연차별 시행)

## 13. 양평1 빗물펌프장 외 1개소 증설

『기상이변을 대비한 빗물펌프장 수방대처능력 향상』을 위해 빗물펌프장의 용량을 증설하여 집중호우 시 침수피해 최소화.

### 1

### 개 요

- 위 치 : 양평동3가 57(양평1 펌프장), 도림동254(도림2동펌프장)
- 규 모(펌프장 용량증대)
  - 양평1 펌프장 : 2,424 → 4,080 $m^3$ /분(증 1,656 $m^3$ /분)
  - 도림2동펌프장 : 1,301 → 1,745 $m^3$ /분(증 444 $m^3$ /분)
- 사업기간 : '07. 12. ~ '10. 9.
- 총사업비 : 24,023백만원(설계비 723 / 감리비 1,100 / 공사비 22,200)

### 2

### 추진실적

- '07. 4 ~ 10 : 기상이변을 대비한 빗물펌프장 수방대처능력 향상을 위한 기본계획용역 시행(서울시)
- '07.12~'08.8 : 기본 및 실시설계용역 시행
- '09. 1 : 공사착공
- '09.10 현재(공정율 : 양평1펌프장 49%, 도림2동펌프장 11%)
  - 양평1 펌프장 : 토출관 D=2,000 $mm$  @3열(L=78m) 완료  
기존펌프동 1층(389 $m^2$ ) 완료, 2층 공사중
  - 도림2동펌프장 : 토출관 D=1,500 $mm$ (L=30m) 완료  
기존 펌프동 리모델링 완료

### 3

### 향후계획

- '09. 10 ~ '10. 9 : 공사시행 및 준공

## 14. 불법자동차 단속

1

### 현황(개요)

- 단속기간 : 2009. 1. 1 ~ 12. 31
  - ※ 설날, 추석연휴 기간은 별도로 특별대책 수립 실시
- 전담단속반 운영 : 기능직3명
- 단속시간
  - 주 간 : 07:00 ~ 18:00까지
  - 야 간 : 22:00 ~ 익일 01:00까지
  - 밤샘주차 : 24:00 ~ 익일 06:00까지
- 중점단속 대상
  - 택 시 : 승차거부, 호객행위, 합승, 부당요금 징수, 미터기 미사용 등
  - 버 스 : 정류소 무정차 통과, 정류소 질서문란행위, 정류소외 승·하차 등
  - 기 타 : 차고지의 밤샘주차, 불법 구조변경 등
- 중점단속 지역
  - 대 방 역 : 조기 근무자 배치
  - 영등포역, 당산역 주변 및 기타 민원발생 유발지역
- 단속방법
  - 사업용 차량 불법행위 단속과 승차질서 제도 병행 실시
  - 심야시간대 운전자와의 충돌 대비하여 필요시 경찰지원요청

2

### 추진 실적

- 단속실적 : 1,042건
  - 버스 452건, 택시 71, 화물 352건, 기타 167건
- 처리내용 : 과태료 66건, 과징금 81건, 타시군구 이첩 895건

3

### 향후 계획


- 영업용 자동차의 준법의식 고취로 안전사고 예방
- 불법영업행위 근절로 시민 불편사항 해소

# 15. 자전거도로 개설사업(구비+시비)

## 1 사업개요

○ 사업구간 : 4개구간 4.08km

연번	도로명	구 간	연장(m)	주요 경유지
①	양산로	구청별관 → 양평보행육교	1,160	양평역, 구청역(5호선)
②	양평역길 강나라길	양평역 → 신한전기	1,100	양평역, 관악고교
③	한어울길 한전길	영남교회 → 신동아(아)	1,400	영일시장, 양화중학교
④	동아리길	관악고교 → 문래보행육교	400	관악고, 안양천

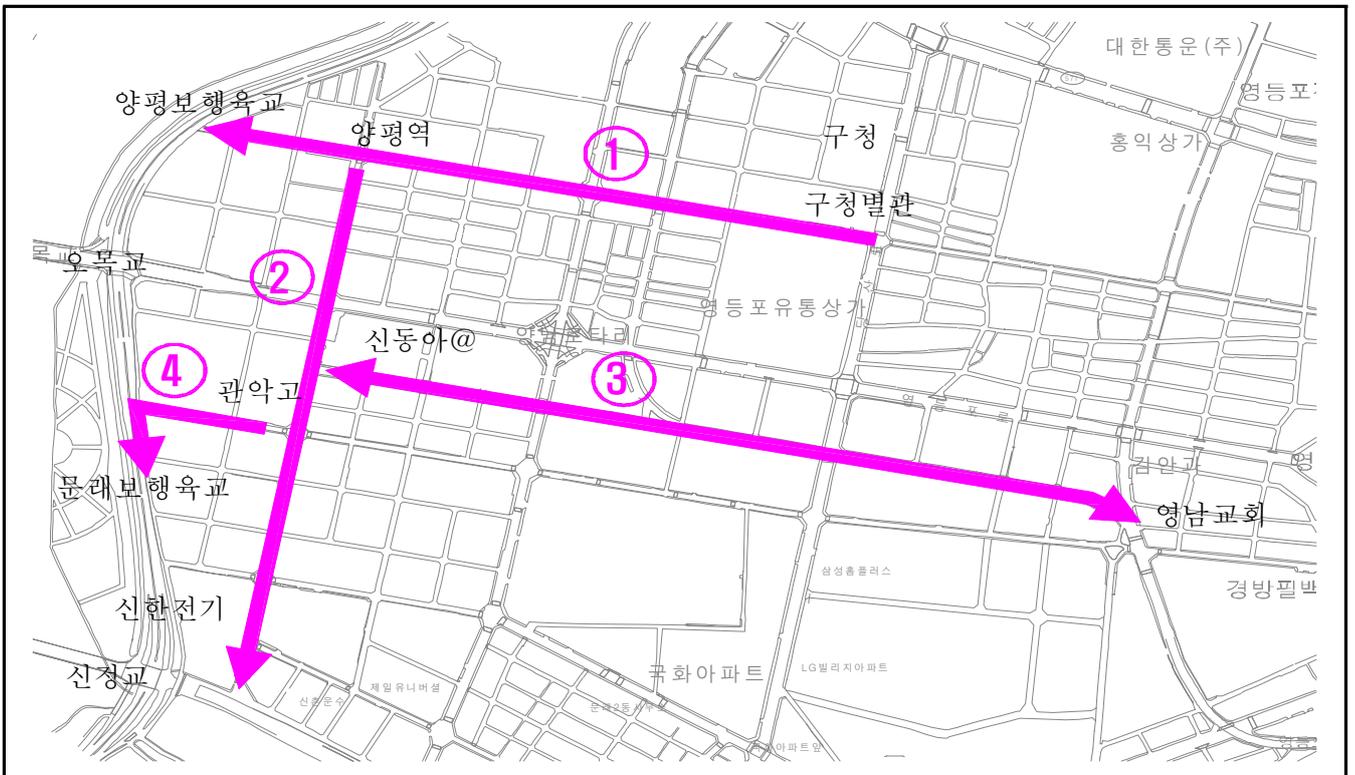

**2****추진 실적**

○ 추진실적 : 2개구간 완료, 2개구간 공사중

연 번	도로명	구 간	자전거도로 연장(m)			추진실적
			계	전용	겸용	
①	양산로	구청별관 → 양평보행육교	1,160	800	360	공사중(90% 10월 완료예정)
②	양평역길 강나라길	양평역 → 신한전기	1,100	550	550	공사완료
③	한어울길 한전길	영남교회 → 신동아(아)	1,400	1,000	400	공사완료
④	동아리길	관악고교 → 문래보행육교	400	300	100	공사중(90% 10월 완료예정)

○ 사업기간 : 09.6월 ~ 09.10월

○ 사업비 : 총 634백만원

- 설계용역 : 48백만원 (구비)

- 공사비 : 586백만원 (시비)

**3****향후 계획**

○ '09. 10월내 모든 공사 완료 예정

## 16. 당산 자전거 무료대여소 설치운영(시비)

### 1

#### 사업개요

- 위 치 : 당산역 4번출구 한강 시민공원 진입로 인접지점
- 설치목적 : 당산역 이용 자전거 환승, 레저, 구청 대여소와 상호 네트워크 구축
- 설치제원 : 20대 규모 (가로 11m 세로 2.5m 높이 3m)
- 추진기간 : 08.12.29 ~ 09.4.8
- 소요예산 : 83백만원(시비)



설치 전



설치 후

### 2

#### 추진실적

- 운영일자 : 09.5.1일 이후 ~ 현재
- 이용실적 : 주말평균 35회 대여 (일 평균 16회)
- 자전거 수리소 운영 : 매주 토요일 09:30 ~ 12:30
- 홍보활동 : 대한노인회 실버인력을 활용한 사용방법 안내 등 홍보
  - 연 인 월 : 12명
  - 근무시간 : 월 ~ 토 09:30 ~ 18:00
  - 소요예산 : 비예산(대한노인회 자체예산으로 충당)
  - 기대효과 : 실버인력 일자리 창출등 상호 Win-Win

### 3

#### 향후계획

- 수리소 운영으로 대여자전거 유지관리를 통한 사고예방 및 최적상태 유지

## 17. 어린이보호구역 개선사업(국비+시비)

### 1

#### 사업개요

- 사업 기간 : 09.1.24 ~ 09.7.24
- 대 상 : 어린이집 8개소  
(신길5동, 해태, 남서울, 은석, 양평1동, 신이화, 무지개영재, 국회어린이집)
- 사 업 비 : 253백만원 (국비, 시비 각 50%)

### 2

#### 추진실적

- 추진현황 : 신길5동 어린이집외 7개원 어린이보호구역 사업완료 (09.7.24)
- 추진내용 : 보호구역내 칼라포장, 고원식 교차로 및 통합교통안전표지 설치 등
- 추진실적
  - 초등학교 주변은 '03년부터 정비를 시작하여 관내 23개교를 모두 공사 완료하였으며
  - '08년에는 유치원 5개원을 '09년에는 어린이집 8개원에 대하여 개선사업을 완료함

### 3

#### 향후계획

- 2010년 추진사업 대상 : 양평동 정은유치원 외 5개소 개선사업 실시

## 18. 부설주차장 및 학교운동장 야간개방(시비-주차계획담당관)

야간에 비어있는 주택가 대형 건축물 부설주차장 및 학교 유휴 공간을 개방하여 인근 주민이 가용 주차공간을 효율적으로 이용토록 함으로써 주택가 주차난을 해소코자 함

### 1

#### 사 업 개 요

- 대 상 : 건축물 부설주차장 315개소, 학교 42개소
- 예 산 : 40,000천원(시비, 구비 각 50%)

### 2

#### 추진실적

- 선유초등학교 유휴 공간 야간개방
  - 개방면수 : 12면
  - 공사내용 : 바닥 점토벽돌 수리 및 교체(도로과), 주차장 주변 철제펜스 및 화단정비 등
  - 예산 : 11,00천원(시, 구 각 50%) 지원
- 동천교회 부설주차장 야간개방
  - 개방면수 : 약 22면
  - 공사내용 : 주차라인 도색, 카스토퍼 및 CCTV설치
  - 예 산 : 5,500천원(시, 구 각 50%씩) 지원

### 3

#### 향후계획

- 야간 개방이 가능한 대형 건축물 부설주차장 및 학교 유휴공간에 대한 지속적 검토

## 19. 주차질서 확립으로 주민 불편 해소

도로 본래의 소통 원활 기능 확보 및 주민생활불편 적극 해소를 위해 지속적인 불법주차 단속으로 주민편익을 증진하고 차량소통의 원활을 기하고자 함

### 1

#### 추진 방향

- 주차질서 확립을 위한 탄력적인 단속 행정 수행
- 불법주차 관련 주민의견 적극 수렴
- 다양한 고기능 단속 장비의 효율적 운용으로 불법주차 근절

### 2

#### 추진 실적

(단위 : 건수)

구분	우리구			서울시			타부서 및 기관
	소계	인력	CCTV	소계	인력	CCTV	인력
총계	103,931	54,889	49,042	24,613	6,281	19,332	124

### 3

#### 향후 계획

- 기동단속조 확대 편성 : 2개조 ⇒ 3개조
  - 기동성 및 탄력적 지도단속으로 주차질서 확립
  - 취약시간대(출, 퇴근) 집중 단속
- 불법주·정차 단속공무원 친절 교육 강화 : 월 1회
- 상습불법주차지역 및 민원다발지역 수시 특별단속 실시
  - 야간, 휴무일 특별근무 확대실시
  - 기동단속반 운영으로 취약지역 및 민원사항 신속조치

## 20. 어르신 주차질서 계도 활동 사업

관내 거주하는 어르신의 주차질서 계도활동을 통하여 어르신 사회참여 지원 및 지역사회 유대감을 형성하고 주차질서를 개선함으로써 주민 편의를 증진코자 함

### 1 사업 개요

- 추진근거 : 노인복지법 제23조, 구청장방침 제406호(2008.12.31)
- 사업목적 : 어르신 일자리창출과 사회참여, 선진주차질서 확립
- 사업기간 : 2009. 2월 ~ 12월(11개월)
- 참여인원 : 연인원 21,120명(1일 160명)

### 2 추진 실적

- 참여인원 : 연인원 15,360명(1일/ 160명, 월/ 12회)
- 예 산 : 322백만원(본예산 206 + 추경 115)
- 실 적 : 73,180건(이동 및 계도조치)

### 3 향후 계획

- 주요 계도활동 지역 범위 확대
  - 이면도로 및 골목진입로, 마을버스 통행로, 일방통행로
  - 어린이 보호구역 및 그린파킹사업지구 주변

## 21. 신길1동 주택가 공영주차장 건설

다가구, 다세대, 연립주택 등 주거 밀집지역에서 주차난이 심각하고 주차장 확보율이 낮은 지역에 주차장을 건설하여 주택가의 부족한 주차시설을 확보함으로써 지역주민들의 불편을 해소하고자 함.

### 1

#### 사업 개요

- 사업위치 : 영등포구 신길1동 120-82 및 120-92
- 사업규모
  - 부지면적 : 540 $m^2$
  - 건설내용 : 평면식 노외주차장 18면 설치
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 6
- 사업비 : 2,303백만원

### 2

#### 추진 실적

- '09.02.27 : 신길1동 주택가 공영주차장 건설 계획
- '09.03.23 : 공영주차장 건설관련 소관사항 검토 협의
- '09.05.12 : 도시계획시설(주차장) 입안
- '09.08.31 : 보상물건 조사완료(가로경관과)
- '09.09.22 : 투자사업 심사분석 의뢰(기획홍보과)
- '09.09.28 : 공영주차장 건설부지 보상의뢰(가로경관과)

### 3

#### 향후 계획

- '09. 10 ~ 12월 : 토지 및 건물 보상실시
- '10. 01 ~ 03월 : 실시설계 발주 및 완료
- '10. 04 ~ : 공사 착공

## 22. Green Parking(녹색주차마을)사업(시비-주차계획담당관)

주택가 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장과 녹지를 확보하여 안전하고 쾌적한 생활도로 조성으로 자연친화적인 주거환경 개선.

### 1 추진방향

- 홍보전략 변화 모색 : 일방적(대중적)방법 ⇒ 개별적 유기적 주민 설득
- 방법기능 등의 다양한 설비 강화로 적극적인 주민 참여 유도

### 2 추진실적

- 녹색마을 조성사업 (‘09 .9월)

담장허물기	생활도로	CCTV	비고
143동 353면	1,220m	10대	

### 3 특수사업

- 오픈-락(자동창문장금장치) 전국 자치단체 최초 설치 : 400개
- 무인 자가방범 시스템 설치 : 193개
- 태양광등 설치 : 193개
- 빗물받이 악취방지기 설치 : 200개
- 음식물 쓰레기통 부스 설치 : 1개 등
- 사업 예산 : 2,859백만원(시비 1,385 / 구비 1,474)

### 4 향후계획

- 주민자율관리 조직 구성 및 정비
  - 그린파킹사업 주민관심제고 및 지속참여 유도
- 사업참여 유도 방안 다각화 발굴(특수시책)
  - 자가방범시스템 기능 개선 및 설치 물량 확대
  - 빗물받이 악취방지기 지속 설치
  - 오픈락(자동방범창기능) 설치

## 투자사업 추진현황

### □ 사업별 현황

(단위:백만원)

연번	사업명	사업개요	예산 현액	현추진 공정	완료 예정일	비고
1	대방천변도로개설공사 (보상 및 용역)	B=6m, L=420m 실시설계용역및보상	550	100%	용역완료	보상진행중 (추경)
2	신길동4300-37~4326-2간 도로개설공사(보상)	'08년 토지보상비 부족으로 인한 1필 지(198㎡) 보상일부	176	100%	완료	
3	대림동 1051-9~810-56간 도로개설공사(보상및공사)	B=6m, L=158m	945	25%	12.30	건물 철거중
4	신길동227-6~260-3간 도로개설공사(보상및공사)	B=8m, L=25m	800	40%	12.30	보상협의중
5	포장도로정비등 소파보수 공사(연간단가)	아스팔트 A=170a 콘크리트 A=30a 보도블럭 A=70a	1,900	95%	12.30	
6	도로시설물 보수 공사 및 장애인 편의 시설 설치 공사 (연간단가)	과속방지턱 L=200m 디자인웬스 설치 및 보수 N=400경간 장애이편의시설 A=20a	1,130	95%	12.30	
7	사회적약자를 위한 도시 환경 개선사업(연간단가)	보도정비 A=16a 점자블록설치 A=12a, 경계석 400m	200	98%	12.30	
8	신길동 2045~2075간외 3개소 도로정비사업	아스팔트 포장 B=4m, L=285m, A=11.4@	120	100%	완료	
9	선유중학교 앞 방음벽개량공사	방음벽설치 H=5.0m, L=66m	202	100%	완료	
10	선유고등학교 앞 방음벽설치공사	방음벽설치 H=5.0m, L=107m	321	100%	완료	
11	선유도공원 진입로 도로정비 공사	보도정비 A=16@ B=5~1m, L=280m	200	5%	11.30	

연번	사업명	사업개요	예산 현액	현추진 공정	완료 예정일	비고
12	가로등시설물정비공사 (연간단가)	가로등정비 50본 글러브세척 3,100등 기타정비 1식	220	90%	2010.2.28	
13	보안등 설치개량 및 유지보수공사(연간단가)	신설310등 유지보수 1식	400	75%	2010.2.28	
14	여의도 아파트(주거)지역 광원교체공사	등기구개량 132개	60	완료		
15	용호로가로등 개량공사	가로등 철거 38본 가로등 설치 55본 분전함 설치 5면	290	95%	2009.10.30	
16	도림천로 가로등 개량공사	가로등 철거 85본 가로등 설치 99본 분전함 설치 6면	584	완료		
17	여의동로 가로등 개량공사	가로등 철거 87본 가로등 설치 96본 분전함 설치 4면	511	95%	2009.10.30	
