

제205회 구의회 제2차 정례회

2017. 11. 20. ~ 12. 21.

청림 영등포

국 별

2017년 주요업무 보고




생활환경국

보고 순서

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	4
III . 2018년 주요업무 추진계획	...	16
IV . 신규·주요투자 사업	...	25

I. 일반 현황

1 조직

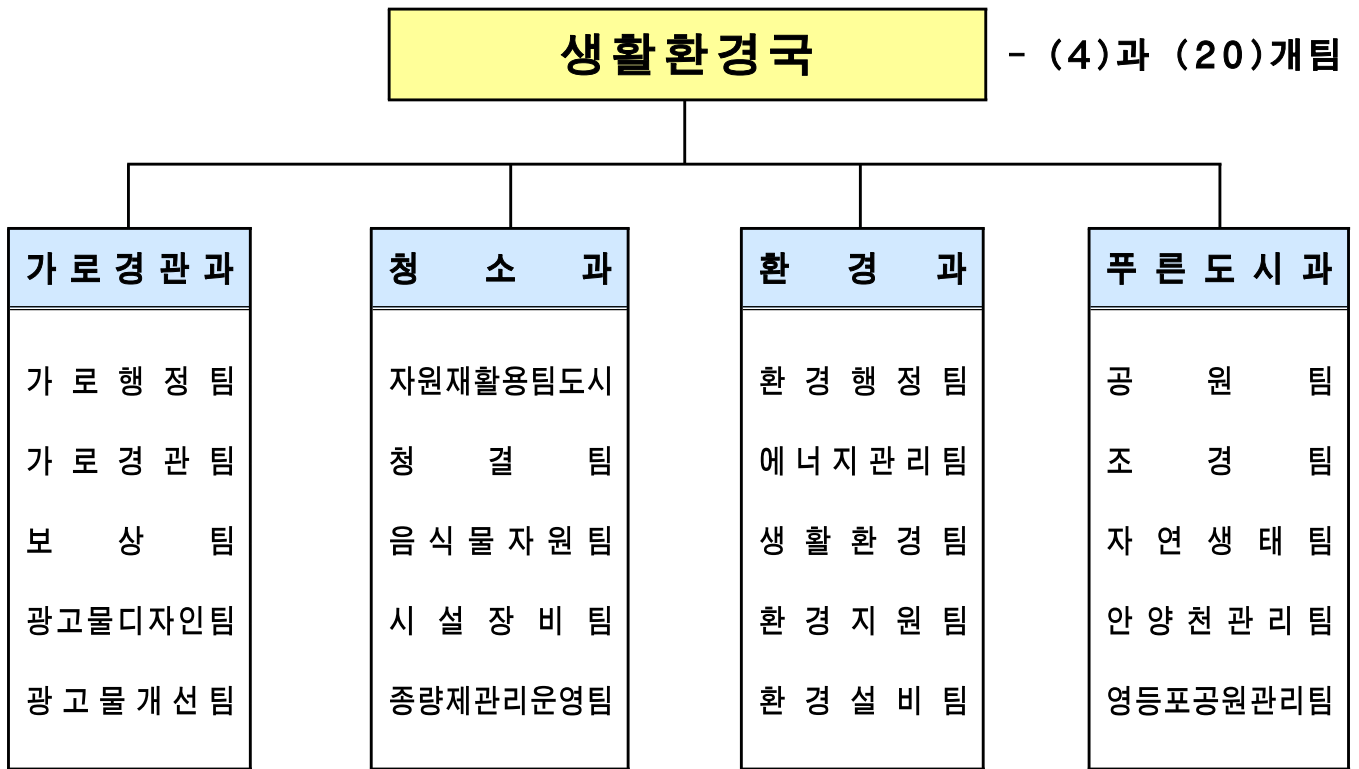

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	142	1	4	27	45	33	18	0	1	3	0	0	0	0	10
현 원	139	1	4	35	47	19	18	0	5	0	0	0	0	0	10
과부족	△3	0	0	8	2	△14	0	0	4	△3	0	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

□ 공공용지 현황 (4,665필지, 5,231,936㎡)

구분	계		도로		하천		제방		구거		기타	
	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)
계	4,665	5,231,936	3,694	3,706,888	335	1,202,371	104	205,444	100	25,678	432	91,555
구유재산	1,880	761,518	1,720	698,594	22	11,070	15	23,971	89	21,970	34	5,913
시유재산	2,009	3,429,688	1,535	2,747,048	121	548,193	28	82,743	7	1,248	318	50,456
국유재산	776	1,040,730	439	261,246	192	643,108	61	98,730	4	2,460	80	35,186

구분	명칭	현황	비고
시설	가로정비 수거품 보관창고	문래동3가 55-1(건축면적 420㎡)	가로경관과
	불법광고물 수거 보관창고	문래동3가 55-1(건축면적 210㎡)	
	가로정비 단속원 정비초소	5개소/문래동 2개, 당산동1개, 여의도동1개, 대림동1개	
	보도상 영업시설물	145개소/가로판매대(73개소), 구두수선대(72개소)	
	광고물 시설물	71개소/현수막 게시대(39개소), 시민게시판(32개소)	
	옥외광고물 관리	5,325개/옥상 53, 돌출 1,518, 지주 151, 가로형 3,250, 세로형 63, 기타 290	
	자원순환센터	재활용선별장, 음식물류폐기물 적환시설, 리사이클링센터 재활용환경미화원휴게실, 탁구장, 힐링숲 등 주민소통 공유시설	청소과
	클린센터	사무실, 환경미화원 휴게실, 세차장, 북카페, 요가장, 창고	
	환경미화원휴게실	10개소/가로청소환경미화원 8개소, 기동대 2개소	
	세척직원 사무실 (舊리사이클링센터)	세척직원 사무실 1, 종량제 봉투 보관 창고 1	
	공중화장실	16개소/건물형 12, 간이형 4	
	근린공원	10개소/549,377㎡ (구공원 6개소/141,431㎡, 시공원 4개소/407,946㎡)	
	어린이공원	18개소/54,637㎡	푸른도시과
	소공원	11개소/13,931㎡	
	마을마당	31개소/18,011㎡	
	녹지대	350개소/724,847㎡	
가로수	109개노선 26종 18,329주		
보호수	은행나무 1종 1주		
체육시설	78개소 22종 840점		

구분	명칭	현황	비고
장 비	소형 화물차(1톤)	6대/차량진출입등 조사(1대), 가로정비 단속(3대), 불법 광고물 단속(2대)	가로경관과
	소형 승용 자동차	1대/광고물 365감시반 정비(임차)	
	수송차량	5대/암롤 4, 압축 1	청소과
	수집차량	28대/재활용 18, 음식물류 4, 폐형광등 1, 기동대 5	
	도로청소차량	18대/노면 6, 분진 4, 살수 8	
	건설기계	3대/굴삭기 1, 로우더 1, 지게차 1	
	기타 차량	11대/음식물통세척 5, 집게차 1, 정비 1, 순찰 4	
	수송용 적재함	22대/재활용품 12, 음식물류 10	
	쏘울(전기차)	1대/생활공해 단속 점검용	환경과
	승용차(엑티온)	1대/배출업소 지도점검	
	휴대용 중금속 측정기	1대	
	PH Meter	2대	
	DO측정기	1대	
	CO, HC 측정기	2대	
	매연측정기	4대	
	비디오카메라(매연측정)	2대	
	소음·진동 측정기	4대	푸른도시과
	화물차	2대/마이티(2.5t)	
	승합차	1대/스타렉스(9인승) 03모 9050(2005년)	
	중형승용차	1대/쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	
소형화물차	3대/포터2(1.0t)		

4

예산현황

(단위: 천원)

부서명	예산액	집행액		집행률(%) (10.31기준)
		10.31기준	12.31까지	
계	51,770,835	37,116,316	48,661,976	71.7
가로경관과	1,033,654	724,391	1,015,584	70.1
청소과	35,323,624	25,645,282	33,051,817	72.6
환경과	2,316,759	2,099,537	2,285,383	90.6
푸른도시과	13,096,798	8,647,106	12,309,192	66.0

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	행정재산(도로·하천 등) 관리의 내실화	5
②	보행로 확보를 위한 가로정비 추진	6
③	재활용품 및 대형폐기물 수거	7
④	주민과 함께 맑고 깨끗한 영등포 가꾸기	8
⑤	온실가스 감축 및 에너지 절약사업 추진	9
⑥	친환경 보일러 설치 지원 사업	10
⑦	공원 노후시설 정비 및 개선	11
⑧	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충	14

국·공유 행정재산 사용자에게 대한 사용료 부과와 무단사용자에 대해 권리 보존 및 변상금을 부과하고 세원 발굴을 통한 세입 증대 및 체계적인 행정재산 관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
- 대 상: 공공용지 4,665필지, 5,231,936 m^2
- 내 용: 행정재산 실태조사, 점용허가 및 점용료·변상금 부과

□ 주요 추진실적

- 2017년 부과·징수 현황 (단위 : 천원)

구 분	목 표	부과	징 수	달성률(%)	징수율(%)
'17.10.31.현재	6,546,349	5,882,440	5,827,896	89.8	99.0

□ 향후계획

- 국·공유 행정재산 실태조사 (1월 ~ 4월) - 총 4,665필지
- 국유지 776필지, 사유지 2,009필지, 공유지 1,880필지
- 지하매설물, 지상시설물 일제 조사 (2월 ~ 3월)
- 하천 점용사실 특별 일제 조사 (4.1 ~ 5. 30) - 공부 및 현장 확인
- 2017년 차량진출입로 일제정비 자료 행정조치 및 부정리(1월~4월)
- 차량진출입로 시설 일제 조사 (5월 ~ 8월) - 1,420건
- 행정재산 무단점유 변상금 부과 자료 조사 (9월 ~ 11월)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
76,207(구비)	54,171	71.0

거리가게 및 노상적치물에 대한 효율적인 정비로 도로기능을 회복, 시민의 통행안전과 보행로를 확보하여 주민불편 사항을 최소화하고 안전한 가로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2017. 1. 1.~12. 31.
- 정비대상: 거리가게 및 노상적치물
- 정비인력 및 장비: 20명(직원 10, 용역 10), 차량3대

□ 주요 추진실적

- 특별 가로정비
 - 2017.02.21.~03.10.: 신학기 학교주변 이동정비 113건
 - 2017.03.31.~04.14.: 여의도 봄꽃축제 정비 1,247건
 - 2017.05.20.~06.16.: 영일마늘시장 이동정비 209건
 - 2017.09.30. : 서울세계불꽃축제 정비 170건
 - 2017.09.08.~10.15.: 여의나루역 보행환경개선 정비 270건
(CCTV, 펜스 등 설치)
 - 2017.07.01~10.31.(계속): 영등포동 아크로타워스퀘어 주변 정비
· 자율정비선 확대(1.3M), 장기방치 노점상가 3개 수거
- 정비실적
 - 거리가게 및 노상적치물 정비: 19,853건
 - 강제수거: 915건(거리가게 438건, 노상적치물 477건)
 - 행정처분: 491건 / 197,375천원

□ 향후계획

- 2017.11.13.~12.10, : 영일 김장시장 특별정비(178개 점포)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
559,477 (구비355,477) (특별교부금 200,000)	406,535 (구비269,782) (특별교부금 136,753)	72

재활용품 및 대형폐기물의 신속한 수거를 통해 주민편의를 도모하고 재활용품 분리배출 정착화로 쾌적하고 아름다운 도시환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업내용: 재활용품 및 대형폐기물 신속한 수거·운반
 - 직영: 영등포본동 외 11개동
 - 민간대행: 6개동

구분	도림동	신길3동	신길5동	대림1동	대림2동	대림3동
업체명	한양환경	삼원환경	동일환경	우성환경	우성환경	동진환경

□ 주요 추진실적(10.31.현재)

- 재활용품 및 대형폐기물 수거: 16,166톤
 - 재활용품: 9,947톤, 대형폐기물: 6,219톤
- 대형폐기물(폐목재)처리: 4,200톤
- 봉제원단조각 재활용
 - 처리전문 민간업체와 봉제원단조각 처리 협약 후 재활용 처리
 - 2017.9월 이후 처리량: 33톤(※ 처리비: 톤당 46,000원)

□ 향후계획

- 재활용품 분리 배출 및 대형폐기물 신속한 수거
- 재활용품 및 대형폐기물 수거 대행업체 지도·점검(12월)
 - 점검내용: 청소차량 청결도, 청소장비 구비 여부, 환경미화원 안전장구 착용 실태 등
- 대형폐기물(폐목재) 무상 처리: '17.10.~
 - 업체(경일에너지(주) & (주)고양우드)와 협약에 따른 폐목재 무상 처리

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,065,000(구비)	787,631	74.0

민·관이 함께하는 주민 자율청소 체계 구축과 청결한 가로환경 조성을 통해 주민이 체감하고 만족할 수 있는 깨끗한 영등포를 구현하고자 함.

□ 사업개요

- 추진기간: 연중
- 사업내용
 - 클린데이 운영 (주민참여형 자율청소 병행 실시)
 - 도로 물청소: 주기적 분진·물청소를 통한 미세먼지 제거
 - 청소 봉사대 운영: 이면도로 및 청소 취약지역 청결유지, 재활용품 분리배출 홍보
 - 365청결기동대 운영: 도심 취약시간대 청소(영등포역 일대)

□ 주요 추진실적

- “행복홀씨” 거리입양 참여 단체: 131단체 / 3,720명(17.9.30 기준)
- 클린데이 실시: 8회 (매월 넷째주 수요일)
- 도로 물청소: 18대(물 청소차 8대, 노면청소차 6대, 분진흡입차 4대)
 - 물청소: 19,984Km(32,821톤 살수), 분진청소: 28,284Km
- 청소 봉사대 운영: 관내 50세 이상 중·장년 및 어르신 280명
 - 청소시간: 매일 07:00~12:00(2시간 범위 내 동별 탄력적 운영)
 - 지원실적: 319,342천원(1인 보상금: 월 110,500원)
- 365 청결기동대 운영: 4명(영등포역, 대림역 일대)

□ 향후계획

- 미세먼지 주의보 발령시 분진·살수 청소 강화 (18:00까지 연장근무)
- 청소취약지역 청결유지를 위한 청소봉사대 등 청소기능 지속유지
- 지속적인 도로분진 및 물청소 실시로 쾌적한 영등포 구현 도모

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
485,720 (시 84,000, 구비 401,720)	390,846 (시 71,171, 구비 319,675)	80.5

각종 에너지 절약사업과 에코마일리지 사업의 추진을 통해 국민 스스로의 에너지 자립 및 에너지 수요 절감을 유도하여 온실 가스 감축을 통한 지구 온난화 방지에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2017. 1. 1~12. 31
- 내 용
 - 에코마일리지 홍보 및 에너지진단 컨설팅, 건물에너지효율화(BRP)용자지원
 - 에코마일리지 가입자의 에너지 절약에 따른 인센티브 지급 등

□ 추진실적

- 녹색생활실천 에코마일리지 가입 및 홍보 추진
 - 신규가입회원: 4,255명(누적가입회원: 115,286명)
 - 에너지 사용량 5%이상 절감회원 상품 지급: 4,467건(156,270천원)
 - 서울시 상반기 평가 결과: “수상구” 선정(인센티브 8,333천원)
 - 에코마일리지 홍보부스 운영: 23회(참여자수 4,010명)
 - 에코마일리지 아파트 및 동별 경진대회 개최
 - 기간: 아파트(3~9월), 동별(전년10월~현년9월)
 - 전광판 홍보(연중), 구 소식지 게재 및 리플릿 배부(수시) 등
- 에너지진단 컨설팅 및 건물에너지효율화(BRP) 용자지원 추진
 - 개인·상가 에너지 진단컨설팅 서비스 제공: 200건(개인185, 상가15)
 - BRP 저금리 용자지원 추진: 21건 132,600천원

□ 향후계획

- 구 각종 행사 시 홍보부스 운영을 통한 에너지절약 사업 국민 홍보
- 자체 홍보물 제작 및 언론매체 등을 통한 국민 홍보

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
40,633 (국 7,400, 시 23,733 구비 9,500)	27,854 (국 6,357, 시 16,057 구비 5,440)	69

노후된 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 설치 시 비용 일부를 지원하여 국민의 경제적 부담을 완화하고 나아가 에너지 절약 및 대기질 개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2017. 3. ~ 12월
- 지원대상: 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체하는 영등포 구민
 - 저소득층 가구주 및 저소득층을 세입자로 둔 주택소유자 우선보급(약14대)
 - 가구주와 주택 소유자가 다른 경우 설치비를 부담하는 자에게 지원
- 지원대수: 약 233대(서울시 전체 3,500대)
- 지원금액: 16만원
- 지원기준: 1가구당 보일러 1대 지원

□ 주요 추진실적

- 친환경 보일러 교체: 233세대
- 교체 설치비 지원 금액: 37,280천원

□ 향후계획

- 신청자 모집: 12월까지
- 추진상황 분기별 보고 및 완료 보고(서울시)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
37,280 (국 18,640, 시비 18,640)	37,280 (국 18,640, 시비 18,640)	100

의자, 목재 데크, 산책로 탄성포장 등 노후시설을 교체하고 창의놀이터를 조성하여 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 영등포공원 보수정비사업

- 위 치 : (영등포본동)신길로 275 영등포공원
- 규 모 : 10,000 m^2
- 예 산 : 1,040,000천원(시비) ※ 실집행액 66,191천원
- 내 용 : 음악분수 및 주변 데크, 탄성포장 정비, 담장 등 경관저해요소 정비, 공중화장실 리모델링, 수목 및 초화류 식재, 잔디광장 유지관리 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 3.~ 8. 18. : 영등포공원 보수정비공사 설계용역
 - 2017. 8. 22. : 공사발주(영등포공원 보수정비공사)
 - 2017. 9. 14. : 공사착공(영등포공원 보수정비공사)
 - 2017. 12.20. : 공사준공(영등포공원 보수정비공사)
 - 2017. 2. 6. : 공사발주(잔디광장 유지관리공사)
 - 2017. 2. 9. : 공사착공(잔디광장 유지관리공사)
 - 2017. 9. 18. : 공사준공(잔디광장 유지관리공사)(완료)

○ 문래근린공원 창의놀이터 재조성사업(명시·사고이월)(완료)

- 위 치 : (문래동)문래동3가 66 문래근린공원 어린이놀이터
- 규 모 : 500 m^2
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 실집행액 197,507천원
- 내 용 : 주민과 전문가가 협업하여 주민참여형 커뮤니티 창의놀이터 조성
- 추진실적
 - 2017. 2. 28. : 설계용역 완료
 - 2017. 2. 27. : 공사발주
 - 2017. 3. 20. : 공사착공
 - 2017. 6. 20. : 공사준공

○ 노후 마을마당 보수정비사업(완료)

- 위 치 : (신길4동)신길로40길 5 덕천길마을마당
- 규 모 : 2,251 m^2
- 예 산 : 60,000천원(시비) ※ 실집행액 58,632천원

- 내 용 : 산책로 및 운동시설 포장 정비, 조합놀이대 보수, 수목식재 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 31. : 도면작성용역 완료
 - 2017. 4. 12. : 공사발주
 - 2017. 4. 19. : 공사착공
 - 2017. 6. 7. : 공사준공

○ 공원 시설물 정비사업(완료)

- 위 치 : (문래동)문래근린공원, (당산1동)당산근린공원, (당산2동)새말소공원, (신길5동)신길근린공원, (신길1동)메낙골근린공원
- 규 모 : 66,465 m^2
- 예 산 : 300,000천원(구비) ※ 실집행액 265,359천원
- 내 용 : (문래)막구조 파고라 3동 설치, 목교 교체, 목재 화단 정비 등, (당산)목재 무대 및 의자 교체, (새말)무대 설치, (신길)바닥 포장 및 정자 1동 교체, (메낙골)수목 전지, 정자 물받이 설치 등
- 추진실적
 - 2017. 2. 18. : 설계용역 완료
 - 2017. 2. 27. : 공사 발주
 - 2017. 3. 20. : 공사 착공
 - 2017. 5. 25. : 공사 준공

○ 어린이공원 정비사업(완료)

- 위 치 : (대림3동)원지, 동심 / (영등포본동)영일/ (영등포동)서강, 중앙/ (여의도동)자유, 평화 / (도림동)고추말
- 규 모 : 800 m^2
- 예 산 : 235,400천원(구비) ※ 실집행액 193,222천원
- 내 용
 - 원지 : 어린이놀이터 바닥재 교체(모래→고무칩), 초화류 식재 등
 - 자유 : 흙막이 정비
 - 서강 : 흙막이 정비, 초화류 식재 등
 - 고추말 : 정자설치 등 시설물 정비
 - 동심 : 장미식재 등
 - 평화 : 농구대함 교체
 - 중앙 : 앉음벽 설치, 초화류 식재 등
 - 영일 : 노후 조합놀이대 철거
- 추진실적
 - 2017. 3. 7. : 설계용역 완료
 - 2017. 3. 20. : 공사발주
 - 2017. 4. 5. : 공사착공
 - 2017. 5. 25. : 공사준공

○ 공원 시설 확충 및 개선사업(완료)

- 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등 68개소
- 규 모 : 10개소
- 예 산 : 50,000천원(구비) ※ 실집행액 48,689천원
- 내 용 : 주민 요구 및 긴급 보수정비 사항 처리
- 추진실적
 - 2017. 4. 26. : 영일어린이공원 탄성볼라드 설치
 - 2017. 5. 12.~5. 25. : 대림어린이공원 조롱박터널 설치
 - 2017. 9. 28. ~ 10. 12. : 양남어린이공원 시설정비공사

○ 공원 소나무 생육환경개선사업(완료)


- 위 치 : (당산1동)당산공원, (문래동)문래공원
- 규 모 : 170주(당산 92주, 문래 78주)
- 예 산 : 25,000천원(구비) ※ 실집행액 21,430천원
- 내 용 : 소나무 전정(131주), 영양공급(26주), 병해충방제(78주)
- 추진실적
 - 2017. 3. 13. : 공사발주
 - 2017. 3. 20. : 공사착공
 - 2017. 6. 15. : 공사준공

□ 소요예산 : 총1,910,400천원(시 1,300,000 / 구 610,400)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,910,400 (시 1,300,000 / 구 610,400)	851,030 (시 322,330 / 구 528,700)	44.5

□ 현황사진(어린이공원 정비사업) - 바닥재 교체

(단위: 천원)

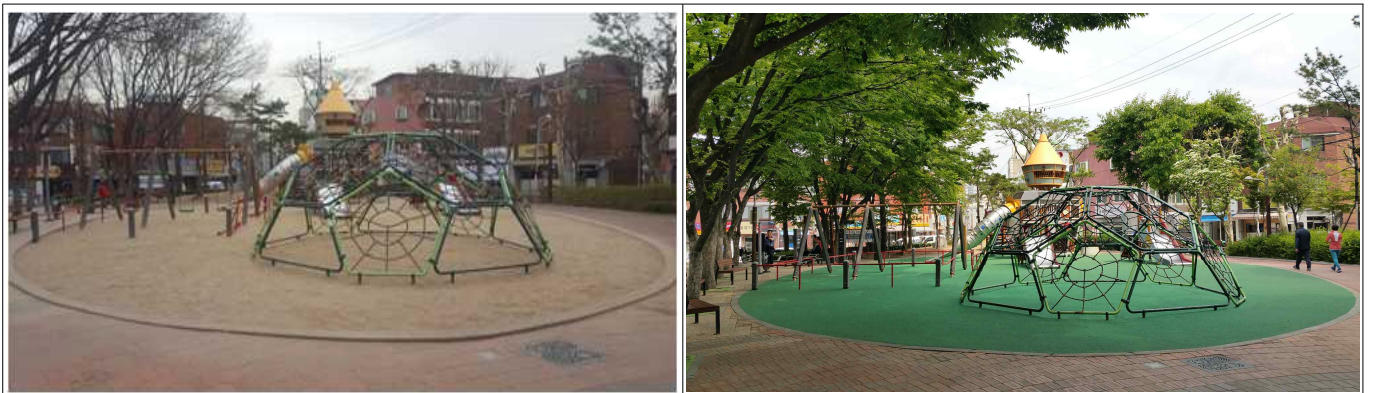

관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 특색 있는 녹색공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 불거리가 있는 휴식 공간 제공

□ 사업개요

○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위 치 : 당산2동 당서초(1,200 m^2), 문래동 문래중(900 m^2),
문래동 영등포초(1,200 m^2)
- 규 모 : 총3,300 m^2
- 예 산 : 370,000천원(시비) ※ 실집행액 339,051천원
 - 당서초 70백만원, 문래중 150백만원, 영등포초 150백만원
- 내 용 : 학습 및 휴식시설 설치, 수목 및 초화류 식재 등
 - 당 서 초 : 플랜터 2개, 원주목경계 48m, 등반보조재(벽면녹화) 9개소,
이팝나무 등 6종 31주, 덩굴장미 등 20종 4,500본 식재 등
 - 문 래 중 : 앓음벽 5m, 산석붙임 81m, 산수유 등 10종 2,028주,
할미꽃 등 8종 2,190본 식재 등
 - 영등포초 : 학습연못 1개소, 파고라 1개소, 물레방아 1개소, 영산홍 등
14종 2,155주, 애기부들 등 16종 4,510본 식재 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 13. : 설계용역 완료
 - 2017. 4. 5. : 공사발주
 - 2017. 4. 24. : 공사착공
 - 2017. 5. 28. : 공사준공

○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위 치 : 여의도역(5호선) 6번 출구 미성아파트 D동 앞(여의동)
- 규 모 : 1,000 m^2
- 예 산 : 194,000천원(시비) ※ 실집행액 185,426천원
- 내 용 : 포켓정원, 초화원, 그늘목 식재, 띠녹지 조성 등
- 추진실적
 - 2017. 2. 21. : 설계용역 완료

- 2017. 3. 16. : 공사발주
- 2017. 4. 6. : 공사착공
- 2017. 6. 3. : 공사준공

○ 아파트 열린녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : (양평2동)현대6차/(양평1동)오목교벽산블루밍
- 규 모 : 약1,500m²
- 예 산 : 269,000천원(사비 134,000, 구비 135,000) ※ 실집행액 266,810천원
 - 현대6차 : 169백만원, 오목교벽산블루밍 100백만원
- 내 용 : 담장 342m(현대6차 220m, 오목교벽산블루밍 122m)철거, 수목이식 및 식재, 편익시설 설치 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 14. : 설계용역 완료
 - 2017. 4. 25. : 공사발주
 - 2017. 5. 22. : 공사착공
 - 2017. 7. 10. : 공사준공

□ 소요예산 : 총833,000천원(시 698,000 / 구 135,000)

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
833,000 (시 698,000 / 구 135,000)	791,287 (시 657,882 / 구 133,405)	95.0

□ 현황사진



가로정원 조성사업

Ⅲ . 2018년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	광고문화 질서회복 불법 광고물 정비	17
②	옥외광고물 허가 및 관리	18
③	재활용품 및 대형폐기물 수거	19
④	청소 대행권역 조정을 통한 행정의 효율성 강화	20
⑤	친환경 고효율 LED조명 보급사업 추진	21
⑥	어린이 활동공간 위해성 관리	22
⑦	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	23
⑧	하천변 녹지 확충 및 정비	24

난립되어 있는 각종 광고물에 대한 효율적 관리체계를 도입하고 효과적인 정비 활동을 실시하여 광고문화 개선과 불법 광고주의 행태변화를 유도하여 보다 깨끗하고 질서 있는 가로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2018. 1. 1.~12. 31.
- 정비대상: 불법 광고물 전반(간판, 현수막, 에어라이트, 입간판, 벽보, 배너 등)

□ 세부추진계획

- 신생 불법 광고물 발생 초기에 원천 차단하여 확산 방지
 - 인·허가 부서와 협조하여 영업신고시 발견되는 불법간판 우선 정비
- 불법 광고 범람 특별구역 지정 집중정비 광고문화 질서회복
- 불법 광고물 부착방지 시설 확충 및 흔적 지우기사업 추진
- 범시민 인식 개선으로 불법 광고물 위법행위 경각심 고취
- 불법 사설지주 철거 및 불법 광고업자 행정처분 및 상습위반자 형사고발
- 불법 광고물 수거보상제 확대를 통한 가로경관 개선 및 구민 일자리 창출
- 불법 광고물 365감시반 상시 계도 및 감시체계 유지
- 구민전단지 배부대 설치 50개소(주요 역 및 유동인구 밀집지역)
- 풍수해 대비 위험간판 상시정비 추진 및 주인 없는 간판 전수조사

□ 추진일정

- 불법 광고물 정비 종합계획 수립: 1월 중
- 불법 광고물 범람지역 특별정비 계획 수립: 2월 중
- 불법 광고물 부착방지 시설 확충 및 흔적지우기 사업계획 수립: 2월 중
- 구민전단지 배부대 설치 계획 수립 및 설치: 3월~4월 중

□ 소요예산: 총 451,778천원(구비 78,280, 옥외광고발전기금 373,498)

옥외광고물의 인·허가 및 광고물 경유제, 안전도검사, LED간판개선사업, 빛 공해 민원처리 등 옥외광고물의 관리업무를 차질 없이 수행하여 도시미관을 개선하고 올바른 광고문화를 정착하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2018. 1. 1.~12. 31.
- 사업내용: 광고물 인·허가, 안전도검사, 현수막 게시대 및 시민게시판 관리, LED간판개선사업, 빛 공해 민원처리 등

□ 세부추진계획

- 정확한 법규검토를 통한 옥외광고물 인·허가 업무
- 광고물 경유제(상담제)를 통한 불법광고물 원천 예방 및 광고주·옥외광고사업자 인식 개선
- 옥외광고심의위원회 (대위원회 및 소위원회) 운영
- 현수막 지정게시대 및 시민게시판 유지·관리
- 신개념 저단현수막 지정게시대 설치(신규)
- 도신로 에너지절약형 LED간판개선사업 추진
- 옥외광고물 안전도 검사

□ 추진일정

- 옥외광고물 인·허가 및 빛공해 민원처리: 연중계속
- 도신로 에너지절약형 LED간판개선사업: 3월~12월
- 현수막 지정게시대 및 시민게시판 유지·관리: 연중계속
- 옥외광고물 안전도검사: 연중계속/해빙기, 풍수해, 하반기 별도실시

□ 소요예산: 총 505,275천원(구비 9,380, 옥외광고발전기금 495,895)

재활용품 및 대형폐기물의 빠른 수거를 통한 주민 편의를 도모하고 재활용품 분리 배출 정착화로 깨끗하고 쾌적한 영등포를 조성하며 자원재활용 활성화를 통해 자원의 선순환에 기여하고자 함

□ 추진방향

- 대형폐기물 온라인(홈페이지) 신고 방법 간소화
- 대형폐기물 배출 신고 품목 세분화 및 현실화
- 폐기물(폐목재, 폐원단조각)의 재활용 촉진 및 처리비용 절감

□ 세부 추진계획

- 대형폐기물 온라인(홈페이지) 배출신고 방법 개선
 - 개선내용

구분	개선 전	개선 후
접속방법	· 회원가입 또는 실명인증	· 성명 및 전화번호
처리결과 조회여부	· 조회 불가	· 조회 가능
수수료 결제방법	· 신용카드, · 실시간 계좌이체	· 기존 방법 · 무통장(가상계좌) 입금

- 대형폐기물 배출 신고품목 다양화
 - 개선내용: 108개(기존)+79개(신규품목 추가)-5개(유사품목 삭제)=182개
- 폐목재 및 폐원단 처리방법 변경
 - 폐목재: 유상처리 → 무상처리(5년간 약 5억원 예산절감 효과)
 - 폐목재 무상처리 업체 발굴, 향후 5년간 무상처리 협약체결
 - 폐원단: 반입불가폐기물 처리 → 전문처리업체에서 신재생에너지로 연료화
 - 비용절감: 현재 104,400원/톤 → 46,000원/톤(연5천6백만원 예산절감)
- 재활용품 및 대형폐기물 수거 대행구역 조정: 3개동
 - 파편화된 대행구역 재조정 업무 효율성 제고

구분	도림동	신길3동	신길5동	대림1동	대림2동	대림3동
기 준	한양환경	삼원환경	동일환경	우성환경	우성환경	동진환경
조 정	한양환경	남서울환경	삼원환경	우성환경	우성환경	경청산업

□ 소요예산: 1,382,026천원(구비)

4 청소 대행구역 조정을 통한 행정의 효율성 강화

청소과

기존 대행구역이 독립채산제 운영시 대행업체 편의에 의한 조정으로 인해 파편화 되어 있는 대행구역을 재조정함으로써 청소 행정의 효율성 및 예산 절감을 도모하고자 함.

□ 추진방향

- 생활권 반영 주민편의 증대 및 효율적인 청소체계 구축
- 업무 효율성 증대에 따른 비용 절감 및 종사자 업무 부담 경감

□ 사업개요

- 용역기간: 2018. 1월 ~ 12월
- 용역범위: 생활·음식물·재활용품 수거운반 및 종량제 봉투 배송 운반
- 구 역 : 8개 권역

구 분	기 준	조 정
1권역	영등포동(6·7·8가), 당산1·2동	당산1·2동, 대림3동
2권역	문래동(문래4·5·6가), 양평1동(양평1·2가) 신길5동	문래동
3권역	여의동 중부, 도림동	여의동 중부, 도림동
4권역	여의동 동부, 대림1·2동	여의동 동부, 대림1·2동
5권역	영등포본동, 영등포동(1·2가) 문래동(1·2·3가), 신길4동	영등포본동, 신길1·3·4동
6권역	영등포동(3·4·5가), 대림3동	영등포동
7권역	여의동 서부, 신길1·3동, 신길6동 남부	여의동 서부, 신길5·6·7동
8권역	양평동3가, 양평2동, 신길7동, 신길6동 북부	양평1·2동

□ 세부 추진계획

- 조정된 청소 대행구역 용역 시행
 - 조정에 따른 주민 불편 최소화를 위한 대행업체 교육 강화
 - 주민 생활권 고려 1동 1대행업체에 의한 폐기물 수거(여의동 제외)
- 대행업체 구조조정 추진에 따른 문제점 검토 및 해결방안 모색
- 구역 조정에 따른 인력 및 차량 조정 등 대응방안 마련

□ 소요예산: 비예산

에너지 취약계층에 설치된 노후화된 조명을 친환경 고효율 LED조명으로 교체함으로써 전기요금 절감 혜택을 부여하여 에너지복지를 실현하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 4월 ~ 11월
- 보급품목 : 사각 및 원형 평면형 LED조명(11~40W)
- 대 상 : 복지시설 11개소, 저소득층 199가구
- '14~'17년 미교체 시설 중 선정하고, 대상시설 실사 시 신청수량 변경 예상
- 추진방법 : 환경과에서 공사시행(설계 및 시공 감독)

□ 세부 추진계획

- 복지시설 LED조명 보급사업
 - 대 상 : 구립이화경로당 등 11개소
 - 사업비 : 100백만원
 - 내 용 : 평판형 LED조명 600등 무상교체
 - 방 법 : 설치업체 선정 후 교체공사 실시
- 저소득층 LED조명 보급사업
 - 대 상 : 저소득층 199세대
 - 사업비 : 24백만원
 - 내 용 : 노후된 조명을 LED조명으로 교체
 - 방 법 : 각 세대 방문하여 교체공사 실시

□ 추진일정

- 복지시설 및 저소득층 교체물량 최종 확인 : 4월~5월
- 복지시설 및 저소득층세대 공사일정 협의 : 6월~7월
- 공사발주 및 시행 : 8월~10월
- 공사준공 : 11월

□ 소요예산: 총124,000천원(국 66,800, 시 28,600, 구비 28,600)

어린이 활동공간 환경유해인자의 사전관리를 통해 아이들이 안심하고 건강하게 뛰어놀 수 있는 친환경 생활 공간을 조성하여 어린이들의 건강을 보호하고자 함

□ 사업개요

- 대 상: 586개소[어린이 놀이시설(323개소), 어린이집 보육실(263개소)]
 - ※ 2018년부터 2009.3.22 이전 설치된 430㎡ 미만의 민간어린이집 포함(115개소)
- 내 용
 - 어린이활동공간 환경안전 관리대상 지도 점검 실시
 - 어린이활동공간 확인검사 제도의 안내

□ 세부 추진계획

- 어린이활동공간 환경안전 관리대상 지도 점검 실시
 - 점검시기: 2018. 3. ~ 11월
 - 점검대상: 586개소 중 '15~17년 점검대상을 제외하고 선정
 - ※ 2018년 서울시 지도점검 계획에 따라 점검대상 확정
 - 점검항목: 도료, 마감재료 함유 중금속, 목재 방부제 사용여부 등
 - 점검방법: 육안점검 및 중금속 측정기(XRF) 이용 간이 측정
 - ※ 간이측정결과 기준 초과 시 시료 채취 및 정밀 검사 의뢰
 - 조치사항
 - 정밀검사 초과 시 시설개선명령 또는 환경안전관리 기준의 준수명령
 - 행정처분 미이행 시 시설 소유자 또는 관리자 고발 조치
- 어린이활동공간 확인검사 제도의 안내
 - 검사대상: 어린이 활동공간의 신규설치, 증축(면적 33㎡ 이상), 수선(바닥, 벽면, 천장 등의 총 면적 70㎡ 이상)한 시설
 - 검사시기: 신축, 증축 또는 수선 후 30일 이내
 - ※ 확인 검사를 받지 않거나 확인검사결과 부적합한 시설을 어린이가 이용하게 하였을 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

□ 소요예산: 총 1,000천원(구비 1,000)

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화 도시 영등포 이미지 향상하고자 함

□ 사업개요

사업명	위치 및 규모	내용	일정	예산
도시구조물 벽면녹화	도림천과가벽면 (문래동) (500㎡)	식생벽조성, 환토, 등반보조재 설치, 수목/만경류식재 등	·1.~4. : 실시설계 및 유관기관 협의, 시 설계심의 ·5.~6. : 공사시행	200,000천원 (시비)
사계절 꽃길조성	국회앞 중앙녹지 등 3개소 (400㎡)	꽃길조성 200m 장식화단, 길이 화분 설치 등	·1.~10. : 봄, 가을 꽃길조성	85,000천원 (시비)
영등포꽃 으로 피다	서부간선로 방음벽사면 (문래현대5차 ~오목교) (1,700㎡)	가로변 사계절 장식화단 조성, 자투리땅 꽃·나무 식재 등	·1.~10. : 실시설계 및 공사시행	90,000천원 (구비)
녹지대 수목보식 및 시설물 정비	관내 녹지대 등 (500㎡)	노후 시설물 (의자 등)정비, 수목 보식 등	·1.~4. : 사면정비, 편의시설보수/교체 ·1.~12. : 녹지대 시설물 정비, 수목보식 등	50,000천원 (구비)
공개공지 되살리기	여의대방로9길 5 (신길6동) (500㎡)	쉼터조성, 수목식재, 노후시설물 보강 등	·1.~4. : 실시설계, 주민의견수렴 ·4.~6. : 공사시행	30,000천원 (시비)
빗물관리 시설 확충	문래동 로데오윅주변 (500㎡)	빗물유입화단 조성, 분산식 빗물시설 투수블록 포장 등	·1.~4. : 실시설계, 시 설계심의 ·5.~10. : 공사시행	300,000천원 (시비)
도림천변 사면정비	쌍용플로티넘 시티 앞사면 (도림동, 600㎡)	사면 나대지 초화류 피복, 산책로 및 노후 운동기구 재정비 등	·1.~3. : 실시설계 및 계약심사 ·4.~6. : 공사시행	80,000천원 (구비)

□ 소요예산 : 총835,000천원(시 615,000, 구 220,000)

안양천, 유수지 등 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업
 - 위치 및 규모 : 안양천 제방 및 산책로 주변 약 3km
 - 내 용 : 수목보식, 안내판 정비, 휴게시설 정비 등
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 4.
 - 예 산 : 10,000천원(구비)
- 안양천 화장실 설치사업(구 주민참여)
 - 위 치 : 안양천 제방 산책로 변 등
 - 내 용 : 공중화장실 1개소 설치
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 6.
 - 예 산 : 50,000천원(구비)
- 샛강생태공원 친환경 문화프로그램 운영사업(공약사업)
 - 위 치 : 여의도동 4-5일대 샛강생태공원 내
 - 내 용 : 생태교육(140회) 및 소규모 문화행사(10회) 진행
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 11.
 - 예 산 : 15,000천원(구비)
- 안양천 야생초화 식재
 - 위치 및 규모 : 안양천 사면(목동교~양화교) 약 1km
 - 내 용 : 외래 위해식물 제거 및 야생초화류 식재
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 10.
 - 예 산 : 300,000천원(시비)
- 안양, 도림천 수목 가지치기
 - 위 치 : 안양, 도림천 산책로 및 자전거 도로 일대
 - 규 모 : 약 1,700여주
 - 내 용 : 보행지장 및 위험 대형수목 가지치기 등
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 4.
 - 예 산 : 5,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총380,000천원(시 300,000, 구 80,000)**

IV . 신규·주요 투자사업

연번	사 업 명	쪽
①	영등포동 전통시장 주변 보행환경 개선	26
②	저단현수막 게시대 및 구민 전단지 배부대 설치 운영	27
③	도림2빗물펌프장 외 1개소 태양광발전 설치	28
④	건강취약계층 미세먼지 차단망 설치 지원	29
⑤	가로변 녹지량 확충사업	30
⑥	안양천 들레길 정비 및 그늘목 조성	31
⑦	녹지공간 확충 및 가로수길 조성	32

아크로타워스퀘어 입주 및 주변 환경 변화로 지역 상인들의 상품 무단적치에 대한 보행권 욕구 상승이 예상됨에 따라 상가의 자율정비 유도 및 지도단속을 통하여 보행권 확보에 만전을 기하고자 함.

□ 정비개요

- 위 치: 영등포전통시장 및 영등포기계 공구상가 주변
- 점포수: 180여개 / 정비기간: 2018년 1월 ~ 12월
- 정비대상: 노상 적치 상품, 상가 좌판 등

□ 추진현황

추진일정	사업내역	추진내용
2017. 5. 1.	- 아크로타워스퀘어 주변 특별 가로정비 안내문 배포	- 정비기간 ; 2017. 5. 1. ~ 8.30. - 상인회 주관 자율정비 요구
2017. 7.27.	- 아크로타워스퀘어 주변 자율 정비선 그리기	- 지역 : 기계공구 상가 구역 - 자율정비선 그리기 작업(1.3m)
2017. 9. 1. ~ 12.31.	- 자율 정비 이후 지속적인 점검 및 홍보 강화	- 정기적 순찰 강화 : 일 2회 순찰 - 자율정비선 위반업소에 대한 계도 및 단속

□ 세부 추진계획

- 영등포시장역 주변 단계별 추진

단계	추진구간	추진내용
1	영등포주민센터 → 영등포로터리	자율정비선 준수 및 이면도로 확대 운영
2	영등포시장 북문 → 영등포 주민센터	인도주변 주민 통행로 확보 (2.5m 이상)

- 상가 연합회 및 상가 차원의 자율적 정비에 의한 자진정비 유도
- 노점상 전매·전대 행위 근절을 위한 노점상 연합회와의 협조 강화
- 상가 운영자에 대한 전반적 운영실태 전수 조사 실시(시장 상인회)
- 위반업소에 대한 과태료 및 행정 대집행 강화
- 영등포동 아크로타워스퀘어 인도에 무단횡단 방지용 횡스 설치 요청

□ 소요예산: 가로환경 개선 사업비에 포함

2 저단현수막 게시대 및 구민 전단지 배부대 설치 운영 가로경관과

불법현수막 및 벽보 단속 강화로 늘어난 광고수요를 해소하고 시민안전과 거리미관 향상을 위하여 저단 현수막 게시대 및 구민 전단지 배부대를 설치하여 쾌적한 가로환경으로 개선시켜 나가고자 함

□ 추진방향

- 적법하게 광고를 할 수 있는 홍보 공간 마련
- 도로 양 옆에 저단현수막 게시대 설치로 현수막 게시자에게 설치공간 제공
- 지정된 공간에 전단지 배포 유도로 불법 벽보 부착 차단 및 수거 보상비 절감
- 이용 수수료 징수를 통한 세외수입 증대 기여

□ 사업개요

- 운영기간: 2018. 1. ~ 12.(연중 계속)
- 설치장소: 유동인구 집중지역 및 역세권 등 주민의 주요 통행로 안전지대
- 운영방법: 광고주가 구청에 방문하여 사용 신고 후 게시(기간 15일)
※ 불법현수막 및 미신고 전단지는 지속적 단속 및 과태료 부과

□ 세부 추진계획

- 저단현수막 게시대 설치, 운영
 - 설치지역: 당산로, 신길로, 국회대로 등 4차선 이상 도로 양편 20개소
 - 설치대수: 20개(1개, 900천원)
- 구민 전단지 배부대 설치, 운영
 - 설치규모: 50개소(1개당 6면, 총 300면)
 - 배부대 형태: 1,630×830mm, 보도통행과 시야를 가리지 않는 형태로 최적화
 - 디자인: 현장과 잘 어울리며 안전에 지장이 없도록 하고 영등포구 상징성을 바탕에 도안

□ 추진일정

- 저단현수막 및 구민전단지 배부대 설치 계획 수립 및 설치: 3월~4월 중

□ 소요예산: 52,000천원(옥외광고발전기금 52,000)

구 소유건물 옥상의 여유 공간에 태양광 발전을 설치하여 에너지 자립도시 기반 구축에 앞장서고, 전기사용량 저감을 통한 기후온난화예방, 미세먼지 저감, 전기요금 절약에 기여하고자 함

□ 추진방향

- 국·시비 예산 확보를 통한 신재생에너지 보급의 지속적 추진
- 공공건물 태양광발전소 확대 보급으로 에너지 자립도시 기반 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 8월
- 총사업비 : 66,080천원
- 시설규모 : 도림2빛물펌프장 20KW, 보훈회관 3KW
- 사업방법 : 환경과에서 공사발주 및 시행

□ 세부 추진계획

- 도림2빛물펌프장
 - 용 량 : 태양광 20KW
 - 사업비 : 57,460천원 (국28,730, 시14,370, 구14,360)
- 보훈회관
 - 용 량 : 태양광 3KW
 - 사업비 : 8,620천원 (시4,310, 구4,310)

□ 추진일정

- 건물구조 안전성 검토 : 3월
- 태양광발전장치 설계 : 4월
 - 공사발주 : 4월
 - 공사시행 및 준공 : 5월 ~ 8월

□ 소요예산: 총66,080천원(국 28,730, 시 18,680, 구비 18,670)

건강에 취약한 어르신 세대를 대상으로 창문에 미세먼지 차단망을 설치해 줌으로써 미세 먼지로 인한 구민의 건강을 보호하고 마음놓고 생활할 수 있는 주거 공간을 조성하는데 기여하기 위함

□ 추진방향

- 건강취약계층 건강 보호
- 쾌적한 주거생활 공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2018. 5. 1. ~ 8. 30.
- 설치대상: 300세대
- 사업비: 10,500천원

□ 세부 추진계획

- 미세먼지 차단망 설치 희망자 모집
 - 신청자격: 국민기초생활수급자 중 65세이상 세대
 - 신청방법: 각 주민센터 및 구청환경과 전화 신청
 - 선정방법: 선착순
 - 설치갯수: 세대당 1~2개(크기:110cm×220cm)
- 설치방법
 - 업체선정: 공개경쟁입찰(최저가 낙찰)
 - 설치내용: 선정 세대에 방문하여 설치(전·후 사진, 설치완료 확인서 제출)

□ 추진일정

- 신청자 모집: 2018. 5. 1. ~ 6. 30.
- 차단망 설치: 2018. 7. 1. ~ 8. 30.

□ 소요예산: 총 10,500천원(구비 10,500)

관내 주요 녹지대와 나대지에 수목 생육환경 개선 및 다층구조 식생조성, 쇠굴 현상이 심한 사면복구 및 노후시설물 정비 등으로 쾌적한 가로변 녹지환경 조성 및 주민휴식공간 제공

□ 추진방향

- 훼손된 사면 피복 및 녹지량 확충을 통한 쾌적한 가로환경 조성
- 쉼터 조성을 통한 주민 소통, 화합의 공간 제공
- 주민 설명회 개최를 통한 주민 의견 수렴 및 적극 반영

□ 사업개요

- 위 치 : 양평2동 124-3 양평가로녹지대 등 9개소
- 규 모 : 30,000 m^2
- 내 용 : 나대지, 노후 녹지대 정비, 사면 배수시설 정비 및 노후시설물 교체, 수목 및 초화류 식재 등
- 일 정
 - 2018. 1. ~ 2. : 현장조사 및 실시설계
 - 2018. 3. ~ 4. : 설계심의 및 공사발주
 - 2018. 5. ~ 10. : 공사시행 및 준공
- 예 산 : 2,300,000천원(시비)

□ 기대효과

- 다층구조 식생조성을 통한 쾌적한 가로변 녹지환경 조성
- 주민 휴식 및 소통의 공간 제공

□ 소요예산 : 총2,300,000천원(시 2,300,000)

안양천 서울둘레길에 끊어진 데크로드를 잇고 산책로변에 큰나무를 식재하여 이용 주민에게 편의를 제공함으로써 쾌적한 하천환경을 조성하고 하천 녹지축 연결에 기여

□ 추진방향

- 단절된 서울둘레길 산책로 데크로드를 연결하여 산책길 완성
- 하천변 그늘목 식재로 주민에게 생태적 휴식공간 제공
- 하천변 녹음수 식재 등으로 하천 녹지축 연결

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안(성산대교남단~한강합수부), (양평교~한강합수부)
- 규 모 : 1.5km
- 내 용 : 안양천 서울둘레길 데크로드 연결 및 산책로변 큰나무 식재
- 일 정
 - 2018. 1. ~ 2. : 기술용역타당성 심사
 - 2018. 3. ~ 4. : 실시설계용역
 - 2018. 5. : 공사발주
 - 2018. 6. ~ 10. : 공사시행 및 준공
- 예 산 : 2,150,000천원(시비)

□ 기대효과

- 녹지축 연결을 통한 쾌적한 하천환경 조성
- 주민 휴식공간 제공으로 주민만족도에 기여

□ 소요예산 : 총2,150,000천원(시 2,150,000)

지구 온난화와 기상이변에 의한 도심 열섬화 현상 가속, 폭염에 의한 생활불편이 증대되고 있어 가로변 떠녹지를 정비하여 녹지량을 확충하고 신길로 33길 가로수를 정비하여 장기적으로 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

□ 추진방향

- 가로변에 훼손된 떠녹지를 보식하고, 정비하여 쾌적한 가로환경 조성
- 신길로33길 가로수길 조성으로 동네명소 브랜드화

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동 국제금융로 등 / 신길3동 신길로33길 일대
- 규 모 : 300m / 가로수 정비교체 30주
- 내 용 : 가로변 떠녹지 정비, 아교목/관목류/초화류 등 유지관리 등
가로수 바꿔심기 및 가로수길 조성(구 주민참여)
- 일 정
 - 2018. 1. ~ 4. : 실시설계
 - 2018. 4. ~ 10. : 공사시행 및 준공
- 예 산 : 148,000천원(구비)

□ 기대효과

- 가로변에 조성된 녹지대의 정비를 통한 쾌적한 가로변 녹지환경 조성

□ 소요예산 : 총148,000천원(구 148,000)
