

제209회 구의회 제1차 정례회

2018. 9. 7. ~ 9. 20.

청림 영등포

2018년 주요업무 보고




푸른도시과

보고 순서

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 중점사업 추진실적	...	21

I. 일반 현황

1 조직

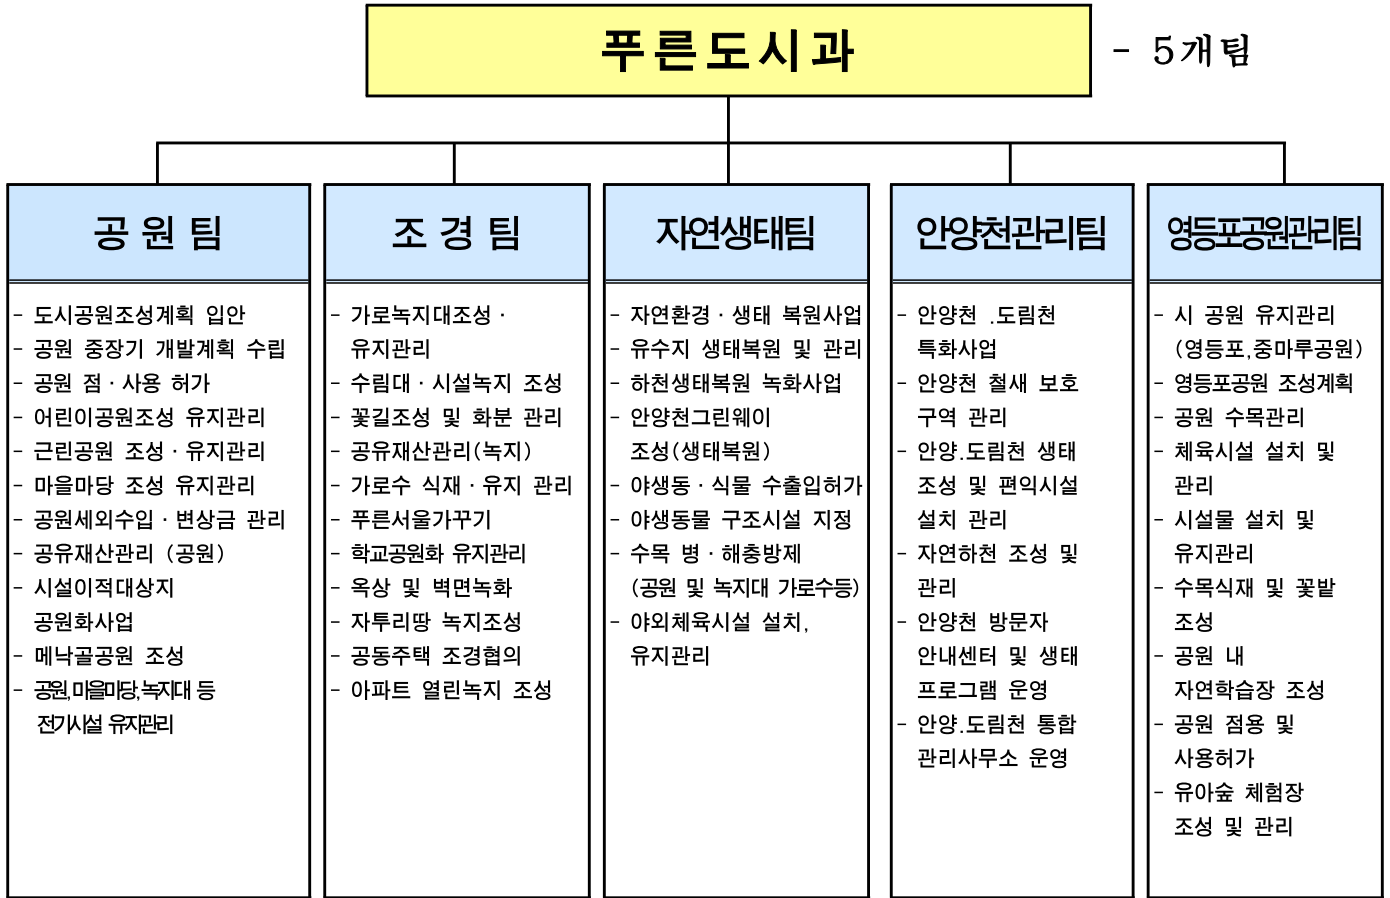

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제				
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	29	0	1	6	7	7	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0
현 원	28	0	1	7	11	4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
과부족	△ 1	0	0	1	4	△ 3	△ 4	0	2	△ 1	0	0	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	근린공원	10개소/549,377㎡ (구공원 6개소/141,431㎡, 시공원 4개소/407,946㎡)	공원팀
	어린이공원	18개소/54,637㎡	공원팀
	소공원	11개소/13,931㎡	공원팀
	마을마당	31개소/18,011㎡	공원팀
	녹지대	352개소/727,517㎡	조경팀
	가로수	109개노선 26종 18,423주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	자연생태팀
	체육시설	78개소 22종 840점	자연생태팀
장비	화물차	마이티(2.5t) 87루 7056(2017년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두 5244(2018년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두 5224(2018년)	자연생태팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루 8982(2018년)	공원팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루 8935(2018년)	조경팀
	소형화물	포터2(1t) 86우 4171(2011년)	안양천관리팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7630(2005년)	공원팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7614(2005년)	자연생태팀
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원팀

4

예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	10,853,354	6,845,303	63
공원관리 수준향상	3,152,346	2,244,032	71
가로녹지 수준향상	6,211,840	3,656,572	59
자연생태 수준향상	492,060	327,594	67
안양·도림천 특화	620,050	295,568	48
인력운영비	162,000	162,000	100
기본경비	174,232	119,100	68
내부거래지출	40,826	40,437	99

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	4
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충	7
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리	9
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	11
⑤	하천변 녹지 확충 및 정비	14
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성	15
⑦	공원내 위험요소 사전 정비	17
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비	19

의자, 목재데크, 산책로 탄성포장 등 공원 노후시설을 정비 및 교체하고 새로운 시설을 도입하여 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업 추진실적

○ 영등포공원 보수정비사업

- 위 치 : 신길로 275 영등포공원(영등포본동)
- 규 모 : 5,000 m^2
- 내 용 : 주차장 초소 주변 화단 정비, 물놀이장 및 배드민턴장 바닥 정비, 나대지 수목 식재, 잔디 유지관리 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 1. 31. ~ 3. 30. : 실시설계용역(영등포공원 보수정비사업)
 - 2018. 5. 4. ~ 6. 12. : 공사착공 및 준공(영등포공원 보수정비사업)
 - 2018. 2. 27. : 잔디유지관리용역 착공
 - 2018. 9. 30. : 잔디유지관리용역 준공(예정)
- 예 산 : 172,000천원(시비) ※ 집행액 : 125,109천원(시비)

○ 노후 마을마당 보수정비사업(완료)

- 위 치 : 덕천길마을마당(신길4동), 너섬마을마당(여의동)
- 규 모 : 2,722 m^2
- 내 용 : 조합놀이대 보수, 수목보식, 투수포장, 배수로정비, 화단정비 등
- 추진실적
 - 2018. 1. 24. ~ 3. 26. : 실시설계용역 시행
 - 2018. 4. 12. : 공사발주
 - 2018. 5. 27. : 공사준공
- 예 산 : 80,000천원(시비) ※ 집행액 : 79,038천원(시비)

○ 생활권 공원 녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : 영등포구 문래동5가 22-1 일대(문래동), 문래현대5차 앞
- 규 모 : 약 500 m^2
- 내 용 : 폐쇄도로 녹화, 아스팔트 철거, 수목식재, 휴게시설 조성 등

- 추진실적
 - 2018. 1. 25. ~ 3. 25. : 실시설계용역 시행
 - 2018. 4. 10. : 공사발주
 - 2018. 6. 15. : 공사준공
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 : 289,178천원(시비)
- 공원 시설물 정비사업(완료)
 - 위 치 : 문래, 당산, 신길, 메낙골, 자매공원, 새말, 인스빌소공원, 덕천길
 - 규 모 : 111,972.8 m^2
 - 내 용 : 노후 정자 등 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비, 수목식재
 - 추진실적
 - 2018. 1. 19. ~ 3. 17. : 실시설계용역 시행
 - 2018. 4. 4. : 공사발주
 - 2018. 6. 9. : 공사준공
 - 예 산 : 290,000천원(구비) ※ 집행액 : 254,214천원(구비)
- 어린이공원 정비사업(완료)
 - 위 치 : 신우공원 등 6개소(대림, 양남, 영일, 평화, 신길광장)
 - 규 모 : 20,000 m^2
 - 내 용 : 노후 어린이 놀이시설 및 휴게시설 교체, 수목식재 등
 - 추진실적
 - 2018. 1. 29. ~ 3. 9. : 실시설계용역 시행 및 준공
 - 2018. 4. 19. ~ 6. 26. : 공사 착공 및 준공
 - 예 산 : 235,400천원(구비) ※ 집행액 : 204,667천원(구비)
- 공원 시설 확충 및 개선사업(완료)
 - 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등 68개소
 - 규 모 : 5,000 m^2
 - 내 용 : 문래공원 노외주차장 주차관제시스템 설치,
노후·훼손 공원시설 정비, 수목·초화류 보식 및 긴급 보수정비사항 처리
 - 추진실적
 - 2018. 3. 29. ~ 4. 20. : 한마음마을마당 개선공사 시행
 - 2018. 4. 3. ~ 6. 26. : 문래공원 노외주차장 주차관제시스템 설치
 - 2018. 6. 15. : 강마을공원 철봉설치
 - 2018. 7. 4. : 물놀이장 이용안내판 설치
 - 예 산 : 110,000천원(구비) ※ 집행액 : 99,540천원(구비)

○ 공원 소나무 생육환경개선사업

- 위 치 : 문래공원 등 4개소(자매, 신길, 대림)
- 규 모 : 200주
- 내 용 : 소나무 전지, 영양공급, 병해충방제
- 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 3. 27. : 공사 발주
 - 2018. 3. 30. : 공사 착공
 - 2018. 9. 25. : 공사 준공(예정)
- 예 산 : 25,000천원(구비)

□ 현황사진(생활권 공원녹지 조성공사)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,212,400 (시 552,000, 구비 660,400)	1,051,746 (시 493,325, 구비 558,421)	86.7

관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 녹색공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 이용주민에게 다양한 볼거리와 휴식공간을 제공하고자 함

□ 사업 추진실적

○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위 치 : 영원중(영등포동), 양화중(문래동)
- 규 모 : 1,200 m^2 (영원중:600 m^2 , 양화중:600 m^2)
- 내 용 : 쉼터 조성, 야생화정원, 잔디정원, 그늘목 식재 등
- 추진실적
 - 2018. 2. 5. ~ 4. 15. : 실시설계 및 서울시 설계심의
 - 2018. 4. 24. ~ 6. 27. : 영원중 공사시행
 - 2018. 5. 4. ~ 6. 27. : 양화중 공사시행
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 : 299,917천원(시비)

○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위 치 : 여의도역(5호선) 2번 출구 앞 등
- 규 모 : 1,000 m^2
- 내 용 : 그늘목식재, 띠녹지 조성, 야생초화 식재, 산책로 정비 등
- 추진실적
 - 2018. 2. 8. ~ 3. 10. : 실시설계용역 시행
 - 2018. 6. 4. : 공사발주
 - 2018. 7. 18. : 공사준공
- 예 산 : 110,000천원(시비) ※ 집행액 : 105,375천원(시비)

○ 아파트 열린녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : 문래공원한신(문래동), 신길우성1차(신길3동), 양평현대2차(양평2동)
- 규 모 : 약2,500 m^2
- 내 용 : 담장 철거, 수목이식 및 식재, 편익시설 설치 등

- 추진실적

- 2018. 1. 26. ~ 4. 11. : 실시설계 및 주민의견 수렴
- 2018. 4. 25. ~ 6. 23 : 문래공원한신 공사시행
- 2018. 4. 26. ~ 6. 24 : 양평현대2차 공사시행
- 2018. 5. 23. ~ 6. 29 : 신길우성1차 공사시행

- 예 산 : 690,000천원(시비 345,000, 구비 345,000)

※ 집행액 : 594,000천원(시비 297,000, 구비 297,000)

□ 현황사진(가로정원 조성공사)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,100,000 (시 755,000, 구비 345,000)	999,292 (시 702,292, 구비 297,000)	90.8

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공하고자 함

□ 사업 추진실적

○ 가로수 생육환경 개선사업(진행중)

- 위 치 : 영등포로(오목교 ~ 영등포시장 4, 신길3거리~대방역)
도림로(문래대림A~대림역), 경인로(영등포R ~ 영등포역),
영중로(국회대로~양평로)

- 규 모 : 가로수 메워심기 60주, 보호판 500조 정비

- 내 용 : 가로수 메워심기, 보호판 정비 등

- 추진실적 및 향후계획

· 2018. 2. 21. ~ 6. 07. : 실시설계 용역 및 서울시 설계심의

· 2018. 8. ~ 10. : 공사시행(예정)

- 예 산 : 345,000천원(시비) ※ 집행액 8,660천원(시비)

○ 왕벚나무 수세회복사업(완료) / 보호수 생육환경개선 사업

- 위 치 : 여의도 봄꽃길 / 당산2동 보호수 등

- 규 모 : 왕벚나무 100주, 보호수 1주

- 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등

- 추진실적 및 향후계획

· 2018. 2. 28. : 공사발주(왕벚나무 수세회복사업)

· 2018. 3. 16. : 공사준공(10,000천원(구비)※집행액 9,200천원

· 2018. 7. 16. : 공사발주(보호수 생육환경 개선사업)

· 2018. 7. 16. : 공사착공

· 2018. 8. : 공사준공(예정)(13,600천원(시비)※집행액 13,450천원)

- 예 산 : 23,600천원(시비 13,600 구비 10,000)※집행액 22,650천원

○ 가로수 식재 및 은행나무 바꿔심기사업(진행중)

- 위 치 : 국제금융로(여의동) 등 관내 노선
- 규 모 : 가로수 식재(교체) 60주, 보호판 정비교체 60조 등
- 내 용 : 가로수 보식 및 교체, 보호판 정비 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 2. 13. ~ 3. 12. : 대상수목 현장조사 및 실시설계
 - 2018. 5. 03. : 공사착공
 - 2018. 11. 30. : 공사준공(예정)
- 예 산 : 150,000천원(구비) ※ 집행액 39,600천원(구비)

□ 현황사진(왕벚나무 수세회복)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
518,600 (시 358,600, 구비 160,000)	70,910 (시 22,110, 구비 48,800)	13.7

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화도시 영등포 이미지에 걸맞는 거리환경을 조성하고자 함

□ 사업 추진실적

- 가로변(의사당대로) 녹지량 확충사업(완료)
 - 위 치 : 여의도동 의사당대로
 - 규 모 : 3,000 m^2
 - 내 용 : 녹지대 조성 및 정비, 휴게시설 조성 등
 - 추진실적
 - 2018. 2. 14. ~ 4. 5. : 실시설계용역 시행
 - 2018. 5. 4. : 공사발주
 - 2018. 5. 28~7.26. : 공사준공
 - 예 산 : 350,000천원(시비) ※ 집행액 : 329,222천원(시비)
- 가로변(여의대로) 녹지량 확충사업(진행중)
 - 위 치 : 여의도동 여의대로 등 3개소(여의서로, 국제금융로)
 - 규 모 : 5,000 m^2
 - 내 용 : 토양개량, 녹지대 조성 및 정비, 휴게시설 조성 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 2. 9. ~ 5. 4. : 실시설계용역 시행
 - 2018. 6. 14. : 공사발주
 - 2018. 7. 9 ~ 11.15. : 공사준공(예정)
 - 예 산 : 750,000천원(시비) ※ 집행액 27,100천원(시비)
- 선유도역 걷고싶은 거리 조성사업(진행중)
 - 위 치 : 양평로 22길(선유도역 2번출구 ~ 양평가로녹지)
 - 규 모 : 4,000 m^2
 - 내 용 : 데크 휴게쉼터 조성, 무단횡단방지웬스, 보도블럭 등 교체, 수목식재 등 녹지조성
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 2. 5. ~ 4. 25. : 실시설계용역 시행
 - 2018. 6. 8. : 공사발주
 - 2018. 7. 3 ~ 9. 30. : 공사준공(예정)
 - 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 21,327천원(시비)

○ 도시구조물 벽면녹화사업(완료)

- 위 치 : (문래동)도림천고가 벽면
- 규 모 : 500 m^2
- 내 용 : 식생기반조성, 환토, 등반보조재 설치, 수목 및 덩굴식물 식재 등
- 추진실적
 - 2018. 2. 12. ~ 3. 13. : 실시설계, 서울시 설계심의
 - 2018. 4. 30. ~ 6. 21. : 공사시행
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 집행액 : 190,707천원(시비)

○ 사계절 꽃길 조성사업(완료)

- 위 치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 3개소
- 규 모 : 400 m^2
- 내 용 : 꽃길조성 200m, 장식화단 조성, 걸이화분 설치 등
- 추진실적
 - 2018. 5. 1. : 봄철 꽃길 조성 완료
- 예 산 : 36,626천원(시비) ※ 집행액 : 35,185천원(시비)

○ 영등포 꽃으로 피다 사업(완료)

- 위 치 : 서부간선도로 방음벽 아래 사면(문래현대5차~오목교)
- 규 모 : 1,700 m^2
- 내 용 : 가로변 사계절 장식화단 조성, 자투리땅 꽃·나무 식재 등
- 추진실적
 - 2018. 3. 21. ~ 4. 10. : 도면작성용역 시행
 - 2018. 4. 27. : 공사발주
 - 2018. 6. 1. : 공사준공
- 예 산 : 75,000천원(구비) ※ 집행액 : 69,020천원(구비)

○ 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업(진행중)

- 위 치 : 관내 가로녹지대 등
- 규 모 : 500 m^2
- 내 용 : 노후 시설물(의자 등)정비, 수목 보식 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 9. ~ 10. : 도면작성용역 시행
 - 2018. 10. ~ 12. : 양남사거리 등 녹지대 시설물 정비, 수목보식 등
- 예 산 : 50,000천원(구비)

○ 띠녹지 보식 및 정비(진행중)

- 위치 : 여의동 국제금융로 등 관내 띠녹지구간
- 규모 : 300m
- 내용 : 가로변 띠녹지 정비, 식재기반, 아교목/관목류/초화류 등 식재
- 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 3. ~ 8. : 실시설계, 주민의견수렴
 - 2018. 9. ~ 11. : 공사시행(예정)
- 예산 : 30,000천원(구비)

○ 공개공지 되살리기(완료)

- 위치 : 여의대방로9길 5(보래매두산위브, 신길6동)
- 규모 : 500m²
- 내용 : 쉼터조성, 수목식재, 노후시설물 보강 등
- 추진실적
 - 2018. 3. 21. ~ 4. 10. : 도면작성용역 시행
 - 2018. 5. 15. : 공사발주
 - 2018. 6. 26. : 공사준공
- 예산 : 30,000천원(시비) ※ 집행액 : 29,800천원(시비)

□ 현황사진(영등포 꽃으로 피다)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,021,626 (시 1,866,626, 구비 155,000)	702,361 (시 633,341, 구비 69,020)	34.7

안양천, 우수지에 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 제공하고자 함

□ 사업 추진실적

- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업(완료)
 - 위 치 : 안양천 제방 및 산책로 주변
 - 규 모 : 약 3km
 - 내 용 : 수목보식, 안내판 정비, 휴게시설 정비 등
 - 추진실적
 - 2018. 3. 6. : 공사 발주
 - 2018. 3. 8. ~ 3. 20. : 공사준공
 - 예 산 : 10,000천원(구비) ※ 집행액 : 9,200천원(구비)
- 안양천 화장실 설치사업(구 주민참여)(진행중)
 - 위 치 : 안양천 둘레길 (목동교~양평교)
 - 규 모 : 화장실 1동
 - 내 용 : 공중화장실 설치
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 8. ~ 9. : 추경(20백만원) 확보 및 공사 발주
 - 2018. 10. ~ 11. : 공사시행(예정)
 - 예 산 : 50,000천원 (구비)
 - ※ 총사업비 70,00천원이 소요되는 사업으로, 사업비(20백만원) 부족으로 사업 추진이 지연되고 있는 실정임.
- 셋강생태공원 친환경 문화프로그램 운영사업(진행중)
 - 위 치 : 여의도동 4-5일대 셋강생태공원 내
 - 내 용 : 생태교육(140회) 및 소규모 문화행사(10회) 진행
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 4. ~ 7. : 잠자리 생태문화학교 생태프로그램(106회)
 - 2018. 8. ~ 11. : 잠자리 생태문화학교 생태프로그램(64회)
 - 예 산 : 15,000천원(구비) ※ 집행액 : 10,288천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
75,000 (구 75,000)	19,488 (구비 19,488)	25.9

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 수목의 수형조절 가지치기 및 위험수목을 제거하여 안전사고 예방하고 가로경관을 향상시켜 안전하고 쾌적한 도심환경을 조성하고자 함

□ 사업 추진실적

○ 품격있는 가로수 관리사업(진행중)

- 위 치 : 경인로 등 시도로 9개노선, 배전선로 노선 37개 노선
- 규 모 : 여름/겨울철 1,000주, 배전선로 4,000주
- 내 용 : 시도로 및 한전 고압선 하부 가로수 가지치기 수형조절
- 추진실적 및 향후계획

- 2018. 2. 26. ~ 4. 06. : 겨울철 시도로 가지치기사업
- 2018. 3. 07 ~ 4. 20. : 배전선로 하부 가로수 가지치기사업
- 2018. 8. ~ 9. : 여름철 가로수 수형조절사업 시행(예정)

- 예 산 : 114,500천원(시비 114,500천원, 한전예산 별도)

※ 집행액 : 94,500천원(시비)

○ 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)(진행중)

- 위 치 : 문래로 등 관내 103개 노선, 양평가로 녹지대 등 300개소
- 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 600주
- 내 용 : 위험목/민원/신호등/표지판 저촉수목/ 녹지대 수목제거 및 수형조절
- 추진실적 및 향후계획

- 2018. 2.26. ~ 6. 8. : 가로수 가지치기사업(연간단가) 시행
- 2018. 2.26. ~ 12. 10. : 녹지대 위험수목 정비사업(연간단가) 시행

- 예 산 : 100,000천원(구비)※ 집행액 : 45,600천원(구비)

○ 열린학교(학교공원) 수목정비사업(진행중)

- 위 치 : 영림초교 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 15개소

- 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 150주
- 내 용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 150주
- 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 2. 12. ~ 2. 27. : 열린학교 수목정비사업(완료)
 - 2018. 10. ~ 11. : 하반기 수목정비사업 시행(예정)
- 예 산 : 30,000천원(구비)※ 집행액 : 19,000천원(구비)

□ 현황사진(겨울철 가로수 가지치기)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
244,500 (시 114,500, 구비 130,000)	159,100 (시 94,500, 구비 64,600)	65.1

공원 내 공원등과 전기시설 및 CCTV, 위험수목 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

□ 사업 추진실적

○ 공원 방송 음향시설 정비(완료)

- 위 치 : 당산공원(당산1동), 신길공원(신길5동)
- 규 모 : 공원 안내방송시설 정비 2개소 등
- 내 용 : 안내방송용 앰프, 스피커 설치, 안내방송시스템 구축
- 추진실적
 - 2018. 4. 5. : 공사발주
 - 2018. 4. 12. : 공사계약
 - 2018. 4. 12. : 공사착공
 - 2018. 5. 21. : 공사준공
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 집행액 : 18,085천원(구비)

○ 공원등 LED 조명 교체사업(완료)

- 위 치 : 중앙어린이공원 등 8개소
- 규 모 : 공원등 132등 교체
- 내 용 : 공원등 LED 등으로 교체하여 전기요금 절감 등
- 추진실적
 - 2018. 2. 1. : 공사발주
 - 2018. 2. 5. : 공사계약
 - 2018. 2. 6. : 공사착공
 - 2018. 3. 13. : 공사준공
- 예 산 : 80,000천원(구비) ※ 집행액 : 72,967천원(구비)

○ 전기시설물 유지관리사업(연간단가)(진행중)

- 위 치 : 관내 공원, 녹지대 등(문래공원 등 68개소, 녹지대 등)
- 규 모 : 공원등 764본 978등, 분전함 62면, 기타 전기시설 정비
- 내 용 : 공원등, 분전함, 기타 전기시설 정비 유지관리

- 추진실적 및 향후계획

- 2018. 1. 18. : 공사발주
- 2018. 1. 23. : 공사계약
- 2018. 5. 21. : 1차기성 준공
- 2018. 12. 31. : 준공(예정)

- 예 산 : 27,000천원(구비) ※ 집행액 : 16,454천원(구비)

○ 공원 내 수목 가지치기 및 식재사업(완료)

- 위 치 : 신갈근린공원 등 9개소(자매, 문래, 신우, 다사랑, 대림, 중앙, 양남, 달맞이)
- 규 모 : 158주
- 내 용 : 수목 가지치기 150주, 이식 6주, 뿌리분제거 2주
- 추진실적

- 2018. 3. 9. : 공사발주
- 2018. 3. 15. ~ 4. 3. : 공사 착공 및 준공

- 예 산 : 30,000천원(구비) ※ 집행액 : 28,958천원(구비)

○ 공원 내 수경시설 유지관리(진행중)

- 위 치 : 신갈5동 신갈광장 물놀이장 등 13개소
- 규 모 : 물놀이장5개소, 조형분수 2개소, 바닥분수4개소, 계류2개소
- 내 용 : 수경시설 노후부품교체 및 정비 등
- 추진실적 및 향후계획

- 2018. 3. 15. ~ 4. 4. : 현장조사 및 설계
- 2018. 4. 17. : 공사 시행(공원 내 수경시설 유지관리공사)
- 2018. 5. 3. : 공사 준공
- 2018. 6. 14. : 공사 시행(영일어린이공원 바닥분수 정비공사)
- 2018. 6. 28. : 공사 준공
- 2018. 6. 29.~ 10. 31. : 노후부품교체 및 추가 정비(예정)

- 예 산 : 25,000천원(구비) ※ 집행액 : 14,070천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
182,000 (구비 182,000)	150,534 (구비 150,534)	82.7

8 주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비(추진중) 공원팀·자연생태팀

주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

□ 사업 추진실적

- 공중화장실 환경개선(완료)
 - 위 치 : 신길근린공원 등 4개소(원지, 신우, 대림)
 - 규 모 : 공중화장실 4개소
 - 내 용 : 소변기 장애인손잡이 등 화장실 노후시설 교체 등
 - 추진실적
 - 2018. 4. 13. : 공사 발주
 - 2018. 4. 19. ~ 5. 16. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 19,000천원(구비) ※ 집행액 : 14,600천원(구비)
- 마을단위 야외체육시설 설치(진행중)
 - 위 치 : 도림게이트볼장 등 10개소
 - 규 모 : 흙먼지털이기 및 운동기구 30점 설치 및 교체
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 3. 2. : 공사발주(도림게이트볼장 등 휴게시설 정비공사)
 - 2018. 4. 2. : 공사준공(도림게이트볼장 등 휴게시설 정비공사)
 - 2018. 5. 9. : 구매발주(양평1동 흙먼지털이기 설치)
 - 2018. 6. 15. : 설치완료(양평1동 흙먼지털이기 설치)
 - 2018. 3. ~ 8. : 공사준공(신우어린이공원 등 8개소)
 - 2018. 9. ~ 12. : 노후체육시설물 교체 설치 시행(예정)
 - 예 산 : 100,000천원(구비) ※ 집행액 77,327천원
- 공원녹지포지 폐기물처리사업(진행중)
 - 위 치 : 양평2동 1-29(아리수정수센터 옆)
 - 규 모 : 2,500ton

- 내 용 : 공원녹지 발생 각종 혼합폐기물 반출처리
- 추진실적 및 향후계획
 - 2018. 3. 29 ~ 4.22 : 폐기물처리용역 1차 시행(완료)
 - 2018. 6. 14 ~ 7. 5. : 폐기물처리용역 추가 시행(완료)
 - 2018. 8. ~ 10. : 폐기물처리용역 하반기 시행(예정)
- 예 산 : 75,000천원(구비) ※ 집행액 : 32,550천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
194,000 (구비 194,000)	124,477 (구비 124,477)	64.2

Ⅲ . 중점사업 추진실적

1 생활권 공원녹지 조성사업(완료)

공원팀

주변에 공원이 없고 안양천 접근이 어려운 문래동 현대5차아파트 앞에 위치한 이면도로 폐쇄지역에 녹지와 쉼터를 조성함으로써 공원소외지역을 해소하고 쾌적한 주거 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동5가 22-1 일대(문래동, 문래현대5차 앞)
- 기 간 : 2018. 1. ~ 6. 15.
- 규 모 : 약500m²
- 내 용 : 이면도로 폐쇄구간 차 없는 거리조성, 쉼터, 산책로 조성
운동기구, 휴게시설설치, CCTV설치, 수목 및 초화류 식재 등

□ 추진실적

- 2017. 7. 7 : 서울지방경찰청 규제승인(차없는 거리)
- 2018. 1. 25. ~ 4. 5.: 실시설계용역
- 2018. 3. 6. : 주민 사업설명회 개최
- 2018. 3. 23. : 서울시 설계심의
- 2018. 4. 3. : 계약심사 및 일상감사
- 2018. 4. 10. : 공사발주
- 2018. 5. 2. : 공사착공
- 2018. 6. 15. : 공사준공

□ 향후계획

- 2018. 8. ~ : 상시 유지관리

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
300,000 (시 300,000)	289,178 (시 289,178)	96.4

양평2동 노후된 거리를 걷고 싶은 거리로 조성하여 보행여건 및 경관을 개선하고 선유도공원 이용자 및 주변 방문객들에게 쾌적하고 아름다운 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 양평로 22길(선유도역 2번출구 ~ 양평가로녹지)
- 기 간 : 7. 3. ~ 9. 30.
- 규 모 : 약 4,000 m^2
 - 양평로 22길: L 0.35km(폭 5~8M), 양평가로녹지대 일부
- 내 용 : 데크 휴게쉼터 조성, 무단횡단 방지웬스, 보도블럭 등 교체, 수목식재 등 녹지조성

□ 추진실적

- 2018. 2. 5. ~ 4. 25.: 실시설계용역 시행
- 2018. 4. ~ 5.: 설계심의 및 계약심사 시행
- 2018. 6. 8.: 공사발주
- 2018. 7. 3.: 공사착공

□ 향후계획

- 2018. 9. 30. : 공사 준공(예정)
- 2018. 10. ~ : 상시 유지관리

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
500,000 (시 500,000)	21,327 (시 21,327)	4.3%

지구 온난화와 기상이변에 의한 도심 열섬화 현상 가속, 폭염에 의한 생활 불편이 증대되고 있는 상황에 적극 대처하기 위해 가로변 띠녹지를 정비하여 도심 기온을 낮추고 장기적으로 아름답고 쾌적한 가로경관 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동 국제금융로 등
- 기 간 : 2018. 9. ~ 11.
- 규 모 : 300m
- 내 용
 - 가로변 띠녹지 조성 및 정비, 아교목/관목류/초화류 식재 등

□ 추진실적

- 2018. 3. ~ 8. : 실시설계 및 주민의견 수렴

□ 향후계획

- 2018. 9. ~ 11. : 공사발주 및 시행(예정)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
30,000 (구 30,000)	- (구 -)	-

신길로33길 일대에 이팝나무 가로수를 식재하여 아름다운 수형과 꽃을 감상할 수 있는 가로수길을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신길로33길 래미안프레비뉴아파트 앞
- 기 간 : 2018. 3. ~ 6.
- 규 모 : 270m
- 내 용 : 느티나무 14주 이식, 이팝나무 41주 식재 등

□ 추진실적

- 2018. 2. ~ 3. : 사업추진계획 수립 및 주민의견 수렴
- 2018. 2. 27. ~ 3. 26. : 실시설계용역 시행
- 2018. 5. 29. : 공사발주
- 2018. 6. 14. ~ 6. 27. : 공사착공 및 준공

□ 향후계획

- 2018. 8. ~ : 급수 등 활착유도 관리

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
90,000 (구 90,000)	72,405 (구 72,405)	80.5

우리구 공원 및 녹지대에 설치된 공원등을 고효율, 친환경 LED조명으로 교체하여 에너지 및 전기요금을 절감하고 온실가스 감축을 통한 저탄소 녹색 산업 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 중앙어린이공원 등 9개소
- 기 간 : 2018. 1. ~ 3. 13.
- 규 모 : LED조명 132등 교체
- 내 용 : 공원안전등급(R,Y)이 낮은 공원 우선적으로 LED조명 교체하여 안전하고 쾌적한 공원환경 제공

□ 추진실적

- 2018. 2. 1. : 공사발주
- 2018. 2. 5. : 공사계약
- 2018. 2. 6. : 공사착공
- 2018. 3.13. : 공사준공

□ 향후계획

- 2018. 4. ~ : 정기적으로 시설물을 점검하고 효과 분석을 통하여 매년 LED 조명 확대

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
80,000 (구 80,000)	72,967 (구 72,967)	91.2

매년 공원을 이용하는 주민의 증가에 따라 공원내 금지행위 안내방송을 통하여 공원 이용 기본 질서를 잘 지킬 수 있도록 안내방송하여 쾌적한 공원 이용환경을 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 당산공원(당산1동), 신길공원(신길5동)
- 기 간 : 2018. 4. ~ 5. 21.
- 규 모
 - 당산공원 : 노후 스피커 교체 및 앰프 설치
 - 신길공원 : 스피커 및 앰프 신설
- 내 용 : 공원 이용객이 많은 당산·신길공원에 공원 기초질서 계도를 위한 안내방송 시스템을 구축하여 쾌적한 공원환경을 제공

□ 추진실적

- 2018. 4. 5. : 공사발주
- 2018. 4.12. : 공사계약
- 2018. 4.12. : 공사착공
- 2018. 5.21. : 공사준공

□ 향후계획

- 2018. 5. ~ : 지속적인 효과 분석을 통한 점진적 개선

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
20,000 (구 20,000)	18,085 (구 18,085)	90.4
