

제198회 구의회 제2차 정례회

2016. 11. 21. ~ 12. 20.

청림 영등포

국 별

# 2016년 주요업무 보고



## 안전건설국

# 보고 순서

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 6
III . 2017년 주요업무 추진계획	· · · 26
IV . 신규·주요투자 사업	· · · 43

# I. 일반 현황

## 1 조직

### 안전건설국 - (6)과 (26)개팀



## 2 인력

구분	계	일반직						관리운영직				별정직·임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정원	195	1	6	42	62	54	17	1	3	4	1	1	1	1	1
현원	188	1	6	44	65	26	27	1	13	0	0	1	1	1	2
과부족	△7	-	-	2	3	△28	10	-	10	△4	△1	-	-	-	1

### 3

## 주요시설 및 장비

### 도시안전과

구분	명칭	현황	비고
시설	재난위험 시설	24개소	- D급 24
	U- 영등포통합관제센터	영등포보건소 지하1층/1개소	
	CCTV	892개소/1,516대	
장비	민방위장비	2,722개	(전자메가폰 579, 지휘용 애플 89, 응급처치 세트 348, 환자용 들것 341, 휴대용 조명등776, 교통신호봉 589)
	영상관제시스템	79대	- 서버, 영상저장장치, 보안시스템, 관제용PC
	통신장비	6대	- 자가정보통신망, 네트워크 장비
	영향음향시스템	1식	- 모니터 등

### 건설관리과

#### □ 가로 시설물 현황

(단위 : 개소)

보도상 영업시설물			광고물 시설물		
소계	가로 판매대	구두 수선대	소계	현수막 게시대	시민게시판
148	74	74	68	36	32

#### □ 옥외광고물 관리 현황

(단위 : 개소)

계	옥상	돌출	지주	가로형	세로형	기타
5,991	57	1,545	154	3,865	63	307

## 도 로 과

도로현황 : 주요간선도로(경인로 외 27개 노선)

연장 390.6km		도 로 율
시도 76.0km	구도 314.6km	23.4% (서울시 : 22.42%)

시설물 현황

계	교 량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	입체교차로
51개소	20	6	12	1	7	5

조명시설

가 로 등 - 구 관리	보 안 등 - 구 관리
9,105등 (LED 867)	9,800등 (LED 1,688)

## 치 수 과

시설물 현황

구 분	빗물펌프장	간이펌프장	수 문	원격감시시설	하수관거	하천
시설개요	8개소	7개소	23개소 (59문)	26개소	473,220m	4개 (16.96km)

## 교통행정과

교통시설물 현황

계	도로안내표지	보행자안내표지	도로반사경	자전거보관대	무인자전거시설
955개소	536	57	228	132 (3,817대)	2 (282대)

건설기계 등록

계	영업용	자가용	관 용	비 고
18,163	16,362	1,788	13	서울시 전체(47,708대)의 38.1%

자동차 등록 현황

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	이륜자동차
163,619	118,868	6,343	20,459	1,123	16,826

**주차문화과**

주차장 현황

구분	계	노상주차장				노외주차장				건축물 부설주차장				
		소계	가주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일반 건축물
개 소	11,733	5,479	5,429	41	9	66	30	3	33	6,188	1,691	1,885	958	1,654
면 수	160,160	6,658	5,429	957	272	5,779	2,799	1,000	1,980	147,723	2,850	4,418	67,697	72,758

CCTV 현황

계	불법 지정차 단속용	그린파킹 계도용
210대	118	92

## 4

## 예산 현황

(단위: 천원)

부서명	예산액	집행액		집행률(%) (10.31기준)
		10.31기준	12.31까지	
계	46,128,618	26,543,219	32,111,477	57.5
도시안전과	3,459,343	3,011,113	3,390,606	87.0
건설관리과	677,977	591,730	645,722	87.2
도로과	8,374,264	5,893,869	6,562,257	70.4
치수과	4,290,335	3,120,605	3,605,041	73.0
교통행정과	1,188,131	727,113	1,000,126	61.2
주차문화과	28,138,568	13,198,789	16,907,725	46.9

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	재난 안전관리 체계 및 대응능력 향상 .....	7
②	방범용 CCTV 신규 및 성능개선 .....	9
③	도로·하천 등 행정재산 관리 .....	10
④	거리가게 및 노상적치물 정비 .....	11
⑤	광고물의 효율적 관리 및 정비 .....	12
⑥	도림로 확장공사 .....	13
⑦	도림동 ~ 신도림역간 보도육교 설치공사 .....	15
⑧	도림동 286-11 ~ 187-39간 도로개설공사 .....	16
⑨	LED 가로등 및 보안등 설치공사 .....	17
⑩	하수관로·사각형거 개량 및 보수·보강공사 .....	18
⑪	빗물펌프장 수방시설 정비 및 정밀안전진단 .....	19
⑫	교통사고 예방 안전대책 강구 .....	20
⑬	교통 안전 및 편의시설 유지관리 .....	21
⑭	자동차 관련 법규위반자 처리 .....	22
⑮	공영주차장 건설 적극 추진 .....	23
⑯	지속적인 불법 주·정차 단속을 위한 주차질서 확립 .....	24
⑰	주·정차 위반 과태료 징수율 제고 .....	25

각종 재난으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고, 실제 재난상황 발생 시 대응역량을 강화하여 구민 안전관리에 만전을 기하고자 함

## □ 사업개요

- 재난 및 안전관리 계획: 33개유형
  - 자연재난: 풍수해 대책 등 7개분야, 사회재난 : 감염병대책 등 14개분야, 안전관리: 공연·행사장, 지역축제 안전사고 등 12개분야
- 특정관리시설물 현황: 1,010개소
  - 중점관리시설 986개소(A~C급), 재난위험시설 24개소(D급)
- 민간단체 현황

구 분	지역자율방재단	우리동네 안전감시단
구 성	'09. 7.	'16. 7.
활동내용	재난취약지역 사전예찰활동 및 신고·정비	지역 내 순찰 및 안전위해요소 신고
인 원	504명(18개동 및 민간단체)	36명

## □ 주요 추진실적

- 2016 재난안전관리계획 수립: 재난안전대책본부 구성, 재난유형별 책임 부서 지정, 책임관별 주요임무, 13개 기능반별 임무와 역할
- 해빙기 안전관리 추진
  - 옹벽 등 재난위험시설 52개소 민·관 합동점검 실시: 2.15. ~ 3.31.
    - 23개소 현지시정 및 보수·보강 조치 완료
- 우기대비 안전관리 추진
  - 건설공사장 등 위험시설 57개소 민·관 합동점검 실시: 2.1. ~ 9.30.
    - 15개소 현지시정 및 보수·보강 조치 완료
- 폭염 종합대책 추진 (인명 및 재산피해 : 없음)
  - 기 간: '16. 6월 ~ 9월
  - 폭염대비 독거어르신 등 취약계층 보호활동
    - 노 숙 인: 무료진료 86, 거리상담 2,361, 순찰246
    - 쪽 방 촌: 방문 214, 전화 329
    - 무더위쉼터:194개소 280회 점검
    - 문자서비스 홍보: 44,277명

- 특정관리대상시설물 안전점검(상반기)
  - 특정관리대상시설 자체점검 및 민·관 합동점검 실시
    - 25개소 현지시정 및 보수·보강 조치 완료
- 재난 취약가구 안전점검 및 정비사업 시행 : '16. 5. ~ 9.
  - 총 777가구 안전점검(전기 340, 소방 315, 가스 122)
    - 누전차단기, 스위치, 콘센트 교체 및 간이소화기, 가스타이머 설치
- 재난대응 훈련실시 및 평가보고회 개최
  - 서울 대규모 복합재난 합동훈련(4.27) - 여의도한강공원
    - 재난현장통합지원본부, 응급의료소 설치, 엠블런스 출동 훈련 등
  - 안전한국훈련(5.16~5.20)
    - 비상소집훈련, 소방차 길터주기, 심폐소생술, 재난대피 훈련 등
  - 재난대응 평가보고회(9.28)
    - 재난안전대책본부 13개 협업반별 임무와 역할 보고
- 재난안전교육
  - 공무원 및 공사관계자: 2회 372명
  - 자율방재단 재난 교육: 100명
  - 어린이 재난 안전 예방교육: 65개소 어린이집
- 저지대 주민 풍수해 보험 가입: 171가구
- 안전문화운동영등포구 협의회 개최; 10.27
  - 기관별·단체별 추진사항 및 우수사례 보고

**□ 향후계획**

- 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 정비
- 월동기 안전관리 추진: 특정관리대상시설 중 등급하향시설 민·관합동점검
- 특정관리대상시설물 일제조사: '16. 9. ~ 11.
- 동절기 재난 취약가구 안전점검 및 정비시행: '16.11.~12.
- 한파 대책 추진; '16.12. 1~ '17. 3.15

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
121,148 (국비3,000 시비 44,799, 구비 73,349)	113,529 (국비 3,000, 시비 44,799, 구비 68,730)	93.0

## 2 방법용 CCTV 신규 및 성능개선

도시안전과

방법 CCTV 신규 설치 및 저화질(41만화소) CCTV와 구형(아날로그) 비상벨을 성능 개선하여 긴급 상황 대응 등 운영업무의 효율성을 제고함.

### □ 사업개요

- 소요예산: 1,320백만원
- 사업내용

구 분		사업내용	소요예산 (단위:천원)		
			국비	시비	구비
		계	900,000	100,000	320,000
신규설치 (45개소)		- 범죄 취약지 36개소(국비) - 시 주민참여 선정 장소 5개소(시비) - 구 주민참여 선정 장소 4개소(구비)	720,000	100,000	70,000
성능 개선	CCTV	- 내구연한 경과 41만 화소 38대 (국비: 8대, 구비: 30대)	40,000		150,000
	비상벨	- 아날로그 비상벨 238대 (국비: 108대, 구비: 130대)	140,000		100,000

※ 성능개선 연도별 추진 계획

구분	합계	2016년	2017년	2018년	2019년
CCTV	226대	38대	20대	90대	78대
비상벨	353대	238대	20대	95대	-

### □ 주요 추진실적

- 1월 ~ 2월: 신년인사 주민건의 사항 등 동별 수요조사
- 2월 : 구 위치선정위원회 구성 및 심의
- 3월 : 각 동별 설치동의서 징구 및 행정예고
- 3월 ~ 4월: 현장조사(설계) 및 조달발주
- 6월 ~ 9월: 계약 및 시공
- 9월 : 준공 및 접수

### □ 향후계획

- 16. 11 ~12: 쓰레기무단투기 단속CCTV 신규설치(5개소)
- 16. 11 ~12: 방법CCTV 신규설치(8개소)

### □ 예산현황

(단위:천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,320,000 (국900,000 시100,000, 구비320,000)	1,181,491 (국900,000 시100,000 구비181,491)	89.5

국·공유지 행정재산의 체계적인 관리로 무단사용자에 대한 권리보전 및 신규세원을 발굴하고 사용료, 변상금 등 징수율을 제고하여 세외수입 증대와 행정재산 관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 대 상: 공공용지 4,660필지, 5,096,410 $m^2$
- 내 용
  - 도로사용료 정기분 부과 ⇒ 3월
  - 도로 무단 점유 변상금 정기분 부과 ⇒ 12월
  - 행정재산 실태조사를 통한 신규 세원 발굴 ⇒ 연중

○ 징수목표 (단위 : 천원)

계	도로사용료	변상금	하천사용료	과 태 료	징수교부금	가로판매대 사용료
6,527,871	3,439,639	965,223	14,310	58,390	2,011,867	38,442

□ 주요 추진실적 (단위 : 천원)

구 분	목 표	부 과	징 수	달성률
'16.10.31.현재	6,527,871	6,197,417	5,882,700	90.1%

□ 향후계획

- 국·공유 행정재산 실태조사 실시(연중 수시)
- 행정재산 무단점유 변상금 정기분 부과(12월 예정)

□ 예산현황 (단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
53,780 (구비 53,780)	41,116 (구비 41,116)	76.4

거리가게 및 노상 적치물에 대한 효율적인 정비를 추진하여 주민의 안전을 위한 도로 기능을 회복하고, 보행권을 확보하여 쾌적하고 편리한 가로환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간: 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 대 상: 거리가게 및 노상적치물
- 정비인력 및 장비: 11명, 차량 3대

### □ 주요 추진실적

- 주요추진사업
  - 2.22. ~ 3.11.: 신학기 학교주변 거리가게 및 적치물 정비
  - 4. 3. ~ 4.11.: 영등포 여의도 봄꽃축제 특별 가로정비
  - 5.18. ~ 6.12.: 영일마늘시장 특별가로정비
  - 8. 9. ~ 9.18.: 영등포 청과시장 특별가로정비
  - 10.8. : '16년 서울세계 불꽃축제 특별가로정비
  - ※ 공휴일 · 야간 등 근무시간 외 특별 가로정비 실시: 50회
- 정비실적
  - 거리가게 및 노상적치물 이동(계도): 26,020건
  - 강제수거: 792건(거리가게 504, 노상적치물 288)
  - 행정처분: 138건 / 58,386천원

### □ 향후계획

- 소통과 상생의 원칙에 의한 이원적 관리
- 대형 · 기업형 거리가게 집중 단속 및 대집행
- 반복 · 상습적 위반자에 대한 행정조치 확행

### □ 예산현황

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
351,604 (구비 351,604)	331,988 (구비 331,988)	94.4

난립되어 있는 불법광고물을 정비하여 보다 밝은 도시 미관을 조성하고 오가는 시민들에게 쾌적한 보행 환경을 제공하기 위하여 다양한 정비사업을 지속적으로 실시하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 정비대상
  - 고정 광고물: 무허가 · 미신고, 표시위반 광고물 등
  - 유동 광고물: 불법현수막, 입간판, 에어라이트 등

□ 주요 추진실적

- 옥외광고물 관리
  - 신규 및 연장 간판 안전도검사 실시: 수시
  - 해빙기 및 풍수해 특수관리시설(옥상 간판 등) 안전점검 실시 : 해빙기점검(2.15.~2.26.) / 풍수해점검(5.10.~6.30.)
  - 옥외광고심의위원회 개최: 대심의(9회) / 소심의(34회)
- 불법광고물 정비
  - 종류별 정비실적

(단위 : 건)

유동광고물					고정광고물			
계	현수막	입간판	에어라이트	기타	계	가림(세로)	돌출	기타
63,033	41,386	939	108	20,600	154	76	28	50

- 불법광고근절 캠페인 및 간담회 개최
- 불법현수막 수거보상제 실시
- 불법광고물 부착방지판 설치(대림역 주변, 양평2동 ‘건고싶은거리’)

□ 향후계획

- 불법사설안내표지판 정비: 동 주민센터 불법표지판 등 총 30여개소 정비

□ 예산현황

(단위 : 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
71,427 (시 46,000, 구비 25,427)	54,222 (시 38,545, 구비 15,677)	75.9

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위 치: 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~신길동421-16간(신길광장)
- 규 모: 도로확장 B=25→35m L=1,150m
  - ┌ 상부: 기확장 850m, 미확장 300m(신길14구역 100m제외)
  - └ 하부: 기확장 870m, 미확장 280m
- ※ 2016년
  - ┌ 공사위치: 신길동355-662~신길동420-192(하부)
  - 공사규모: 폭 30→35m, 연장 173m
  - 보상위치: 신길동 420-193~신길동 421-29
  - └ 보상규모: 토지 2필지(145㎡), 연장 37m
- 사업기간: 1997년 ~ 2018년
- 총사업비: 50,150백만원(시비, 보상비 44,100, 공사비 5,900, 설계비150)
- 연차별 투자계획 (단위:백만원)

구 분	총 사업비	기투자	2015	2016	2017	2018	비고
계	50,150	36,550	1,000	2,000	2,600	8,000	
보 상 비	44,100	32,600	500	1,400	2,200	7,400	
공 사 비	5,900	3,800	500	600	400	600	
설 계 비	150	150	-	-	-	-	

□ 주요 추진실적

- '16. 3.23.: 공사 착공
- '16. 4. ~ 9.: 건축물 철거 및 각종 지장물 이설
- '16. 10.: 아스팔트 및 보도블록 포장완료, 교통신호기 설치

□ 향후계획

○ '16. 11.: 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
2,000,000 (시비 2,000,000)	346,333 (시비 346,333)	17.3

□ 위치도



도림천으로 단절되어 있는 신도림역과 아파트 단지 간의 연결로 설치로 보행로를 확보하여 신도림역의 보행접근 편의성 향상을 도모코자 함.

## □ 사업개요

- 위 치: 도림동 아파트단지 ~ 신도림역 1호선
- 규 모: 연결로 폭 2.5m, 연장 104.6m
- 사업기간: 2013년 ~ 2016년
- 총사업비: 2,880백만원(시비 2,880) (단위:백만원)

구 분	계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비 고
총사업비	2,880	50	253	2,577			
설 계 비	180	50	130				
공 사 비	2,700		123	2,577			

## □ 주요 추진실적


- '16. 1.~5.: 강교설치 및 부대공사(진입로 설치 등)
- '16. 5. 28.: 공사완료 및 개통

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,673,798 (시비 이월금1,673,798)	1,673,798 (시비 이월금1,673,798)	100

## □ 위치도 및 현황사진

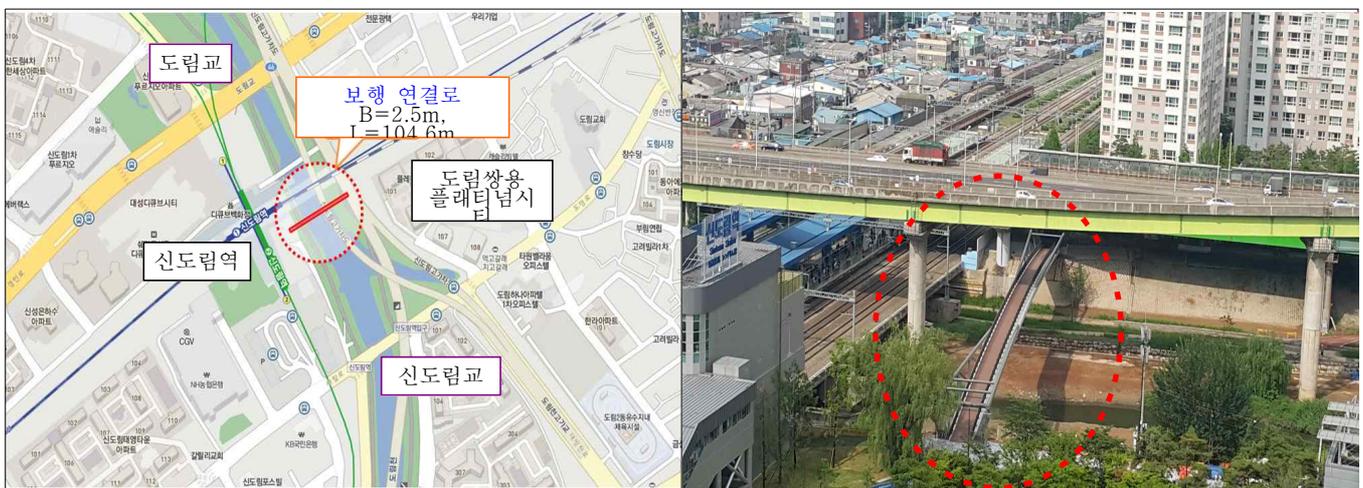

철도변 이면도로 개설로 신도림역을 이용하는 영등포동, 도림동 구민의 통행불편 해소 및 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 추진으로 민원해소.

### □ 사업개요

- 위 치: 도림동 286-11~187-39간
- 규 모: 도로개설 폭 6m, 연장 265m
  - ※ 보상 1기 보상(2010) - 토지2필지(57 $m^2$ )
  - ↳ 금회보상(2016) - 토지7필지(260 $m^2$ )
- 사업기간: 2010~2018년
- 총사업비: 4,903백만원(구비: 보상비3,750, 공사비1,103, 설계비 50)  
(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2015	2016	2017	장 래	비 고
총사업비	4,903	350		1,000	730	2,823	
설 계 비	50	50					
보 상 비	3,750	300		1,000	350	2,100	
공 사 비	1,103				380	723	

### □ 추진실적

- '16. 6. ~ 10. : 도시계획시설(도로) 선형변경 및 실시계획인가고시

### □ 향후계획

- '16.11. ~ 12. : 보상시행(건설관리과)

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,000,000 (구비 1,000,000)	61,364 (구비 61,364)	6.1

### □ 위 치 도



□ 사업개요 및 추진실적

구분	위 치	규 모	사업기간	예 산 (천원)	공정율 (%)
가 로 등	신평로 (도림로~대방로)	75W 80본 (91등)	'16. 6. ~ '16.11	690,000	80
	가마산길 (도림로~가마산로65길)	75W 31본 (33등)	'16. 6. ~ '16. 9	220,000	100
	복음길 (제물포로~여의도공원)	100W 36본 (42등)	'16. 6. ~ '16. 9	260,000	100
보 안 등	대림1동 일대	50W 112등	'16. 6. ~ '16.10	114,000	100
	대림3동 일대	50W 194등	'16. 6. ~ '16.10	213,360	100

□ 향후계획

- '16. 11. : 신평로 가로등 개량공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,497,360 (시 1,427,360, 구비 70,000)	1,280,425 (시 1,210,425, 구비 70,000)	85.5

노후·불량 하수관로 및 사각형거를 보수·보강함으로써 안정성 확보 및 원활한 유수 소통을 통해서 안전한 도시환경 조성 및 수해예방에 만전을 기하고자 함.

### □ 사업개요 및 추진실적

구분	위 치	규 모 (■: 사각형거 / D: 하수관로)	사업기간	예 산 (백만원)	공정률
보수·보강	여의도 배수분구	■ 1.4×1.0~■ 2.8×1.5m A=3,394㎡(L=1,002m)	'15.10.22.~ '16. 6. 4.	1,000	100
	당산동2가 45-5~164-4	D=800~1,000mm L=526m	'16.3~11.27	500	97
	영등포구청역 ~ 양평역간 일대	■ 1.0×1.0~3.8×2.3m, 단면보수 A=2,073㎡	'16.4.11~11.18	500	100
개량공사	양평동3가 59~70-1번지	D=450~700mm, L=510m	'16.2~12.23	700	95
	영등포동7가 43-7~ 63-46	■ 2.0×1.8m, L=295m	'15.6.10.~ '16.10.30	1,400	100
	영등포동8가 28~59-1번지	D=1,000mm, L=187m	'16.2~10.17	400	100
	문래동 44 ~ 45번지	■ 1.2×1.2m, L=264m	'16.2~12.15	700	90
	문래동2가 14-1~49-21번지	D=1,000mm, L=255m	'16.2.~12.23	600	83
	영등포구청 주변 및 도림동, 문래동	D300~D1,200mm, L=3,202m	'15.4. ~ '16.7.22.	3,000	100
	여의공원로 13길 일대	D600~800mm, L=188m (개량) ■ 2.3×1.5m, L=400m(A=1,950㎡) (보강)	'16. 2.~12.30	1,000	78

### □ 향후계획

- '16.11.~12.: 사각형거 보수·보강공사 준공

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
9,800,000 (시비9,800,000)	7,563,317(시비)	77

빗물펌프장 및 수문 등 수방시설에 대한 점검·정비·진단을 실시하여 수방 준비 및 사전 재해예방에 만전을 기하고자 함.

## □ 사업개요

- 기간: '16. 1. 1. ~ 12.
- 대상: 빗물펌프장 8개소, 간이펌프장 7개소, 수문 23개소 점검·정비

## □ 주요 추진실적

- 양평1빗물펌프장 모터펌프 제작구매 설치: 12대(입축사류펌프 630Hp)
- 빗물펌프장 정밀안전진단 용역: 4개소 (양평1·양평2·신길·영등포)
- 수방용 양수기 점검·정비용역: 1,333대
- 빗물펌프장 배수펌프 교체: 4대
  - 대림2빗물펌프장 50Hp×1대, 20Hp×1대
  - 대방천3간이펌프장 20Hp×2대
- 수문 정밀점검 용역 : 8개소
  - 여의도, 양평1, 대림1, 대림2, 대림3, 대림4, 대림5, 대림6
- 빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비공사: 4개소
  - 영등포, 도림2, 문래, 대림3
- 빗물펌프장 노후 수문 정비 공사: 10개소
  - 양평2, 신길, 영등포, 대림3, 문래, 대림2·2-1·2-2, 대방배수문, 강변4호수문

## □ 향후계획

- '16.11.: 수방용양수기 점검·정비 용역 준공
- '16.11.: 양평1빗물펌프장 모터펌프 제작설치(8대) 준공
- '16.12.: 빗물펌프장 정밀안전진단 용역 준공

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
2,070,940 (구비 75,000, 시비 1,837,940) 구기금 158,000)	1,757,515 (구비 41,917, 시비 1,573,858) 구기금: 141,740)	82.2

서울시 교통사고 사망자 통계에 따르면 2015년도 우리구 사망자수가 29명으로 가장 높게 나타나 금년도에 교통사고를 획기적으로 줄일수 있도록 교통안전대책을 강구함

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 연중
- 내 용 : 총 16개사업 699백만원 규모의 교통안전대책 사업추진
  - 시설분야: 차없는거리 조성등 8개사업 649백만원
  - 운영분야: 교통실태조사 실시 등 3개사업 35백만원
  - 교육분야: 안양천 교통안전체험장 운영 1개사업 15백만원
  - 홍보분야: 보호구역 홍보캠페인 등 3개사업 (비예산)
  - 기타분야: 영등포구 교통안전 토론회 개최 (비예산)

□ 주요 추진실적

- 교통사망사고 발생건수('16.10.31일 기준) - 19명(15년 대비: -1명)
- 시설분야: 양평로22라길 안전웬스 115m 설치완료 , 차없는거리 완료, 영등포로타리 칼라레인 설치완료
- 운영분야: 교통안전실태조사(국토교통부, 교통안전공단) 진행중  
교통사망사고 신속운영팀(TF) 운영4회 완료 및 교통안전지도사업 정상 추진중
- 교육분야: 안양천 교통안전체험장 정상운영(10월기준) - 72회 1,242명
- 기타분야: 영등포구 교통안전 토론회 개최(6.30) 완료

□ 향후계획

- 금년도 추진사업들에 대한 정상 추진 예정

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
699,000 (국224,600, 시358,400, 구비116,000)	664,000 (국222,800, 시339,200, 구비102,000)	95.0

우리구 관내 교통안전시설물 및 편의시설물 중, 노후·파손된 시설은 즉시 교체 정비하고, 민원 요구사항이나 필요시에는 신규로 추가 설치함으로써 도로를 이용하는 주민들에게 편의를 도모하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간: 2016년 연중
- 내 용
  - 버스승차대 신설 및 유지보수(연간단가), 도로안내표지판 문안수정, 시선유도봉 및 도로반사경 정비 교체, 교통안전시설물(안전표지, 노면표시) 신설 및 정비공사(연간단가) 시행 등

**□ 주요 추진실적**

- 버스승차대 유지관리 정비공사: 승차대 침지물 제거(3개소), 승차대 지붕보수(1개소) 등
- 버스승차대 신설공사 실시: 총 3개소(여의도중학교, 당산동진로아파트, 대동초등학교)
- 버스승차대 바람막이 설치공사 완료: 선유중학교 1개소
- 교통시설물 유지관리 정비공사: 시선유도봉 신설(41개) 및 도로반사경 신설(11개) 등
- 도로안내표지판 정비공사 실시: 문안정비 27건, 표지판 교체 1건
- 봄꽃축제 교통통제에 따른 표지판 제작 54개, 걸개형 플랜카드 제작 설치 10개
- 안전표지 설치·교체·이설·철거·조정 : 131건
- 노면표시 도색·제거 : 20,803m

**□ 향후계획**

- '16. 10. ~ 11.: 영동초교 주변 통학로 정비공사 실시
- '16. 10. ~ 11.: 자전거이용시설 정비공사 실시
- '16. 10. ~ 11.: 과속경보시스템 정비공사 실시
- '16. 10. ~ 11.: 생활권 이면도로 정비사업 실시

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
324,700 (국 130,000, 구비194,700)	266,609 (국 126,294, 구비 140,315)	82.1

자동차손해배상보장법 제8조(운행의 금지)를 위반한 의무보험 미가입 차량 운행 위반자와 자동차관리법 제26조(자동차의 강제처리)를 위반한 무단방치 차량 소유자를 관련 법규에 의거 공정하고 신속하게 처리함으로써 행정에 대한 신뢰 향상

□ 사업개요

- 기 간: 2016년 연중
- 대 상: 의무보험 미가입 차량 운행 위반자  
무단 방치 차량 소유자 또는 점유자
- 내 용: 자동차관련법규 위반자 신문 및 범칙금 부과 또는 검찰송치

□ 주요 추진실적

- 의무보험 미가입 차량 운행위반자 처리내역 (단위:대, 천원)

구분	적발 및 접수 내역				처리내역						처리중
	계	과년도 이월	국토부 통보	타기관 통보	계	범칙금 부과		검찰 송치	자체 종결	타기관 이첩	
						건수	금액				
계	1,350	719	221	410	1,225	135	49,100	394	22	674	※175

※ 중복처리: 50건(기소중지자 재송치 등)

- 무단방치 차량 처리 내역 (단위:대, 천원)

구분	접수 내역				처리 내역				처리중
	계	과년도 이월	120	전화	계	자진 처리	무등록 폐차	특사경 이첩	
계	280	32	88	160	247	137	77	33	33
승용차	85	9	25	51	67	38	-	29	19
이륜차	195	23	63	109	180	99	77	4	14

□ 향후계획

- 공소시효 임박 사건의 경우 피의자에 대한 적극적인 소재수사를 통해 시효도과 전 신속하게 해결
- 소재불명 피의자는 기소중지 송치 후 소재발견 시 수사를 재진행.

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
9,587(구비)	6,927(구비)	72.3%

주택 밀집지역에 공영주차장 건설과 부설주차장 개방을 지속적으로 발굴함으로써 주차장을 확보하여 주민에게 쾌적한 주차환경을 제공하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 추진내용
  - 주택 밀집지역 내 주차장 부지 확보 및 건설
  - 부설주차장 개방 추진

**□ 주요 추진실적**

- 경부제3녹지 지하공영주차장 건설 완료
  - 위 치: 영등포로 405일대(3,745㎡)
  - 규 모: 지하2층 자주식 143면(연면적 5,622㎡)
  - 건설기간: 2015. 2.27. ~ 2016. 6. 5.
- 양평2동 공공복합청사 지하공영주차장 건설
  - 위 치: 양평동4가 96
  - 규 모: 지하3층 ~ 지상4층(주차장: 지하층)
  - 사업기간: 2014. 7. ~ 2018.11.
  - 시 계약심사 및 공사 발주·계약: 2016.10. ~ 11.
- 부설주차장 야간개방 추진
  - 개방 면수: 총 4개소 112면
  - 개방 기간: 5면 이상 2년 이상 개방

**□ 향후계획**

- 양평2동 공공복합청사 지하공영주차장 건설
  - 착공식 및 공사 착공: 2016.11. ~ 12.
- 부설주차장 야간개방을 위한 홍보 및 신청 접수·협약 등: 연중

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
8,431,786 (시 5,841, 구비 8,425,945)	64,977 (시 5,841, 구비 59,136)	0.8

## 16 지속적인 불법 주·정차 단속을 통한 주차질서 확립 주차문화과

지속적인 불법 주·정차 단속을 통해 불법 주차 행위를 예방, 근절함으로써 주민들의 안전하고 편리한 보행과 운행차량의 안전확보에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 추진기간: 연중
- 단속지역: 6개 지역(권역별 단속조 책임구역제 순환지정 운영)
- 단속인력: 32명(주차단속원 30명, 기동반 2명)
- 단속방법: 일반·이면도로 등 계도 위주, 중점단속구역은 단속 후 견인

### □ 주요추진 실적

- 주차단속 실적('16.10.31 현재)

구 분	계	단 속 반	CCTV	계 도	비 고
단속건수	153,158	71,453	53,037	28,668	

- 봄꽃축제(4.2.~4.10.): 4,775건(과태료 2,658, 견인 419, 계도 1,698)
- 주차단속 관련 의견진술처리: 4,500건
- 휴대폰 문자알림서비스 제공: 67,436건
- 주차단속 민원처리(응답소, 새올상담, 구청장에 바란다 등): 9,200건

### □ 향후계획

- 중점단속구역, 소통장애 유발 구간, 취약지역 집중 단속 실시
- 주차단속원 조별 책임구역제로 불법 주·정차 단속 전문성 제고
- 무인단속지역 휴대폰 문자알림서비스 제공으로 행정의 신뢰성 확보

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,470,496 (구비 1,470,496)	981,382 (구비 981,382)	66.7

불법 주·정차 위반 과태료 징수율 제고를 위하여 정기 및 체납 과태료를 적기에 부과·징수하고 체납자에 대하여 차량 및 부동산 압류 등 채권 확보를 통한 지속적인 징수활동으로 과태료 징수율을 높이고자 함

□ 사업개요

- 주·정차 위반 과태료 징수 목표: 6,326백만원
  - 현년도 (2016년) : 3,469백만원
  - 과년도 (2015년 이전) : 2,857백만원
- 단계별 고지서 발송 및 지속적인 체납고지서 송달
- 차량·부동산 등 재산 압류를 통한 채권 확보

□ 주요 추진실적 (2016.9월말 현재)

(단위 : 건/백만원)

구 분	부 과		징 수		시효·불납결손		체납		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금 액	건수	금액	건 수	금 액	
계	714,104	31,060	112,343	4,522	10,980	487	590,781	26,051	
2016년	101,729	3,785	74,704	2,632	0	0	27,025	1,153	69.5
2015년 이전	612,375	27,275	37,639	1,890	10,980	487	563,756	24,898	6.9

- 체납고지서 발송: 690,994건 / 41,012백만원
- 차량 압류 : 39,685건 / 1,778백만원
- 30만원 이상 주정차위반 과태료 체납자 부동산 압류 실시
  - 부동산압류 : 224명(3,219건) / 160백만원
- 3건 이상 체납자 거주자우선주차 배정 제외: 317건 / 17백만원

□ 향후계획

- 과년도 체납자 연차별 체납·독촉고지서 발송
- 30만원 이상 고액체납자 재산조회 실시 후 부동산 압류실시
- 체납자에 대한 차량압류 및 징수 불가능 체납자료 결손처분 실시

□ 예산현황

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
514,859 (구비 514,859)	267,036 (구비 267,036)	51.9

### Ⅲ . 2017년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	예방 중심의 재난 안전관리 강화 .....	27
②	U-영등포통합관제센터 운영 관리 .....	29
③	도로·하천 등 행정재산 관리 .....	30
④	쾌적한 가로환경 조성 .....	31
⑤	옥외광고물 효율적 관리 .....	32
⑥	도림동 286-11 ~ 187-39간 도로개설공사 .....	33
⑦	도로 및 도로시설물 정비공사 .....	34
⑧	‘16/17 제설대책 추진 .....	35
⑨	도림2유수지 복개구조물 설치 공사 .....	37
⑩	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 .....	38
⑪	하수관로 개량·보강공사 .....	39
⑫	교통시설물 정비 및 유지보수 .....	40
⑬	교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리 .....	41
⑭	공영주차장 확보 및 부설주차장 개방 추진 .....	42

분야별 철저한 안전관리와 위험시설 등을 보강하고 유관기관 및 관련 부서간 협조체계를 강화하고, 효율적인 재난예방 및 대응·복구 체계를 구축하여 재난에 강한 안전한 도시를 만들고자 함

## □ 사업개요

- 평소 재난안전 관리 체계 유지 및 사전점검을 통하여 재난발생시 신속대응
- 재난 발생시 대응능력을 강화하기 위한 민간단체 활성화
- 재난안전 교육 강화 등 안전문화 운동 활성화

## □ 세부 추진계획

- 2017 안전관리계획수립
  - 자연재난, 사회재난 안전관리분야에 대한 단계별 대책
- 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 정비
  - 내 용: 현장조치 행동 매뉴얼 정비 및 대응수칙(기관·개인) 작성
    - ☞ 풍수해, 대설, 지진, 한파, 감염병, 대형건축물붕괴 등
- 재난대응 및 예방을 위한 훈련 강화
  - 재난대응 국가재난 안전한국훈련 실시 : 5월 중(5일간)
    - ☞ 실전상황에서 대응능력을 발휘할 수 있도록 테마를 설정하여 실행훈련 실시
- 폭염·한파대책 추진
  - 시 기: 한파 11.15 ~ 3.15 / 폭염 6.1 ~ 9.30
- 지진대책 추진
  - 공공건축물 중 『지진안전성 표시제』 3건 이상 실시로 유사시 대피 여부 판단의 정보제공
  - 해당 부서의 예산확보로 내진성능 개선 추진
- 시설물 안점점검
  - 특정관리대상시설물 안전점검 : 2회(상·하반기)
    - 점검주기: 중점관리시설(반기 1회), 재난위험시설(D급 월1회, E급 월2회)

- 시기별 공사장, 시설물 안전점검 실시 : 연중
  - 해빙기, 우기, 행락철, 월동기 등
- 재난 취약가구 안전점검 실시 : 2017. 3. 1.~10. 31.

○ 민간단체 활성화

- 자율방재단 및 안전감시단 재난대응능력 향상 추진
  - 자율방재단 조직 재정비 및 운영비 지원 등을 통한 활동 활성화
  - 재난대응능력 강화를 위한 소양교육 실시 : 2회(상·하반기)
- 안전문화운동추진 영등포구 협의회 운영 활성화
  - 안전문화운동 실무분과위원회 및 총회 개최 : 연 1회 이상 개최
    - 5개 분과위원회 42명(공동위원장 2, 당연직 4, 자문위원 1, 위촉직 35)
  - 기 능: 안전문화 실천과제 발굴·추진, 민관협력 안전문화운동 전개, 홍보 활동

○ 재난안전교육

- 안전문화운동 참여단체 및 신청단체 대상 재난교육 실시
- 공사장 안전관계자 및 재난안전 공무원의 교육실시
- 어린이 재난안전 예방 교육 실시
  - 대 상: 60개소 어린이집(교육신청)
  - 내 용: 재난안전(지진, 화재, 폭우) 및 생활안전교육(물놀이, 교통안전)
- 부모와 함께하는 어린이 안전교육 뮤지컬 공연 관람 : 2회 600명
  - 대 상: 어린이 및 부모 600명(상반기 300명, 하반기 300명)

○ 저지대 주민 풍수해보험 운영 및 지원 : 연중

□ **소요예산: 총103,541천원(구비 103,541)**

방법용 CCTV 신규설치 및 성능개선과 공공요금 납부 등 운영관리로 안전한 주거환경 조성을 통한 국민의 생명과 재산보호에 만전을 기하고자 함

□ 운영현황

○ 관제센터 연계 CCTV 운영 현황

대분류 (개인정보보호법) 중분류(행자부) 소분류 (영등포구)	합 계	범죄예방(방법)						교통 단속	시설 안전
		생활방법			어린이 보호	무단 투기	유관 기관 (경찰서)	불법 주정차	대림 운동장
		방법	그린 파킹	공원 방법					
개소수	892	455	92	86	87	38	15	117	2
대수	1,516	712	121	92	153	38	15	383	2

※ 성능개선 연도별 추진 계획

구분	합계	2017년	2018년	2019년	비고
CCTV	188대	20대	90대	78대	
비상벨	115대	20대	95대	-	

□ 세부 추진계획

- 방법용 CCTV시스템 성능개선 : 41만화소 20대 ('09년 이전설치분)
- 비상벨 성능개선 : 구형(아날로그)비상벨 20대
- 방법용(다목적) CCTV시스템 신규설치 3개소 및 1개소(구 주민참여예산)
- U-영등포통합관제센터 및 CCTV 현장 시설장비 유지보수 관리
- 방법용 CCTV 관제용역 관리
- U-영등포통합관제센터 운영 및 홍보
- 보안시스템(방화벽) 교체(1식) 및 IP관리시스템 라이선스 추가 구매(500개)

□ 추진일정

- '17. 1. ~ 8.: CCTV시스템 성능개선 및 비상벨 성능개선 사업추진
- '17. 1. ~ 8.: 방법용(다목적) CCTV 설치사업 추진
- '17. 1. ~12.: CCTV 통합유지보수 및 방법용 CCTV 관제용역 실시
- '17. 3. ~ 5 : 보안시스템(방화벽) 교체 및 IP관리시스템 라이선스 구매

□ 소요예산: 총 1,210,475천원(구비)

국·공유지 행정재산의 체계적인 관리로 무단사용자에 대한 권리보전 및 신규 세원을 발굴하고 사용료, 변상금 등 징수율을 제고하여 세외수입 증대와 행정재산 관리에 만전을 기하고자 함

**□ 사업개요**

- 국·공유 행정재산 전수 조사를 통한 신규세원 발굴
- 조세 저항 완화 및 민원발생 최소화로 징수율 제고

**□ 세부 추진계획**

- 국·공유지에 대한 정기 및 수시 실태조사
  - 행정재산 자료검토 및 현황 조사 → 무단 점유 사실 관계 확인  
→ 사용료부과 / 변상금 부과 사전통지
- 고액 및 상습체납자에 대한 체계적인 관리로 세외 수입 증대
  - 부과자료 검토 → 사용료·변상금 부과 → 납부독려 → 체납자 재산 압류
- 징수목표 (단위 : 천원)

계	도로사용료	변상금	과 태 료	징수교부금	가로판매대사용료
6,546,349	3,601,497	917,633	63,500	1,925,535	38,184

**□ 추진일정**

- 국·공유 행정재산 실태조사 및 신규세원 발굴(1월~11월)
- 지하매설물, 지상시설물 일제 조사 실시(1월)
- 정기분 도로사용료 부과자료 적합성 검토(1~2월)
- 도로사용료 정기분 부과(3월)
- 차량 진출입시설 전수 조사 및 신규세원 발굴(4월~8월)
- 행정재산 무단점유 변상금 부과 자료 조사(9월~11월)
- 변상금 정기분 부과(12월)

**□ 소요예산: 총 72,314천원(구비 72,314)**

거리가게 및 적치물에 대한 효율적인 관리와 취약구역별 중점단속 정비를 통해 보행자의 권리 보장과 쾌적하고 청결한 도시 미관을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간: 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
- 정비인력 및 장비: 21명(직원 11, 용역 10), 차량3대
- 내 용
  - 도시환경 저해 거리가게 및 노상적치물 정비 관리
  - 상시단속반 운영, 용역인력은 취약 구역별 상주 집중단속
- 방 법
  - 기 준: 민원처리 위주, 일시적 단속
  - 변 경: 미래지향적 능동형 단속체계 구축

### □ 세부 추진계획

- 구역별 집중정비 지역 단속 용역 상주 근무
  - 영일·영등포 청과시장, 신평시장, 영중로, 당산역, 대림동 지역
- 시간별·계절별 특성에 따라 단속원 임무 부여
  - 적재적소에 정비인력 장비 등 집중 투입
- 행사장 주변 거리가게 특별 정비 실시
- 상가 밀집지역 노상적치물 자율정비 추진
- 특별정비(새벽·야간·공휴일) 연중 실시

### □ 추진일정

- 2. 20. ~ 3. 10.: 신학기 학교주변 거리가게 및 적치물 정비
- 4. 3. ~ 4. 11.: 영등포 여의도 봄꽃축제 특별가로정비
- 5. 15. ~ 6. 11.: 영일마늘시장 특별가로정비
- 9. 1. ~ 10.18.: 영등포 청과시장 특별가로정비
- 10월 초 : '17년 서울세계 불꽃축제 특별가로정비
- 11.21.~12.18.: 영일 김장시장 특별가로정비

### □ 소요예산 : 총 362,863천원(구비 362,863)

지속적인 정비에도 불구하고 여전히 난립되어 있는 불법광고물이 도시미관을 해칠 뿐 아니라 오가는 시민들에게 불편을 초래하고 있어 기존 정비 방식과는 차별화된 새로운 방안을 마련하여 불법광고물 발생을 억제하고자 함

## □ 사업개요

- 기 간: 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
- 관리대상: 관내 옥외광고물(고정/유동)
  - 고정 광고물: 가로(세로), 돌출, 지주이용, 옥상 등 간판
  - 유동 광고물: 현수막, 입간판, 에어라이트, 전단 등
- 추진내용
  - 옥외광고물 안전도검사 등 지속적인 관리
  - 불법광고물 정비 및 올바른 광고문화 확산

## □ 세부 추진계획

- 불법간판 단계별 정비(3단계)
  - 1단계: 주인없는 간판 철거(대형, 노후, 흉물 간판 우선 실시)
  - 2단계: 불법간판 전수조사 및 정비(대림동, 여의동 등 상가밀집지역 중심)
  - 3단계: 사후관리(이면도로, 골목으로 정비활동 확대 실시, 사전예방에 주력)
- 옥외광고물 설치 가이드라인 사전안내 실시
  - 구청 인·허가 부서와 협조하여 광고물 설치 전 준수사항 안내
- 불법 현수막 및 침지물(벽보) 수거보상제 실시
- 해빙기 및 풍수해 특수관리시설(옥상 간판 등) 특별안전점검 실시
- 영등포로 LED간판 개선사업 추진(신길역~대방역)
- 빛공해 방지 및 조명환경 관리·규제

□ 소요예산: 총 105,030천원(시 40,000, 구비 65,030)

철도변 이면도로 개설로 신도림역을 이용하는 영등포동, 도림동 구민의  
통행불편 해소 및 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 추진으로 민원해소

### □ 사업개요

- 위 치: 도림동 286-11~187-39간
- 규 모: 폭 6m, 연장 265m(보상 37필지(토지,1,603㎡))
- ※ 2017년 공사개요
  - 위 치: 도림동 187-17 ~ 200-16
  - 규 모: 도로개설 6m, 공사 L=90m(토지보상 1필지(91㎡))
- 사업기간: 2010~2018년
- 총사업비: 4,903백만원(구비 : 보상비3,750, 공사비1,103, 설계비50)  
(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2015	2016	2017	장 래	비 고
총사업비	4,903	350		1,000	730	2,823	
설 계 비	50	50					
보 상 비	3,750	300		1,000	350	2,100	
공 사 비	1,103				380	723	

### □ 추진실적

- '64.01.24. 도시계획시설(도로) 결정(건고시-제768호)
- '10. ~ '16.: 일부구간 보상완료(L=90m, 토지9필지(317㎡))

### □ 세부 추진계획

- '17. 1. ~ 3.: 공사설계 및 계약체결
- '17. 3.: 공사착공
- '17. 12.: 공사준공

### □ 위 치 도



### □ 소요예산: 총 730,000천원(구비 730,000)

주민 생활에 불편을 주는 노후·파손된 도로 및 도로시설물을 신속히 정비하여 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요 및 추진계획

세부사업명	규 모	사업내용	예 산 (천원)
포장도로정비 등 소파보수공사 (연간단가)	아스팔트정비 175a, 콘크리트정비 10a, 보도정비 10a	노후·파손된 도로 포장 정비 응답소, 민원상담, 순찰 등 각종 도로관련 민원처리 및 유지보수	1,302,500 (구비)
도로시설물 설치 및 보수공사 (연간단가)	블라드 정비 및 설치 200개, 안전펜스 설치 및 보수 300m, 과속방지턱 설치 및 보수 300m, 과속방지턱 도색 4,000㎡ 등	블라드, 안전펜스, 과속방지턱, 지하보도, 보도육교 등 도로시설물 유지관리	500,800 (구비)
보도정비공사 (연간단가)	보도블록 정비 17a	노후보도(평탄성불량, 침하 등) 정비	130,700 (구비)
사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사 (연간단가)	보도 턱낮춤 정비 50개소 등	사회적약자의 보행환경 개선 (보도 턱낮춤, 점자블록 정비 등)	60,000 (구비)
포장도로 굴착복구 공사 (연간단가)	아스팔트 정비 180a, 보도블록 정비 60a	굴착 원인자 구청복구 의뢰 시 포장 짚은 굴착으로 인한 노후 불량 도로 정비	1,713,000 (기금)
불량맨홀 정비공사 (연간단가)	불량맨홀 정비 300개소	도로면과 맨홀뚜껑면 불일치로 인한 불량 맨홀 주변 정비	200,000 (기금)
보도환경개선공사 (시주민참여)	노후 보도 정비 4개소 31a	○ 사업위치 - 영등포푸르지오(아) 뒤편(영등포본동) - 대신시장 일대 일부 (신길1동) - 신길로157~신길로205(신길3 동) - 대림로86~시흥대로641(대림1동) ○사업기간 : '17. 2 ~ 8.	392,500 (시주민참여)

□ 소요예산: 총 4,299,500천원

(시비 392,500, 구비 1,994,000, 기금1,913,000)

겨울철 강설에 대비하여 제설대책본부를 운영하고, 강설시 제설작업에 안전을 기함으로써 원활한 교통소통 및 주민 불편 사항을 최소화 하고자 함.

#### □ 제설대책본부운영

- 기 간 : 2016. 11. 15. ~ 2017. 3. 15.(4개월)
- 구 성 : 5개반 48명
- 제설대상 : 388.8km(간선도로 61.9km, 보조간선도로 및 이면도로 326.9km)
- 단계별 근무 기준
  - 강수확률예보에 따라 평시, 보강근무
  - 적설량 예보에 따라 1 ~ 3단계 근무
- 최근 5년간 강설 현황
  - 5년 평균 강설횟수는 13.6회, 강설량은 24.7cm

#### □ 제설장비·자재 보유현황

- 장 비 : 50대(다목적 3대, 제설삽날 11대, 살포기 34대, 바브켓 2대)
- 제설제 : 1,267톤(염화칼슘 375톤, 소금 719톤, 친환경 173톤)

#### □ 제설작업 시행

- 직영조 편성 : 1개조
- 용역조 편성 : 15개조
- 인 력 : 25명(직영 1, 상황요원 1, 작업원 6, 운전원 15, 장비기사 2)
- 장 비
  - 덤프트럭 13대(15톤 3대, 5톤 2대, 2.5톤 4대, 1톤 4대)
  - 다목적제설차 3대, 백호(0.7m<sup>3</sup>) 2대
- ※ 보강시 1/4 투입, 1단계 1/2 투입, 2·3단계 장비 전부 투입

#### □ 강설시 근무요령

- 1단계 : 적설량 1~5cm미만 제설인원 1/4 투입
- 2단계 : 적설량 5cm이상 제설인원 1/4 필요시 1/2 투입
- 3단계 : 적설량 10cm이상 제설인원 1/2 필요시 전원 투입

## □ 세부 추진계획

- 제설함 설치(358개)
  - 고가차도 및 취약시설(20개), 주요 간선도로(95개)  
이면도로, 고갯길(198개), 보도육교(8개소 / 19개), 초등학교 주변(26개)
- 보행자 미끄럼 안전사고 저감대책
  - 계단 보수 및 핸드레일 설치·정비로 보행환경 개선
  - 상습결빙 낙상사고 조심 안내표지판 설치(동주민센터 5장씩 배부)
  - 야자매트를 활용한 급경사지 미끄럼 해소(동주민센터 10m씩 배부)
  - 모래를 활용한 급경사지 미끄럼 해소
- 도로 물청소차를 활용한 친환경 제설 시행
  - 제설장비 구매 없이 기존 도로 물청소차(6톤) 2대 활용
  - 액상제 살포로 초동 제설 능력 향상 등 친환경 제설시행

## □ 주요 개선사항

- 자동액상살포장치 설치·운영

제설 취약지점에 자동액상살포장치를 설치·운영하여 원격 통신망을 이용한 제설작업으로 초동 제설작업 능력 향상

- 고정식 자동액상살포장치(2개소)
  - 신길지하차도, 도림고가차도(각 저장하우스 1동, 분사노즐 500m)
- 이동식 자동액상살포장치(2개소 / 5개)
  - 신길자이아파트 주변(3개), 도림동성당 주변(2개)
- 도시형 아이젠 비치

관내 이면도로 결빙 지역에서 어르신 등 65세 이상 고령자 보행 약자들의 낙상사고 방지를 위하여 고지대 노인복지시설에 비치하여 안전사고 예방

- **소요예산: 총 200,000천원(시 100,000천원 구비 100,000천원)**

최근 늘어나는 배드민턴 수요의 증가로 365일 이용가능한 실내배드민턴장을 건립하여 구민의 건강증진 욕구 및 삶의 질 향상 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 도림동 254번지(도림유수지 내)
- 기 간 : '15. 7. ~ '17.12.
- 사업규모 : 유수지 일부복개 3,900 $m^2$ 
  - 실내체육관(배드민턴 12면)
  - 체육시설 정비(육상트랙 및 농구장 등)

#### ■ 유수지 현황

- 저수용량 : 31,000 $m^3$
- 유역면적 : 1.504 $km^2$ (도림동,신길동)
- 수혜세대 : 12,300세대

### □ 추진실적

- 배드민턴 전용 실내체육관 건립 기본계획 수립('15. 7.31.)
- 사업타당성조사 연구용역 착수 및 준공('15. 9.30.)
- 도림2유수지 복개구조물 기본 및 실시설계 용역('16.11.22.)

### □ 세부 추진계획

- '16.12. : 공사발주 및 계약
- '17. 1.~'17. 6. : 공사시행 및 준공

□ 소요예산: 총 4,000,000천원(시비 4,000,000천원)

### □ 위치도



방류 후 잔류수가 처리되지 않아 인근 주민들에게 악취로 인한 혐오 시설로 인식되고 있어 유수지 지하에는 저류조 설치, 지상에는 생태공원 및 체육공간을 조성하여 악취저감 및 안양천 등 공공수역 수질개선을 통하여 쾌적한 생활공간을 제공하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치: 양평1빗물펌프장(양평유수지 내)
- 기 간: '14. 7. ~ '18.12.
- 사업규모:
  - 지하 저류조 46,000m<sup>3</sup>
  - 상부체육시설(축구장) 1식
- 시행부서: 서울특별시 도시기반시설본부 방재시설부 환경시설과

■ 유수지 현황

- 저수용량 : 115,000m<sup>3</sup>
- 유역면적 : 4.525km<sup>2</sup>(양평동,당산동,문래동,영등포본동,영등포동)
- 수혜세대 : 41,000세대

## □ 추진실적

- 기본 및 실시 설계용역 완료('16.3.26.)
- 축구장 국제규격 확보를 위한 설비동 이전 요청('16.7.22.)
- 공사발주('16.8.10.)

## □ 세부 추진계획

- '16.12. : 공사계약
  - ※ 입찰과정중 적격심사 이의신청에 따른 검토기간 소요로 계약절차 지연
- '18.12. : 준 공

□ 소요예산: 총 38,737,000천원(시비19,368,000천원, 국비19,368,000천원)

## □ 위치도



노후·불량 하수관로 및 사각형거를 보수·보강함으로써 안정성 확보 및 원활한 유수 소통을 통해서 안전한 도시환경 조성 및 수해예방에 만전을 기하고자 함.

□ **당산동4가 38-1~80주변 하수관로 개량공사**

○ 사업개요

- 기 간: 2017. 1 ~ 11
- 사 업 비: 1,000,000천원
- 규 모 D=700~1,200mm L=842m

○ 추진일정

- 2017. 1~ 3 : 설계용역 및 완료
- 2017. 3~ 4 : 공사발주 및 계약
- 2017. 4~11 : 공사착공 및 준공

□ **신길동 362-22~276-77주변 하수관로 개량공사**

○ 사업개요

- 기 간: 2017. 1 ~ 11
- 사 업 비: 1,000,000천원
- 규 모: D=900~1,000mm L=820m

○ 추진일정

- 2017. 1~ 3 : 설계용역 및 완료
- 2017. 3~ 4 : 공사발주 및 계약
- 2017. 4~11 : 공사착공 및 준공

□ **여의대방로 359~의사당대로 141외 2개소 하수관로 보수·보강공사**

○ 사업개요

- 기 간: 2017. 1 ~ 10
- 사 업 비: 800,000천원
- 규 모: ■2.4X1.0m, L=605m

○ 추진일정

- 2017. 1~ 2 : 공사발주 및 계약
- 2017. 3~11 : 공사착공 및 준공

□ **소요예산: 총 2,800,000천원(시비 2,800,000천원)**

교통안전시설물 및 편의시설물 중, 노후·파손된 시설은 즉시 정비하고, 민원 요구사항이나 필요시에는 신규로 추가 설치함으로써 도로를 이용하는 주민들에게 편의를 도모하고자 함

## □ 사업개요

- 내 용: 교통시설물(도로안내표지판, 반사경 등) 신설 및 유지보수 실시

## □ 세부 추진계획

- 버스승차대 신설공사 :역상형(4.0m) 및 일반형(6.0m) 각각 1개 설치
- 버스승차대 유지관리 정비공사(연간단가) 실시
  - 상시순찰시 적출사항 및 민원사항에 대하여 우선적으로 공사실시
  - 승차대 침지물 제거(138개소), 대기의자설치(5개소)
  - 승차대 후면유리 보수(1개소), 승차대 출력물 보수(1개소) 등
- 도로안내표지판 신설 및 유지관리
  - 신설 : 해군회관앞 교차로 1개소, 문안수정 : 지적공사 교차로 등 20개소, 지주 재도색 : 경인고속도로입구 교차로 등 20개소
- 교통시설물(반사경, 시선유도봉) 신설 및 유지관리
  - 파손된 교통시설물에 대한 정비 및 신설 민원에 대한 검토후 신설추진
  - 도로반사경 정비 신설 (15개) 및 교체 (15개), 각도조정 (10개)
  - 시선유도봉 신설 (20개) 및 정비 교체 (100개) 실시
- 보행자안내표지판 유지관리(회손 및 구형 보행자안내표지판) (20개)
- 스쿨존과속경보시스템 신설(1개소, 영등포푸르지오아파트) 및 유지보수 (13개소)
- 교통안전시설물(안전표지, 노면표시) 신설 및 정비공사(연간단가) 시행
  - 대 상 : 구도로상 안전표지 및 노면표시, 내용 : 노후 및 퇴색된 시설물 유지보수

## □ 추진일정

- 1 ~ 12월: 버스승차대 신설공사 및 유지관리 정비공사, 교통시설물 유지관리 정비공사
- 1 ~ 12월: 교통안전시설물(안전표지, 노면표시) 신설 및 정비 시행
- 5 ~ 7월 : 도로안내표지판 신설 및 문안정비 공사, 보행자안내표지판 정비 공사 시행
- 5 ~ 8월 : 스쿨존과속방지시스템 신설공사 및 정비공사 실시

## □ 소요예산: 총 243,500천원 (구비)

교통혼잡을 유발하는 시설물의 소유자에게 교통유발 부담금을 부과하여 사회·경제적 손실비용을 부담토록 하고, 교통량 감축 프로그램을 이행한 경우 부담금을 감면함으로써 도심속 교통혼잡을 완화하고 대중교통 이용 활성화 유도

## □ 사업개요

- 교통유발부담금 부과(매년 10월에 정기부과)
  - 근거법령: 도시교통정비촉진법, 서울특별시 교통유발부담금 경감등에 관한 조례
  - 부과대상: 연면적1,000㎡이상 시설물 (주택용도 제외)
  - 부과기준: 매년 7월 31일 현재 당해시설물의 소유자
  - 부담금산정기준: 바닥면적 합계 × 단위부담금 × 교통유발계수
- 기업체 교통수요관리
  - 교통량 감축 프로그램 이행 실적에 따라 부담금 경감
  - 사업대상: 총 781개소 (민간기업: 750, 공공기관: 31)
  - 교통량감축프로그램: 승용차부제운영, 주차장 유료화, 나눔카 이용 등

## □ 세부 추진계획

- 교통유발부담금 부과를 위한 시설물 현장조사 및 자료정비 : 3~9월
  - 신규, 변경, 멸실 건축물 현황 자료 재정비
  - 기간제 근로자 채용을 통한 시설물별 정확한 현장조사 추진
- 교통량 감축 프로그램 참여확대 및 이행점검 : 221개소 → 231개소
  - 공공기관 기업체 교통수요관리 프로그램 100% 참여 권장
  - 대상시설물 현장 방문 및 이행현황 점검 : 분기별 1회
- 교통량 감축 프로그램 이행실적에 따른 교통유발부담금 경감심의 : 9월
- 교통유발부담금 부과 및 징수 : 10월
- 교통유발부담금 체납금에 대한 신속하고 정확한 체납처분 : 12월

## □ 소요예산: 총 106,195천원 (구비 106,195)

## 14 | **공영주차장 확보 및 부설주차장 개방 추진** 주차문화과

주차장 건설 적합 부지 확보, 공영주차장 건설 및 개방 가능 부설주차장 발굴 등을 통하여 주민 주차 공간 확대에 기여하고자 함

### □ **사업개요**

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 추진내용
  - 주택 밀집지역 내 주차장 건설부지 및 공영주차장 확보
  - 양평2동 공공복합청사 지하공영주차장 건설
  - 건축물 부설주차장 야간개방 발굴 및 협약 체결 추진

### □ **세부 추진계획**

- 양평2동 공공복합청사 지하공영주차장 건설
  - 위 치: 양평동4가 96(現 양평2동 공영주차장)
  - 사업기간: 2014. 7. ~ 2018.11.
  - 규 모: 지하3층 93면(4270.4㎡)
  - 소요예산: 7,004백만원(시 2,954/구 4,050)
- 부설주차장 야간 개방
  - 추진기간: 2017. 1. ~ 12.
  - 목 표: 3개소 80면(신규, 연장개방)
  - 대 상: 학교, 교회, 일반 건축물 등 부설주차장

### □ **추진일정**

- 양평2동 공공복합청사 지하공영주차장 건설
  - 공사 착공 및 준공: 2016.11. ~ 2018.11.
- 부설주차장 야간개방
  - 개방 주차장 발굴 및 협약 체결: 연중

□ **소요예산: 총 7,164,370천원(구비 7,164,370)**

## IV . 신규·주요 투자사업

연번	사 업 명	쪽
①	영등포로 에너지절약형 LED간판 개선사업 .....	44
②	도림로 확장공사 .....	45
③	LED도로조명 설치(개량)공사 .....	47
④	도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블럭) .....	49
수	교통사고 예방 안전대책 강구 .....	51
⑥	양산로 자전거 도로 정비사업 .....	53

무질서하게 설치된 불법 간판을 제거함과 동시에 적법하고 아름답게 디자인된 간판으로 교체·설치함으로써 사람중심의 안전하고 쾌적한 거리환경을 조성하고자 함

### □ 추진방향

- 작고 아름답게 디자인된 적법한 간판으로 교체하여 가로경관 개선
- 기존의 형광등, 네온을 LED간판으로 교체하여 최대 80% 에너지 절감

### □ 사업개요

- 사업명: 영등포로 에너지절약형 LED간판 개선사업
- 기간: 2017. 3. ~ 12월
- 사업구간: 영등포로(신길역~대방역) 약2.0km(216개 업소)
- 개선대상: 150개 간판(업소당 최대 2,500천원 지원 가능)

### □ 추진일정

- '17. 3.: 사업구간 내 간판 물량조사 및 점포주, 소유주 파악
- '17. 4.: 정비시범구역 지정 및 표시제한 고시
- '17. 5.: 區와 간판개선주민위원회 간 사업추진 협약체결
- '17. 5.: 간판디자인 및 제작·설치 업체 모집 공고
- '17. 6.: 제안서평가위원회 개최 및 협상 적격자 선정
- '17. 7. ~ 12.: 간판시공 및 사후정산



□ 소요예산: 총 375,000천원(기금 375,000)

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위 치: 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~신길동421-16간(신길광장)
- 규 모: 도로확장 B=25→35m L=1,150m(양측)
- 사업기간: 1997년 ~ 2018년
- 사업비: 50,150백만원 (시비,보상비 46,600,공사비 5,900,설계비150)
- ※ 2017년 공사개요
  - 위 치: 신길동 420-193 ~ 432-10
  - 규 모: B=30→35m, (공사 L=107m, 토지보상 6필지(287㎡))
- 연차별 투자계획 (단위:백만원)

구 분	총 사업비	기투자	2015	2016	2017	2018	비고
계	50,150	36,550	1,000	2,000	2,600	8,000	
보 상 비	44,100	32,600	500	1,400	2,200	7,400	
공 사 비	5,900	3,800	500	600	400	600	
설 계 비	150	150	-	-	-	-	

□ 추진실적

- '78.12.07: 도시계획시설(도로) 결정 (건설부고시 제393호)
- '97 ~ '16: 일부구간 공사완료
  - 상 부: 기확장 850m, 미확장 200m(신길14구역 100m제외)
  - 하 부: 기확장 1,043m, 미확장 107m('17년 공사시행)

□ 세부 추진일정

- '17. 1. ~ 3.: 공사설계 및 계약체결
- '17. 3.: 공사착공
- '17. 12.: 공사준공

□ 소요예산: 총 2,600,000천원(시비 2,600,000)

# □ 위치도



노후 가로등 및 보안등을 고효율 장수명의 LED등으로 개량하여, 전기에너지 절약을 통한 예산 절감 및 빛 공해를 해소하여 주민 삶의 질 향상에 기여하고, 야간 교통 환경을 개선하여 도로이용자 편의 제공

□ 사업개요 및 추진일정

구분	위 치	규 모	사업기간	추진일정	예 산 (천원)
가 로 등	복음길 (KBS본관~ 여의도지구대)	LED가로등 (75W) 68등	'17. 6. ~ '17. 11.	'17. 4. : 계약심사 '17. 5. : 공사발주 '17. 6. : 공사착공 '17.11. : 공사준공	640,000 (시비)
보 안 등	문래동 (예술창작촌)	LED보안등 (50W) 118등	'17. 6. ~ '17. 10.	'17. 4. : 계약심사 '17. 5. : 공사발주 '17. 6. : 공사착공 '17.10. : 공사준공	132,000 (시 주민 참여예산)
	신길6동 일대	LED보안등 (50W) 70등	'17. 6. ~ '17. 10.	'17. 4. : 계약심사 '17. 5. : 공사발주 '17. 6. : 공사착공 '17.10. : 공사준공	70,000 (구비)
지하 보도	여의도동 여의초교앞 지하보도내	LED실내등 (50W)44등 LED실내등 (10W)78등	'17. 3. ~ '17. 9.	'17. 2. : 계약심사 '17. 3. : 공사발주 '17. 3. : 공사착공 '17. 9. : 공사준공	50,000 (구 주민 참여예산)
계		378등			892,000

□ 소요예산: 총 892,000천원(시 772,000, 구비 120,000)

□ 위 치 도

구분	위 치	위 치 도
가로등	복음길 (KBS본관~ 여의도자구대)	
보안등	문래동 (예술창작촌)	
지하 보도	신길6동 일대	
지하 보도	여의도동 여의초교앞 지하보도내	

## 4 도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(4블럭) 치수과

도림1배수분구의 노후 및 불량 하수관거를 개량하는 등 종합계획에 의한 정비를 함으로써 통수능 확보와 수해 예방 및 효율적인 하수처리로 수질 개선에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 사업위치: 대림동(대림1,2,3동)일대(면적 : 215.5ha)
- 사업규모: 총연장 47.1km(하수관로 정비-D300mm~ $\square$ 1.5 $\times$ 2.0m)
- 사업기간: '10. 9.~'23.12(계속사업)
- 총사업비: 74,441백만원('17년 3,000백만원)-서울시하수도특별회계

### □ 추진실적

- 전체 하수관로 정비대상 47.1km 중 정비실적 29.7km('16년 포함)

### □ 2017년 추진계획

- '16. 11~12: 대림2동 지역 - 4블럭('17~'19) 발주 및 계약
- '17. 2~12: 대림2동 지역(4블럭) 하수관로 정비 시행(L=3.9km)

### □ 향후 추진계획


- '18. ~ '19.: 4블럭 잔여구간(L=5.8km)시행

### □ 소요예산: 총 3,000,000천원(시비 3,000,000천원)

### □ 위치도



□ 단계별 사업계획(도림1배수분구)

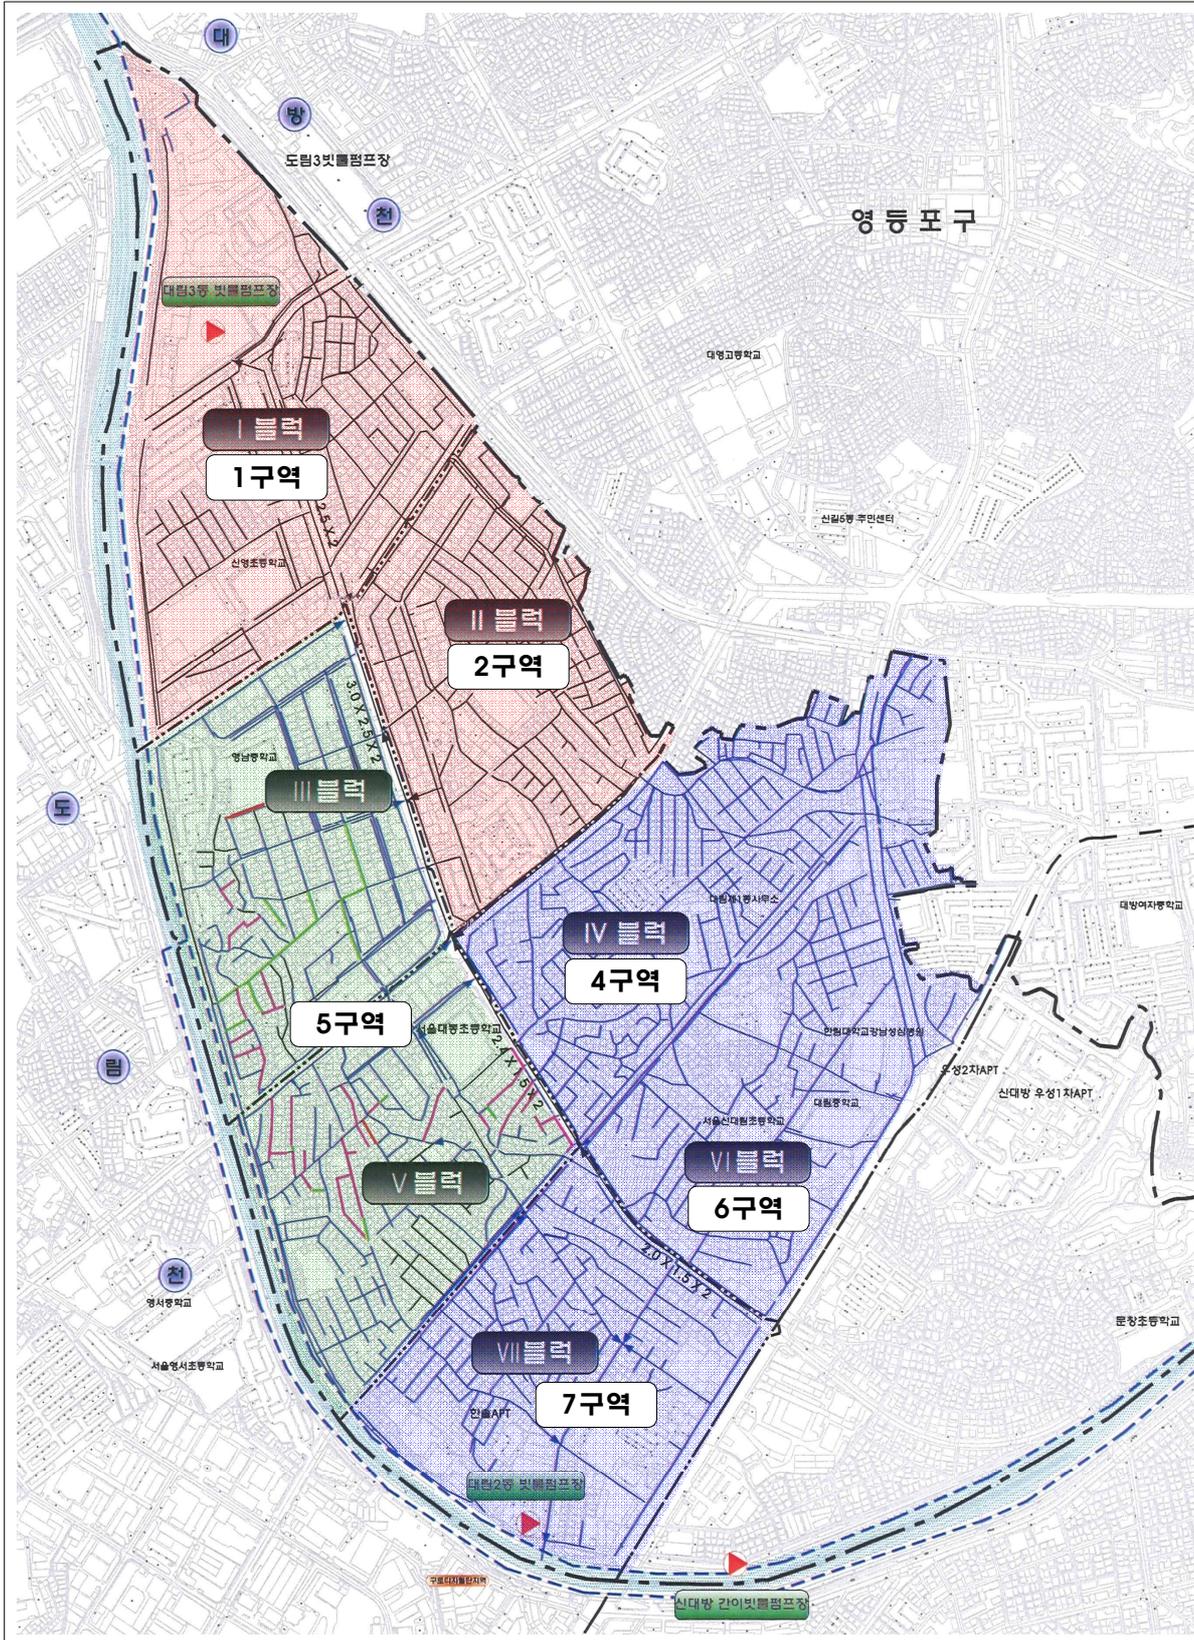

우리구 교통사고 예방을 위해 시설개선 등 다양한 분야별 사업추진을 통해 교통사고를 줄일수 있도록 교통안전대책을 강구함

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2017년
- 내 용: 총 13개사업 523백만원 규모의 교통안전대책 사업추진

#### □ 세부추진계획

- 연간단가(교통안전 및 편의시설물)사업 추진
  - 대 상: 관내 구도로상 교통시설물(반사경, 시선유도봉, 안전표지 및 노면표시)
  - 내 용: 교통시설물 신설 및 기존 노후 및 퇴색된 시설물 유지보수
- 차없는거리 사업추진
  - 규 모: 관내 8m이하 이면도로중 1개구간 선정
- 선재어린이집 보호구역 개선 및 CCTV 설치
  - 내 용: 도로시설(미끄럼방지포장 등), 교통안전시설(노면 및 표지판) 설치
  - CCTV 설치위치: 보호구역 지정구간 중 1개소 선정 예정
- 과속경보시스템 및 무인단속카메라 설치 추진
  - 과속경보시스템: 영등포푸르지오아파트 내 1개소
  - 무인단속카메라: 여의도 한영아파트 사거리 1개소('16년도 사망사고 지점)
- 보행자 무단횡단 방지 횡스 설치(2개소 L=308m)
  - 위 치: 2개소(영등포로터리, 여의나루역)
- 양산로 자전거전용도로 폐지후 우선도로로 변경·시설개선 추진
  - 구 간: 양산로111 ~ 양산로 3(L=1.16km)
  - 내 용: 전용도로 구분시설 철거 및 재포장(A=3,480m<sup>2</sup>) 등
- 사망사고지점 TFT 운영 및 교통안전지도사 년중 추진
  - TFT 참여기관: 구청, 경찰서, 서울시, 도로교통공단
  - 교통안전지도사 운영규모: 9개교 교통안전지도사 11명

- 교통안전체험장 정상 추진
  - 운영기간: 3월 ~ 6월, 9월 ~ 11월
  - 운영규모: 총 120회, 2,000명
  - 교육대상: 교육을 희망하는 단체(어린이집, 유치원 등) 및 개인
- 보호구역 캠페인 년중추진 및 민간건물 가변정보판 활용·홍보
  - 대 상: 관내 23개 초등학교(구청, 경찰서, 녹색어머니회 등)
  - 가변정보판 홍보: 여의도동 23-2 신한투자빌딩(4~5월)

□ **소요예산 : 총 523,000천원**(구비 317,000, 시비 134,400, 국비 71,600)


자전거도로 구분시설(도로경계석)로 인한 사고다발구간인 양산로를 자전거 우선도로로 변경하여 사고예방하고, 2016년 시행한 양산로 자전거 우선도로 사업구간과 연계하여 안전하고 쾌적한 자전거 이용환경 조성 하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 2017년
- 사업위치: 양산로 111(영등포구청 앞 사거리) ~ 양산로 3(안양천 보행육교)
- 총사업비: 100,000천원
- 사업내용
  - 편측 자전거전용도로 철거 및 양측 자전거우선도로 신설 (연장 1,160m)
  - 아스팔트 재포장 ( $A=3,480m^2$ ) 실시
  - 자전거 우선도로 노면표시 및 안전표지 설치 등

## □ 세부 추진계획

- 2017년 1월 ~2월: 현장조사 및 공사설계 시행
- 2017년 3월 ~4월: 공사착공 및 준공(예정)

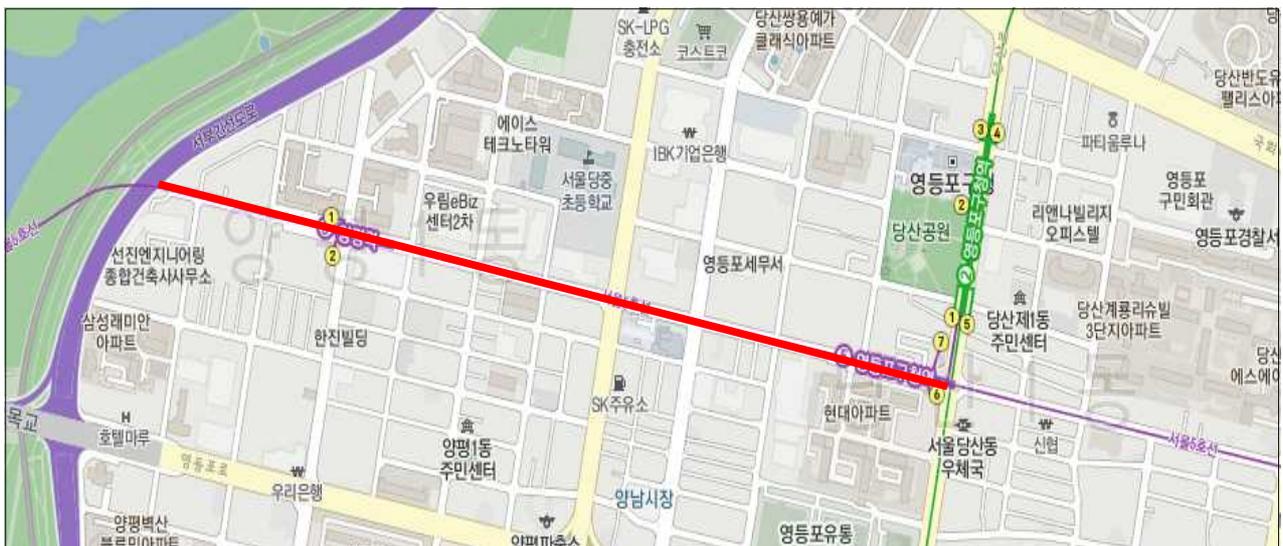

## □ 소요예산: 총 100,000천원(구비 100,000)
