

# 부서별 주요업무 보고



푸른도시과

# 보고 순서

**1. 일반 현황**

**2. 2014 주요업무 추진실적**


**3. 2015 주요업무 추진계획**

**4. 신규 · 주요투자 사업**

# I. 일반 현황

■ 기 구 : 6개팀

■ 조직도

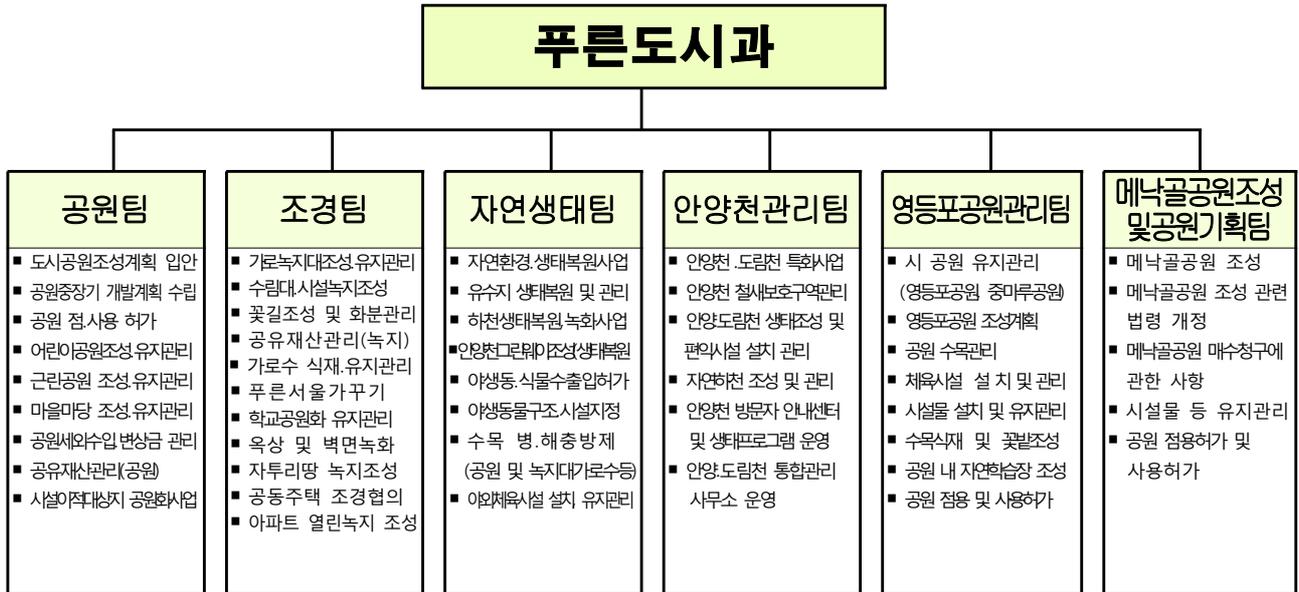

■ 인 력 : 현원 31명 / 정원 31명

팀 별	계	일 반 직				
		5급	6급	7급	8급	9급
계	31/31	1/1	8/6	13/8	8/8	1/8
과부족	-	-	2	5	-	△7

## ■ 주요시설 및 장비

### ○ 시설물 현황

구 분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	35	10	6	4	18	7	30	258	86개 노선	2종	67개소
면 적 (m <sup>2</sup> )	612,371	549,377	141,431	407,946	54,637	8,356	17,838	697,359	16,121주	2주	22종 744점

### ○ 장비 현황

구 분	차 종	차 명	차량등록번호	연식	용 도
장 비	화 물 차	마이티(2.5t)	80모5681	2005	가로수 관리 업무용
	화 물 차	마이티(2.5t)	80모5698	2005	녹지대 관리 업무용
	승 합 차	스타렉스	03모9050	2005	순찰 업무용
	소 형 화 물 차	포터2(1t)	86우4171	2011	안양천관리 업무용
	소 형 화 물 차	포터2(1t)	80모7630	2005	공원관리 업무용

## ■ 예산집행 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	집 행 액		이월 예상액	예상잔액
		집행액 (10.31 기준)	집행예정액 (12.31까지)		
계	5,425,514	3,976,212	714,827	460,000	274,475
공 원 녹 지 관 리 수 준 향 상	1,712,990	1,481,334	203,780	-	27,876
아름다운환경및 편리한시설만들기	2,570,500	1,601,989	366,909	460,000	141,602
안양·도림천특화	436,570	383,091	50,200	-	3,279
인 력 운 영 비 (푸른도시과)	494,685	333,169	65,750	-	95,766
기 본 경 비 (푸른도시과)	184,070	149,959	28,188	-	5,923
내 부 거 래 지 출	26,699	26,670	0	-	29

## Ⅱ. 2014 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	공원시설물 정비 .....	5
②	어린이공원 정비 .....	6
③	공원 내 수목 가지치기 및 식재 .....	7
④	공중화장실 환경개선 .....	8
⑤	쌈지마당 조성 .....	9
⑥	영등포공원 물놀이장 조성 .....	10
⑦	2014년 시공원 보수정비 .....	11
⑧	노후마을마당 재정비 .....	12
⑨	열린학교(학교공원화) 유지관리 .....	13
⑩	가로수 보식 및 식재 .....	14
⑪	도림로 가로수 바꿔심기 .....	15
⑫	생활주변 자투리땅 녹화 .....	16
⑬	가로수 가지치기(연간단가) .....	17
⑭	녹지대 위험수목 정비(연간단가) .....	18
⑮	천수공간 수경시설 유지관리 .....	19
⑯	떠녹지 보식 및 정비 .....	20

연 번	사 업 명	쪽
-----	-------	---

17	녹지대 수목보식 및 시설물 정비 .....	21
18	『영등포 꽃으로 피다』 사업 .....	22
19	아파트 열린녹지 조성 .....	23
20	가로수 생육환경 개선 .....	24
21	가로변 녹지량 확충 .....	25
22	여의로 가로수 보호판 교체 .....	26
23	사계절 꽃길 조성 .....	27
24	에코스쿨 조성 .....	28
25	2014년 주민참여 골목길 가꾸기 .....	29
26	마을단위 야외체육시설 설치 .....	30
27	안양천 제방 산책로 수목 보식 .....	31
28	안양천 장미꽃길 조성 .....	32
29	양평유수지 생태복원 특화 .....	33
30	안양천 하천 생태복원 .....	34
31	전기시설물 유지관리공사(연간단가) .....	35

공원 내 파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의시설을 확충하여 공원 환경개선에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 신길공원(신길5동) 등 4개소  
문래공원(문래동), 메낙골공원(신길4동), 솔파크마을마당(대림2동)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 조경석 쌓기 및 투수블럭 포장(신길), 체육시설 4조 설치(솔파크)  
고무칩 364㎡ 포장(잔여 600㎡) 및 수목식재(문래), 목계단 설치(메낙골)

□ 추진실적

- 2014. 1월 : 현장조사
- 2014. 2. 5 : 실시설계용역 착공
- 2014. 3. 3 : 실시설계용역 준공
- 2014. 3. 26 : 공사 착공
- 2014. 5. 24 : 공사 준공

□ 예산액 : 총200,000천원 (구비)

예산액	집행액	집행율(%)
200,000 (구비)	152,989 (구비)	76

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상

□ 사업개요

- 위    치 : 평화어린이공원(여의동) 등 4개소  
          중앙(영등포동), 꿈에그린(신길5동), 다사랑(대림2동)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 5월
- 사업내용 : 노후고무칩 및 농구장 바닥정비(평화), 배수로정비(중앙),  
          바닥포장 정비(꿈에그린), 파고라 교체(다사랑)

□ 추진실적

- 2014. 2. 11 : 실시설계용역 착공
- 2014. 3.  3 : 실시설계용역 준공
- 2014. 4.  4 : 공사 착공
- 2014. 5. 12 : 공사 준공

□ 예 산 액 : 총80,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
80,000 (구비)	66,130 (구비)	83

공원 내 수목 중 무성한 수관 형성으로 공원 인접 주택에 민원을 야기 하거나 공원 이용에 위해가 되는 수목에 대하여 정비 공사를 시행하여 안전 사고 예방 및 쾌적한 공원 환경 제공

#### □ 사업개요

- 위      치 : 문래공원(문래동) 등 16개소  
               근린공원(당산, 문래), 소공원(당산역), 마을마당(무지개)  
               어린이공원(신우, 동심, 중앙, 강마을, 대림, 양남, 다사랑,  
               원지, 평화, 두암, 신일, 양평)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 10월
- 사업내용 : 공원내 지장수목 320주 가지치기

#### □ 추진실적

- 2014. 3. 10 : 공사 착공(1차)
- 2014. 4. 3 : 공사 준공(1차)
- 2014. 9. 25 : 공사 착공(2차)
- 2014. 10. 13 : 공사 준공(2차)

#### □ 예 산 액 : 총40,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
40,000 (구비)	32,210 (구비)	80

도시 공원 내 노후하고 위험한 공중화장실 시설을 개선하여 이용주민에게  
편안하고 쾌적한 공원 환경 제공

사업개요

- 위    치 : 당산근린공원 공중화장실(당산1동)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 4월
- 사업내용 : 대변기 및 정화조 오수배관 교체 등

추진실적

- 2014. 2. 21 : 사업방침 수립
- 2014. 2. 25 : 사업 시행
- 2014. 3. 7 : 공사 착공
- 2014. 4. 3 : 공사 준공

예 산 액 : 총20,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
20,000 (구비)	11,000 (구비)	55

시민 생활권 주변에 주민참여 방식 쌈지마당 조성으로 공원소외지역 해소 및 지역커뮤니티 형성 유도에 기여

#### □ 사업개요

- 위 치 : 시흥대로177길 11-5(대림2동 990-69)
- 규 모 : 172.2 $m^2$
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 보상 및 쌈지마당 조성 등

#### □ 추진실적

- 2014. 1. : 기존 대상지 소유주 심경 변화에 따른 매매의사 철회
- 2014. 2 ~ 8월 : 14개소 대상지 협의 무산
- 2014. 9. : 사업대상지 확정 및 방침 수립
- 2014. 10. : 도시계획시설(공공공지) 입안
- 2014. 11. : 매매계약 및 소유권이전등기 완료

#### □ 향후계획

- 2014. 11. : 쌈지마당 조성사업 발주, 착공
- 2014. 12. : 쌈지마당 조성사업 준공

#### □ 예 산 액 : 총900,000천원 (시비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
900,000 (시비)	688,995 (시비)	76

주민 생활 여가와 어린이들이 물놀이를 동시에 즐길 수 있는 체험형 친수공간을 조성하여 공원 이용활성화와 이용자 만족도 향상에 기여

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포근린공원(영등포본동)
- 규 모 : 400m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 7월
- 사업내용 : 물놀이시설 5종 및 휴식시설 설치, 수목 및 초화 식재 등

#### □ 추진실적

- 2014. 2. 18 : 실시설계용역 착공
- 2014. 5. 15 : 실시설계용역 준공
- 2014. 6. 5 : 공사 착공
- 2014. 7. 24 : 공사 준공
- 2014. 7~ 8월 : 물놀이장 운영

#### □ 예산액 : 총600,000천원 (시비)

예산액	집행액	집행율(%)
600,000 (시비)	544,702 (시비)	90

시공원 내 산책로, 배수시설 등 노후 시설물 보수정비를 통하여 각종 안전사고를 사전에 예방하고 쾌적한 공원 환경을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포공원(영등포본동), 중마루공원(영등포동)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 8월
- 사업내용 : 산책로 탄성포장 1,177㎡, 배수로 133m 매설 등  
노후시설물 보수정비 등

□ 추진실적

- 2014. 3. 28 : 서울시 설계심의
- 2014. 4. 8 : 계약심사
- 2014. 5. 12 : 공사 착공
- 2014. 8. 8 : 공사 준공

□ 예산액 : 총250,000천원 (시비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
250,000 (시비)	234,947 (시비)	93

시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 찾고 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소인 마을마당이 조성된 지 오랜시간 경과하여 노후된 상태로 수목보식 및 편의시설 등을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 선유봉마을마당(양평2동) 등 4개소  
동산(신길1동), 감나무(신길3동), 솔파크(대림2동)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 5월
- 사업내용 : 파고라 1개소, 체육시설 5개소, 관목 2,050주 식재 등

□ 추진실적

- 2014. 3. 24 : 공사 시행
- 2014. 4. 7 : 공사 착공
- 2014. 5. 16 : 공사 준공

□ 예산액 : 총75,000천원 (시비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
75,000 (시비)	71,955 (시비)	95

열린학교 조성사업 대상 학교 내 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식, 가지치기의 사업을 시행하여 학생들의 안전사고 예방 안전한 면학 환경 제공

사업개요

- 대 상 : 5개소(여의도동 여의도중, 당산2동 영동초, 양평1동(2가) 관악고, 신길5동 대영초, 신길6동 대길초)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 3월
- 사업내용 : 학교공원화사업 수목 은행나무 외 13종 126주 전지

추진실적

- 2014. 2. 24 : 현장조사
- 2014. 2. 25 : 자체설계
- 2014. 2. 26 : 계약심사
- 2014. 3. 3 : 공사 계약
- 2014. 3. 7 ~ 3. 26 : 공사 시행
- 2014. 3. 26 : 공사준공

문제점 및 대책

- 열린학교 유지관리에 따른 협약 종료로 지원 근거 미약
- 유지관리 지원을 위한 협약 재체결 독려

예산액 : 총14,400천원 (구비)

예산액	집행액	집행율(%)
14,400 (구비)	11,470 (구비)	80

관내 주요 가로수 결주지(비어있는 곳)에 가로수 메워심기 및 보호판 정비를 실시하여 노선별로 일관되고 통일된 경관을 연출하여 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양산로 등 8개노선(영등포본동, 여의동, 대림1,3동)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 4월
- 사업내용 : 왕벚나무 등 3종 29주 식재 및 보호판 정비 28개소

□ 추진실적

- 2014. 2. 21 : 2014년 추진계획 수립
- 2014. 3. 3 : 실시설계 및 원가심사
- 2014. 3. 5 : 공사발주
- 2014. 3. 13 : 공사계약
- 2014. 3. 17 ~ 4. 11 : 공사시행  
- 가로수 식재 29주 및 보호판 정비 28개소

□ 문제점 및 대책

- 전체 가로수 16,121주 중 빈 결주지가 300개소 이상됨
- 구 재정난으로 예산확보가 어려워 일시에 메워심기 시행 곤란
- 구/시비 적극적 확보를 통해 메워심기 사업 지속 시행

□ 예산액 : 총48,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
48,000 (구비)	34,059 (구비)	71

우리구 도림로(도림고가~도림사거리) 회화나무 가로수를 왕벚나무로 바뀌 심기하여 관련 주민 불편민원을 해소, 쾌적하고 아름다운 가로 환경조성

□ 사업개요

- 위 치 : 도림로(도림고가 ~ 도림사거리, 도림동)
- 규 모 : 도림로 300m 가로수 31주
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 4월
- 사업내용 : 회화나무 -> 왕벚나무 31주 바뀌심기

□ 추진실적

- 2014. 1. 28 : 추진계획 수립 및 실시설계
- 2014. 2. 7 : 원가심사
- 2014. 2. 11 : 공사발주
- 2014. 3. 3 ~ 4. 7 : 공사시행

□ 기대효과

- 관련 민원해소 및 아름다운 가로경관 연출

□ 예 산 액 : 총60,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
60,000 (구비)	45,179 (구비)	75

도심 생활권의 자투리땅에 쓰레기 무단 투기로 지속적인 민원이 유발됨에 따라 이 지역을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸어 주민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시를 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 양평동6가 98-1(양평한솔아파트 옆 자투리 공지, 양평2동)
- 규 모 : 250㎡ (시유지, 지목 : 도로)
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 5월
- 사업내용 : 수목식재, 운동기구, 그네 설치 및 휴식공간 조성

#### □ 추진실적

- 2014. 3. 19 : 계약심사 완료
- 2014. 3. 26 : 공사 발주
- 2014. 4. 2 : 공사 착공
- 2014. 5. 15 : 공사 준공

#### □ 예 산 액 : 총50,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,000 (구비)	42,324 (구비)	85

관내 가로수에 대한 여름철 수형조절과 태풍 등의 안전사고 예방, 가로수 불편민원해결을 위한 가지치기를 실시하여 연중 쾌적하고 아름답게 관리

사업개요

- 위 치 : 문래북로 등 14개 노선
- 규 모 : 고사 가로수 제거 및 가지치기 등 500주
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 고사목, 위험가로수 제거 및 가지치기 등 500주

추진실적

- 2014. 1. 24 : 실시설계 및 원가심사
- 2014. 1. 27 : 공사발주
- 2014. 2. 14 : 공사계약
- 2014. 2. 18 ~ 12. 31 : 공사시행(연간간가)

문제점 및 대책

- 전체 86개 노선에 가로수 16,121주로 예산규모에 비해 사업물량이 많아 집약적 관리에 어려움
- 시비 가지치기(배전선로 등) 사업 예산 최대한 확보하여 활용

예 산 액 : 총63,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
63,000 (구비)	38,797 (구비)	62

태풍 및 폭우 등에 의한 위험요소를 사전에 정비, 안전사고를 예방하여 쾌적하고 안전한 녹지 환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 양평2동 가로녹지대 등
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 11월
- 사업내용 : 위험수목 전지 및 제거 408주

□ 추진실적

- 2014. 1. 23 : 공사발주
- 2014. 2. 18 : 공사계약
- 2014. 2. 18 ~ 8. 31 : 2차 기성검사 완료(376주 완료)
- 2014. 9 ~ 11월 : 376주 전지 등 완료
- 2014. 11. 10 : 공사 준공

□ 예산액 : 총63,600천원 (구비)

예산액	집행액	집행율(%)
63,600 (구비)	47,825 (구비)	75

가로변 바닥분수 등 수경시설을 가동하여 아름답고 쾌적한 가로변을 조성하고 다양한 볼거리 및 활기찬 가로경관 연출

사업개요

- 위 치 : 여의나루벽천 등 6개소
- 사업기간 : 2014. 4 ~ 10월
- 사업내용 : 노후된 수경시설 시스템 정비 등

추진실적

- 2014. 4. 10 : 계약심사 완료
- 2014. 4. 11 : 공사 발주
- 2014. 4. 15 : 공사 착공
- 2014. 4. 29 : 공사 준공
- 2014. 5 ~ 10월 : 분수 가동 및 유지관리(동절기 대비 포함)

예산액 : 총60,000천원 (구비)

예산액	집행액	집행율(%)
60,000 (구비)	18,480 (구비)	31

※ 최종유보액 37,000천원

관내 띠녹지 중 겨울철 제설제 피해와 인위적 훼손이 심한 곳에 메위 심기(보식) 및 경관시설을 설치하는 등 재정비하여 보행자에게 다양한 볼거리와 아름다운 보행환경을 제공함

#### □ 사업개요

- 위 치 : 국제금융로(진주아파트 상가 ~ 여의동주민센터, 여의도동)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 4월
- 사업내용 : 띠녹지 재정비 800m
  - 등근사철 등 7종 1,897주, 맥문동 등 6종 4,108본 식재
  - 경관석 42개, 물확/석등 8개소 설치 등

#### □ 추진실적

- 2014. 3. 17 : 실시설계, 원가심사
- 2014. 3. 24 : 공사발주
- 2014. 3. 31 : 공사계약
- 2014. 4. 1 ~ 4. 18 : 공사시행

#### □ 문제점 및 대책

- 조성 후 시간경과로 노후되거나 훼손된 띠녹지가 많음
- 어려운 구 재정으로 예산확보가 어려워 많은 지역 일제 재정비 곤란
- 구/시비 적극적 확보를 통해 재정비 사업 지속 시행

#### □ 예산액 : 총45,000천원 (구비)

예산액	집행액	집행율(%)
45,000 (구비)	27,711 (구비)	62

녹지대 내 고사 수목을 보식하고 노후되거나, 파손된 편의시설을 정비하는 등 공공시설에 대한 수시 정비로 안전하고 쾌적한 녹지환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포역 동부광장 녹지(영등포본동), 구청사 주변(당산1동)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 6월
- 사업내용
  - 암석원 조성/정비 : 영등포역 동부광장 고가하부 암석원 조성 1개소
  - 구청사 주변 녹지정비 : 당산로, 구청사주변 띠녹지 보식 등

□ 추진실적

- 2014. 3. 11 ~ 3. 18 : 암석원 조성
- 2014. 5. 21 ~ 6. 3 : 구청사 주변 녹지 보식  
(사철나무 등 7종 1,460주, 맥문동 등 2종 1,291본 식재)

□ 예산액 : 총27,000천원 (구비)

예산액	집행액	집행율(%)
27,000 (구비)	10,200 (구비)	38

※ 최종유보액 16,000천원

우리구 관문이자 금융의 허브인 여의도에 계절별 다양하고 아름다운 꽃을 식재하는 「영등포 꽃으로 피다」 사업을 실시하여 우리구 위상 제고

#### □ 사업개요

- 위 치 : 여의도 환승센터, 여의도역 1번 출구 앞 녹지대(여의도동)
- 규 모 : 230㎡
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 수수꽃다리 등 5종 2,050주, 벌개미취 등 8종 3,310본  
사각돌화분 10개, 꽃걸이형 화분 50조

#### □ 추진실적

- 2014. 3. 24 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2014. 4. 2 : 공사 발주
- 2014. 4. 21 : 공사 착공
- 2014. 5. 19 : 공사 준공

#### □ 예산액 : 총50,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,000 (구비)	34,865 (구비)	70

노후되고 폐쇄된 아파트 담장을 철거한 후 열린 숲길을 조성하여 준공공녹지를 확보함으로써 도시 경관을 향상하고 지역 주민의 커뮤니티 공간으로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 선유로 33길 22(경남아너스빌1차아파트, 양평1동)
- 규 모 : 담장철거 170m, 신규 녹지조성 132㎡
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 11월
- 사업내용 : 아파트 담장 철거 후 녹지조성

□ 추진실적

- 2014. 2. 6 : 실시설계용역 시행
- 2014. 3. 3 : 실시설계용역 준공
- 2014. 9. 12 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2014. 9. 19 : 공사 발주
- 2014. 10. 13 : 공사 착공
- 2014. 11. 18 : 공사 준공

□ 예산액 : 총140,000천원 (시비 70,000, 구비 70,000)

예산액	집행액	집행율(%)
140,000 (시비 70,000, 구비 70,000)	127,564 (시비 63,782, 구비 63,782)	91

관내 시도로 가로수의 열악한 생육환경을 개선하여 가로수의 건전한 생육을 도모하고, 보도폭이 넓은 곳은 띠녹지를 새로이 조성하여 쾌적하고 아름다운 보행환경을 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 국회대로 등 5개소(여의동,서로, 국제금융로, 경인로)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 5월
- 사업내용
  - 국회대로(당산2동) : 삼성A 앞(띠녹지 조성 150m, 가로수식재 6주)
  - 여의동서로(여의도동) : 가로수 메워심기 25주
  - 국제금융로(여의도동) : 띠녹지 재정비 1,000m
  - 경인로(문래동) : 가로수 메워심기 및 보호판 정비 13주

#### □ 추진실적

- 2014. 2 ~ 3월 : 실시설계, 시 설계심의, 원가심사 등
- 2014. 3. 3 : 공사발주
- 2014. 3. 21 : 공사계약
- 2014. 3. 26 ~ 5. 16 : 공사시행

#### □ 문제점 및 대책

- 전체 가로수 16,121주 중 결주지, 뿌리용기지, 보호판 훼손지 등 사업 대상물량이 많으나 구/시비 예산확보에 어려움
- 구/시비 적극적 확보를 통해 사업 지속 시행

#### □ 예산액 : 총181,460천원 (시비)

예산액	집행액	집행율(%)
181,460 (시비)	179,606 (시비)	99

가로변 자투리 공간 등에 다양한 수목을 식재하여 도심 녹지량을 늘리고  
소음 및 대기오염을 저감하여 쾌적한 환경 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 경인고속도 입구 등 3개소(양평1동, 신길7동)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 5월
- 사업내용
  - 경인고속도로 입구 : 왕벚나무 등 10종 3,647주
  - 해군회관 사거리 : 둥근소나무 등 3종 769주
  - 양평1동 코오펀더스 앞 : 자산홍 등 2종 800주

#### □ 추진실적

- 2014. 2 ~ 3월 : 실시설계, 설계심의, 원가심사 등
- 2014. 3. 4 : 공사발주
- 2014. 3. 24 : 공사계약
- 2014. 3. 24 ~ 5. 12 : 공사시행

#### □ 예산액 : 총100,000천원 (시비)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000 (시비)	98,980 (시비)	99

노후되고 훼손된 여의도 가로수 보호판을 교체하여 가로수 생육환경과 보행여건을 개선하고 쾌적한 가로경관을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여의서로(서강대교 남단 ~ 서울교, 여의도동)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 7월
- 사업내용 : 여의서로 보호판 교체 245조
  - 서강대교 남단 ~ 파천교 : 182조
  - 파천교 ~ 서울교 : 63조

□ 추진실적

- 2014. 1 ~ 4월 : 제품선정위원회개최, 실시설계, 설계심의 등
- 2014. 5. 19 : 공사발주
- 2014. 6. 2 : 공사계약
- 2014. 6. 2 ~ 7. 31 : 공사시행

□ 문제점 및 대책

- 여의동서로 및 기타 노선 중 뿌리용기지, 보호판 훼손지 등 사업 대상물량이 많으나 구/시비 예산확보에 어려움
- 구/시비 적극적 확보를 통해 사업 지속 시행

□ 예산액 : 총200,000천원 (시비)

예산액	집행액	집행율(%)
200,000 (시비)	190,234 (시비)	95

우리구 대표노선으로 선정된 국회대로 등의 화단에 계절별 다양한 꽃을 식재하여 도심 내 아름다운 가로경관 연출

□ 사업개요

- 위 치 : 국회 앞 화단, LG트윈타워 앞 화단
- 규 모 : 300 $m^2$
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 9월
- 사업내용 : 봄, 여름, 가을 계절별 다양한 꽃 식재

□ 추진실적

- 2014. 3. 20 : 봄철 테마화단 꽃묘 식재(팬지 등 37,250본)
- 2014. 6. 9 : 여름철 테마화단 꽃묘 식재(베고니아 등 35,545본)
- 2014. 9. 15 : 가을철 테마화단 꽃묘 식재(메리골드 등 37,000본)

□ 예산액 : 총37,000천원 (시비)

예산액	집행액	집행율(%)
37,000 (시비)	37,000 (시비)	100

활용도가 낮은 학교옥상, 유휴공지 등에 꽃과 나무를 심어 자연친화적이고 아름다운 교육환경을 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 대영고등학교(도림로 86길 16, 신길5동)
- 규 모 : 671 $m^2$ (유휴공지 502 $m^2$ , 옥상조경 169 $m^2$ )
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 6월
- 사업내용 : 산수유 등 11종 2,586주 식재  
비구방지망 펜스 설치, 옥상녹화 시행 등
- ※ 관내 초중고 수 : 43개소(초23/ 중11/ 고9)
- ※ 학교 공원화 현황 : 30개소(초17/ 중9/ 고4)

#### □ 추진실적

- 2014. 4. 8 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2014. 4. 22 : 공사 발주
- 2014. 5. 12 : 공사 착공
- 2014. 6. 25 : 공사 준공

#### □ 예산액 : 총80,000천원 (시비)

예산액	집행액	집행율(%)
80,000 (시비)	76,535 (시비)	96

생활주변 마을 골목길을 주민 스스로 꽃과 나무를 심고 가꾸어 열악한 골목길의 환경을 개선하고 마을공동체 문화를 형성하여 이웃간 만남과 소통의 공간을 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포본동 620-459일대(고추말어린이공원 인근)
- 규 모 : 800㎡ (연장 200m)
- 사업기간 : 2014. 5 ~ 11월
- 사업내용 : 주민참여를 통한 골목길 가꾸기 및 유지관리  
주민참여프로그램 운영 등

#### □ 추진실적

- 2014. 5월 : 제안공모 심사결과 발표
- 2014. 6 ~ 8월 : 참여단체와 사업협의
- 2014. 9 ~ 11월 : 주민설명회 개최, 공사시행 및 프로그램 운영

#### □ 예산액 : 총30,000천원 (시비)

예산액	집행액	집행율(%)
30,000 (시비)	30,000 (시비)	100

늘어나는 웰빙인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 생활권 녹지대, 공원 등에 야외체육시설을 설치하고 배드민턴장 등 노후화된 시설물을 새롭게 정비하여 구민건강 증진 및 생활체육 활성화에 기여

#### □ 사업개요

- 위 치 : 문래공원 등 8개소
- 규 모 : 야외체육시설 설치 19점, 체육시설 2개소
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 8월
- 사업내용
  - 노후포장 정비(탄성포장 271㎡), 도림배드민턴장 정비
  - 야외체육시설 설치

#### □ 추진실적

- 2014. 1. 10 : 사업추진계획 수립
- 2014. 2. 5 : 계약심사 의뢰(노후포장 정비)
- 2014. 3. 5 : 공사 착공(노후포장 정비)
- 2014. 4. 1 : 공사 준공(노후포장 정비)
- 2014. 5. 23 : 상반기 체육시설물 설치 완료
- 2014. 8. 20 : 하반기 체육시설물 설치 완료

#### □ 예 산 액 : 총70,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
70,000 (구비)	67,649 (구비)	97

안양천 제방 산책로에 왕벚나무를 보식하여 관내 걷고 싶은 길 명소로 조성

사업개요

- 위 치 : 안양천 제방 산책로(오목교~목동교)
- 규 모 : 1km
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 3월
- 사업내용 : 왕벚나무 보식 24주

추진실적

- 2014. 2. 20 : 추진계획 수립
- 2014. 2. 27 : 계약심사
- 2014. 3. 13 : 공사 착공
- 2014. 3. 24 : 공사 준공

예 산 액 : 총18,000천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
18,000 (구비)	14,953 (구비)	83

안양천 그린웨이 산책로 주변에 장미를 식재하여 하천경관을 향상시키고  
이용주민의 정서함양을 위한 쾌적하고 아름다운 장미꽃길을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 제방사면(신정교~오목교 구간, 성산대교 남단)
- 규 모 : 1km
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 유해식물 제거, 식생기반 조성, 교목 6주, 관목 14,050주,  
사계장미 1,840주, 초화류 매트 2,762매 식재

□ 추진실적

- 2014. 1. 8 : 추진계획 수립
- 2014. 2. 7 : 설계용역 착수
- 2014. 3. 8 : 설계용역 준공
- 2014. 3. 7 : 계약심사, 일상감사
- 2014. 4. 1 : 공사 착공
- 2014. 5. 10 : 공사 준공

□ 예 산 액 : 총200,000천원 (시비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
200,000 (시비)	183,126 (시비)	92

유수지 본래의 저수기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 토양정화 수생 초화류 및 수목을 식재하고 정자 등 시설을 보완하여 자연생태를 복원하고 주민휴식공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 국회대로22길 20 양평유수지
- 규 모 : 34,000 $m^2$
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 논 확장, 데크 주변 정자설치 및 보수, 교목 8주, 관목 850주, 초화류 270본 식재

□ 추진실적

- 2014. 1. 8 : 추진계획 수립
- 2014. 2. 5 : 설계용역 착수
- 2014. 3. 14 : 계약심사, 일상감사
- 2014. 3. 24 : 설계용역 준공
- 2014. 4. 8 : 공사 착공
- 2014. 5. 30 : 공사 준공

□ 예 산 액 : 총100,000천원 (시비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000 (시비)	99,980 (시비)	99

안양천 제방사면의 유해식물제거, 다양한 초화류 및 수목식재를 통하여 자연생태복원, 하천경관 향상 및 주민여가 공간 조성

사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 제방사면(성산대교 남단)
- 규 모 : 500 $m^2$
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 4월
- 사업내용 : 흙쌓기 등 9종, 야자섬유매트(물억새, 수크령) 520 $m^2$  설치

추진실적

- 2014. 1. 8 : 추진계획 수립
- 2014. 2. 17 : 계약심사
- 2014. 3. 13 : 공사 착공
- 2014. 4. 6. : 공사 준공

예 산 액 : 총40,000천원 (시비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
40,000 (시비)	39,385 (시비)	98

공원 및 녹지대에 설치되어 있는 전기시설물(공원등, 전력시설)의 유지 관리를 위해 전기공사 연간단가를 시행함으로써 민원발생시 신속한 민원처리에 만전을 기하고 전기시설물 사전점검을 통하여 전기안전사고를 미연에 방지하여 효율적인 전기시설물 유지관리

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 녹지대 등
- 규 모 : 공원등 270등(램프, 안정기 등 교체)
- 사업기간 : 2014. 3 ~ 12월
- 사업내용 : 공원 및 녹지대의 전기시설물 이상발생시 즉시 조치

□ 추진실적

- 공원등 부점등 민원처리
  - 부점등 민원처리 270등
  - 기타 전기시설 보수 1식

□ 예 산 액 : 총30,500천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
30,500 (구비)	24,359 (구비)	80

### Ⅲ. 2015 주요업무 추진계획

연 번	사 업 명	쪽
①	공원시설물 정비 .....	38
②	공원 내 수목 가지치기 및 식재 .....	39
③	전기시설물 유지관리공사(연간단가) .....	40
④	공중화장실 환경개선 .....	41
⑤	어린이공원 정비 .....	42
⑥	공원 수경시설 유지관리(연간단가) .....	43
⑦	자유어린이공원 안전 위험요소 제거 (구 주민참여) ...	44
⑧	2015년 시공원 보수정비 .....	45
⑨	신길근린공원 바닥 정비(시 주민참여) .....	46
⑩	위험천만! 어린이공원 옆 낭떠러지 정비(시 주민참여) .....	47
⑪	차 없는 거리 조성 .....	48
⑫	가로수 보식 및 식재 .....	49
⑬	생활주변 자투리땅 녹화사업(구 주민참여) .....	50
⑭	가로수 가지치기(연간단가) .....	51
⑮	녹지대 위험수목 정비(연간단가) .....	52

연 번	사 업 명	쪽
16	천수공간 수경시설 유지관리 .....	53
17	녹지대 수목보식 및 시설물 정비 .....	54
18	열린학교(학교공원화) 유지관리 .....	55
19	『영등포 꽃으로 피다』 사업 .....	56
20	배전선로 하부 가로수 가지치기 .....	57
21	가로정원 조성 .....	58
22	가로수 생육환경 개선 .....	59
23	가로변 녹지량 확충 .....	60
24	2015년 주민참여 골목길 가꾸기 .....	61
25	사계절 꽃길 조성 .....	62
26	도시구조물 벽면녹화 .....	63
27	마을단위 야외체육시설 설치 .....	64
28	안양천 제방 산책로 수목 보식 .....	65
29	양평유수지 농촌 체험학습장 조성(구 주민참여) .....	66
30	안양천 하천복원 및 녹화 .....	67

파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의시설을 확충하여 공원환경 개선에 기여

사업목표

- 노후되고 파손된 시설물을 정비하여 각종 안전사고 예방
- 쾌적한 휴식공간 제공 및 공원이용활성화 도모

사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 마을마당 43개소
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 공원 내 노후시설물 교체 및 수목식재 등

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 공원시설물 정비공사 실시설계용역 시행
- 2015. 3월 : 계약심사 및 일상감사
- 2015. 4 ~ 5월 : 공원시설물 정비공사 시행

소요예산 : 총200,000천원 (구비)

공원 내 수목 중 무성한 수관 형성으로 공원 인접 주택에 민원을 야기 하거나 공원 이용에 위해가 되는 수목에 대하여 정비공사를 시행하여 안전 사고 예방 및 쾌적한 공원 환경 제공

사업목표

- 공원 내 주택가 인접 위험 수목을 전지하여 안전사고 예방
- 수목의 불필요한 가지를 전지하여 수목생리 활성화를 통한 공원경관 향상

사업개요

- 위    치 : 다사랑어린이공원 등 32개소  
       - 근린공원 8개소, 어린이공원 19개소, 소공원 5개소
- 규    모 : 가지치기 300주
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 서강어린이공원 버즘나무 50주, 원지어린이공원 버즘나무 40주 등

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장조사
- 2015. 1 ~ 2월 : 실시설계
- 2015. 3 ~ 12월 : 공사시행

소요예산 : 총40,000천원 (구비)

공원 및 녹지대에 설치되어 있는 전기시설물(공원등, 전력시설)의 유지 관리를 위해 전기공사 연간단가를 시행함으로써 민원발생시 신속한 민원처리에 만전을 기하고자 하며 전기시설물 사전점검을 통하여 전기안전사고를 미연에 방지하여 효율적인 전기시설물 유지관리를 하고자 함

**사업목표**

- 각종 범죄 등을 사전에 예방하고 공원이용 주민에게 심리적 안정감 제공
- 시설물 파손을 사전 예방하여 쾌적한 공원환경 제공

**사업개요**

- 위 치 : 관내 공원 및 녹지대 등
- 규 모 : 공원등 636본, 기타 전기시설
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 공원 및 녹지대의 전기시설물 이상발생시 즉시 조치

**추진방향**

- 노후된 공원등 및 분전함 개량
- 부점등 처리 및 전기시설 안전점검하여 공원이용객 편의제공

**추진일정**

- 2015. 1 ~ 2월 : 물량산출 및 계약심사 요청
- 2015. 2월 : 전기시설물 유지관리공사(연간단가) 시행
- 2015. 12월 : 공사준공

**소요예산 : 총27,000천원 (구비)**

도시공원 내 노후한 공중화장실 시설을 개선하여 이용주민에게 편안하고 쾌적한 공원환경 제공

사업목표

- 공중화장실 내 노후되고 위험한 시설물을 정비하여 공중화장실 환경 개선 및 공원이용 만족도 개선

사업개요

- 위    치 : 신우공원 공중화장실 외 1개소(원지공원 공중화장실)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 4월
- 사업내용 : 노후시설물 교체 및 편의시설 설치

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 공중화장실 환경개선사업 실시설계용역 시행
- 2015. 3 ~ 4월 : 공중화장실 환경개선사업 시행

소요예산 : 총15,000천원 (구비)

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상

사업목표

- 노후 및 파손 편익시설물을 정비하여 안전한 공원 환경을 제공
- 쾌적한 휴식공간 제공으로 공원 이용 활성화 및 만족도 향상에 기여

사업개요

- 위 치 : 대림어린이공원(대림1동), 자유어린이공원(여의동)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 6월
- 사업내용 : 파손 놀이시설 교체 및 노후 공원시설 정비

추진일정

- 2015. 1 ~ 3월 : 실시설계용역 시행
- 2015. 3 ~ 4월 : 일상감사, 계약심사
- 2015. 4 ~ 6월 : 공사발주, 공사 시행 및 완료

소요예산 : 총63,000천원 (구비)

도심 내 볼거리 창출 및 주민 휴식공간 제공 등 활용도가 큰 물놀이장 등 수경시설을 지속적으로 관리하여 사전 위험요소를 제거하고 안전사고를 예방코자함

사업목표

- 공원내 수경시설 유지보수 및 정비를 정기적으로 시행하여 민원해소 및 안전하고 쾌적한 공원환경 제공

사업개요

- 위 치 : 영등포공원 물놀이장 등 12개소
- 규 모 : 물놀이장 4개소, 조형분수 2개소, 바닥분수 4개소, 계류 2개소
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 10월
- 사업내용 : 노후된 공원 수경시설 정비 및 유지관리

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장조사
- 2015. 2 ~ 3월 : 실시설계
- 2015. 4 ~ 10월 : 공원내 수경시설 유지보수 및 민원처리 등

소요예산 : 총25,000천원 (구비)

자유어린이공원 내 노후화로 공원 이용자의 불편을 야기하는 포장면을 정비하여 안전사고를 예방하고 배수체계를 개선하여 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상

사업목표

- 노후 및 파손 편익시설물을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공
- 쾌적한 휴식공간 제공으로 공원 이용 활성화 및 만족도 향상에 기여

사업개요

- 위    치 : 자유어린이공원 (여의동 50-3)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 6월
- 사업내용 : 배수시설 정비, 놀이터·산책로 불량 포장면 정비 등

추진일정

- 2014. 9월       : 제안 사업 신청 및 접수
- 2014. 11월     : 예산 사업 최종 결정
- 2015. 1 ~ 3월 : 실시설계용역 시행
- 2015. 3 ~ 4월 : 일상감사, 계약심사
- 2015. 4 ~ 6월 : 공사발주, 공사 시행 및 완료

소요예산 : 총45,000천원 (구비)

공원 내 산책로, 배수시설 등 노후 시설물 보수 정비를 통하여 각종 안전사고를 사전에 예방하고 쾌적한 공원 환경 조성

□ 사업목표

- 노후된 공원시설 정비를 통한 재해 안전 대비 및 공원이용 활성화
- 주민 여가, 휴식공간 제공 및 쾌적한 공원 환경 조성

□ 사업개요

- 위    치 : 영등포공원(영등포본동)
- 규    모 : 61,544m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 7월
- 사업내용 : 공원 내 산책로 및 하수관 정비, 음악분수 및 화장실 시설 정비 등

□ 추진일정

- 2015. 1월      : 서울시 기술용역타당성 심사
- 2015. 2 ~ 3월 : 설계 용역
- 2015. 3월      : 설계 심의
- 2015. 4월      : 공사 발주
- 2015. 4 ~ 7월 : 공사 시행

□ 소요예산 : 총250,000천원 (시비)

노후 된 공원 내 배드민턴장, 농구장 바닥 등을 정비하여 시민의 생활 체육 활성화에 기여하고, 공원이용객에게 수준 높은 서비스를 제공

□ 사업목표

- 노후 된 우레탄 바닥을 교체하여 안전사고를 사전에 예방
- 운동시설을 개선함으로써 공원이용객에게 수준 높은 공원이용 환경 제공

□ 사업개요

- 위    치 : 신길근린공원 (도림로80길 6)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 6월
- 사업내용 : 배드민턴장, 농구장 바닥 우레탄 교체 및 주변 환경정비 등

□ 추진일정

- 2014. 5월 : 직접제안 사업신청
- 2014. 6월 : 자치구 및 서울시 사업타당성 검토
- 2014. 6월 : 분과위 심사
- 2014. 7. 25 ~ 7. 26 : 참여예산총회 참여예산사업 최종 결정
- 2015. 1 ~ 3월 : 실시설계용역 시행
- 2015. 3 ~ 4월 : 일상감사, 계약심사
- 2015. 4 ~ 6월 : 공사발주, 공사 시행 및 완료

□ 소요예산 : 총190,000천원 (시비)

고추말어린이공원 내 무단 점유된 부지가 점유자의 건축신축으로 인해 담장 등이 철거됨에 따라 공원 경계담장 및 공원 부지 정비로 공원 진입로 확보를 통한 공원 이용 활성화에 기여하고자 함

□ 사업목표

- 노후 된 경계 담장 정비로 안전사고를 사전에 예방
- 공원 부지 재정비 및 진입로 확보 공원 이용 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 고추말어린이공원 (도림1동 23-1일대)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 6월
- 사업내용 : 경계 담장 기반 시설 재정비, 진입로 및 녹지 조성 등

□ 추진일정

- 2014. 5월 : 직접제안 사업신청
- 2014. 6월 : 자치구 및 서울시 사업타당성 검토
- 2014. 6월 : 분과위 심사
- 2014. 7. 25 ~ 7. 26 : 참여예산총회 참여예산사업 최종 결정
- 2015. 1 ~ 3월 : 실시설계용역 시행
- 2015. 3 ~ 4월 : 일상감사, 계약심사
- 2015. 4 ~ 6월 : 공사발주, 공사 시행 및 완료

□ 소요예산 : 총150,000천원 (시비)

통행량이 적은 이면도로를 폐쇄하고 숲길 및 주민쉼터를 조성하여 녹지량을 확충하고 주민화합, 소통의 공간으로 제공함으로써 주민 삶의 질을 향상하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 도신로 68(신길3동) 신길우성 1차 아파트 앞
- 규 모 : 4,200㎡(길이 200m, 폭 21m)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2015. 5월
- 사업내용 : 이면도로 폐쇄 후 녹지 및 쉼터 조성

□ 추진실적

- 2014. 1 ~ 2월 : 녹화협약 체결, 실시설계 용역 발주
- 2014. 3. 7 : 용역 착수
- 2014. 8. 27 : 용역기한 연기
- 2014. 10. 17 : 주민설명회 개최
- 2014. 10. 22 : 구비예산확보(460백만원)

□ 문제점 및 대책

- 시/구 매칭사업으로 구비 예산 확보(추경)가 늦어져 사업추진 지연

□ 향후계획

- 2014. 11. 20 : 서울시 계약심사 완료
- 2014. 11. 24 : 공사 발주
- 2014. 12. 15 : 공사 계약 및 착공
- 2015. 5월 : 공사 준공

□ 예산액 : 총1,000,000천원 (시비 500,000 구비 500,000)

예산액	집행액	집행율(%)
1,000,000 (시비 50%, 구비 50%)	27,670 (구비)	3

관내 주요 가로수 결주지(비어있는 곳)에 가로수 메워심기 및 보호판 정비를 실시하여 노선별로 일관되고 통일된 경관을 연출하여 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

#### □ 사업목표

- 가로수 메워심기를 통해 일관되고 연속된 가로경관 연출
- 메워심기 수종은 가로수 조성 및 관리 기본계획에 의거 선정
- 보행지장 등 가로수 불필요 시 보도 복구

#### □ 사업개요

- 위     치 : 양산로, 선유동1/2로, 문래북로 등 구도로 10개노선
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 5월
- 사업내용
  - 가로수 메워심기 : 느티나무, 은행나무 등 3종 20주
  - 보호판 정비 : 보호판 정비 및 설치 10개소

#### □ 추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장조사 및 추진계획 수립
- 2015. 2 ~ 3월 : 실시설계 및 원가심사
- 2015. 3 ~ 5월 : 공사시행

#### □ 소요예산 : 총20,000천원 (구비)

도심 생활권 주변의 방치된 유휴공간을 인근 주민들의 휴게 및 운동공간으로 조성함으로써 골목길을 아름답게 가꾸고 주민 소통의 장소로 제공하고자 함

사업목표

- 생활과 인접한 곳에 휴게공간을 조성하여 주민의 소통·화합의 장소로 제공
- 방치된 유휴공간을 녹화함으로써 아름다운 골목길 환경 조성

사업개요

- 위 치 : 신길동 188번지(영등포본동) 일대
- 규 모 : 200 $m^2$
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 녹지기반조성, 수목식재 등

추진일정

- 2015. 1월 : 사업추진계획 수립
- 2015. 2월 : 공사발주
- 2015. 3 ~ 5월 : 공사시행 및 준공

소요예산 : 총48,000천원 (구비)

여름철 수형조절을 실시하여 태풍 등의 안전사고 예방, 가로수 불편 민원해소를 위한 가지치기 사업을 연간단가로 시행. 민원에 즉각 대처하고 연중 쾌적하고 아름다운 가로환경을 조성

사업목표

- 가로수 가지치기를 통해 일관되고 통일된 가로경관 연출
- 정돈된 가로수형을 유지하여 도시미관 향상 및 건전한 생육 도모
- 가로수 불편민원해소, 위험, 고사목 제거 등으로 안전한 환경구축

사업개요

- 위    치 : 문래로 등 10개노선
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월
- 사업내용
  - 고사목, 위험수목 제거 100주
  - 가로수 수형조절 가지치기 400주 등

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 원가심사 및 공사발주
- 2015. 2 ~ 12월 : 공사시행

소요예산 : 총50,000천원 (구비)

녹지대 및 간선도로 주변의 위험수목을 사전에 정비하여 태풍, 폭우 등 기상이변으로 인한 녹지대 수목의 쓰러짐을 예방함으로써 안전하고 쾌적한 가로환경을 조성하고자 함.

사업목표

- 태풍 및 폭우로 인한 녹지대 위험수목을 사전에 정비, 안전사고 예방
- 쾌적하고 안전한 녹지환경 조성으로 지역 환경 개선에 기여

사업개요

- 위    치 : 관내 녹지대, 주택가 주변 수목
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 11월(연간단가)
- 사업내용 : 위험수목 제거 및 전지

추진일정

- 2015. 1월            : 위험수목 전수 조사 및 설계 시행
- 2015. 2월            : 공사 발주
- 2015. 3 ~ 11월    : 위험수목 정비공사 시행

소요예산 : 총40,000천원 (구비)

가로변 바닥분수 등 수경시설을 가동하여 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하고 다양한 볼거리 및 활기찬 도심경관 연출

사업목표

- 하절기 무더위에 지친 주민들에게 청량감과 더위 해소에 기여
- 노후된 수경시설을 교체·정비하여 안전하고 쾌적한 수경시설 유지

사업개요

- 위    치 : 노들길 분수대 외 5개소
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 11월
- 사업내용 : 노후 수경시설 정비 및 교체

추진일정

- 2015. 3 ~ 4월 : 현장 점검 및 설계 시행
- 2015. 4월       : 공사 발주 및 시행
- 2015. 5 ~ 11월 : 수경시설 가동 및 유지관리

소요예산 : 총20,000천원 (구비)

녹지대 내 고사 수목 및 교통사고로 훼손된 녹지대 수목을 연중 보식하고 노후 시설물을 정비하여 아름답고 쾌적한 녹지대 환경을 조성

사업목표

- 도로변 녹지에 수목 및 숙근 초화류를 보식하여 가로경관 향상 및 공해 저감
- 녹지대 노후 시설물 정비로 주민 이용 불편사항 해소

사업개요

- 위    치 : 관내 녹지대 258개소
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 수목식재 및 시설물 정비 등

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장 조사 및 설계 시행
- 2015. 3월       : 공사 발주
- 2015. 3 ~ 12월 : 공사 시행 및 유지관리

소요예산 : 총20,000천원 (구비)

열린학교 조성사업 대상 학교 내 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식, 가지치기 등으로 이용 학생의 안전사고 예방 및 아름답고 쾌적한 교육환경 제공

사업목표

- 열린학교 내 설치된 녹지 및 휴식공간 관리로 쾌적한 교육 환경 제공
- 열린 녹지 및 휴식 공간 제공으로 지역 환경 개선에 기여

사업개요

- 위    치 : 당산서중 외 30곳
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 노후 시설물 보수 및 수목 보식, 위험수목 가지치기

추진일정

- 2015. 1월           : 유지보수 시설물 및 위험수목 전수 조사
- 2015. 2월           : 현장 조사
- 2015. 3 ~ 5월   : 공사 발주 및 공사시행
- 2015. 1 ~ 12월   : 유지관리 지원

소요예산 : 총10,000천원 (구비)

우리구 가로경관이 불량한 나대지에 계절별 다양하고 아름다운 꽃을 식재하는 「영등포 꽃으로 피다」 사업을 실시하여 우리구 위상 제고

□ 사업목표

- 아름답고 쾌적한 거리환경 제공 및 도심경관 향상
- 유휴공간에 꽃과 나무를 심어 1년 내내 꽃을 감상하는 즐거움 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 137-8 자투리땅(도림동)  
대림역 8번 출구 앞 벽면(대림동)  
대림2동 1121-1 나대지(대림동)
- 규 모 : 200m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 식재기반조성, 수목 및 초화류 식재 등

□ 추진일정

- 2015. 1월 : 사업계획 수립
- 2015. 2 ~ 4월 : 실시설계용역 시행
- 2015. 4월 : 사업 착공
- 2015. 5월 : 사업 준공

□ 소요예산 : 총20,000천원 (구비)

관내 가로수 노선 중 한전 배전선로 하부 가로수에 대한 겨울철 가지치기를 통해 안전사고를 예방하고, 가로수로 인한 각종 민원을 해소하는 등 안전하고 쾌적한 가로경관 조성

사업목표

- 한전 배전선로와 근접한 가로수에 대한 수형조절로 일관된 경관연출
- 과도한 가지치기를 지양하고 고유 수형에 맞는 가지치기 실시

사업개요

- 위    치 : 가마산로 등 50개 노선
- 규    모 : 배전선로 하부 가로수 5천여주
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 4월
- 사업내용
  - 배전선로 근접 가로수에 대한 고유수형 가지치기 실시
  - 한전 부담금 확보를 통한 매칭사업(시 15%, 한전 85%)

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장조사 및 추진계획 수립
- 2015. 2 ~ 3월 : 실시설계 및 원가심사
- 2015. 3 ~ 4월 : 공사시행

소요예산 : 총473,000천원 (시비 71,000, 한전 402,000)

이용자가 많은 지하철역 주변 보도위에 계절별 다양한 수목과 초화류로 가득한 가로정원을 조성하고 다양한 휴게시설을 설치하여 이용자들의 쉼터, 만남의 장소 등으로 제공하고자 함

사업목표

- 보도위 안전한 가로변 정원조성으로 아름다운 경관 연출
- 꽃과 나무가 어우러진 정원에 다양한 휴게시설 설치로 만남의 장 제공

사업개요

- 위    치 : 의사당대로(9호선 국회의사당역 출입구 주변)
- 규    모 : 500m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 6월
- 사업내용
  - 지하철 환기구 주변 벽면녹화, 결이화분, 소규모 정원, 초화원 조성
  - 교통섬 그늘목 식재, 다양한 휴게시설 설치, 가로수 식재 등

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장조사 및 추진계획 수립
- 2015. 2 ~ 3월 : 실시설계 및 원가심사
- 2015. 4 ~ 6월 : 공사시행

소요예산 : 총200,000천원 (시비)

보도폭이 넓은 시도로에 띠녹지를 조성하여 가로수의 생육환경을 개선하여 건전한 생육을 도모하고, 훼손된 보호관 정비, 뿌리용기 지역 정비 등으로 쾌적하고 아름다운 보행환경을 조성

#### □ 사업목표

- 가로수 메워심기를 통해 일관되고 연속된 가로경관 연출
- 보도폭이 넓은 곳은 띠녹지 조성하여 볼거리 제공 및 보행환경 개선
- 보행 지장 뿌리용기 지역 집중 정비 실시

#### □ 사업개요

- 위     치 : 선유로 등 3개노선
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 5월
- 사업내용
  - 가로수 메워심기 : 은행나무 등 20주
  - 띠녹지 조성 : 선유로 당중초교 주변 200m
  - 보호관 정비 : 보호관 정비 및 설치 50개소 등

#### □ 추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장조사 및 추진계획 수립
- 2015. 2 ~ 3월 : 실시설계 및 원가심사
- 2015. 3 ~ 5월 : 공사시행

#### □ 소요예산 : 총196,000천원 (시비)

관내 주요 가로변에 수목 식재를 통한 가로변 녹지량을 확충하여 가로경관을 향상하고 소음, 비산먼지 흡수를 통한 대기정화를 통해 쾌적한 생활환경을 제공

#### □ 사업목표

- 주요 가로변에 녹지량 확충으로 통한 가로경관 향상
- 도심 소음, 먼지 제어를 통한 쾌적한 생활환경 제공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 여의도동 1-6(국회의사당역 앞 녹지)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 6월
- 사업내용
  - 토양 치환 : 8,000 $m^2$
  - 수목 식재 : 소나무 등 20종 10,000주
  - 수목재배치 : 느티나무 등 10종 600주

#### □ 추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 현장조사 및 추진계획 수립
- 2015. 2 ~ 3월 : 실시설계 및 설계심의, 원가심사
- 2015. 4 ~ 6월 : 공사시행

#### □ 소요예산 : 총150,000천원 (시비)

생활주변 마을 골목길을 주민 스스로 꽃과 나무를 심고 가꾸어 열악한 골목길의 환경을 개선하고 마을공동체 문화를 형성하여 이웃간의 만남과 소통의 공간을 조성

#### □ 사업목표

- 주거생활에 밀접한 골목길을 주민 스스로 가꾸는 자발적인 참여유도
- 꽃과 나무를 식재하여 마을 명소, 지역특색이 있는 골목길로 경관개선
- 골목길에서 주민들이 이웃과 함께 소통하는 마을공동체 문화형성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 355-154 일대
- 규 모 : 380 $m^2$ (연장 113m)
- 사업기간 : 2015. 5 ~ 9월
- 사업내용 : 주민참여를 통한 골목길 가꾸기 및 유지관리  
주민참여프로그램 운영 등

#### □ 추진일정

- 2015. 5월 : 제안공모 심사결과 발표
- 2015. 6월 : 참여단체와 협약체결
- 2015. 7 ~ 9월 : 주민설명회 개최, 공사시행 및 주민참여프로그램 운영

#### □ 소요예산 : 총50,000천원 (시비)

우리구 도심 내 통행량이 많은 주요 지역에 테마화단 및 사계절 특색있는 꽃길을 조성하여 아름다운 도시 이미지 향상 및 시민정서 함양 도모

□ 사업목표

- 아름답고 쾌적한 거리환경 제공 및 도심경관 향상
- 테마화단에 꽃과 나무를 심어 연중 꽃을 감상하는 즐거움 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 국회의사당 앞 화단, LG트윈빌딩 앞 화단
- 규 모 : 350 $m^2$
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 9월
- 사업내용 : 계절별 초화류 식재

□ 추진일정

- 2015. 1월 : 사업계획 수립
- 2015. 3월 : 봄철 계절별 초화류 식재
- 2015. 6월 : 여름철 계절별 초화류 식재
- 2015. 9월 : 가을철 계절별 초화류 식재

□ 소요예산 : 총40,000천원 (시비)

도시미관을 저해하는 콘크리트 담장, 건축물 및 옹벽 등 녹화사업을 시행하여 도시미관 향상 및 쾌적한 가로경관을 조성

사업목표

- 도시미관 향상 및 쾌적한 가로경관 도모
- 도심 녹화량 확충 및 대기질 개선

사업개요

- 위     치 : 문래동 도림천로 고가 옹벽(문래동4가 50)
- 규     모 : 250m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 식재기반조성, 수목 및 초화류 식재 등

추진일정

- 2015. 1월           : 사업계획 수립
- 2015. 2 ~ 3월       : 자체설계 시행
- 2015. 4월           : 사업 착공
- 2015. 5월           : 사업 준공

소요예산 : 총30,000천원 (시비)

체육활동 인구증가에 대비하고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 마을단위 야외 체육시설을 설치하여 건강증진 및 체육인구 저변확대

사업목표

- 공원 및 생활권 녹지대 등에 야외체육시설 설치로 웰빙인구 수요 충족
- 노후된 야외체육시설 정비로 주민 만족도 향상

사업개요

- 위    치 : 대림어린이공원 등 5개소
- 규    모 : 야외 운동기구 8점 설치, 도림동 배드민턴장 정비
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 10월
- 사업내용 : 운동기구 설치 및 체육시설 정비

추진일정

- 2015. 1 ~ 2월 : 사업추진계획 수립
- 2015. 3 ~ 6월 : 상반기 체육시설물 설치
- 2015. 8 ~ 10월 : 하반기 체육시설물 설치

소요예산 : 총30,000천원 (구비)

안양천 제방산책로에 왕벚나무를 보식하여 관내 걷고 싶은 길 명소로 조성

사업목표

- 많은 시민들에게 다양한 봄꽃을 감상할 수 있는 기회 제공
- 안양천 하천변의 경관 향상으로 주민 만족도 제고

사업개요

- 위 치 : 안양천 제방 산책로(목동교~양평교)
- 규 모 : 1km
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 4월
- 사업내용 : 왕벚나무 15주 보식

추진일정

- 2015. 1월 : 사업추진계획 수립
- 2015. 2월 : 공사발주
- 2015. 3 ~ 4월 : 공사시행 및 준공

소요예산 : 총10,000천원 (구비)

양평유수지에서 농촌체험 등 다양한 볼거리를 제공하여 주민들에게 도시 농업의 장을 제공하여 친환경적인 삶 추구

사업목표

- 휴식공간으로 제공된 유수지 내 농촌풍경의 소중한 체험 기회 제공
- 어린이 친환경 도시농업 학습체험의 장 마련

사업개요

- 위 치 : 국회대로22길 20 양평유수지
- 규 모 : 34,000 $m^2$
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 5월
- 사업내용 : 박터널, 텃밭 조성, 독설치, 휴게시설 설치, 연못 설치 등

추진일정

- 2015. 1월 : 사업추진계획 수립
- 2015. 2월 : 공사발주
- 2015. 3 ~ 5월 : 공사시행 및 준공

소요예산 : 총45,000천원 (구비)

안양천 제방사면의 유해식물 제거, 다양한 초화류 및 수목식재 등을 통하여 자연생태복원, 하천경관 향상 및 주민 여가공간 조성

□ 사업목표

- 자연생태복원 및 볼거리 제공으로 하천경관 향상
- 주변 안양천과 연결하여 주민 여가활동 증진, 자연학습장으로의 활용

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 제방사면 (성산대교남단~양화교)
- 규 모 : 3,000 $m^2$ (L=300m)
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 10월
- 사업내용
  - 유해식물 제거 및 식생기반 조성
  - 초화류 및 수목 식재

□ 추진일정

- 2015. 1월 : 사업추진계획 수립
- 2015. 1월 : 설계용역 발주
- 2015. 2 ~ 4월 : 설계용역 시행(설계심의 등 제반절차 이행)
- 2015. 5 ~ 10월 : 공사 시행 및 준공

□ 소요예산 : 총295,000천원 (시비)

## IV. 신규 · 주요투자 사업

연 번	사 업 명	쪽
①	도림천 생태복원(시 주민참여) .....	69
②	신길유수지 생태복원 .....	70

도림천 사면의 경관을 저해하는 유해식물을 제거하여 하천 생태복원 및 경관을 개선하고 산책로 주변에 그늘을 제공하여 자전거 및 도보 이용자들의 편의 제공 및 주민 이용 만족도 제고

사업목표

- 하천경관 개선 및 아름다운 경관 연출
- 주민 이용 만족도 제고 및 편의 제공

사업개요

- 위 치 : 도림천(신정교~대림유수지 앞)
- 규 모 : 1.3km
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 10월
- 사업내용 : 유해식물 제거, 식재기반 조성, 수목식재 등

추진일정

- 2015. 1월 : 사업추진계획 수립
- 2015. 1월 : 설계용역 발주
- 2015. 2 ~ 4월 : 설계용역 시행(설계심의 등 제반절차 이행)
- 2015. 5 ~ 10월 : 공사 시행 및 준공

소요예산 : 총250,000천원 (시비)

유수지 본래의 저수기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 훼손된 유수지 내 사면에 초화류 및 수목을 식재하여 자연학습장 분위기 조성 및 신길역 및 유수지 내 체육시설물 이용객에게 작은 휴식공간 제공

□ 사업목표

- 자연생태복원, 유수지 경관 향상 및 자연학습장으로의 활용
- 주민 여가공간 제공 및 공원 이용 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 신길유수지(신길1동 53)
- 규 모 : 1,740 $m^2$
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 10월
- 사업내용
  - 토양치환 등 식생기반 조성
  - 수목 및 초화류 식재
  - 주민 휴게쉼터 조성

□ 추진일정

- 2015. 1월 : 사업추진계획 수립
- 2015. 1월 : 설계용역 발주
- 2015. 2 ~ 4월 : 설계용역 시행(설계심의 등 제반절차 이행)
- 2015. 5 ~ 10월 : 공사 시행 및 준공

□ 소요예산 : 총100,000천원 (시비)
