

제198회 구의회 제2차 정례회

2016. 11. 21. ~ 12. 20.

청림 명동포구

2016년 주요업무 보고




푸른도시과

보고 순서

I . 일 반 현 황	· · ·	1
II . 주요업무 추진실적	· · ·	3
III . 2017년 주요업무 추진계획	· · ·	27
IV . 신규·주요투자 사업	· · ·	41

I. 일반 현황

1 조직

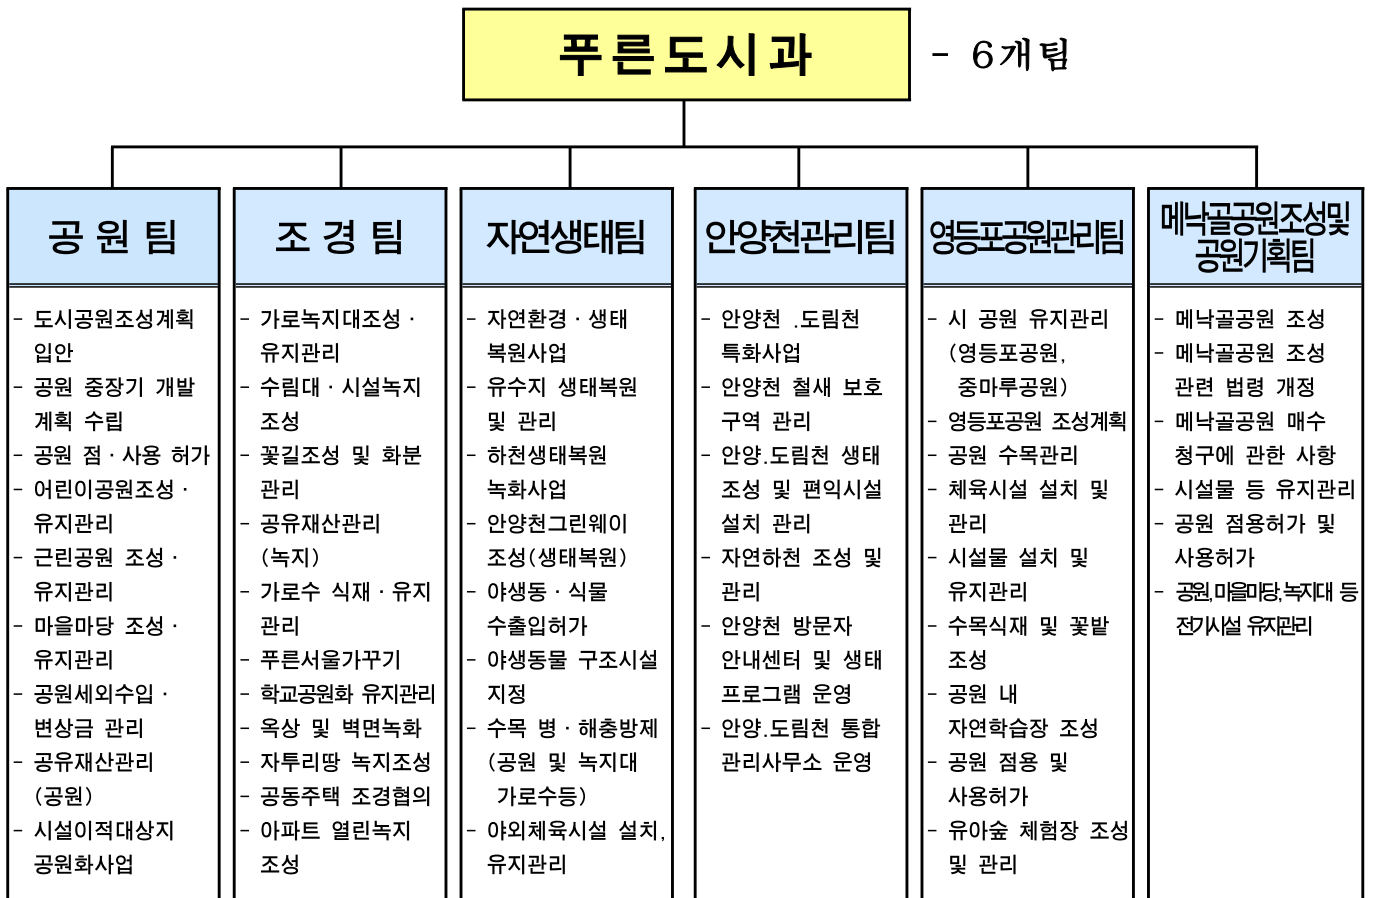

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	30	0	1	6	8	6	7	0	1	1	0	0	0	0	0
현 원	27	0	1	6	12	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0
과부족	△3	0	0	0	4	△3	△4	0	1	△1	0	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속
시설	근린공원	10개소/549,377㎡ (구공원 6개소/141,431㎡, 시공원 4개소/407,946㎡)	공원팀
	어린이공원	18개소/54,637㎡	공원팀
	소공원	11개소/14,074㎡	공원팀
	마을마당	31개소/18,011㎡	공원팀
	녹지대	339개소/719,087㎡	조경팀
	가로수	103개노선 17,709주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	자연생태팀
	체육시설	72개소 22종 792점	자연생태팀
장비	화물차	마이티(2.5t) 80모 5681(2005년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 80모 5698(2005년)	조경팀
	승합차	스타렉스(9인승) 03모 9050(2005년)	공원팀
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원팀
	소형화물	포터2(1.0t) 86우 4171(2011년)	안양천관리팀
	소형화물	포터2(1.0t) 80모 7630(2005년)	공원팀
	소형화물	포터2(1.0t) 80모 7614(2005년)	자연생태팀

4

예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액		집행률(%) (10.31기준)
		10.31기준	12.31까지	
계	7,505,910	6,006,097	7,051,161	80%
공원관리 수준향상	3,043,053	2,491,700	2,799,608	82%
가로녹지 수준향상	2,556,691	2,017,074	2,405,848	79%
자연생태 수준향상	574,077	391,095	538,749	68%
안양·도림천 특화	510,130	394,299	494,825	77%
인력운영비	520,503	486,141	517,140	93%
기본경비	214,322	187,426	207,892	88%
보전지출	48,737	0	48,737	
내부거래지출	38,397	38,362	38,362	99%

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	4
②	다양한 테마가 있는 생활속 녹색 공간 확충	6
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리	9
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	12
⑤	안양천·도림천 생태복원 및 정비	14
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성	16
⑦	공원내 위험요소 사전 정비	18
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비	20
⑨	도심 유휴공지 활용 녹지 확충	22
⑩	영등포공원 유아숲 체험장 조성	24
⑪	원지어린이공원 물놀이장 조성	25
⑫	도림유수지 내 장미 식재	26

의자, 목재 데크, 산책로 탄성포장 등 노후시설을 교체하고 생태놀이터를 만들어 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 공원 보수정비사업(영등포공원 리모델링)(완료)
 - 위 치 : 신길로 275(영등포본동) 영등포공원
 - 규 모 : 5,000 m^2
 - 내 용 : 산책로 탄성포장 778 m^2 교체, 풋살경기장 인조잔디 1,044 m^2 정비 등
 - 기 간 : 2016. 6. 27. ~ 10. 31.
 - 예 산 : 600,000천원(시비)
- 중마루공원 정비사업(완료)
 - 위 치 : 영등포동2가 222(영등포동) 중마루공원
 - 규 모 : 2,000 m^2
 - 내 용 : 흙막이 원주목 208m 교체, 연못 정비, 족구장 조명탑 설치 등
 - 기 간 : 2016. 6. 10. ~ 9. 12.
 - 예 산 : 200,000천원(시 주민참여)
- 공원 시설물 정비사업(완료)
 - 위 치 : 문래소공원(문래동), 당산공원(당산1동), 그린마을마당(신길5동)
 - 규 모 : 400 m^2
 - 내 용 : 목재웬스 330m, 파고라 2개소, 탄성포장 / 목교 / 목재데크 75 m^2 ,
얕음벽 27m, 파고라 1개소 정비 / 수목 식재 2,731주 등
 - 기 간 : 2016. 3. 30. ~ 5. 18.
 - 예 산 : 220,000천원(구비)
- 양평어린이공원 생태놀이터 조성사업(사고이월)(완료)
 - 위 치 : 양평동4가(양평2동) 301-7 양평어린이공원
 - 규 모 : 1,109 m^2
 - 내 용 : 조합놀이대, 숲속오두막, 숲속미로, 통나무균형잡기 설치 등
 - 기 간 : 2016. 3. 7. ~ 4. 25.
 - 예 산 : 300,000천원(국비 90,000, 구비 210,000)

□ 소요예산 : 1,320,000천원


(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,320,000 (국 90,000, 시 800,000, 구 430,000)	1,266,617 (국 89,994, 시 788,414 구 388,209)	95.95

□ 현황사진



영등포공원 보수정비 공사전

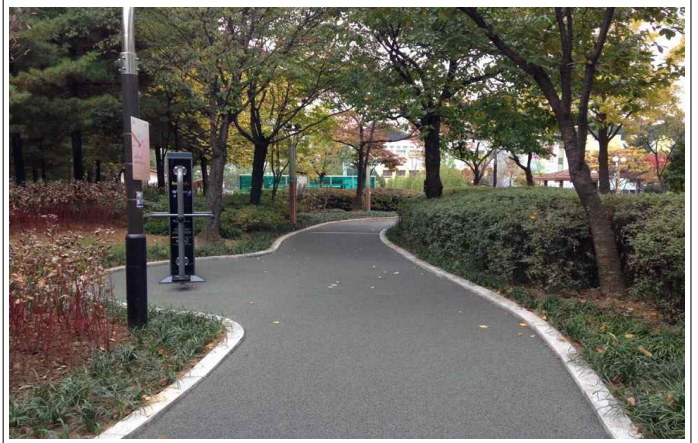

영등포공원 보수정비 공사후



중마루공원 공사전



중마루공원 공사후



생태놀이터 공사전



생태놀이터 공사후

관내 학교, 아파트, 도로변 등 주요 생활권에 보다 아름답고 쾌적하도록 다양한 테마의 특색있는 녹색 공간으로 조성함으로써 도시경관 향상

□ 사업개요

○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위치 : 대림2동 영림초교
- 규모 : 500m²
- 내용 : 파고라 1, 평의자8, 고무칩포장 107m², 목재데크 16m², 암석원 1개소, 산딸나무 등 13종 1,504주, 초화류 2,930본 식재 등
- 기간 : 2016. 4. 28. ~ 7. 1.
- 예산 : 100,000천원(시비)

○ 아파트 열린녹지 조성사업(완료)

- 위치 : 당산1동 삼익/ 양평2동 거성파스텔, 문래동 문래현대3차 /여의동 광장아파트(사고이월)
- 규모 : 담장철거 786m, 녹지조성 2,000m²
- 내용 : 담장 철거 786m, 수목식재 왕벚나무 등 12,960주, 초화류 식재 34,990본 등
- 기간 : 삼익아파트 2016. 5. 16. ~ 10. 7.
거성, 현대3차아파트 2016. 4. 25. ~ 7. 14.
광장아파트 2015. 10. 27. ~ 2016. 4. 30.
- 예산 : 676,268천원(시비 300,000, 구비 376,268 ※사고이월 50,000)

○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위치 : 여의동 국회의사당역(9호선) 3, 4번 출구 국민은행, 이룸센터 앞
- 규모 : 2,000m²
- 내용 : 목재데크 101m², 의자 16개소, 느티나무 등 19종 8,551주
꽃무릇 외 8종 23,366본 등
- 기간 : 2016. 4. 26. ~ 7. 6.
- 예산 : 220,000천원(시비)

○ 걷고싶은 그린로드 조성사업

- 위치 : 당산1동 당산공원, 문래동 문래공원, 대림3동 대림운동장
- 규모 : 100m²
- 내용 : 갈대조명 4, 나비조명 14, 영롱이조명 1세트 등 설치
- 기간 : 2016. 9. 21. ~ 11. 20.
- 예산 : 50,000천원(시비-주민참여사업)

○ 옥상녹화·텃밭 조성사업

- 위치 : 선유동1로 80 영등포구청 별관 옥상
- 규모 : 180m²
- 내용 : 바닥 방수, 앉음벽/등의자3개소, 목재데크 64m², 눈향나무 등 10종 1,292주 식재
- 기간 : 2016. 9. 26. ~ 11. 16.
- 예산 : 60,000천원(시비 42,000천원/ 구비 18,000천원)

향후계획

- 걷고싶은 그린로드 조성 완료(예정) : 2016. 11. 20.
- 옥상녹화·텃밭 조성사업 완료(예정) : 2016. 11. 16.

소요예산 : 1,106,268천원


(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,106,268 (시 712,000, 구 394,268)	954,825 (시 605,019, 구 349,806)	86.3

위 치 도



현황사진(가로정원 조성사업)

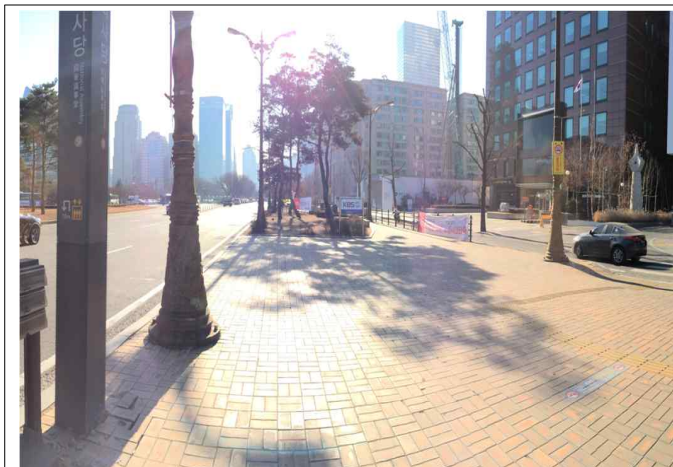

가로정원 공사전



가로정원 공사후

□ 현황사진(아파트 열린녹지조성사업)




아파트 열린녹지조성 공사전



아파트 열린녹지조성 공사후

□ 현황사진(에코스쿨 조성사업)

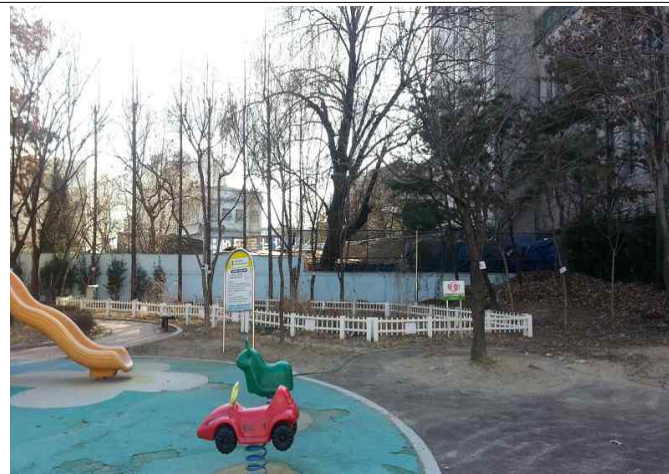

영림초 공사전



영림초 공사후

관내 가로수를 비롯한 주요 수목에 대한 생육환경개선사업을 통해 가로수의 건전한 생육을 도모하고, 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공

□ 사업개요

○ 가로수 보호관 정비사업(완료)

- 위 치 : 여의동 여의대로, 영등포동 영등포로, 신길7동 여의대방로
신길6동 대방천로, 문래동 선유로, 여의동 국회대로
- 규 모 : 6개 노선 566조
- 내 용 : 노후 보호관 교체 566조, 뿌리응기 보도 정비 등
- 기 간 : 2016. 4. 18. ~ 8. 30.
- 예 산 : 300,000천원(시비)

○ 가로수 식재(완료) 및 생육환경개선사업

(가로수 식재/가마산로 바꿔심기/가로수 생육환경개선)

- 위 치 : 문래동 문래북로, 문래로, 영등포본동 도신로29길 /
대림3동 가마산로/여의동 국회대로, 도림동 도신로 등
- 규 모 : 가로수 160주, 띠녹지 50m 등
- 내 용 : 가로수 식재 10주 / 가마산로 수종 교체 130주/
띠녹지 조성 50m, 가로수 식재 20주, 보호관 교체 20조
- 기 간
 - 가로수 보식 및 식재 : 2016. 2. 23. ~ 3. 23.
 - 가마산로 바꿔심기 : 2016. 6. 1. ~ 11. 27.
 - 가로수 생육환경개선 : 2016. 5. 23. ~ 7. 22.
- 예 산 : 320,000천원(시비 300,000, 구비 20,000)
- ※ 가로수식재(20,000/구비), 가마산로(210,000/시비), 생육환경(90,000/시비)

- 왕벚나무 등 수세회복(시,구(완료)) / 보호수 생육환경개선 사업(완료)
 - 위 치 : 여의동 여의동서로, 의사당대로, 여의대로, 영등포동 경인로(시비), 신길6동 벚꽃길(구비) / 당산2동 보호수
 - 규 모 : 왕벚나무 1,736주, 소나무 1,197주(시), 왕벚나무 112주(구) / 보호수 1주
 - 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등 수세회복
 - 기 간
 - 왕벚나무 등 수세회복(시비) : 2016. 4. 19. ~ 11. 30.
 - 왕벚나무 수세회복(구비) : 2016. 2. 18. ~ 3. 25.
 - 보호수 생육환경개선 : 2016. 2. 22. ~ 7. 23.
 - 예 산 : 215,000천원(시비 205,000, 구비 10,000)
- 친수공간 수경시설 유지관리사업(완료)
 - 위 치 : 여의동 여의나루 벽천, 신길6동 벽천 등 5개소
 - 규 모 : 수경시설 6개소
 - 내 용 : 노후 수경시설(노즐, 펌프 등) 교체 정비 등
 - 기 간 : 2016. 4. 25. ~ 10. 15.
 - 예 산 : 20,000천원(구비)

□ **향후계획**

- 가로수 생육환경(가마산로 바꿔심기사업) 완료(예정) : 2016. 11. 27.
- 왕벚나무 등 수세회복(시비)사업 완료(예정) : 2016. 11. 30.

□ **소요예산 : 855,000천원**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
855,000 (시 805,000, 구 50,000)	470,136 (시 418,501, 구 51,635)	54.9

□ 위치도



□ 현황사진



띠녹지 조성 공사전



띠녹지 조성 공사후



보호판 정비전



보호판 정비후

도로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지 조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로 경관을 조성하여 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품도시 영등포 이미지 향상

□ 사업개요

○ 가로변 녹지량 확충사업

- 위치 : 신길3동 대방천가로녹지 / 도림로 우성아파트사거리 등 6개소 (구로경계 도림천녹지, 대림3동사거리, 강남성심병원 앞 등)
- 규모 : 6개소 2,000㎡
- 내용 : 데크 1개소, 정자 1개소, 운동기구 2점 설치, 사철나무 등 15종 2,100주 식재 / 통석의자 6m, 파고라 1개소, 평의자 6점, 사철나무 등 10종 4,790주
- 기간
 - 대방천 가로녹지 : 2016. 8. 22. ~ 11. 20.
 - 도림로 등 6개소 : 2016. 6. 13. ~ 11. 30.
- 예산 : 420,000천원(시비)

○ 영등포 꽃으로 피다 사업(완료)

- 위치 : 신길4동 209-97 외 1개소(탄탄어린이집 주변/신길역 주변)
- 규모 : 200㎡
- 내용 : 회양목 등 12종 752주, 맥문동 등 4종 765본 / 사철나무 등 11종 561주, 맥문동 등 3종 330본
- 기간 : 2016. 5. 9. ~ 6. 9.
- 예산 : 20,000천원(구비)

○ 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업(완료)

- 위치 : 양평가로녹지(양평2동)
- 규모 : 계단정비 1식, 비상벨 설치 1개소
- 내용 : 노후 계단 10m 정비, 양평가로녹지 화장실 비상벨 설치, 회양목 등 2종 220주 식재
- 기간 : 2016. 2. 24. ~ 11. 5.
- 예산 : 20,000천원(구비)

□ 향후계획

- 가로변녹지량 확충사업(대방천) 완료(예정) : 2016. 11. 20.
- 가로변녹지량 확충사업(도림로) 완료(예정) : 2016. 11. 30.

□ 소요예산 : 460,000천원

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
460,000 (시 420,000, 구 40,000)	84,098 (시 51,124, 구 32,974)	18.28

□ 위치도



□ 현황사진



대방천가로녹지 공사전



우성아파트 교차로 공사전



대림3동사거리 공사전



성심병원 앞 공사전

안양천 서울둘레길 중 흙길을 보다 편안하고 쾌적한 환경에서 산책할 수 있도록 조성하고 도림천 제방사면의 위해식물을 제거하고 다양한 초화류 등을 식재하여 생태복원, 하천경관 향상 및 주민 여가공간 조성

□ 사업개요

○ 안양천 둘레길 정비 사업(완료)

- 위 치 : 안양천 제방 상부(신정교~오목교, 양평교)
- 규 모 : 2,232 m^2 (1구간 523m, 2구간 70m)
- 내 용 : 보행환경 개선, 화살나무 등 6종 2,440주 식재
- 기 간 : 2016. 2. 1. ~ 10. 18.
- 예 산 : 250,000천원(시 주민참여)

○ 도림천 생태복원 사업(완료)


- 위 치 : 대림동 640-2 일대(대림3동 빗물펌프장 인근)
- 규 모 : 2,800 m^2
- 내 용 : 식생매트(맥문동 등) 식재, 느릅나무 40주, 숙근코스모스 등 2,756 m^2 , 송악 등 15,785본, 유해식물 제거 등
- 기 간 : 2016. 3. 22. ~ 5. 20.
- 예 산 : 200,000천원(시비)

□ 소요예산 : 450,000천원


(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
450,000 (시 450,000)	439,158 (시 439,158)	97.59

□ 위치도

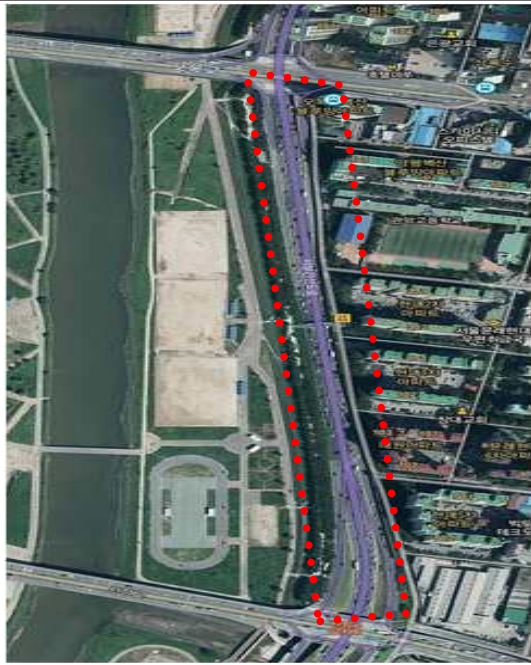

안양천(신정교 ~ 오목교)

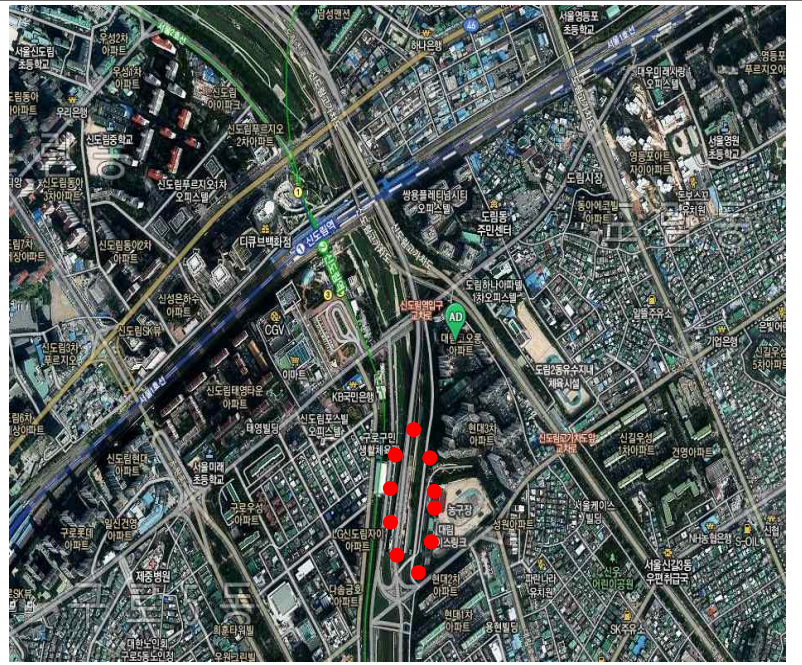

도림천(대림3동 빗물펌프장 인근)

□ 현황사진



안양천 둘레길 정비(전)



안양천 둘레길 정비(후)



도림천 제방사면 조성(전)



도림천 제방사면 조성(후)

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 위험수목 제거 및 수형조절 가지치기를 통해 위험요소를 사전 정비하여 쾌적하고 안전한 가로환경 제공

□ 사업개요

- 가로수 가지치기(연간단가) / 녹지대 위험수목 정비(연간단가)
 - 위 치 : 문래로 등 관내 전노선, 양평가로녹지대 등
 - 규 모 : 문래로 등 30개 노선, 500주
 - 내 용 : 위험목, 민원 및 가로수 등 제거 50주, 전지 200주 / 녹지대 수목 제거 50주 및 수형조절 200주
 - 기 간 : 2016. 2. 15. ~ 12. 31.
 - 예 산 : 90,000천원(구비)
- 겨울철 및 배전선로 하부 가로수 가지치기(완료)
 - 위 치 : 당산로 등 관내 57개 노선
 - 규 모 : 당산로 등 57개 노선, 5,811주
 - 내 용 : 시도로 및 한전 고압선 하부 가로수 가지치기 수형조절 (겨울철 990주, 배전선로 4,821주 약전지)
 - 기 간 : 2016. 1. 28. ~ 4. 6.
 - 예 산 : 545,200천원(시 144,700, 한전 400,500)
- 열린학교(학교공원) 수목정비사업(완료)
 - 위 치 : 신길5동 대영초등학교 등 5개교(여의도동 윤중초, 대림3동 도신초, 대림1동 신대림초, 당산2동 영동초)
 - 규 모 : 5개교 76주
 - 내 용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 76주
 - 기 간 : 2016. 2. 4. ~ 2. 22.
 - 예 산 : 10,000천원(구비)

□ 향후계획

- 가로수.녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가) 완료(예정) : 2016. 12. 31.

□ **소요예산 : 645,200천원**


(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
645,200 (시 144,700, 구 100,000 한전 400,500)	615,053 (시 140,130, 구 100,000 한전 374,923)	95.32

□ **현황사진**



가로수 가지치기 공사전

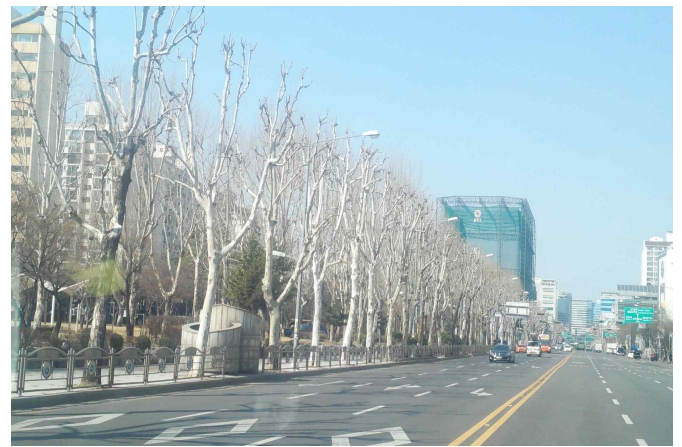

가로수 가지치기 공사후



위험수목 공사전



위험수목 공사후

공원 내 전기시설, 수경시설, 위험수목을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

□ 사업개요

- 전기시설물 유지관리사업(연간단가)
 - 위 치 : 관내 공원, 마을마당, 녹지대 등
 - 규 모 : 공원등 740본 948등
 - 내 용 : 공원등, 분전함 등 전기시설에 대한 연중 정비
 - 기 간 : 2016. 1. 12. ~ 12. 31.
 - 예 산 : 27,000천원(구비)
- 공원내 CCTV 시스템 구축사업(완료)
 - 위 치 : 나루마을마당(당산2동)
 - 규 모 : 1개소
 - 내 용 : CCTV 1개소 설치
 - 기 간 : 2016. 7. 6. ~ 7. 30.
 - 예 산 : 15,000천원(시비)
- 공원등 개선사업(완료)
 - 위 치 : 메낙골근린공원(신길동)
 - 규 모 : 공원등 10본 설치
 - 내 용 : 노후 공원등 교체 6본, 신규 설치 4본
 - 기 간 : 2016. 8. 30. ~ 10. 7.
 - 예 산 : 63,000천원(시비)
- 공원 수경시설 유지관리사업(완료)
 - 위 치 : 영등포동 647-3 영일어린이공원 외 7개소
(영등포동 중앙어린이공원, 당산1동 당산근린공원, 당산2동 꽃담
소공원, 문래동 문래근린공원, 현대1·2차 차없는 거리, 신길5동
꽃섬길마을마당, 대림3동 신우어린이공원)
 - 규 모 : 8개소
 - 내 용 : 노후 펌프 2개소, 밸브 5개소, 수위감지조절기 3개소 교체 등
 - 기 간 : 2016. 5. 2. ~ 5. 26.
 - 예 산 : 25,000천원(구비)

○ 공원내 수목 가지치기사업(완료)

- 위 치 : 자매공원 외 9개소(여의동 자매공원, 평화어린이공원, 영등포동 중마루공원, 서강어린이공원, 신길5동 신길공원, 당산2동 강마을 어린이공원, 꽃담소공원, 노들마을마당, 도림동 고추말어린이공원, 신길3동 감나무마을마당)
- 규 모 : 160주
- 내 용 : 수목 가지치기 160주
- 기 간 : 2016. 3. 21. ~ 4. 15.
- 예 산 : 20,000천원(구비)

□ 향후계획

- 전기사설물 유지관리사업(연간단가) 완료(예정) : 2016. 12. 31.

□ 소요예산 : 150,000천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
150,000 (시비 78,000, 구비 72,000)	111,780 (시비 76,440, 구비 35,340)	74.52

□ 현황사진(공원내 수목 가지치기)



주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

□ 사업개요

- 어린이공원 정비사업(완료)
 - 위 치 : 대림3동 두암·신우, 대림2동 다사랑, 대림1동 대림어린이공원
 - 규 모 : 1,000 m^2
 - 내 용 : 조합놀이대 교체 1개소, 탄성포장 447 m^2 / 벤치 설치 14개소 / 영화상영게시대 설치 등
 - 기 간 : 2016. 3. 25. ~ 7. 20.
 - 예 산 : 235,400천원(구비)
- 공중화장실 환경개선사업(완료)
 - 위 치 : 당산1동 당산근린공원, 영등포동 중앙어린이공원, 대림2동 다사랑어린이공원
 - 규 모 : 화장실 3개소
 - 내 용 : 양변기 5개소, 칸막이 교체 24 m^2 , 세면기수전교체 9개 등
 - 기 간 : 2016. 5. 25. ~ 8. 29.
 - 예 산 : 15,000천원(구비)
- 도림로63길 가로수 바꿔심기사업(완료)
 - 위 치 : 신길5동 도림로63길
 - 규 모 : 350m, 73주
 - 내 용 : 은행나무 → 이팝나무 교체 73주
 - 기 간 : 2016. 3. 10. ~ 11. 3.
 - 예 산 : 130,000천원(구 주민참여예산 50,000, 구비 추경 80,000)
- 은행나무 가로수 암, 수 교체사업(완료)
 - 위 치 : 여의동 의사당대로, 여의대방로, 선유서로, 선유동1로 등
 - 규 모 : 8개 노선 64주
 - 내 용 : 은행나무 암나무 → 수나무 교체 64주
 - 기 간 : 2016. 4. 1. ~ 7. 13.
 - 예 산 : 100,000천원(구비)

○ 마을단위 야외체육시설 설치사업

- 위 치 : 문래동 홈플러스 사잇길 등 13개소
- 규 모 : 야외체육시설 21개 설치, 정비공사 3개소
- 내 용 : 체육시설 및 의자 설치, 수목 식재 등
- 기 간
 - 2016. 4. 08. : 문래동 홈플러스 사잇길 야외체육시설 설치 완료(5점)
 - 2016. 6. 16. : 신길근린공원 내 노후 야외체육시설물 교체 완료(5점)
 - 2016. 8. 09. : 신길근린공원 종합체육시설 설치 완료(7점)
 - 2016. 8. 16. : 도림배드민턴장 그늘막 정비 완료
 - 2016. 9. 01. : 원지어린이공원 등 야외체육시설물 설치 완료(4점)
 - 2016. 10.31. : 도림게이트볼장 파고라지붕 정비 완료
- 예 산 : 230,000천원(시비 115,000, 구비 115,000)

□ 향후계획

○ 마을단위 야외체육시설 설치

- 마을단위 야외체육시설 6개소 설치완료(예정) : 2016. 11. 30.

□ 소요예산 : 710,400천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
710,400 (시비 115,000, 구비 595,400)	528,907 (시비 75,214, 구비 453,693)	74.45

□ 현황사진



어린이공원 정비 공사전



어린이공원 정비 공사후

도심 유휴공지를 활용하여 쉼터 및 녹지 등 녹색환경을 조성함으로써 생활 환경을 쾌적하게 하여 주민 만족도 증대

□ 사업개요

○ 도시구조물 벽면녹화 사업(완료)

- 위치 : 대림3동 대림역7번 출구 주변
- 규모 : 2개소 100m²
- 내용 : 대림역7번출구 앞 수직벽(13m*2m/상록기린초 수벽패널설치)
5,6번출구 주변 회양목 300주, 맥문동 1,210본 식재 등
- 기간 : 2016. 6. 8. ~ 8. 12.
- 예산 : 30,000천원(시비-주민참여사업)

○ 생활주변 자투리땅 녹화사업(완료)

- 위치 : 당산1동 현대아파트 앞 공지
- 규모 : 100m²
- 내용 : 소나무 외 4종 723주, 맥문동 외 1종 775본 식재 등
- 기간 : 2016. 3. 28. ~ 4. 25.
- 예산 : 15,000천원(구비)

□ 소요예산 : 45,000천원

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
45,000 (시 30,000, 구 15,000)	40,098 (시 27,598, 구 12,500)	89.1

□ 위치도 및 현황사진(생활주변 자투리땅 녹화사업)



□ 현황사진



자투리땅 녹화 공사전



자투리땅 녹화 공사후

도시공원 내 유아숲 체험장을 조성·운영하여 자연을 접하기 어려운 도시 아이들이 창의적이고 건강하게 성장할 수 있도록 숲체험 및 숲교육 기회 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 신길로 275(영등포본동) 영등포공원(물놀이장 인근)(완료)
- 규 모 : 약 2,000m²
- 기 간 : 2016. 1. ~ 10.
- 내 용 : 자연형 놀이터, 숲체험 보조시설, 휴게시설 조성 등
- 예 산 : 100,000천원(시비)

□ 주요 추진실적

- 2016. 2. ~ 4. : 실시설계용역 시행
- 2016. 5. 19. : 서울시 설계심의
- 2016. 8. 25. : 계약심사 및 공사발주
- 2016. 9. 19. : 공사착공
- 2016. 10. 28. : 공사준공

□ 소요예산 : 100,000천원

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000 (시 100,000)	99,700 (시 99,700)	99.70

□ 현황사진



공사전



공사후

시설이 낙후되고 안전사고 위험이 있는 기존 친수공간을 오감이 즐거운 체험형 물놀이장으로 조성하여 주민 여가 활용 및 소통, 화합하는 공간으로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 도림로47길 28(대림3동) 원지어린이공원(완료)
- 규 모 : 4,845㎡(물놀이장 약 200㎡)
- 기 간 : 2016. 1. ~ 6.
- 내 용 : 체험형 물놀이장 조성
- 예 산 : 320,000천원(구비)

□ 주요 추진실적


- 2016. 1. 13. : 실시설계용역 시행
- 2016. 3. 15. : 추진계획 수립 및 공사발주
- 2016. 4. 5. ~ 6. 30. : 공사시행 및 준공
- 2016. 7. 9. ~ 8. 31. : 원지물놀이장 가동
※ 운영기간 중 연 이용 인원 약 27,800명

□ 소요예산 : 320,000천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
320,000 (구 320,000)	289,321 (구 289,321)	90.41

□ 현황사진

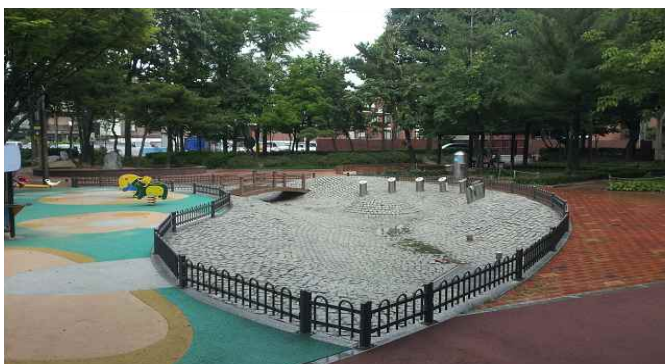

공사전



공사후

매년 개최하고 있는 ‘도림동 장미마을 축제’ 와 연계하여 도림유수지 내 공지에 장미를 식재하고 노후 시설물을 정비함으로서 주민 커뮤니티 공간 제공 및 쾌적하고 아름다운 유수지 환경 조성

사업개요

- 위 치 : 도림유수지(도림동 254)(완료)
- 규 모 : 2,000m²
- 기 간 : 2016. 1. ~ 6.
- 내 용 : 장미식재 및 노후시설물 정비 등
- 예 산 : 200,000천원(시비)

주요 추진실적

- 2016. 2. 23. : 시 설계심의
- 2016. 3. 24. : 공사 발주
- 2016. 4. 18. : 공사 착공
- 2016. 6. 6. : 공사 준공

소요예산: 200,000천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
200,000 (시 200,000)	199,359 (시 199,359)	99.68

현황사진



공사전



공사후

Ⅲ . 2017년 주요업무 추진계획

연 번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	28
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충	30
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리	31
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	33
⑤	하천변 녹지 확충 및 정비	35
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성	36
⑦	공원내 위험요소 사전 정비	37
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비	39

의자, 목재 데크, 산책로 탄성포장 등 노후시설을 교체하고 창의놀이터를 조성하여 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 영등포공원 보수정비사업
 - 위 치 : 신길로 275 영등포공원
 - 규 모 : 4,000 m^2
 - 내 용 : 산책로 정비, 공중화장실 보수, 음악분수대 데크 정비 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 250,000천원(시비)
- 문래근린공원 창의놀이터 재조성사업
 - 위 치 : 문래동3가 66 문래근린공원
 - 규 모 : 500 m^2
 - 내 용 : 주민과 전문가가 협업하여 주민참여형 커뮤니티 창의놀이터 조성
 - 일 정
 - 2016.10. ~ 2017. 2. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 200,000천원(시비)
- 노후 마을마당 보수정비사업
 - 위 치 : 신길4동 232-20 덕천길마을마당
 - 규 모 : 200 m^2
 - 내 용 : 조합놀이대 정비, 탄성포장 교체, 수목식재 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 60,000천원(시비)

○ 공원 시설물 정비사업

- 위 치 : 문래근린공원, 당산근린공원, 신길근린공원, 메낙골근린공원
- 규 모 : 1,000 m^2
- 내 용 : 노후, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 300,000천원(구비)

○ 어린이공원 정비사업

- 위 치 : 영일·자유·서강·원지어린이공원
- 규 모 : 800 m^2
- 내 용 : 노후 어린이 놀이시설 교체, 정비, 배수로 및 탄성포장 정비 등
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 235,400천원(구비)

○ 공원 시설 확충 및 개선사업

- 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등 68개소
- 규 모 : 10개소
- 내 용 : 주민 요구 및 긴급 보수정비 사항 처리
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 12. : 보수 정비 수시 시행
- 예 산 : 50,000천원(구비)

○ 공원 소나무 생육환경개선사업

- 위 치 : 당산·문래·영등포근린공원
- 규 모 : 157주 (당산 68주, 문래 89주)
- 내 용 : 소나무 해충방제, 엽면시비, 토양개량 등
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 4. ~ 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 30,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총1,875,400천원(시 1,260,000, 구 615,400)**

관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 특색 있는 녹색공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 볼거리있는 휴식공간을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 에코스쿨 조성사업

- 위 치 : 당서초등학교(당산2동)
- 규 모 : 500m²
- 내 용 : 쉼터 조성, 야생화정원, 그늘목 식재 등
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 4. : 실시설계 및 시 설계심의
 - 2017. 5. ~ 6. : 공사시행
- 예 산 : 57,000천원(시비)

○ 가로정원 조성사업

- 위 치 : 여의도역(5호선) 6번 출구 미성아파트 D동 앞
- 규 모 : 1,000m²
- 내 용 : 포켓정원, 초화원, 그늘목식재, 띠녹지 조성 등
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 4. : 실시설계 및 시 설계심의
 - 2017. 5. ~ 6. : 공사시행
- 예 산 : 194,000천원(시비)

○ 아파트 열린녹지 조성사업

- 위 치 : (양평2동)현대6차/(양평1동) 오목교벽산 블루밍
- 규 모 : 약1,500m²
- 내 용 : 담장 철거, 수목이식 및 식재, 편익시설 설치 등
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 4. : 실시설계 및 주민의견 수렴
 - 2017. 4. ~ 5. : 시 설계심의 및 계약심사
 - 2017. 6. ~ 10. : 공사시행
- 예 산 : 270,000천원(시비 135,000, 구비 135,000)

□ **소요예산 : 총521,000천원(시 386,000, 구 135,000)**

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 가로수 생육환경 개선사업
 - 위 치 : (양평2동)영등포로, (문래동)도림로 등
 - 규 모 : 가로수 메워심기, 보호판 정비, 띠녹지 조성 200m 등
 - 내 용 : 띠녹지 조성(식재기반, 수목/초화류식재), 가로수보식 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 4. : 실시설계 용역
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사시행
 - 예 산 : 195,000천원(시비)
- 왕벚나무 수세회복사업 / 보호수 생육환경개선 사업
 - 위 치 : 여의도 벚꽃길 / 당산2동 보호수 등
 - 규 모 : 왕벚나무 100주, 보호수 1주
 - 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계 및 공사발주
 - 2017. 4. ~ 5. : 공사시행
 - 예 산 : 15,000천원(시비 5,000, 구비 10,000)
- 가로수 식재 및 은행나무 바꿔심기사업
 - 위 치 : (양평2동)양평로22길, 국제금융로, 의사당대로(여의동) 등
 - 규 모 : 가로수 식재(교체) 70주, 보호판 정비교체 70조 등
 - 내 용 : 가로수 메워심기 10주, 보호판 정비교체 10조
은행나무 암수교체 60주, 보호판 정비 60조 등

- 일 정

- 2017. 1. ~ 4. : 대상지 선정 및 실시설계
- 2017. 5. ~ 6. : 은행나무 시료 DNA 검사
- 2017. 7. ~ 10. : 공사시행

- 예 산 : 120,000천원(구비)

○ 천수공간 수경시설 정비사업

- 위 치 : (신길6동)여의대방로, (여의동)여의나루역 등

- 규 모 : 수경시설 7개소

- 내 용 : 노후부품 교체 및 정비

- 일 정

- 2017. 1. ~ 4. : 실시설계 및 공사시행

- 예 산 : 10,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총340,000천원(시 200,000, 구 140,000)**

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화 도시 영등포 이미지 향상하고자 함

□ 사업개요

○ 가로변 녹지량 확충사업

- 위 치 : 여의동 84 여의대로 마포대교 남단 일대 등
- 규 모 : 1,000 m^2
- 내 용 : 녹지대 신규 조성(식재기반조성, 수목식재 등) 및 기존녹지 정비(시설물 및 수목 정비, 교통섬 녹화 등)

- 일 정

- 2017. 1. ~ 4. : 실시설계 및 시 설계심의
- 2017. 4. ~ 6. : 공사시행

- 예 산 : 200,000천원(시비)

○ 도시구조물 벽면녹화사업

- 위 치 : (문래동)도림천고가 벽면, (여의도)대한지적공사 담장 등
- 규 모 : 600 m^2
- 내 용 : 식생기반조성, 환토, 등반보조재설치, 수목 및 만경류식재 등

- 일 정

- 2017. 1. ~ 4. : 실시설계 및 유관기관 협의, 시 설계심의
- 2017. 5. ~ 6. : 공사시행

- 예 산 : 87,000천원(시비)

○ 사계절 꽃길 조성사업

- 위 치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 3개소
- 규 모 : 400 m^2
- 내 용 : 꽃길조성, 장식화단 조성, 걸이화분설치 등

- 일 정

- 2017. 1. ~ 12. : 봄, 가을 꽃길조성

- 예 산 : 32,000천원(시비)

- 영등포 꽃으로 피다 사업
 - 위 치 : (당산2동)당산동5가 11-37 등
 - 규 모 : 500m²
 - 내 용 : 가로변 사계절 장식화단 조성, 자투리땅 꽃·나무 식재 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 5. : 실시설계 및 공사시행
 - 예 산 : 40,000천원(구비)
- 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업
 - 위 치 : 관내 가로녹지대 등
 - 규 모 : 600m²
 - 내 용 : 노후 시설물(의자 등)정비, 수목 보식 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 4. : 신길6동 벚꽃길 울타리 보수/교체
 - 2017. 1. ~ 12. : 녹지대 시설물 정비, 수목보식 등
 - 예 산 : 50,000천원(구비)
- 선유로 가로녹지 조성사업(구 주민참여)
 - 위 치 : 선유로 207 양평현대6차 앞(양평2동)
 - 규 모 : 120m
 - 내 용 : 가로변 떠녹지 조성, 식재기반, 아교목/관목류/초화류 등 식재
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 4. : 실시설계, 주민의견수렴
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사시행
 - 예 산 : 50,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총459,000천원(시 279,000, 구 180,000)**

안양천, 유수지 등 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업
 - 위 치 : 안양천 제방 및 산책로 주변
 - 규 모 : 약 3km
 - 내 용 : 수목보식, 안내판 정비, 휴게시설 정비 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 현장조사 및 실시설계
 - 2017. 2. ~ 3. : 공사시행
 - 예 산 : 10,000천원(구비)
- 여의도 무궁화 식재사업(구 주민참여)
 - 위 치 : 여의도 한강변 녹지대, 공원, 유희녹지 등
 - 규 모 : 무궁화 4,000주 식재 등
 - 내 용 : 식재기반 조성 및 무궁화 및 꽃나무 식재 등
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
 - 2017. 3. ~ 6. : 공사시행
 - 예 산 : 45,000천원(구비)
- 샛강생태공원 친환경 문화프로그램 운영사업(공약사업)
 - 위 치 : 여의도동 4-5일대 샛강생태공원 내
 - 내 용 : 생태교육(100회) 및 소규모 문화행사(10회) 진행
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 계획수립 및 강사 섭외 등
 - 2017. 3. ~ 11. : 생태교육 및 문화행사 진행
 - 예 산 : 13,000천원(구비)

□ 소요예산 : 총68,000천원(구 68,000)

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 수목에 대한 수형 조절 가지치기 및 위험수목 제거로 안전사고 예방 및 가로경관을 향상시켜 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 여름/겨울철 및 배전선로 하부 가로수 가지치기사업
 - 위치 : 당산로 등 시도로 23개노선, 배전선로 노선 46개 노선
 - 규모 : 여름/겨울철 1,000주, 배전선로 5,000주
 - 내용 : 시도로 및 한전 고압선 하부 가로수 가지치기 수형조절
 - 일정
 - 2017. 1. ~ 3. : 겨울철 시도로 가지치기사업 시행
 - 2017. 2. ~ 4. : 배전선로 하부 가로수 가지치기사업 시행
 - 2017. 8. ~ 9. : 여름철 가로수 수형조절사업 시행
 - 예산 : 520,000천원(시비 140,000, 한전 380,000)
- 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)
 - 위치 : 문래로 등 관내 103개 노선, 양평가로 녹지대 등 300개소
 - 규모 : 위험수목 가지치기 및 제거 600주
 - 내용 : 위험목, 민원 및 가로수 등 / 녹지대 수목제거 및 수형조절
 - 일정
 - 2017. 1. ~12. : 가로수, 녹지대 수목 가지치기사업(연간단가) 시행
 - 예산 : 100,000천원(구비)
- 열린학교(학교공원) 수목정비사업
 - 위치 : 영림초교 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 36개소
 - 규모 : 위험수목 가지치기 및 제거 100주
 - 내용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 76주
 - 일정
 - 2017. 2. ~ 3. : 열린학교(학교공원) 수목정비사업 시행
 - 예산 : 20,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총640,000천원(시 140,000, 구 120,000, 한전 380,000)**

공원 내 공원등 등 전기시설 및 CCTV, 위험수목 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

□ 사업개요

○ 공원등 개선사업

- 위 치 : (영등포동)중앙어린이공원
- 규 모 : 공원등 교체 15분
- 내 용 : 공원등 교체, 기타 전기시설 정비
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
 - 2017. 3. ~ 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 71,000천원(시비)

○ 공원내 CCTV 시스템 구축사업

- 위 치 : (문래동)인스빌소공원1,2
- 규 모 : CCTV 2개소
- 내 용 : CCTV 신규 설치
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
 - 2017. 3. ~ 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 30,000천원(시비)

○ 전기시설물 유지관리사업(연간단가)

- 위 치 : 관내 공원, 녹지대 등
- 규 모 : 공원등 752분 965등, 분전함 62면, 기타 전기시설 정비
- 내 용 : 공원등, 분전함, 기타 전기시설 정비 유지관리
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 12. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 27,000천원(구비)

○ 녹지초소 전기시설 보수사업

- 위 치 : (양평2동)녹지반 초소
- 규 모 : 1개소
- 내 용 : 초소 전기시설 보수
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
 - 2017. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 10,000천원(구비)

○ 공원내 수목 가지치기 및 식재사업

- 위 치 : 관내 공원, 마을마당 등 68개소
- 규 모 : 300주
- 내 용 : 수목 가지치기, 고사목 및 도복 수목 제거 등
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
 - 2017. 3. ~ 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 30,000천원(구비)

○ 대방천변 녹지내 산책로 조명등 설치사업(구 주민참여)

- 위 치 : 도림동 263 도림배드민턴장 ~ 도림게이트볼장 사이
- 규 모 : 13본
- 내 용 : 조명등 설치
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계
 - 2017. 4. ~ 8. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 50,000천원(구 주민참여)

□ **소요예산 : 총218,000천원(시 101,000, 구 117,000)**

주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

□ 사업개요

- 공중화장실 개선사업(시 주민참여)
 - 위 치 : 양남어린이공원(양평1동), 동심어린이공원(대림3동),
대림어린이공원(대림1동)
 - 규 모 : 3개소
 - 내 용 : 남녀화장실 구분(양남·동심), 리모델링 및 주변환경정비(대림)
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 170,000천원(시비)
- 한마음마을마당 조성사업
 - 위 치 : 도림동 182-5 등 한마음마을마당(도림동 동아에코빌아파트 105동 앞)
 - 규 모 : 73 m^2
 - 내 용 : 지장물(콘크리트 건물) 철거 및 마을마당 조성
 - 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 40,000천원(구비)
- 도리미소공원 내 놀이시설 설치사업
 - 위 치 : 도림동 821-3 도리미소공원(도림동 영등포아트자이아파트 104동 앞)
 - 규 모 : 30 m^2
 - 내 용 : 시소 및 흔들말, 놀이자전거, 탄성포장 등
 - 2017. 1. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
 - 예 산 : 20,000천원(구비)

○ 공중화장실 환경개선사업

- 위 치 : 문래근린공원 등 3개소
- 규 모 : 3개소
- 내 용 : 공원 화장실 노후 변기 정비 및 물놀이장 화장실 임차
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
 - 2017. 7. ~ 8. : 공중화장실 임차
- 예 산 : 20,000천원(구비)

○ 마을단위 야외체육시설 설치

- 위 치 : 도림게이트볼장 등 6개소
- 규 모 : 도림게이트볼장 바닥정비, 운동기구 30점 설치 및 시설물 정비 등
- 내 용 : 운동기구 설치, 게이트볼장, 배드민턴장 등 체육시설 정비
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 2. : 사업대상지 현장조사
 - 2017. 3. ~ 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 100,000천원(구비)

○ 공원녹지포지 폐기물처리사업

- 위 치 : 양평2동 1-29(아리수정수센터 옆)
- 규 모 : 1,000ton
- 내 용 : 공원녹지 발생 각종 혼합폐기물 반출처리
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 사업대상지 현장조사
 - 2017. 3. ~ 5. : 폐기물반출 처리
- 예 산 : 50,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총400,000천원(시 170,000, 구 230,000)**

Ⅳ. 신규·주요 투자사업

1 생활권 공원녹지 조성사업

공원팀

이면도로 폐쇄지역과 도로변 유휴공지를 활용하여 숲길 및 쉼터를 조성함으로써 지역 주민이 소통하고 화합할 수 있는 공간을 제공하고, 녹지량 확충을 통한 쾌적한 주거환경 조성

□ 추진방향

- 녹지량 확충을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 주민 소통, 화합의 공간 제공을 위한 공간 구성
- 주민 협의체 구성 및 사업 설명회 개최를 통한 주민 의견 수렴 및 반영

□ 사업개요

- 위 치 : (양평2동)선유로43나길 일대, 거성파스텔 주변 이면도로
- 규 모 : 6,000 m^2 (길이 380m, 폭 6~30m)
- 내 용 : 이면도로 폐쇄지역 철거 및 숲길 조성
- 일 정
 - 2017. 1. ~ 3. : 도시계획시설(공공공지) 결정
 - 2017. 3. ~ 4. : 주민협의체 구성, 주민의견
 - 2017. 4. : 공사발주
 - 2017. 5. ~ 11. : 공사시행 및 준공
- 예 산 : 300,000천원(시비)

□ 세부 추진계획

- 녹지량 확충을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 주민 소통, 화합의 공간 제공 및 민원해소

□ 소요예산 : 총300,000천원(시 300,000)
