

제164회 영등포구의회

제2차 정례회

부과 Zero 청렴 UP 

교육·복지·사람 중심 새 영등포 

주요 업무 보고



푸른 도시 과

보고 순서


I. 일반 현황 1
II. 2011 주요업무 추진실적	.. 3
III. 2012 주요업무 추진계획	11
IV. 특수사업 23

I . 일반현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직(계약직 포함)						기 능 직				대체 인력
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	29		1	5	4	4	6		2	3	4	
현 원	30		1	5	6	6	2	1	3	6		
과부족	1				2	2	-4	1	1	3	-4	

2 조 직

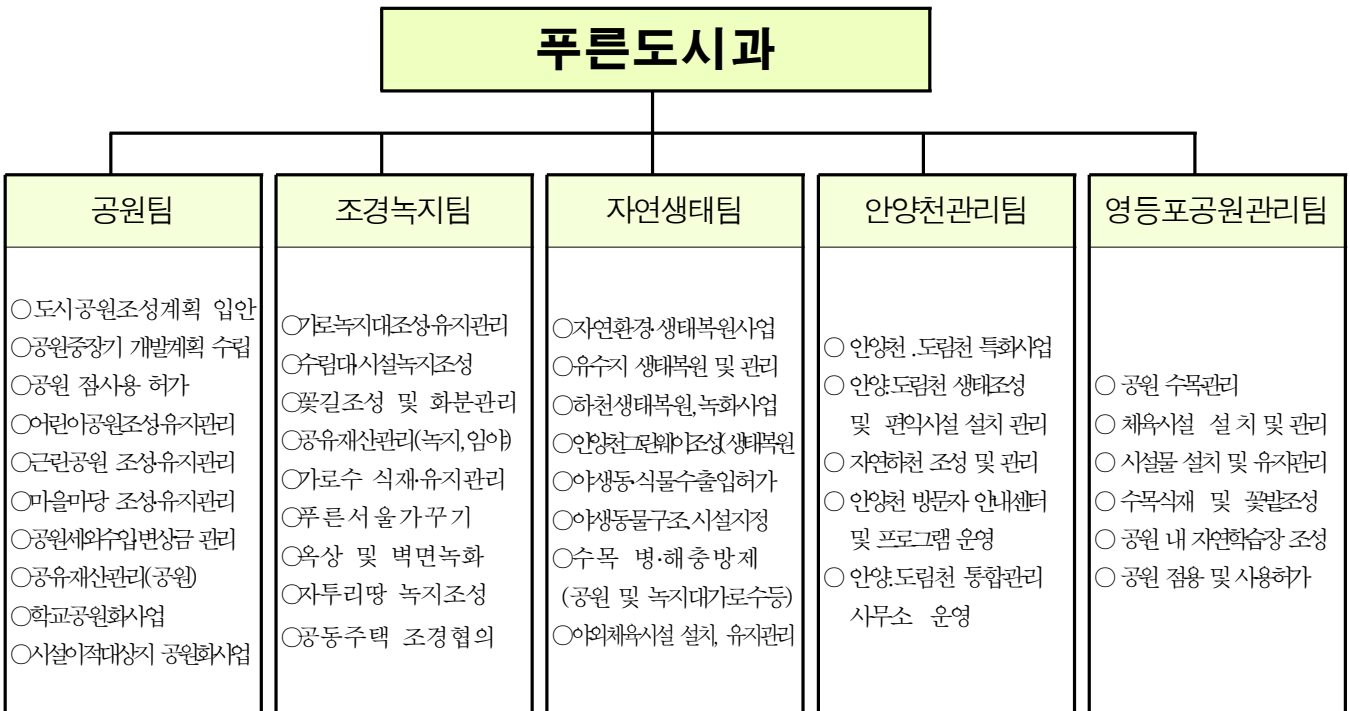

3

주요시설 및 장비

구 분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	34	10	6	4	19	5	29	143	54개 노선	2종	23개소
면 적 (㎡)	606,711	543,463	135,517	407,946	55,702	7,545	15,151	581,482	15,976주	2주	16종 171점

4

예산 집행현황

□ **주요 사업별**

(기준일 : 2011.10.31.현재)

단위 : 천원)

사업명	① 예산현액	②집행액		③ 이월예상액	불용예상액
		집행액 (10.31.기준)	집행예정액 (12.31.까지)		
공원녹지관리 수준향상	6,160,950	5,138,479	1,022,471	0	
아름다운 환경 및 편리한 시설만들기	2,550,366	2,063,477	486,889	0	
안양도림천 특화	376,364	304,575	71,789	0	
푸른공간 늘리기	2,100,000	12,770	-	2,087,230	
행정운영 경비	942,678	659,085	283,593	0	

※ “푸른공간 늘리기”의 이월예상액은 “양평동불량주택 보상비”의 이월예정임

II . 2011년 주요업무 추진실적

1 당산공원 관리사무소 및 공중화장실 신축

도시공원 내 노후된 기존 건축물을 철거하고 관리사무소 및 공중화장실을 신축하여 이용시민의 편의제공 및 효율적인 공원관리

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 당산동3가 385번지(당산근린공원)
- 추진기간 : 2010. 2. 1 ~ 2011. 9. 1
- 사업내역 : 연면적 258.50㎡(지하1층 101.63㎡, 지상1층 156.87㎡) 기존건축물 철거, 공원관리사무실·공중화장실 설치

□ 추진실적

- 2010. 02~09 : 실시설계 용역시행(4.1~9.17)
- 2010. 06~09 : 공원조성계획 변경(심의)
- 2010. 12. 07 : 공사발주
- 2010. 12. 29 : 공사계약
- 2011. 02. 07 : 공사착공
- 2011. 09. 01 : 공사준공(준공검사 09.14)
- 2011. 09. 14 : 준공검사
- 2011. 10. 01 : 공중화장실 개방

□ 예산액

- 총사업비 : 815,000천원(구비715,000, 시비100,000)
 - 2010년도 465,000천원(구비365,000, 시비100,000)
 - 2011년도 350,000천원(구비)

공장, 아파트 등이 밀집한 공원 소외지역에 이면도로를 폐쇄하고 아파트 담장을 철거하여 도시미관을 향상시킴과 동시에 아파트 내 녹지와 이면도로를 오픈스페이스 및 녹지공간으로 재조성하여 지역 주민들의 화합의 장으로 조성

□ 사업개요

- 위치 : 영등포구 문래동 5가 22-3번지 외 3필지
- 추진기간 : 2010. 1 ~ 2011. 7
- 사업내역
 - 면 적 : 1,982㎡(차도 150m×폭8m, 담장철거 391m×폭2m)
 - 수목식재 : 소나무 등 5종 9,978주, 초화류 6종 15,600본
 - 담장철거 391m, 도로폐쇄 150m, 거주자우선 주차구역폐쇄(20면)
 - 커뮤니티 가든(텃밭) 1개소(30㎡) 조성
 - 기 타 : 안내판 2개, 의자 14개, 블라드 10개, 공원등 7개소 등

□ 추진실적

- 2010. 01. 28 : 차없는 문화거리 조성사업 실시설계용역 발주
- 2010. 03. 02 : 교통규제심의를 위한 주민 설문조사 및 주민설명회
- 2010. 09. 28 : '11년 아파트열린숲길 조성사업 대상지 제출(서울시)
- 2011. 01. 21 : '11년 아파트 열린녹지 조성사업 추진계획 통보
- 2011. 01. 26 : 차없는 문화거리 현장조사 및 추진계획 수립
- 2011. 04. 19 : 공사발주 및 착공(2011.05.06)
- 2011. 07. 29 : 공사 준공

□ 예산액

- 총 공사비 : 460,000천원(국비200,000 / 구비260,000)

안양천, 한강, 샛강 등 기 조성된 하천의 산책로를 활용하여 구민 건강 걷기코스로 재조성하고, 산책로, 도로변 녹지 등을 연계하여 걷기 코스 발굴 및 테마가 있는 도심속 올레길 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도, 한강, 샛강, 안양천, 도림천 등
- 추진기간 : 2011. 1 ~ 2013. 12
- 사업내역(총24.9km)
 - 여의도 생태순환길 : 10.1km
 - 영등포 수변둘레길 : 14.8km(안양천,도림천8.2km, 한강6.6km)

□ 추진실적

- 2011. 01. 28 : 영등포올레길 추진계획 수립(푸른도시과-992)
- 2011. 02. 14 : 계약심사 (감사담당관-1558)
- 2011. 02. 15 : 영등포올레길 조성사업 기본설계 용역발주/계약
- 2011. 02. 19 : 영등포 올레길 조성사업 기본설계 용역 시행
(2011. 02. 19 ~ 06. 17)
- 2011. 05. 18 : 기본설계 용역 보고회 및 자문회의 개최
- 2011. 06. 08 : 기본설계 용역 준공
- 2011. 06. 17 : 준공검사

□ 예산액

- 설계용역비 : 35,000천원(구비)

□ 향후계획

- 2012. 01~12 : 영등포 올레길 조성사업 시행
(영등포 수변둘레길 8.2km)
- 2013. 01~12 : 영등포 올레길 조성사업 시행(16.7km)

공원 내 노후 된 어린이놀이시설 및 부대시설을 「어린이놀이시설 안전관리법」 의거, 안전 기준에 적합하고 창의력을 향상할 수 있는 놀이시설을 갖춘 어린이 놀이공간으로 정비하여 쾌적한 공원 환경 제공 및 공원 이용 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 동심어린이공원 외 15개소
 - 상반기 : 동심어린이공원 등 6개소,
 - 하반기 : 고추말어린이공원 등 9개소
- 추진기간 : 2011. 1 ~ 2011. 10
- 사업내역 : 어린이놀이시설 및 부대시설 정비 등

□ 추진실적

- 2011. 2. 19 ~ 3. 30 : 상반기 정비 용역 시행
(동심어린이공원 등 6개소)
- 2011. 4. 4 : 서울시 특별교부금(700백만원) 교부
- 2011. 4. 27 ~ 6. 15 : 상반기 정비공사 준공 및 안전검사시행
- 2011. 5. 23 ~ 7. 11 : 하반기 정비 용역 시행
(고추말 어린이공원 등 9개소)
- 2011. 8. 12 ~ 10. 10 : 하반기 정비 공사 준공 및 안전검사 시행

□ 예산액

- 총사업비 : 11,000,000천원
(구비 400,000/특별교부금 700,000)

□ 향후계획

- 2012. 1 이후 : 유지관리 및 어린이놀이시설 정기안전검사 실시

양평동2가 일대는 공원녹지가 전무하고 노후주택(판자촌) 밀집지대로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성하여 지역주민에게 쾌적한 녹지 환경을 제공코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동2가 41-5 외 31필지
- 추진기간 : 2009. 4 ~ 2012.12
- 사업내역 : 1,109.5m² / 보상 및 마을마당 조성
(구유지 : 28.6m², 사유지 : 287.3m², 사유지 : 793.6m²)

□ 추진실적

- 2009. 04.29 : 영등포구 투자사업 결정
- 2009. 09.07 : 도시계획시설(공공공지)결정 입안
- 2009.11.5 ~ 11.20 : 도시관리계획안 열람공고
- 2009.12.31 : 도시계획시설(공공공지) 결정 및 지적고시
- 2011.1 : 2011 본예산 확보(9천만원)
- 2011.04.04 : 특별교부금 확보(20억원)
- 2011.05.20 : 주민설명회 개최
- 2011.08.25 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획인가를 위한 열람공고
- 2011. 10. 6 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획 인가고시

□ 예산액

- 4,900,000천원(국·시·구비 4,900,000)

□ 향후계획

- 2011. 12 ~ 2012. 6 : 보상공고 및 보상업무 추진
- 2012. 7 ~ 2012. 12 : 마을마당 조성

방범용 CCTV 미 설치 공원에 CCTV를 설치하여 각종 범죄 및 시설물 파손을 사전 예방하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신길 근린공원 등 5개소
- 추진기간 : 2011. 8 ~ 11
- 사업내역 : 방범용 CCTV 8EA 설치 및 U-영등포 통합관제 시스템 연계

□ 추진실적

- 2011. 08.18 : 사업발주
- 2011. 09.19 : 사업착공
- 2011. 11.11 : 사업준공

□ 예산액 : 167,000천원(구비)

□ 향후계획

- 2012. 3 ~ 4 : 2012 공원 내 CCTV시스템 구축사업 실시설계
- 2012. 5 ~ 8 : 2012 공원 내 CCTV시스템 구축사업 시행

장기 미집행 도시계획시설(녹지)에 대해 연차적으로 보상 후 녹지 기능을 회복하여 장기민원 해소 및 주거환경 개선과 도시 경관 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 68-3 일대
- 추진기간 : 2007.11.17 ~ 2012.12.31
- 사업내역 : 7,912㎡(보상대상 : 토지 42필지, 지장물 25, 영업권 49)

□ 추진실적

- 보 상

구 분	총 보상대상	보상완료	미 보 상	실 적	비 고
토 지	42필지 (3,857㎡)	35필지 (3,427㎡)	7필지 (430㎡)	88%	
건물(지장물)	25동	25동	0	완료	
영업권	49건	49건	0	완료	

- 지장물 철거실적 : 25동 중 19동 철거

□ 사업예산

- 22,388,000천원(시비) (단위:백만원)

계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년이후
22,388	2,500	4,000	4,000	4,300	4,000	3,588

□ 향후 추진계획

- 보상완료건물 철거 : 2011. 11 ~ 12
- 미 보상 토지보상 : 2012. 1 ~ 2012. 12
- 잔여건물철거 및 녹지조성공사 : 2012. 6 ~ 12

한정된 토지와 높은 지가(地價)로 공원녹지의 추가 확보가 어려운 도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시 영등포조성에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 888번지 등 4개소
 - 대림동 604-169, 대신시장앞 교통섬, 대림빗물펌프장 앞 교통섬
- 추진기간 : 20011. 1 ~ 2011. 5
- 사업내역 : 파고라 및 휴게시설 설치, 수목식재, 기반시설 정비

□ 추진실적

- 2011. 02 : 실시설계용역 시행
- 2011. 03 : 계약심사 및 공사발주
- 2011. 04 : 공사 착공
- 2011. 05 : 공사 준공

□ 사업예산

- 총사업비 : 150,000천원(구비)

Ⅲ . 2012년 주요업무 추진계획

1 | **공원 내 친환경 화장실 설치사업**

공원 이용객 증가에 따라 화장실 수요가 급증하고 있어 도시공원내 공중화장실을 설치하여 편익제공 및 주민숙원사업을 해결하여 주민의 여가생활 증진 등 쾌적하고 아름다운 도시공원 유지관리

□ 사업개요

- 위 치 : 문래근린공원(문래동 3가 66) 등 3개소
 - 메낙골근린공원(신길동 4934-4)
 - 다사랑어린이공원(대림2동 703-6)
- 규 모 : 3개소(이동식 공중화장실 설치)
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 6월

□ 추진방향

- 도시공원내 공중화장실 설치로 공원을 이용하는 이용주민 편익증진
- 아름답고 쾌적한 공원 조성으로 주민숙원사업 해결 및 삶의 질 향상

□ 소요예산 : 262백만원(구비)

□ 향후계획

- 2012. 1 ~ 2 : 사업추진계획 수립
- 2012. 2 ~ 3 : 실시설계용역 시행
- 2012. 3 ~ 4 : 계약심사, 공사발주
- 2012. 4 ~ 6 : 공사착공 및 준공

어린이공원 내 노후 및 파손 편의시설(파고라, 벤치 등), 산책로, 포장 등을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공하여 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 다사랑어린이공원 외 1개소
- 기 간 : 2012. 1 ~ 2012. 10
- 규 모 : 어린이공원 2개소 (4,703㎡)
- 내 용 : 어린이공원 내 놀이시설 및 파고라, 벤치 등 정비

□ 추진계획

- 2012. 1 ~ 3 : 현황조사 및 실시설계
- 2012. 4 ~10 : 공사시행 및 준공

□ 예산액 : 201,500천원(구비)

□ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 공원 이용 활성화 도모
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

양평동2가 일대는 공원녹지가 전무하고 노후주택(판자촌) 밀집지대로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성하여 지역주민에게 쾌적한 녹지 환경을 제공코자함

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동 2가 41-5일대
- 기 간 : 2009. 4 ~ 2012. 12
- 규 모 : 1,109.5m²
 - 내 용 : 보상 및 마을마당 조성

□ 추진계획

- 2011. 12 ~ 2012. 6 : 보상공고 및 보상업무 추진
- 2012. 7 ~ 2012. 12 : 마을마당 조성

□ 소요예산 : 4,900,000천원

(국·시비 3,900,000천원, 구비 1,000,000천원)

□ 기대효과

- 공원·녹지가 부족한 불량주택(판자촌) 밀집지역에 주민들의 숙원 사업인 공원을 조성하여 시민의 여가 및 휴식 공간 제공
- 주거환경을 개선하여 주민들의 정서함양 및 삶의 질 향상에 기여
- 공원면적이 절대적으로 부족한 영등포에 공원을 조성함으로써 지역간 불균형 해소

4 | **공원 내 CCTV 구축**

방법용 CCTV 미설치 공원에 CCTV를 설치하여 각종범죄 및 시설물 파손을 사전 예방하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 문래근린공원 등 5개소
- 기 간 : 2012. 2 ~ 8
- 내 용 : CCTV 설치 및 U-영등포 통합관제 연계시스템 구축

□ 추진계획

- 2012. 2 : 공원 내 CCTV시스템 구축사업 추진계획 수립
- 2012. 3 ~ 4 : 공원 내 CCTV시스템 구축사업 실시계획
- 2012. 5 ~ 8 : 공원 내 CCTV시스템 구축사업 시행

□ 소요예산 : 150,000천원(구비)

□ 기대효과

- 각종 범죄 등을 사전에 예방하고 주민에게 심리적 안정감 제공
- 시설물 파손을 사전 예방하여 쾌적한 공원 환경 제공

5 | **공원시설물 정비**

파손된 공원시설물을 교체, 정비하여 안전사고를 예방하고 체육시설물을 확충하여 주민 체력증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 대 상 : 58개소(공원 29개소, 마을마당 29개소)
- 위 치 : 여의도동 56 외 57개소
- 기 간 : 2012. 2 ~ 11
- 내 용 : 노후시설물 교체 및 보수, 바닥 포장, 체력단련시설 설치 등

□ 추진계획

- 2012. 2 ~ 3 : 상반기 공원시설물 정비공사 실시계획용역 시행
- 2012. 4 ~ 6 : 상반기 공원시설물 정비공사 시행
- 2012. 7 ~ 8 : 하반기 공원시설물 정비공사 시행
- 2012. 9 ~ 11 : 하반기 공원시설물 정비공사 시행

□ 예산액 : 220,000천원(구비)

□ 기대효과

- 노후되고 파손되어 위험한 공원시설물을 정비하고 각종 안전사고 예방

신길동 68-3일대 도시계획시설 경부제3녹지를 조성하여 경부선 철도 소음·분진 및 노후 된 건축물로 인한 장기 민원을 해소하고 쾌적한 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 68-3일대(신길역 ~ 대방역 구간)
- 기 간 : 1. 1 ~ 12. 31
- 규 모 : 7,912m²
- 내 용 : 토지 보상, 지장물 철거, 녹지 조성 등
- 연차별 보상실적

계	연 도 별						2012	비고
	소계	2007	2008	2009	2010	2011		
22,388	18,800	2,500	4,000	4,000	4,300	4,000	3,588	

□ 추진계획


- 토지보상
 - 2012. 1 ~ 4월 : 7필지 430m²
- 실시설계용역 및 지장물 철거
 - 2012. 1 ~ 5월 : 실시설계용역
 - 2012. 4 ~ 5월 : 토지보상완료 잔여 건물 철거
- 녹지조성
 - 2012. 6 ~ 12월 : 녹지조성 공사 시행 및 완료

□ 소요예산 : 3,588,000천원(시비)

□ 기대효과

- 소음, 분진 감소로 인한 쾌적한 주거환경조성
- 노후 건물 해소 및 수목식재로 인한 가로경관 향상

□ 위치도 및 현황사진

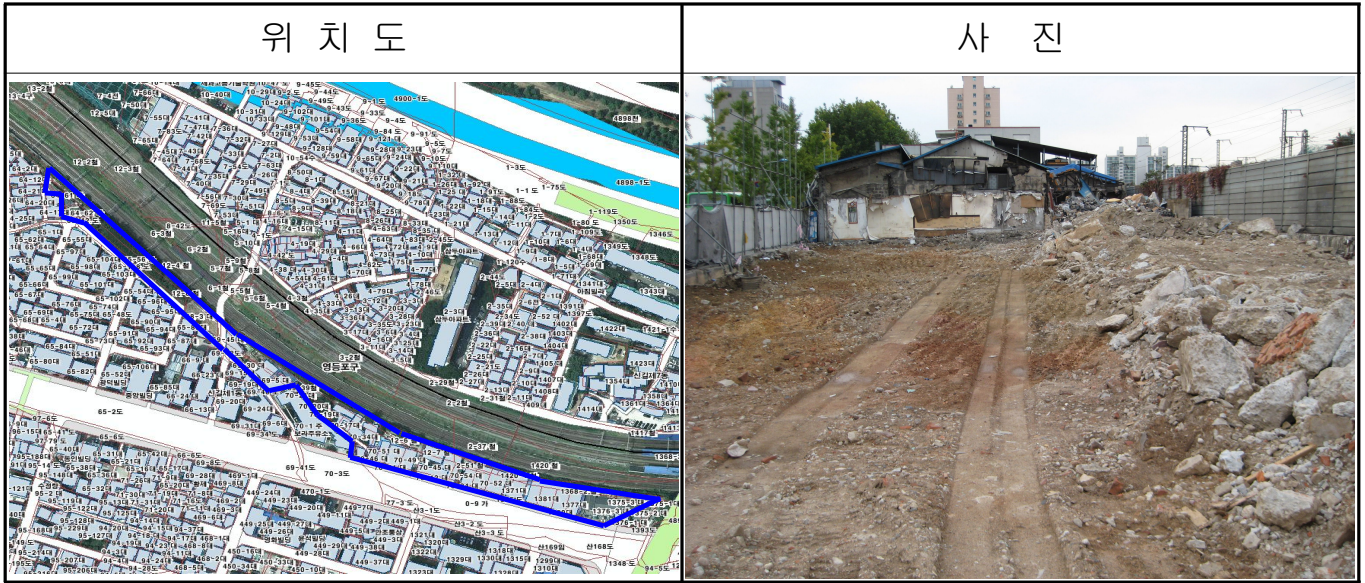

7 가로변 녹지량 확충사업

잡초가 자라고 나대지화 된 영등포로터리 주변 도로 사면 일대를 정비하여 가로경관을 향상함으로써 아름다운 영등포를 만들고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포동 영등포로터리 ~ 신길역 구간(영등포로 사면)
- 기 간 : 2011. 1. 1 ~ 12. 31
- 규 모 : 1,500m²
- 내 용 : 화관목, 초화류 식재 등

□ 추진계획

- 실시설계
 - 2012. 1 ~ 4월 : 실시설계용역 시행
- 공사시행
 - 2012. 4 ~ 12월 : 녹지량 확충공사 시행

□ 소요예산 : 350,000천원(시비)

□ 기대효과

- 차량 통행 및 보행시 심미적 효과 제고
- 화관목 및 야생초화류 식재로 인한 쾌적한 녹지환경 조성

관내 가로수 중 교통사고, 신설도로, 자연고사 등으로 가로수가 없는 지역, 가로수 식재 민원요청지에 가로수를 식재하여 녹지량을 확충하는 한편 쾌적한 가로경관을 조성코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동·서로 등 4개노선
- 기 간 : 2011. 1. 1 ~ 12. 31
- 규 모 : 은행나무 등 가로수 보식 100주
- 내 용 : 교통사고 및 고사 등으로 인한 가로수 공분 지역에 가로수 식재

□ 추진계획

- 2012. 1. : 가로수 보식 및 식재사업 추진계획 수립
- 2012. 2. : 실시설계용역 및 계약심사
- 2011. 3. ~ 6. : 공사시행

□ 소요예산 : 131,043천원(구비)

□ 기대효과

- 가로녹지량 확충 및 녹음제공 등 쾌적한 가로환경 제공

도시경관의 주요 요소인 가로수 하부공간에 선형의 띠녹지를 조성하여 쾌적한 보행환경 및 풍요롭고 아름다운 도시경관 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동로, 국회대로, 의사당대로, 당산로
- 기 간 : 1. 1 ~ 12. 31
- 규 모 : 띠녹지 조성 7,313m²
- 내 용 : 띠녹지 신설 조성(여의동로) 및 띠녹지 내 수목보식

□ 추진계획

- 2012. 1. : 가로수 생육환경 개선사업 추진계획 수립
- 2012. 2. : 실시설계용역 및 계약심사
- 2012. 3. ~ 6. : 공사시행

□ 소요예산 : 585,000천원(시비)

□ 기대효과

- 가로녹지량 확충 및 쾌적한 가로환경 제공

아파트 담장을 허문 후 단지 내 녹지를 개방하여 인근 주민에게 휴식처를 제공 및 가로 녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 쾌적한 환경을 조성하여 삶의 질 향상을 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동6가 11-1번지 유원아파트 외 1개소
- 기 간 : 1. 1 ~ 10. 31
- 규 모 : 담장철거 350m, 녹지조성 1,380m²
- 내 용 : 아파트 담장 철거후 녹지조성

□ 추진계획

- 2012. 1 ~ 2 : 사업추진계획 수립
- 2012. 3 ~ 4 : 실시설계용역 시행(주민설명회 등 주민의견수렴)
- 2012. 5 ~ 6 : 계약심사, 공사발주
- 2012. 7 ~ 10 : 공사착공 및 준공

□ 소요예산 : 220,000천원(시비50%, 구비50%)

□ 기대효과

- 녹지 확보가 어려운 도심생활권에 사유지를 활용한 준 공개녹지 확보
- 가로변 녹시율 증진과 걷고 싶은 보행환경 조성

도심권 녹지부족 지역으로 집중녹화가 필요한 공공기관 옥상에 옥상 공원화 사업을 추진하여 도심 녹화량 확충 및 대기질 개선 등 쾌적한 도심환경에 기여코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 422 (신길5동 주민센터)
- 기 간 : 1. 1 ~ 7. 31
- 규 모 : 옥상조경 300m²
- 내 용 : 수목식재 및 조경시설물 설치

□ 추진계획

- 2012. 1 ~ 2 : 사업추진계획 수립
- 2012. 3 ~ 4 : 구조안전진단 및 실시설계용역 시행
- 2012. 5 ~ 6 : 설계심의(시 조경과), 공사발주
- 2012. 7 ~ 10 : 공사착공 및 준공

□ 소요예산 : 105,000천원(시비50% 구비50%)

□ 기대효과

- 도심열섬화 완화 및 주민휴게쉼터 조성
- 소규모 생물서식공간 확보
- 냉난방 에너지 절약, 대기질 개선 등 환경개선에 기여

환삼덩굴, 쇠뜨기, 가시박 등 하천경관을 저해하는 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 제방사면을 다양한 화목류와 초종이 생육할 수 있도록 생태복원사업을 시행하여 사람과 자연이 어우러지는 생태경관 지역으로 조성코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안(목동교 ~ 양평교) 제방사면 / 1.0km
- 기 간 : 2012. 1 ~ 12
- 규 모 : 15,682m²(L=1,075m)
- 내 용 : 안양천 제방 사면 산책로 탄성포장 및 수크렁, 산조풀 등 식생매트 식재 등으로 생태하천으로 복원

□ 추진계획

- 2012. 1 : 현장조사, 사업추진계획 및 방침수립
- 2012. 2 ~ 6 : 기술용역타당성 심의 (기술심사담당관)
- 2012. 4 ~ 6 : 용역보고회, 주민설명회, 설계심의
- 2012. 5 ~ 6 : 계약심사 및 국토관리청 협의
- 2012. 7 ~ 12 : 공사착공 및 준공

□ 소요예산 : 2,700,000천원(시비) ※ 예산 미확정

□ 기대효과

- 하천제방 환경개선 및 녹지량 확충으로 계절별 꽃이 피는 하천 경관 조성
- 다양한 식생으로 하천생태계 보전 및 청소년들의 자연학습장 제공

체육활동 인구 증가에 대비하고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 마을 단위 야외 체육시설을 설치하여 구민건강 증진 및 체육인구 저변확대

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동 배드민턴장 외 7개소
- 기 간 : 2012. 1 ~ 7
- 규 모 : 7,000m²
- 내 용 : 배드민턴장 및 야외농구장 바닥 정비, 게이트볼장 주변 안전휀스 설치, 야외 운동기구 설치 및 보수 등

□ 추진계획

- 2012. 1 ~ 2 : 사업대상지 현장조사
- 2012. 2 ~ 4 : 실시설계 발주 및 용역시행
- 2012. 4 : 계약심사 및 공사발주
- 2012. 5 ~ 7 : 공사시행 및 완료

□ 소요예산 : 196,500천원(구비)

□ 기대효과

- 구민 건전한 여가선용 및 생활체육을 통한 삶의 질 향상
- 구민건강 증진 및 체육인구 저변 확대

IV. 특수사업

1 영등포 친환경 물놀이장 조성

도심 내 접근이 편리하고 다양한 계층이 이용 가능한 친수시설을 도입함으로써 도심 내 열섬화 현상 저감 등 가족과 함께 여가를 즐기고 사계절 활용이 가능한 물놀이장을 조성하여 주민들 간의 관심과 소통, 화합하는 커뮤니티 공동체 형성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 431-28번지 일대(꽃섬길 마을마당)
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 6월
- 사업규모 : 430m²
- 시설내역 : 물놀이시설, 벽천, 실개천, 분수 등 테마공간 조성

□ 추진방향

- 친환경 물놀이장으로 조성하여 가족친지 등 다양한 계층이 생활의 쉼터로 찾아 이용 할 수 있는 테마공원으로 조성
- 자연학습과 물놀이를 동시에 즐길 수 있는 수변공간으로 조성함으로써 친환경 관광명소로 개발

□ 소요예산 : 522백만원(구비)

- 2011년도 - 22,000천원(실시설계 용역)
- 2012년도 - 500,000천원

□ 향후계획

- 2012. 1 ~ 2 : 사업추진계획 수립
- 2012. 3 ~ 4 : 계약심사, 공사발주
- 2012. 4 ~ 6 : 공사착공 및 준공

차량통행이 적은 도로를 폐쇄 후 오픈스페이스 및 녹지공간으로 재조성하여 쾌적한 환경조성, 문화거리 및 소통의 공간 등 주민들의 화합의 장으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동 6가 45-1(도)외 1필지(45-2도)
(문래동 현대1,2차 아파트 사잇길-글마당길)
- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 6
- 사업규모 : 960m²(120m×8m)
- 시설내역 : 담장철거, 수목식재, 커뮤니티 가든(텃밭), 의자 등

□ 추진방향

- 생활권 녹지 확충으로 주거환경 개선 및 도시경관 향상
- 도심과 안양천을 연결하는 차없는 문화거리 조성 및 녹지축 연결

□ 소요예산 : 525백만원(구비)

- 2011년도 - 25,000천원(실시설계용역)
- 2012년도 - 500,000천원

□ 향후계획

- 2012. 1 ~ 2 : 사업추진계획 수립
- 2012. 3 ~ 4 : 계약심사, 공사발주
- 2012. 4 ~ 6 : 공사착공 및 준공
