

제189회 구의회 제1차 정례회

2015. 7. 1. ~ 7. 14.

청림 명동포구

2015년 주요업무 보고




푸른도시과

보 고 순 서

I . 일 반 현 황	••••	1
II . 주요업무 추진 실적	••••	3
III . 중점사업 추진 실적	••••	23

I. 일반 현황

1 조직

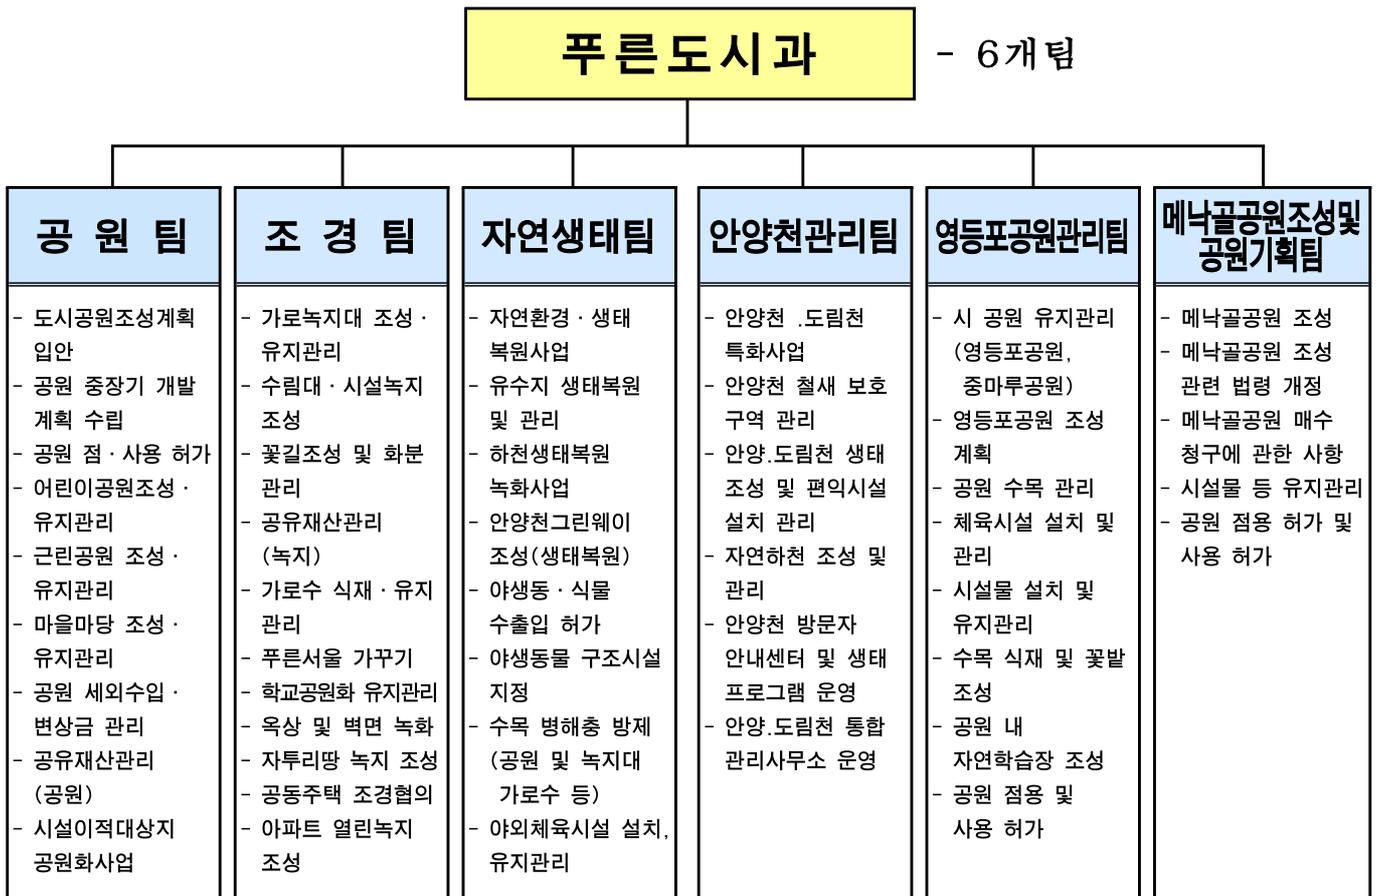

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	0	1	6	7	6	7	0	1	2	1	0	0	0	0
현 원	28	0	1	6	10	4	2	1	4	0	0	0	0	0	0
과부족	△3	0	0	0	3	△2	△5	1	3	△2	△1	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

□ 시설물

구분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이 소공원	어린이 소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	35	10	6	4	18	7	31	322	99개 노선	2종	68개소
면적 (㎡)	612,370	549,377	141,431	407,946	54,637	8,356	18,011	694,362	16,643주	2주	22종 755점

□ 장비

구분	차종	차명	차량등록번호	연식	용도
장비	화물차	마이티(2.5t)	80모5681	2005	가로수 관리 업무용
	화물차	마이티(2.5t)	80모5698	2005	녹지대 관리 업무용
	승합차	스타렉스	03모9050	2005	순찰 업무용
	소형화물차	포터2(1t)	86우4171	2011	안양천 관리 업무용
	소형화물차	포터2(1t)	80모7630	2005	공원 관리 업무용

4

예산현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	6,145,032	2,832,195	46.1
공원관리 수준향상	1,735,518	714,078	41.1
가로녹지 수준향상	2,682,956	1,332,587	49.7
자연생태 수준향상	658,729	221,451	33.6
안양·도림천 특화	394,148	136,914	34.7
인력운영비(푸른도시과)	419,558	286,690	68.3
기본경비(푸른도시과)	194,506	80,900	41.6
보전지출	29,182	29,175	99.9
내부거래지출	30,435	30,400	99.9

Ⅱ . 주요업무 추진 실적

연 번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	4
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충	6
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리	8
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	10
⑤	하천변 공원 이용 활성화	12
⑥	안양천 · 신길유수지 생태복원 및 녹화	14
⑦	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성	15
⑧	공원 내 위험요소 사전 정비	17
⑨	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비사업	19
⑩	도심 유휴공지 활용 및 생태환경 정비	21

노후된 공원 산책로 포장, 수경시설, 시설물 등을 개선하여 안전하고 쾌적한 공원 환경 제공으로 이용자 만족도 향상 및 주민들로부터 사랑받는 지역 명소로 자리매김하는데 기여

□ 사업개요

- 공원 보수정비(영등포공원 리모델링)
 - 위치 : 신길로 275(영등포본동) 영등포공원
 - 내용 : 수경시설 정비, 산책로, 농구장, 풋살경기장 포장 정비 등
- 공원 시설물 정비 및 공중화장실 개선
 - 위치 : 문래공원, 달맞이·덕천길마을마당, 원지·신우어린이공원
 - 내용 : 목재데크, 탄성포장, 비가림시설, 화장실 변기·세면대 교체 등
- 영일어린이공원 생태놀이터 조성
 - 위치 : 영등포본동 647-3 영일어린이공원
 - 내용 : 자연소재 놀이요소 도입 및 생태휴식공간 조성
- 공원 수경시설 유지관리
 - 위치 : 신길1동 메낙골공원 등 5개소(당산공원, 원지어린이공원, 꽃담소공원, 신길광장)
 - 내용 : 펌프, 밸브, 수위감지조절기 교체, 노즐 수리 등

□ 추진실적

- 공원 보수정비 - 영등포공원 리모델링(1,300,000천원-시비)
 - 2015.6.5 : 수경시설 정비공사 완료(6.5)
 - 2015.5.20 ~ 8.17 : 보수정비공사 시행
- 공원 시설물 정비 및 공중화장실 개선(230,000천원-구비)
 - 2015.6.11 : 공원 시설물 정비공사 완료
 - 2015.3.30 : 공중화장실 개선공사(원지·신우어린이공원) 완료
- 영일어린이공원 생태놀이터 조성(300,000천원-국비 30%, 구비 70%)
 - 국비 90,000천원 확보 완료
 - 국비, 구비 매칭사업으로 구비 추경 210,000천원 확보 후 추진 가능
- 공원 수경시설 유지관리(25,000천원-구비)
 - 2015.5.7 : 당산근린공원 등 5개소 수경시설 정비

□ **향후계획**

- 공원 보수정비 - 영등포공원 리모델링
 - 2015.8.17 : 보수정비공사 완료
- 영일어린이공원 생태놀이터 조성
 - 2015. 9~11월 : 구비 추경 210,000천원 확보 후 추진

□ **기대효과**

- 안전하고 쾌적한 공원 환경 제공으로 이용자 만족도 향상
- 자연친화적 환경 제공으로 어린이 정서 함양 및 삶의 질 향상

□ **소요예산**

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,855,000 (국비 90,000, 시비 1,300,000, 구비 465,000)	546,338 (시비 334,189, 구비 212,149)	29.5

□ **현황사진(공원시설물 정비공사)**



문래공원 체조공간 바닥 정비 전

문래공원 체조공간 바닥 정비 후

관내 학교, 아파트, 도로변 등 녹지가 부족한 생활권을 보다 아름답고 쾌적하도록 테마가 있는 다양한 녹색 공간으로 조성함으로써 도시경관 향상

□ 사업개요

- 에코스쿨 조성 및 유지관리 사업
 - 위치 : 신길4동 우신초교 등 4개교(여의도 윤중초, 대림2동 대동초, 대림1동 신대림초)
 - 내용 : 학교 내 수목, 초화류 식재, 휴게시설 설치 등
- 아파트 열린 녹지 조성사업
 - 위치 : 영등포본동 푸르지오 아파트
 - 내용 : 아파트 담장 철거 및 녹지 조성
- 도시구조물 벽면녹화사업
 - 위치 : 문래동5가 50 도림천변 신도림 고가 옹벽 등(문래동)
 - 내용 : 식재기반 조성 및 벽면 녹화

□ 추진실적

- 에코스쿨 조성사업(400,000천원-시비)
 - 2015.5.13 ~ 7.8 : 공사 시행(공정률 30%)
- 열린학교(학교공원) 유지관리 사업(10,000천원-구비)
 - 2015.2.2 ~ 2.16 : 사업 완료
- 아파트 열린 녹지 조성사업(200,000천원-시비 100백만원, 구비 100백만원)
 - 2015. 1~5월 : 주민설명회 실시 및 사업계획안 협의
 - ※ 당초 시비 150백만원, 구비 100백만원 확보(구비 50백만원 추정 확보 어려워 200백만원으로 조정 시행)
- 도시구조물 벽면녹화사업(59,000천원-시비, 당초 30백만원에서 29백만원 추가배정)
 - 2015.5.14 ~ 6.10 : 사업 완료

□ 향후계획

- 2015. 7월 : 에코스쿨 조성사업 완료
- 2015. 12월 : 아파트 열린녹지 조성사업 완료

□ 기대효과

- 생활권 내 다양한 녹화사업으로 도시경관 향상 및 녹지량 확충

□ **소요예산**

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
669,000 (시비 559,000, 구비 110,000)	66,150 (시비 58,112, 구비 8,038)	9.9

□ **위치도 및 현황사진(에코스쿨 조성사업)**



위 치 도



현황사진(신길4동 우신초교)

우리구 대표 봄꽃 축제 명소인 여의동서로 등 관내 주요 가로수에 대한 생육환경개선사업을 통해 가로수의 건전한 생육을 돕고, 보다 아름답고 쾌적한 가로경관을 조성하여 품격 있는 가로경관을 제공

□ 사업개요

- 여의도 가로수 보호관 정비사업
 - 위치 : 여의동서로, 의사당대로(여의동)
 - 내용 : 노후 보호관 교체 정비, 뿌리융기지 정비 등
- 가로수 식재 및 생육환경 개선사업
 - 위치 : 선유로(양평1동), 선유동1로(당산1동), 도림로63길(신길5동) 등
 - 내용 : 떠녹지 조성 150m, 가로수 식재 22주 등

□ 추진실적

- 여의도 가로수 보호관 정비사업(400,000천원-시비)
 - 2015.5.20 ~ 7.18 : 공사 시행(공정률 20%)
- 가로수 보식 및 식재사업(20,000천원-구비)
 - 2015.2.27 ~ 3.26 : 사업 완료
- 2015년 가로수 생육환경 개선사업(110,000천원-시비)
 - 2015.4.20 ~ 6.3 : 사업 완료

□ 향후계획

- 여의도 가로수 보호관 정비사업
 - 2015. 7월 : 공사 완료

□ 기대효과

- 보행자 편의를 위한 보도 및 보호관 정비로 보행환경 개선
- 보도 위 떠녹지 조성으로 쾌적한 보행환경 제공
- 가로수 메워심기로 일관되고 통일된 가로경관 연출

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
530,000 (시비 510,000, 구비 20,000)	124,368 (시비 108,041, 구비 16,327)	23.5

□ 현황사진(2015년 가로수 생육환경 개선사업)



공사 전



공사 후

도로 주변 유희녹지에 아름다운 꽃길 및 녹지 조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하고 시민정서 함양 및 사계절 볼거리 제공을 통한 명품도시 영등포 이미지 향상

□ 사업개요

- 가로변 녹지량 확충사업
 - 위 치 : 여의대로 중앙분리 녹지대 등 2개소
 - 내 용 : 녹지대 수목 식재, 다양한 꽃이 피는 야생초화류 식재 등
- 사계절 꽃길 조성사업
 - 위 치 : 여의도 국회의사당 주변 및 대림역 8번 출구 등
 - 내 용 : 화단 꽃묘 식재, 자투리땅 꽃·나무 식재 등
- 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비
 - 위 치 : 관내 녹지대 및 수경시설 6개소
 - 내 용 : 노후 휴게(수경)시설물 정비, 녹지대 수목 보식 등

□ 추진실적

- 가로변 녹지량 확충사업(300,000천원-시비)
 - 2015.5.8 ~ 7.8 : 공사 시행(공정률 50%)
- 사계절 꽃길 조성사업(56,000천원-시비 36백만원, 구비 20백만원)
 - ※ 시비 40백만원에서 36백만원으로 조정됨
 - 2015.3.16 ~ 6.1 : 봄철, 여름철 꽃묘 식재 완료
- 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비(20,000천원-구비)
 - 2015.3.23 ~ 3.31 : 1차 완료(13백만원 집행)

□ 향후계획

- 2015. 7월 : 가로변 녹지량 확충사업 공사 완료
- 2015. 10월 : 사계절 꽃길 조성사업(가을철 꽃묘 식재)
- 2015. 11월 : 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비 공사 완료

□ 기대효과

- 아름다운 가로환경 조성 및 녹지량 확충 등

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
376,000 (시비 336,000, 구비 40,000)	169,809 (시비 136,780, 구비 33,029)	45.2

□ 현황사진(사계절 꽃길 조성사업)



조성 전



조성 후

왕벚나무 보식 및 수세회복을 시행하고 다양한 생태체험 프로그램 등을 운영하여 하천변 경관 향상 및 주민이용 활성화

□ 사업개요

- 여의도 봄꽃축제 왕벚나무 수세회복
 - 위치 : 여의동서로
 - 내용 : 토양개량, 영양공급, 외과수술, 가로수 메워심기 등
- 셋강생태공원 생태프로그램 운영
 - 위치 : 셋강생태공원
 - 내용 : 생태체험 프로그램 확대 운영, 소규모 문화행사 운영
- 하천변 수목 식재
 - 위치 : 안양천 제방(목동교~양평교)
 - 내용 : 왕벚나무 보식

□ 추진실적

- 여의동서로 왕벚나무 수세회복(400,000천원-시비)
 - 2015.4.20 ~ 6.2 : 왕벚나무 130주 보식 완료
 - 2015.4.24 ~ 9.20 : 수세회복 공사 시행(공정률 20%)
- 셋강생태공원 생태프로그램 운영(10,000천원-구비)
 - 2015.4.1 ~ 11.30 : 프로그램 26회 운영(추진율 25%)
- 하천변 수목 식재(10,000천원-구비)
 - 2015.3.13 ~ 3.16 : 왕벚나무 19주 보식 완료

□ 향후계획

- 여의동서로 왕벚나무 수세회복 - 수목 보호(시비)
 - 2015. 9월 : 사업 완료
- 셋강생태공원 생태프로그램 운영(구비)
 - 2015. 11월 : 사업 완료

□ 기대효과

- 봄철 여의도 왕벚나무의 생육여건을 조성하여 아름답고 풍성한 봄꽃축제장 제공
- 셋강을 활용하여 다양한 친환경 생태체험 프로그램 운영

□ **소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
420,000 (시비 400,000, 구비 20,000)	98,288 (시비 88,965, 구비 9,323)	23.4

□ **현황사진(여의동서로 왕벚나무 수세회복 - 조경 식재)**



공사 전



공사 후

유수지와 안양천 제방사면의 위해식물을 제거하고 다양한 초화류 및 수목 식재 등을 통하여 자연생태복원, 하천경관 향상 및 주민 여가공간 조성

□ 사업개요

- 안양천 하천복원 및 녹화
 - 위치 : 안양천 우안 제방사면(성산대교 남단~양화교)
 - 내용 : 위해식물 제거 및 식생기반 조성, 초화류 식재 등
- 신길유수지 생태복원
 - 위치 : 신길1동 53 신길유수지
 - 내용 : 토양 치환, 수목·초화류 식재 등

□ 추진실적

- 안양천 하천복원 및 녹화(295,000천원-시비)
 - 2015.5.13 ~ 10.31 : 공사 시행(공정률 10%)
- 신길유수지 생태복원(100,000천원-시비)
 - 2015.4.30 ~ 7.10 : 공사 시행(공정률 70%)

□ 향후계획

- 안양천 하천복원 및 녹화(시비)
 - 2015. 11월 : 공사 완료
- 신길유수지 생태복원(시비)
 - 2015. 7월 : 공사 완료

□ 기대효과

- 자연생태복원 및 볼거리 제공으로 하천경관 향상
- 유수지를 생태복원하여 주민 여가활동 증진 및 자연학습장으로 활용

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
395,000 (시비)	21,850 (시비)	5.5

관내 가로수 및 녹지대, 공원 등에 생육중인 위험수목에 대한 제거 및 수형 조절 가지치기를 통해 위험요소를 사전 정비하여 쾌적하고 안전한 가로녹지 환경 조성

□ 사업개요

- 가로수, 녹지대 위험수목 가지치기 사업
 - 위치 : 문래로 등 가로수 식재 노선, 관내 녹지대 등
 - 내용 : 가로수 가지치기 및 수형조절, 위험수목 정비 등
- 배전선로 하부 가로수 가지치기
 - 위치 : 당산로 등 배전선로 설치 가로수 50여개 노선
 - 내용 : 배전선로 근접 가로수 가지치기 수형조절
- 공원 내 위험수목 정비사업
 - 위치 : 관내 근린, 어린이공원 등
 - 내용 : 공원 내 위험수목 제거 및 가지치기

□ 추진실적

- 가로수 가지치기(연간단가) 사업(50,000천원-구비)
 - 2015.1.28 ~ 12.31 : 공사 시행(공정률 20%)
- 녹지대 위험수목(연간단가) 정비사업(40,000천원-구비)
 - 2015.1.28 ~ 11.30 : 공사 시행(공정률 70%)
- 배전선로 하부 가로수 가지치기(410,000천원-시비/한전)
 - 2015.2.4 ~ 3.25 : 사업 완료
- 공원 내 위험수목 정비사업(40,000천원-구비)
 - 2015.3.12 ~ 4.2 : 1차 사업 완료(공정률 50%)

□ 향후계획

- 가로수, 녹지대 수목 가지치기 사업 추진
 - 2015.12.31 : 사업 추진
- 공원 내 위험수목 정비사업
 - 2015. 6~8월 : 2차 사업 추진

□ 기대효과

- 재해 위험수목 사전정비로 안전한 생활환경 구축

□ **소요예산**

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
540,000 (시비 61,500, 구비 130,000, 한전 348,500)	423,213 (시비 57,691, 구비 38,610, 한전 326,912)	78.4

□ **현황사진(배전선로 근접 가로수 가지치기)**



공사 전



공사 후

공원 내 CCTV시스템을 구축하고 노후 공원등 및 전기시설물을 정비하여 안전하고 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

- 공원 내 CCTV 시스템 구축(3개소, 200만 화소)
 - 위치 : 신흥역소공원(신길6동), 선유봉마을마당(양평2동), 위브(영등포본동)마을마당
 - 내용 : 노약자, 여성들이 안심하고 이용할 수 있는 공원 제공
 - ※ 2011년 이전(40만 화소), 2012~2013년 상반기(130만 화소)
- 공원등 개선
 - 위치 : 신우어린이공원, 동심어린이공원(대림3동)
 - 내용 : 노후 공원등 15본 정비, 신규 설치 1본
- 전기시설물 유지관리
 - 위치 : 관내 공원, 마을마당, 녹지대 등
 - 내용 : 공원등, 공원 수경시설 등 다양한 전기시설에 대한 연중 점검, 정비로 상시 전기시설 안전 유지

□ 추진실적

- 공원 내 CCTV 시스템 구축(45,000천원-시비)
 - 2015.6.12 ~ 10.31 : 행정정보공개(공정률 1%)
- 공원등 개선(60,000천원-시비)
 - 2015.6.10 ~ 8.30 : 빗공해 심의완료(공정률 1%)
- 전기시설물 유지관리(연간단가) (27,000천원-구비)
 - 2015.1.29 ~ 12.31 : 공사 시행중(공정률 55%)
- 공원 내 CCTV 시스템 구축
 - 2015.6.12 : 공사 추진(홍보전산과 발주)

□ 향후계획

- 공원등 개선
 - 2015. 6~7월 : 계약심사 후 공사발주
- 전기시설물 유지관리
 - 연중 실시

기대효과

- CCTV 구축으로 안심하고 이용할 수 있는 공원 환경 제공
- 노후 공원등을 교체하여 쾌적한 공원 환경 제공
- 공원등 및 공원 내 전기설비 연중 점검·정비로 전기설비 안전관리

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
132,000 (시비 105,000, 구비 27,000)	0	0

현황 사진(공원내 CCTV 시스템 구축)



CCTV 설치 전



CCTV 설치 후

9 주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비사업 공원팀 · 자연생태팀

공원 및 녹지대 등의 노후 시설을 정비하고 주민의 체력증진을 위한 다양한 운동시설을 설치하여 주민 생활 편의 증진

□ 사업개요

- 어린이공원 정비
 - 위치 : 도림동 고추말, 여의동 자유, 대림3동 대림어린이공원
 - 내용 : 경사로 개선, 놀이시설 및 게이트볼장 정비
- 신길근린공원 바닥 정비
 - 위치 : 도림로80길 6(신길5동) 신길근린공원
 - 내용 : 배드민턴장, 농구장 우레탄 교체, 산책로, 우배수로 정비 등
- 마을단위 야외체육시설 설치
 - 위치 : 도림동 배드민턴장 등 7개소
 - 내용 : 장애우와 함께 이용할 수 있는 운동기구 설치

□ 추진실적

- 어린이공원 정비(249,000천원-시비 150백만원, 구비 99백만원)
 - 자유, 대림 완료('15.5.24), 고추말('15.7.30 완료 예정)
- 신길근린공원 바닥 정비(190,000천원-시비 주민참여예산)
 - 조달청 우레탄 제품 KS규정 개정으로 내구성이 우수하고 하자가 적은 단일우레탄 시공을 위하여 발주 연기
- 마을단위 야외체육시설 설치(90,000천원-시비 40백만원, 구비 50백만원)
 - 4.20~4.24 : 대림2동 구로디지털단지역 야외체육시설 6대 설치 완료
 - 4.24~5.21 : 도림동 배드민턴장 라인 교체 완료
 - 3.31~6.26 : 영일어린이공원, 메낙골공원 체육시설 12대(장애우용 6대 포함) 설치(공정률 70%)

□ **향후계획**

- 어린이공원 정비
 - 2015. 7월 : 정비공사 완료
- 신길근린공원 바닥 정비
 - 2015. 7~10월 : 공사 시행 및 준공
- 마을단위 야외체육시설 설치(신길4동 4934-10 등 3개소)
 - 2015. 6~10월 : 공사 시행 및 준공

□ **기대효과**

- 안심하고 이용할 수 있는 어린이공원 환경 조성
- 장애인 배려를 통한 소통·화합하는 복지 실현

□ **소요예산**

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
529,000 (시비 380,000, 구비 149,000)	117,334 (시비 40,062, 구비 77,272)	22.2

□ **현황사진(공원시설물 정비공사)**



10 도심 유희공지 활용 및 생태환경 정비 조경팀 · 자연생태팀

주민참여예산으로 도심 유희공지를 활용하여 녹화 및 이용함으로써 녹색 환경을 조성하고, 녹지량을 늘려 쾌적한 생활환경 및 주민 볼거리 제공

□ 사업개요

- 도림천 생태복원
 - 위치 : 도림동 도림천(신정교~대림유수지 앞)
 - 내용 : 산책로변 그늘목 식재, 식재기반 조성, 초화류, 수목 식재 등
- 골목길 가꾸기 등 생활주변 자투리땅 녹화
 - 위치 : 영등포본동 넓은마당 등 5개소
 - 내용 : 주민참여 골목길 녹화, 자투리땅 녹화 등
- 양평유수지 농촌 체험학습장 조성
 - 위치 : 양평1동 양평유수지
 - 내용 : 황소·초가집 등 조형물 설치, 조롱박터널 설치 등

□ 추진실적

- 도림천 생태복원(250백만원-시비)
 - 2015. 1월 ~ 5.18 : 설계용역 시행, 공사발주
- 주민참여 골목길 가꾸기(30백만원-시비, 당초 50백만원에서 30백만원으로 조정)
 - 2015. 3~5월 : 주민제안 접수 및 대상지 선정
- 생활주변 자투리땅 녹화(48백만원-시비, 43백만원-구비)
 - 2015.5.4 ~ 5.28 : 사업완료(시비, 여의도 서울교 교차로 녹지대)
 - 2015.4.30 : 공사착공(구비, 넓은마당)
- 양평유수지 농촌 체험학습장 조성(36백만원-구비)
 - 2015.4.24 ~ 7.30 : 공사 시행(공정률 85%)

□ 향후계획

- 도림천 생태복원(시비)
 - 2015. 9~10월 : 공사시행 및 완료
- 생활주변 자투리땅 녹화(구비)
 - 2015. 7월 : 공사 완료
- 양평유수지 농촌 체험학습장 조성(구비)
 - 2015. 8월 : 공사 완료

기대효과

- 유휴공지 활용을 통한 토지이용률 향상, 주민참여 녹지량 확충

소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
407,000 (시비 328,000, 구비 79,000)	87,482 (시비 61,400, 구비 26,082)	21.5

현황사진(양평유수지 농촌 체험학습장 조성)



공사 전



공사 후

Ⅲ . 중점사업 추진 실적

1 가로정원 조성

조경팀

복합 업무지구로 유동인구가 많은 국회의사당역(9호선) 주변에 꽃과 나무, 사람이 어우러진 특색 있는 가로정원을 조성하여 쉼터 및 만남의 장소로 제공하고, 서로 소통할 수 있는 정원같은 공간을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 9호선 국회의사당역 2, 5번 출입구 주변, 버스정류소 주변(여의동)
- 규 모 : 1,000㎡(길이 50m, 폭 20m)
- 내 용
 - 휴게데크 2개소, 등 의자 15조 설치로 휴식과 만남의 장소 조성
 - 수 목 : 왕벚나무 등 4종 43주, 남천 등 15종 6,542주
 - 초화류 : 꽃잔디 등 15종 20,590본

□ 추진실적

- 2015.2.4 ~ 3.20 : 실시설계용역 시행
- 2015.4.10 ~ 5.24 : 공사 시행 및 사업 완료

□ 향후계획

- 2015. 6월 ~ : 수목, 초화류 및 편의시설 유지관리 등

□ 기대효과


- 통행량이 많은 장소에 가로변 쉼터 및 만남의 장소 제공
- 다양한 꽃과 나무 식재로 볼거리 제공 및 쾌적한 환경 제공

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
200,000 (시비)	189,641 (시비)	94.8

□ 현황사진(가로정원 조성사업)

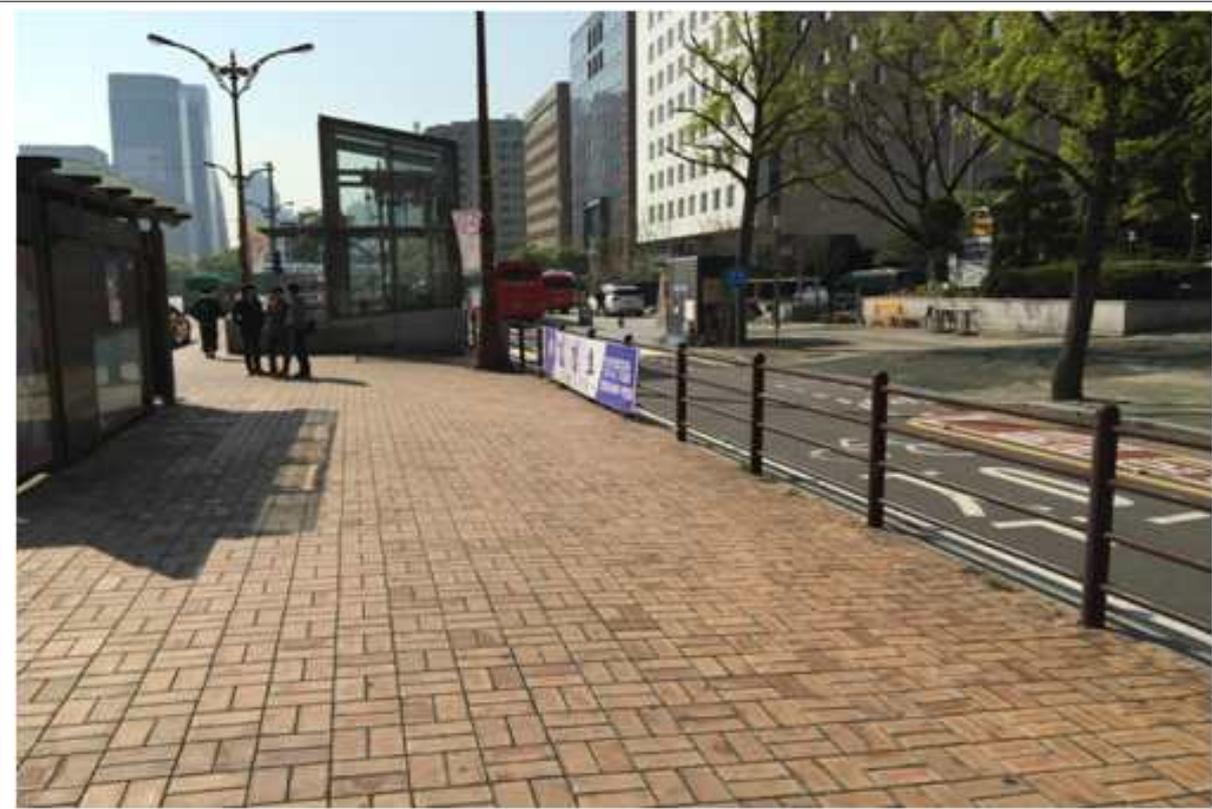

공사 전



공사 후

차량 통행이 적은 이면도로를 폐쇄하고 숲길 및 주민 쉼터를 조성하여 지역주민의 소통과 휴식을 위한 열린 공간으로 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 도신로 68 신길우성1차아파트 앞 가마산로49길(신길3동)
- 규 모 : 4,200㎡(길이 200m, 폭 21m)
- 내 용
 - 이면도로 폐쇄, 산책로 포장, 수목, 초화류 식재
 - 정자 3동, 의자 등 휴게시설, 벽천 1개소, 운동기구 10개소 등 설치

□ 추진실적

- 2014.3.6 ~ 11.24 : 실시설계용역 시행
- 2014.10.17 : 주민설명회 실시
- 2014.12.12 ~ 2015.6.26 : 공사 시행(공정률 90%)

□ 향후계획

- 2015. 7월 ~ : 준공 및 식재 수목·초화류 및 편의시설 유지관리 등

□ 기대효과


- 소통과 휴식이 가능한 열린 녹지 공간 제공으로 지역주민 삶의 질 향상
- 다양한 꽃과 나무 식재로 볼거리 제공 및 쾌적한 환경 제공

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,000,000 (시비 500,000, 구비 500,000)	356,670 (시비 178,335, 구비 178,335)	35.7

□ 현황사진(차 없는 거리 조성)

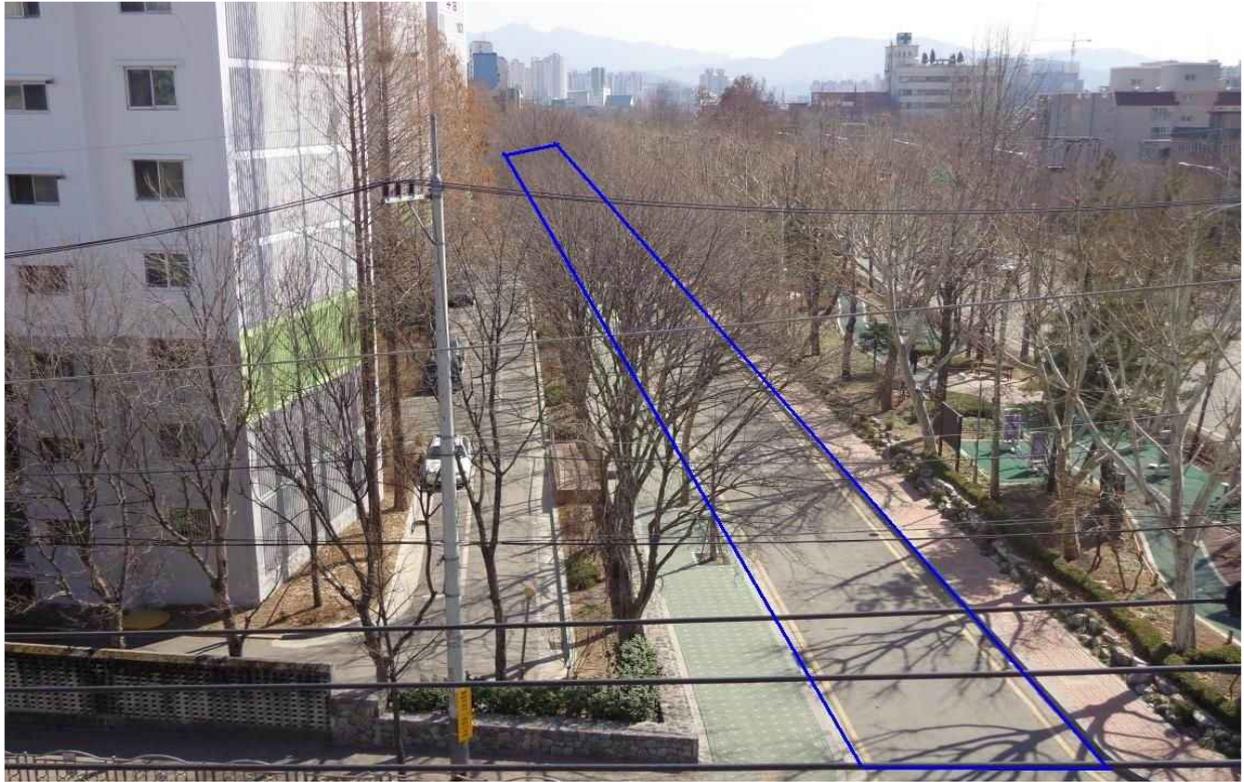

조성 전



조성 후(조감도)
