

主要業務報告



2003.11

公園綠地課

報告順序

I. 一 般 現 況


II. 2003 主要業務實績
(2003.10.31기준)

III. 2004 主要業務計劃

IV. 特 殊 施 策

1. 一般現況

1. 公園綠地課職制

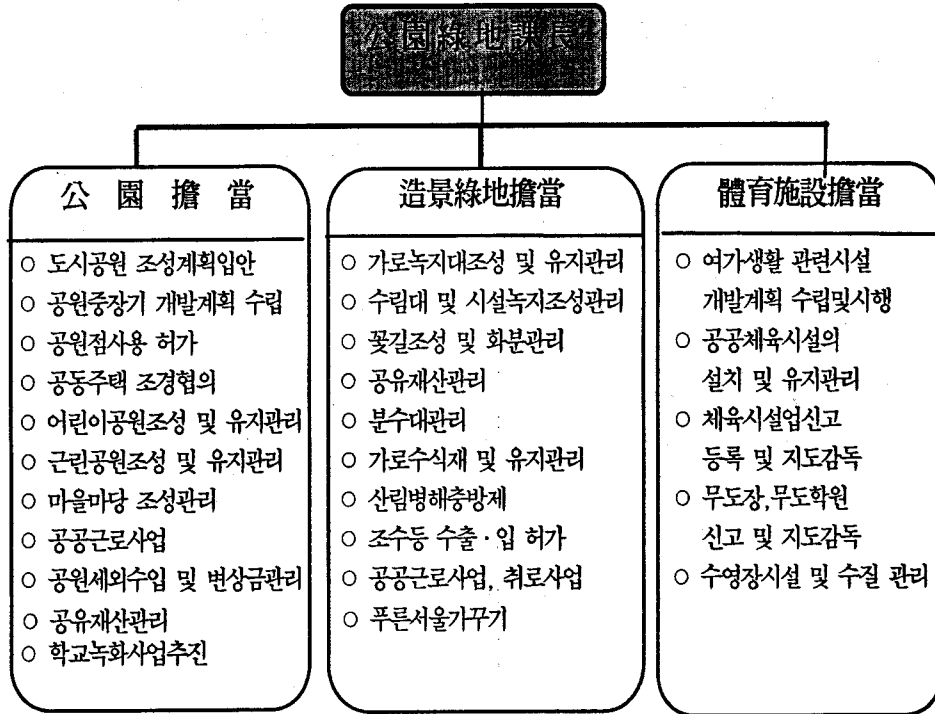

2. 職員現況

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	고용직	비고
정원	25	1	3	5	5	3	8	0	
현원	24	1	3	6	5	2	7	0	
과부족	-1	-	-	+1	0	-1	-1	-	

3. 施設現況

□ 公 園

구분		소 계	면적 (㎡)	비고
근린공원	소 계	11	559,961.9	
	시 설	11	559,961.9	문래, 자매, 신길, 당산, 양희폭포, 대림운동장공원, 메나골공원, 영등포, 선유도공원, 중마루, 여의도
어린이공원	소 계	18	54,105.6	
	시 설	17	53,041.1	서강, 중앙, 평화, 자유, 강마을, 양남, 산성, 다사랑, 원지, 동십, 두압, 신우, 대림, 고추말, 신일, 양평, 영일공원
	미시설	1	1,064.5	당육

□ 마을마당

구분	소재지	면적 (㎡)	시정일	비고
여 의 동 마을마당	여의동 14-1	471	1998. 5.25	
당산2동 마을마당	당산동 121-101	747	1998. 5.29	
양평2동 마을마당	양평동4가 287-6	360	1998.11.14	
신 길 광 장 공 원	신길5동 431-1	1,550	1999.11.1	
신길2동 마을마당	신길2동 159-2	293	2000.12.29	
신길3동 마을마당	신길3동 296-65	331	2001. 5. 7	
도림1동 마을마당	도림1동 136-47	125	2001.10.22	
신길6동 마을마당	신길6동 3742-6	284	2002. 5. 5	
신길6동 마을마당	신길6동 3203-2	184	2002. 5.16	
도림2동 마을마당	도림2동 182-4	100	2002. 6.16	
신길2동 마을마당	신길2동 41-3	95	2003. 4.25	
신길6동 마을마당	신길6동 1581-13	158	2003. 4.25	
신길1동 마을마당	신길1동 89-137	475	2003. 6.10	
신길3동 마을마당	신길3동 268-22	453	2003. 6.10	

□ 街路樹및綠地帶

가로수	56개노선	15,599	○총13종15,599주 - 은행나무5,520, 버즘나무5,731, 버드나무167, 밤나무1,035, 단풍나무121, 느티나무1,903, 은단풍729, 기타(포플러, 회화, 침엽수 등) 393
녹지대	79개소 (511,337㎡)	1,612,660	○느티나무 외 30종, 위령탑1개소, 분수대2개소, 파고라 등 11종 440점

□ 指定保護樹

지번 번호	수종	수량	수목현황				위치	소유자	관리자
			수령	수고	둘레	수관폭			
서19-1	은행나무	1주	530년	20.5m	5.4m	12.8m	당산동6가10	시	당산2동장
서19-2	등근잎 느티나무	1주	100년	15m	2.7m	23.3m	양평동4가84	양평동 교회	양평2동장

□ 水景施設

시설명(위치)	시설개요	가동시간
양화폭포 (양화동153-8외1필지)	○인조바위 : 면적 1,620㎡ ○폭포 : 6개소 ○모타 : 9대 (50HP5대, 30HP1대, 20HP1대, 10HP1대, 1HP1대) ○시설일자 : '79. 9. 15. ○휴게소(관폭정) : '80.6.30 준공	○기간 : 4. 1 ~ 10. 31 ○시간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00
당산공원 분수대 (당산동3가 385)	○분수조면적 : 201㎡ ○모타 : 1대(10HP) ○시설일자 : '77.7.17.	○기간 : 4. 1 ~ 10. 31 ○시간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00
여의나루역 벽천 (여의도동 8번지)	○분수조면적 : 90㎡ ○조형벽천1조, 유리벽천2조 ○모타 : 8대 (0.5HP2대, 2HP4대, 4HP1대, 7.5HP1대) ○시설일자 : 2001.12.20	○기간 : 4. 1 ~ 10. 31 ○시간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00
노들길 분수대 (당산2동삼성아파트)	○분수조면적 : 70㎡ ○모타 : 5대 (5HP3대, 2HP2대) ○시설일자 : 2001.11.30	○기간 : 4. 1 ~ 10. 31 ○시간 : 1일 3회 가동 - 08:00 ~ 09:00 - 12:00 ~ 14:00 - 16:00 ~ 17:00

□ 體育施設

합계 : 14개소 16종	67,572	154	73	6	4	10	5	4	7	37	81	9	9	8	10	9	18	6	12
대림운동장	16,498	20	13	1	1	2	1	3	1	4	7	1	2	1	1	1			
양평동체력단련장	1,628	23	5			2				3	18	2	1	3	1	2	5		4
대방천체력단련장	4,243	23									23	2	1	2	6	2	4	2	4
안양안양화교체력장	21,950	21	8	2	2	2	2				13	1	1	1	1	2	3	2	2
안양산신정교체력장	15,209	27	15	2	1	1	1		5	5	12	1	2	1	1	1	2	2	2
문래공원다목적광장	3,720	9	9	1		2			1	5									
신길공원다목적광장	1,800	4	4			1	1			2									
양평공원배드민턴장	250	3	3							3									
자매공원배드민턴장	164	2	2							2									
강미울공원배드민턴장	200	2	2							2									
당산공원배드민턴장	250	3	3							3									
도림2동배드민턴장	450	7	4							4	3	1	1					1	
당산동배드민턴장	564	9	4							4	5	1	1				1	2	
도림 테니스장	646	1	1					1											

4. 體育施設業 現況

(단위:개소)

개	당구장	체육토장	계력단련장	에어로빅장	골프연습장	볼링장	수영장	종합체육시설	테니스장	무도학원
556	270	101	67	28	45	2	7	4	1	31

II. 2003 主要業務 推進實績

1. 추진실적 현황

□ 투자사업 : 36건 / 21,159,663 천원

※ 완료 : 23건 2,007,663 천원, 진행 : 13건 / 19,152,000천원

○ 공원사업 : 10건 / 11,597,663천원-완료5건/551,663천원,진행5건/11,046,000천원

○ 조경녹지사업 : 20건 / 5,374,000천원 - 완료14건/1,086,000천원,진행6건/ 4,288,000천원

○ 체육시설사업 : 6건 / 4,188,000천원 - 완료4건/370,000천원,진행2건/3,818,000천원

□ 예산내역 : 총21,159,663천원

※ 구비 : 4,578,210 시비 : 16,581,453

2. 사업별 세부실적

□ 공원사업 : 10건 (진행5건 . 완료5건)

○ 진행사업 : 5건

(단위: 천원)

구분	사업개요	비고
진행	<p>1. 1동 1마을 공원조성</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치 : 신길4동 232-136번지 일대(29필지) ◦ 면적 : 3,099㎡ ◦ 사업기간 : 2003. 6월 ~ 2004 ◦ 사업비 : 14,224,000 ◦ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지하주차장건립 : 지하 2층 5,000㎡(160대) - 공원조성 : 2,251㎡ - 어린이집건립 : 848㎡(지상2층 990㎡,보육인원143명) <p>※ 현공정 및 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시계획시설 결정 (공공공지,사회복지시설,주차장) ◦ 실시계획인가 및 보상 : 2003. 8월 ~ 12월 ◦ 공사시행 : 2004년 	<p>시비 : 5,526,000</p>

구분	사업개요	비고
진행	2. 2003 학교공원화사업 ◦ 대상 : 당산중, 영원, 영림초등학교 ◦ 사업기간 : 2003. 2 ~ 12월 ◦ 사업비 : 400,000 ◦ 사업내용 : 담장개방, 수목식재, 시설물설치 등 ※ 현공정 및 향후계획 ◦ 당산 중학교 : 공사진행(90%) ◦ 영원초등학교 : 공사착공 ◦ 영림 중학교 : 공사착공	시비사업
	3. 공원시설물 유지관리사업 ◦ 위치 : 신길공원등 34개소 ◦ 사업기간 : 2003. 1 ~ 12월 ◦ 사업비 : 100,000 ◦ 사업내용 : 수목, 시설물 유지관리	
	4. 공원 내 수목 전정 ◦ 위치 : 신길공원등 34개소 ◦ 사업기간 : 2003. 11 ~ 12월 ◦ 사업비 : 20,000 ◦ 사업내용 : 공원 내 수목 전정 ※ 현공정 및 향후계획 ◦ 2003.11.20 발주예정	
	5. 신길근린공원 조성사업 ◦ 위치 : 신길동 245-45외 3필지 ◦ 사업기간 : 2003. 9 ~ 2004. 12월 ◦ 사업비 : 5,000,000 ◦ 사업내용 : 토지보상, 영업권 보상 ※ 현공정 및 향후계획 ◦ 보상공고(2003.11.12) ◦ 감정평가의뢰(2003.12.30)	시비사업(교부금)

○ 완료사업 : 5건

(단위:천원)

구분	사업개요	비고
의	1. 문래공원 외 1개소 조경 및 시설확충 ◦ 대 상 : 문래. 메낙골공원 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 1 ~ 4. 30 ◦ 사업비 : 80,000 ◦ 사업내용 : 소나무 등 5종 1,330주 식재 지압보도 설치 등	
	2. 공원 내 고무매트 설치 ◦ 대 상 : 신일어린이공원. 도림1동고추말공원 ◦ 사업기간 : 2003. 3. 15 ~ 4. 14 ◦ 사업비 : 40,000 ◦ 사업내용 : 공원에 466㎡(신일142㎡,고추말324㎡)	
도	3. 신길 1.3동 마을마당 조성 (이월사업) ◦ 위 치 : 신길1동 89-137외 6필지(475.8㎡) 신길3동 268-22외 5필지(453㎡) ◦ 사업기간 : 2003. 4. 16 ~ 6. 10 ◦ 사업비 : 142,453 ◦ 사업내용 : 주목 외 13종 1,420주 식재 사각정자 등 시설물 설치 및 점토벽돌 포장 등	시비사업
	4. 신길 2. 6동 마을마당 조성공사(이월사업) ◦ 위 치 : 신길2동 41-3(95㎡) 신길6동 1581-13외1(158㎡) ◦ 사업기간 : 2003. 3. 17 ~ 2003. 4. 28 ◦ 사업비 : 89,210 ◦ 사업내용 : 소나무 외 6종 484주 식재 사각정자 등 시설물 설치 및 점토벽돌 포장 등	
	5. 공원시설물 정비 ◦ 대 상 : 당산근린공원 외 13개소 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 17 ~ 5. 16 ◦ 사업비 : 200,000 ◦ 사업내용 : 음수대 교체, 수세식 간이화장실 설치, 조합놀이대 설치, 관목류 식재 등	

□ 조경녹지사업 : 20건 (진행6건 . 완료14건)

○ 진행사업 : 6건

(단위: 천원)

구분	사업개요	비고
진행	1. 경부제4녹지 조성 ◦ 위치 : 영등포동 422번지 일대 ◦ 사업기간 : 2003. 1 ~ 12월 ◦ 사업비 : 3,500,000 ◦ 사업내용 : 토지보상 및 녹지 조성 1,000㎡ ※ 현공정 및 향후계획 ◦ 도시계획사업 인가고시 : 2003. 6. 30 ◦ 토지, 건물 보상 계획수립 및 협의 : 2003. 7 ~ 12	시비사업
	2. 영등포 소방서 옥상녹화 조성 ◦ 위치 : 영등포 소방서 ◦ 사업기간 : 2003. 11. 5 ~ 12. 4 ◦ 사업비 : 72,000 ◦ 사업내용 : 옥상녹화시스템구축 및 녹지조성 260㎡	구비사업
	3. 가로수생육환경 개선 ◦ 위치 : 도신로 등 5개소 ◦ 사업기간 : 2003. 10. 21 ~ 12. 4 ◦ 사업비 : 130,000 ◦ 사업내용 : 가로수보호판 교체 등 생육환경개선	시비 : 100,000 구비 : 30,000
	4. 가로수아래 관목류 식재 ◦ 위치 : 영등포1동 대우아파트앞 등 5개소 ◦ 사업기간 : 2003. 10. 24 ~ 12. 22 ◦ 사업비 : 236,000 ◦ 사업내용 : 가로수아래 녹지조성 890㎡	시비사업
	5. 안양천둔치 갈대, 억새 등 꽃밭 조성 ◦ 위치 : 안양천둔치(신정교~오목교~양화교) ◦ 사업기간 : 2003. 11. 8 ~ 12. 7 ◦ 사업비 : 300,000 ◦ 사업내용 : 갈대, 억새 등 꽃밭 조성 15,340㎡	시비사업

구분	사업개요	비고
진행	6. 문래동 가각 녹지대 정비 공사 ◦ 위 치 : 문래동 현대5차 APT 등 4개소 ◦ 사업기간 : 2003. 11. 3 ~ 12. 2 ◦ 사업비 : 50,000 ◦ 사업내용 : 선주목 등 4종 1,013주 식재 및 화분 31개소 설치	시비사업

○ 완료사업 : 14건

(단위: 천원)

구분	사업개요	비고
완료	1. 2003 동절기 가로수 전정공사 ◦ 대 상 : 노량진로 등 4개노선 ◦ 사업기간 : 2003. 2. 3 ~ 3. 14 ◦ 사업비 : 30,000 ◦ 사업내역 : 버즘나무 446주 전지	
	2. 왕벚나무 식재공사 ◦ 위 치 : 여의도 윤중로 ◦ 사업기간 : 2003. 2. 26 ~ 3. 27 ◦ 사업비 : 35,000 ◦ 사업내역 : 왕벚나무 100주 식재	
	3. 2003 가로수 보식공사 ◦ 대 상 : 공군회관옆 신설도로 등 13개 노선 ◦ 사업기간 : 2003. 3. 15 ~ 4. 17 ◦ 사업비 : 60,000 ◦ 사업내용 : 은행나무 등 5종 110주 식재 가로수보호판 73조 설치	
	4. 안양천변 둔치 갈대밭. 억새길 조성 ◦ 위 치 : 안양천변 둔치 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 4 ~ 6. 17 ◦ 사업비 : 250,000 ◦ 사업내역 : 갈대식재(3,280㎡), 억새식재(3,300㎡), 왕벚나무식재(551주)	시비 : 150,000 구비 : 100,000

구분	사업개요	비고
원	5. 가로변녹지량 확충공사 ◦ 위 치 : 신길7동 육군아파트주변 등 5개소 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 7 ~ 5. 26 ◦ 사업비 : 100,000 ◦ 사업내역 : 소나무 등 14종 1,929주 식재	시비사업
	6. 도림2동 철도연변소공원 확충 ◦ 위 치 : 도림2동 270-2번지 일대 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 10 ~ 6. 13 ◦ 사업비 : 100,000 ◦ 사업내역 : 소공원확충 1,566㎡	
	7. 대방천 수림대 정비 ◦ 위 치 : 대방천북개도로(신길5동 671번지 일대) ◦ 사업기간 : 2003. 4. 17 ~ 5. 15 ◦ 사업비 : 100,000 ◦ 사업내용 : 스트로브-잣나무 등 6종 1,898주 식재 매쉬웬스 설치 556m 소형고압블럭포장 430m	
료	8. 도시구조물 벽면녹화 ◦ 위 치 : 양평2동 삼호아파트 등 8개소 ◦ 사업기간 : 2003. 5. 1 ~ 6. 14 ◦ 사업비 : 181,000 ◦ 사업내용 : 벽면녹화 조성 550㎡ 회양목 등 12종 21,122본 식재	시비사업
	9. 녹지시설물 도색 및 보수 ◦ 위 치 : 대방천수림대 등 31개소 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 2 ~ 4. 24 ◦ 사업비 : 20,000 ◦ 사업내용 : 정자(22개소), 파고라(9개소) 정비 및 도색	
	10. 대방로확장 가로수 이식 ◦ 위 치 : 신길6동LG주유소 ~ 우진(아) 입구간 ◦ 사업기간 : 2003. 6. 1 ~ 6. 20 ◦ 사업비 : 64,000 ◦ 사업내역 : 버즘나무 등 4종 106주	시비사업

구분	사 업 개 요	비 고
인 문	11. 녹지내 휴식공간 조성 ◦ 위 치 : 신길6동 신평역 주변 녹지대 ◦ 사업기간 : 2003. 3. 25 ~ 4. 17 ◦ 사업비 : 20,000 ◦ 사업내역 : 소나무 등 5종 502주 식재 반원형의자 2개소 설치	
	12. 녹지관리창고 정비 ◦ 위 치 : 양평동 녹지관리 창고 ◦ 사업기간 : 2003. 3. 12 ~ 4. 10 ◦ 사업비 : 20,000 ◦ 사업내용 : 컨테이너 1동 설치, 조정석 쌓기 (16t)	
	13. 불량수목 수세회복 ◦ 위 치 : 윤중로 등 2개소 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 1 ~ 8. 29 ◦ 사업비 : 30,000 ◦ 사업내용 : 부패부분제거 및 병충해방제, 전정작업	
	14. 대방로확장 가로수 식재 공사 ◦ 위 치 : 대방로(LG주유소~삼성아파트) ◦ 사업기간 : 2003. 9. 4 ~ 11. 2 ◦ 사업비 : 76,000 ◦ 사업내용 : 느티나무 등 2종 79주 식재	

□ 체육시설사업 : 6건 (진행2건 . 완료4건)

○ 진행사업 : 2건

(단위: 천원)

구분	사 업 개 요	비 고
진 행	1. 구민종합체육센터 건립사업 ◦ 부지면적 : 5,380㎡ ◦ 건축규모 : 연면적 9,229㎡(지상3/지하2) ◦ 공사비 : 3,658,000(본예산2,770,00, 추경888,000) ◦ 총사업비 : 14,888,000 ◦ 공사기간 : 2001. 10. 22 ~ 2004. 5 ◦ 진행사항 - 지상층 골조공사 완료(현재45%)	- 구비 3,658,000 (시비 832,000) . 본예산 2,770,000 . 추 경 888,000
	2. 체육 및 편익시설물 확충공사 ◦ 위 치 : 대림운동장 등 5개소 ◦ 사업기간 : 2003. 11. 21 ~ 2003. 12. 15 ◦ 사업비 : 160,000 ◦ 사업내용 : 음수대 설치등 15개 공종	

○ 완료사업 : 4건

(단위: 천원)

구분	사업명	비고
완료	1. 안양천체육공원화 사업 ◦ 위치 : 안양천 (신정교 ~ 양화교) ◦ 공사기간 : 2003. 4. 24 ~ 6. 12 ◦ 사업비 : 200,000 ◦ 사업내용 : 게이트볼장 5면, 배드민턴장 5면, 그늘막 3동 설치 등	
	2. 체육 및 편익시설물 도색공사 ◦ 대상 : 대림체육공원 등 4개소 ◦ 사업기간 : 2003. 3. 17 ~ 4. 4 ◦ 사업비 : 20,000 ◦ 사업내용 : 조합페인트 1,357㎡ 페인트긋기 675㎡ 라인도색 3,194m	
	3. 체육시설물 보수공사 ◦ 대상 : 대림체육공원의 2개소 ◦ 사업기간 : 2003. 4. 25 ~ 5. 17 ◦ 사업비 : 100,000 ◦ 사업내용 : 역기대 등 체육시설물 4종 정자 등 편익시설물 2종 헬스 등 보호시설물 4종	
	4. 도림2동게이트볼장 조성공사 ◦ 위치 : 도림2동 265번지 ◦ 공사기간 : 2003. 5. 6 ~ 7. 17 ◦ 사업비 : 50,000 ◦ 사업내용 : 건물철거 1동, 게이트볼장 1면 조성	

Ⅲ. 2004 主要業務 推進計劃

1. 추진 방향

- 유휴지, 자투리땅을 활용 공원, 녹지공간 적극 확충
- 공원의 질적 수준향상으로 지역 주민의 쾌적한 휴식공간 제공
- 체육시설을 확충하여 구민 체력증진 및 건전한 여가생활에 기여

2. 사업 총괄

- 총사업비 : 29건 / 11,216백만원
- 예산내역 : 구비 21건/5,653백만원, 시비 8건/5,563백만원
(단위 : 백만원)

구분	건수	사업비 (투자사업)	비고	
총계	29	11,216		
구비	총계	21	5,653	
	공원사업분야	6	2,580	· 현대홈타운앞 공지 공원조성 사업 외 7건
	조경녹지사업 분야	11	870	· 녹지대 지피식물 식재 외 10건
	체육시설사업 분야	3	2,203	· 구민체육센터건립 사업외 3건
시비	총계	8	5,563	()는 구비사업과 복합
	공원사업분야	2	1,413	· 학교공원화 사업외 1건
	조경녹지사업 분야	7(1)	4,150	· 철도연변 수림대조성 사업 외6건

* ()는 區費 사업건수에도 포함

3. 사업추진계획

공원사업 (8개사업)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	개요	사업비	비고
합 계			3,993	사비 1,413 구비 2,580
1	1동1마을공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 신길4동 232-51외28필지 · 규 모 : 3,099㎡ · 사업내역 : 주차장(지하), 어린이집, 공원조성 (수목식재, 유희, 편익, 체육시설 등) 	998 (계축사업)	시비
2	마을숲 조성	<ul style="list-style-type: none"> · 대 상 : 신길동245-32외 2개소 · 규 모 : 1,613㎡ · 사업내역 : 수목식재(소나무등, 향토수종) 시설물 공사(정자, 체육시설, 유희시설 등) 	1,370	구비
3	현대홈타운앞 공지 공 원 조 성	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 문래동3가94-1 · 규 모 : 3,311.4㎡ · 사업내역 : 공원조성(휴식시설, 수목식재, 체육시설 등) 	690	구비
4	학교공원화 사업	<ul style="list-style-type: none"> · 대 상 : 영남중, 장훈중, 고등학교 · 사업내역 : 담장철거, 수목식재 등 학교를 녹지 거점화 	415	시비

연번	사업명	개요	사업비	비고
5	공원내 나지 피복	<ul style="list-style-type: none"> ·대 상 : 신길근린공원 외 6개소 ·규 모 : 1,250㎡ ·사업내역 : 토사유출지역 나지 피복 	40	구비
6	공원내 전기시설물 보 수	<ul style="list-style-type: none"> ·대 상 : 신길공원 등 38개소 ·사업내역 : 공원등 보수, 전기노후시설 교체 등 	30	구비
7	공원시설물 정비	<ul style="list-style-type: none"> ·대 상 : 신길공원 등 38개소 ·사업내역 : 각종노후시설물 교체정비 공원관리사무소 정비 등 	250	구비
8	공 원 시 설 물 유지 관리사업	<ul style="list-style-type: none"> ·대 상 : 신길공원등 44개소, ·사업내역 : 공원시설물 도색,청소,수목, 잔디관리등 공원시설의 상시 유지 관리작업 	200	구비

□ 조경녹지사업 (17개사업)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	개요	사업비	비고
합 계			5,020	시비:4,150 구비: 870
1	철도연변 수림대 조성	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 신길동 12-4번지 일대 · 규모 : 2,400㎡ · 사업내역 : 수림대 조성 	300	시비
2	공공기관 담장 녹화	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 영등포구청 · 규모 : 800㎡ · 사업내역 : 담장녹화, 휴게공간 조성 	600	시비
3	녹지대 지피식물 식재	<ul style="list-style-type: none"> · 대상 : 대방역입구 녹지대 등 10개소 · 규모 : 3,000㎡ · 사업내역 : 토사유출지역 나지피복 	50	구비
4	윤중로 등 2개소 벚꽃길 정비	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 여의도 서로 등 2개소 · 규모 : 7km · 사업내역 : 왕벚나무 300주 식재 계단 및 휴게시설 설치 	110	구비
5	대방천 수림대 정비	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 대방천북개도로 수림대 (신길3동 지역) · 규모 : 800㎡ · 사업내역 : 수림대 산책로 정비 및 시설물보완 	100	구비
6	도시구조물 벽면녹화	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 제물포길 대한통운등10개소 · 규모 : L=1,500m, B=30cm · 사업내역 : 담장이 등 덩굴식물 식재 	250	시비
7	경부제4녹지조성 사업	<ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 영등포동 423번지일대 · 규모 : 800㎡ · 사업내역 : 토지보상 및 녹지조성 	2,100	시비
8	가로변 녹지량 확충	<ul style="list-style-type: none"> · 대상 : 양평동3가97-2 등 7개소 · 규모 : 2,500㎡ · 사업내역 : 조경석쌓기, 수목및지피식물식재 	500	시비

연번	사업명	개요	사업비	비고
9	안양천변 둔치 갈대밭·억새길 조성 및 유지관리	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 안양천변 둔치 ◦ 규 모 : 3,000㎡ ◦ 사업내역 : 갈대·억새밭 조성및유지관리 	100	시비
10	불량수목수세회복	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대 상 : 여의도 동.서로 등 2개소 ◦ 규 모 : 벚나무 1,600주 ◦ 사업내역 : 부패부 제거 및 병해충방제 등 	50	구비
11	가로수 전정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대 상 : 대방복개로 등 8개소 ◦ 규 모 : 버즘나무등 800주 ◦ 사업내역 : 수목 전지 	50	구비
12	가로수생육환경개선	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대 상 : 여의도 ◦ 규 모 : 벚나무 등 1,500주 ◦ 사업내역 : 생육환경개선 	330	구비: 30 시비:300
13	가로수 보식	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대 상 : 양평로 등 10개 노선 ◦ 규 모 : 느티나무 등 4종 200주 ◦ 사업내역 : 가로수 결주지 보식 	60	구비
14	녹지관리창고보수	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 양평동 녹지관리창고 ◦ 사업내역 : 지붕, 벽체 등 보수 	20	구비
15	신길6동 벚꽃길 생육공간 조성공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 신길6동 벚꽃길 ◦ 규 모 : H=1m, L=800m ◦ 사업내역 : 아스팔트제거,토양환토,가로수 보호판교체 및 생육공간조성 	100	구비
16	녹지대 유지관리사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대 상 : 국회앞 녹지대등 79개소 ◦ 규 모 : 511,337㎡ ◦ 사업내역 : 시설물 도색,녹지대청소,수목 잔디관리 등 상시 유지관리 	250	구비
17	도림동자연학습장 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도림빗물펌프장 앞 녹지대 ◦ 규 모 : 4,000㎡ ◦ 사업내역 : 수목 식재 및 이식, 자연석 쌓기, 웬스 철거 및 폐기물 처리 등 	100	구비

□ 체육시설사업 (3개사업)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	개요	사업비	비고
합 계			2,203	구비
1	구민종합체육센터 건설 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 신길5동426-3(신길근린공원) ◦ 규 모 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적: 5,380㎡ - 건축면적: 9,229㎡(지상3/지하2) ◦ 사업내역 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 : 14,888백만원 - 2004년사업내역 : 내부 및 마감공사 	1,918	구비
2	안양천제방 조경로 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 안양천제방(신정교~오목교) ◦ 규 모 : 총연장 1km, 폭 7m ◦ 사업내역 : 경계블럭 설치 (2,000m) 마사토 포설 (600㎡) 주변 잔디 및 관목류 식재 	185	구비
3	체육 시설물 보수 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 신정교제1축구장 등 4개소 ◦ 사업내역 : 지압보도설치(30㎡) 경계석 설치(110m) 배드민턴장 라인마킹(6면) 배드민턴장웬스(100m) 조이콘 포장(900㎡) 산책로 조성(200m) 	100	구비

II. 特殊施策

1. 구민종합체육센터 건립

복합체육시설 확충을 통해 구민들의 체력증진과 건전한 여가선용의 기회를 제공하고 구민들의 삶의 질 향상을 위한 사회복지 실현에 기여코자 함.

가. 구민체육센터 건립의 차질없는 시공

□ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 426-3 신길공원내
- 사업기간 : 2001. 10 ~ 2004. 5
- 사업비 : 총14,888백만원 (시비 2,232 / 구비 12,656)
- 2004년 : 1,918백만원 (구비)
- 규 모 : 지하2층 지상3층 (연면적 9,229㎡)
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 실내골프연습장, 체육관, 주차장 등

□ 추진상황

- 기본계획 : 1996. 10. 1
- 실시설계 : 2001. 6. 28
- 공사착공 : 2001. 10. 22
- 현재공정 : 지상층 골조공사(45%)

□ 설계변경 계획

- 추진배경
 - 구민체육센터 공사를 진행하던 중 시설의 규모에 비하여 구민이 이용할 수 있는 시설이 열악하여 구민의 욕구를 충족하고자 증별 특성을 고려한 공간 재배치 및 프로그램 선호도에 따른 면적조정으로 종합체육센터로서의 기능성 확보

○ 추진방향

- 2개층을 점유하고 있는 대체육관을 2개층으로 분리하여 241평을 증설하여 선호도가 높은 시설도입.

- 실내골프연습장시설도입 : 93평(10타석)
- 헬스장 증설 (85평→230평)
- 주차장 증설 (68대→78대)

- 일부시설의 배치 및 규모조정

○ 설계변경 계획(안)

- 용도변경

구분	당초	면적(m ²)	변경계획안	면적(m ²)	비고
계		8,323.62 (2,518평)		9,223.89 (2,792평)	증905.27 (274평)
지하2층	수영장(361평) 기계실, 전기실, 주차장 18대	2,953.93 (894평)	수영장(361평) 기계실, 전기실, 여자실 주차장 19대	3,064.06 (927평)	증110m ² (33평)
지하1층	에어로빅실(65평) 헬스실(85평) 주차장 47대	2,333 (706평)	주차장확대(68대→78대) 골프연습장(10타석)	2,333.23 (706평)	시설용도 변경
지상1층	다목적체육관(83평) 유아스포츠교실(31평) 유아놀이방(27평)	1,321.90 (400평)	변경없음	1,321.90 (400평)	변경없음
지상2층	대체육관(235평) 탁구장(53평)	1,260.31 (381평)	헬스장(230평) 사무실(40평)	1,260.31 (381평)	시설용도 변경
지상3층	강좌실(50평)	454.25 (137평)	대체육관(200평) 강좌실(50평)	1,244.39 (378평)	층고조정으로 면적증가 (241평)

□ 총사업비 소요판단

- 총예상공사비 : 14,888백만원(중 1,918백만원)
 - 당초 공사비 : 12,970 백만원
 - 증축관련 소요예산 : 1,516 백만원
 - . 타당성조사 용역비 : 44 백만원
 - . 설계변경 용역비 : 122 백만원
 - . 공사비 : 1,350 백만원
 - 당초 설계누락 및 변경추가 공사비 : 402 백만원
 - . 락카함 : 50 백만원
 - . 롤스크린 : 18 백만원
 - . 지붕공사단열(법개정) : 50 백만원
 - . 기계분야 장비설치공사등 6건 : 68 백만원
 - . 자동제어장치 : 205 백만원
 - . 제잡비 : 11 백만원
- ※ 2004년 확보예산 : 1,918백만원

나. 구민체육센터 준공에 따른 사전준비

□ 사전준비 사항

- 영등포구체육시설관리조례 및 규칙제정
- 체육센터운영방침 결정(직영 또는 위탁운영) 및 소요예산 파악
- 체육센터 프로그램 수강료 결정
- 프로그램에 따른 체육시설물 구입 및 설치
- 체육시설 내부 및 외부 인테리어 공사 및 사인물 제작설치
- 시설관리 행정장비 구입 (비품 및 전산기기)
- 각종 홍보물 및 안내판 제작설치 (도립로, 신길로 등 3개소)
- 관리직원 채용
- 강사 및 지도교사 채용

2. 문래동 현대홈타운 부지 공원조성

공동주택 건립시 공원용지로 확보된 부지에 공원을 조성하여 생활권 주변
공원녹지를 확충함으로써 시민의 여가공간을 확대하고 지역주민의 불편사항
을 해소코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 문래동 3가 94-1
- 면 적 : 3,311.4㎡
- 사업내용 : 수목 및 지피류 식재, 조경시설 및 유희시설, 편익시설 설치 등
(정자, 의자, 파고라, 배드민턴장, 놀이터 등)

- 추진기간 : 2004. 1 ~ 6월
- 소요예산 : 690백만원

□ 추진실적

- 공장이전 적지내 공동주택건립에 따른 공원용지 확보
(2000.3.22 : 서울시도시계획위원회 심의 결정)
- 부지확보 : 기부채납(2003. 7. 1 - 지적정리)

□ 추진일정

- 2004. 1 ~ 2 : 설계실시
- 2004. 3. : 공사발주
- 2004. 3~6 : 공원조성공사 시행

□ 사업효과

- 쾌적한 생활환경 조성 및 도시경관 수준향상
- 생활주변 환경개선 요청 민원해소

3. 1동 1마을공원 조성

서울시에서는 공원과 보육시설이 없고 주차난이 심한 주택 밀집지역 6개구의 12개동을 대상으로 심사를 거쳐 우리구 신길4동이 대상지로 선정되어 지하는 주차장, 지상은 공원과 어린이집을 건립. 주민들의 쉼터를 조성하여 열악한 주거환경을 개선하고 도시미관의 향상을 도모코자함.

□ 대상지 현황

- 위치 : 신길4동 우신동물병원 뒤쪽 불량주택 밀집지역
 - 신길4동 232, 233번지 일대 28필지
- 면적 : 3,099㎡
- 건물현황 : 24동/1,696㎡(1층17동, 2층5동, 다세대2동)

□ 시설계획

- 총소요예산 : 14,224백만원(시비11,424, 구비2,800)
- 주차장건립
 - 건립비 : 5,600백만원(시,구비 각50%)
 - 면적 : 지하2층/연면적 5,000㎡
 - 주차면수 : 160대
- 공원조성
 - 조성비 : 6,524백만원(보상비5,526, 공사비527, 설계용역.기타 471)
 - 면적 : 2,251㎡
- 어린이집 건립
 - 건립비 : 2,100백만원
 - 건립규모 : 848㎡ (지상2층 연면적 990㎡ 보육인원 143명)

□ 추진일정

- 2003. 6 ~ 9 : 도시계획시설(공공공지,사회복지시설,기하주차장)결정
- 2003. 9 ~ 10 : 도시계획사업에 따른 실시 계획인가
- 2003.10 ~ 12 : 토지 및 건물보상
- 2004. : 사업시행(지하주차장, 공원, 어린이집)

4. 안양천 체육공원 조성

주민들의 건강증진과 건전한 여가활동에 기여코자 안양천 둔치에 부족한 체육시설 확충과 갈대·억새밭을 조성하고 제방에 뽕나무를 식재하여 자연풍경이 어우러지는 자연 친화적인 체육공원을 조성코자 함.

시설현황

- 체육시설 : 축구장 4, 배구장 3, 농구장 4, 족구장3, 로라스케이트장 1
- 편의시설 : 음수대 2, 그늘막 7

추진방향

- 기존공지에는 부족한 체육시설을 확충하고
- 기타 자연보존 지역은 갈대, 억새숲으로 가꾸어 자연 친화적 환경조성
- 기존시설은 잘 정비하여 쾌적한 활동공간 제공

2004년도 계획

(단위 : 천원)

구분	사업명	규모	사업기간	사업비	비고
계				285,000	
체육시설	조깅코스 조성	신정교~오목교 1000m(폭7m)	2003. 4 ~ 6	185,000	제방상단
조경시설	갈대 및 억새 식재	3,000㎡	2004. 4 ~ 12	100,000	둔치

향후계획

- 추진기간 : 2004년~ 2006년
- 주요시설
 - 체육시설 : 축구장 1면, 제방조깅코스 신설 3,700m
 - 편의시설 : 그늘막 10동, 의자 80개
 - 조경시설 : 갈대 및 억새 37,000㎡ 조성
- 총사업비 : 2,130백만원

5. 도시구조를 벽면녹화

우리구는 舊 시가지로서 가로변의 담장, 방음벽 등 삭막한 각종 구조물이 많아, 이런 구조물에 담쟁이 등을 중점적으로 식재 피복하여 가로경관도 향상시키고 부족한 우리구의 녹지도 확충코자함

□ 사업개요

- 대 상 : 방음벽, 옹벽, 담장, 축대 등 각종 수직 구조물
- 방 법 : 벽면하단에 플랜터를 조성하고 담쟁이 등 덩굴 피복식물 식재
- 추진기간 : 2004. 2 ~ 2004. 6. 30
- 소요예산 : 250,000천원(시비)

□ 추진내역

연도별	위 치	물량(m)	사업비(천원)	비고
계	31개소	7,694	1,231,000	
2001	영등포초등학교 방음벽 등 8개소	940	200,000	
2002	문래동 신정교 진입옹벽 등 4개소	1,052	100,000	
2003	문래1동 방림방적 등 9개소	1,202	181,000	
2004	10개소	1,500	250,000	
	제물포로변 대한통운	100	17,000	
	제물포로변 농산물검사소	150	25,000	
	문래2동삼환APT앞	200	33,000	
	문래2동 제니코식품앞	100	16,000	
	문래2동 조흥화학앞	100	20,000	
	여의동 윤중초등학교앞	100	5,000	
	여의동 목화아파트앞	250	51,000	
	문래2동 신한전기앞	200	33,000	
	여의중학교앞	200	33,000	
2005	10개소	1,500	250,000	

6. 신길근린공원 조성사업

장기미집행 도시계획시설(신길근린공원)에 대한 사유지 보상과 공원조성으로 민원을 해소하고 공원녹지 확충으로 주민들에게 쾌적한 휴식공간 제공 및 도시경관 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 425-45 일대
- 면 적 : 19,782㎡(약 5,994평)
- 사업내용 : 사유지 보상, 공원조성(지하 주차장, 지상 공원)
- 사업기간 : 2004. 9 ~ 2006년
- 소요예산 : 5,000백만원(시 교부금)

□ 추진실적

- '40. 03. 12 : 도시계획시설(공원) 결정
- '92. 12. 11 : 공원조성계획 결정
- '85 ~ '93 : 사유토지 보상실시
- '93. 12. 30 : 공원일부 조성(13,211㎡)
- '96. 03. 15 : 구민체육센터 건립계획 수립
- '96 ~ 2002 : 토지보상 5,585㎡

□ 추진계획

- 2003. 9 ~ 2004. 12 : 사유지 2,451㎡보상, 영업권(테니스장)보상
- 2005 ~ 2006 : 지하 주차장, 지상 공원조성
 - 지하 주차장 : 교통행정과에서 도시계획시설 중복결정 및 시설설치
 - 지상 공원 : 지하 주차장 설치후 공원녹지과에서 상부 녹지조성

□ 사업효과

- 장기미집행 도시계획시설 보상으로 민원해소
- 생활주변 환경개선 및 도시경관 향상
