

제197회 구의회 임시회

2016. 10. 19. ~ 10. 26.

청림 영등포

---

# 2016년 주요업무 보고

---




푸른 도시 과

# 보고 순서

I . 일반 현황	.....	1
II . 주요업무 추진실적	.....	3
III . 중점사업 실적	.....	24

# I. 일반 현황

## 1 조직

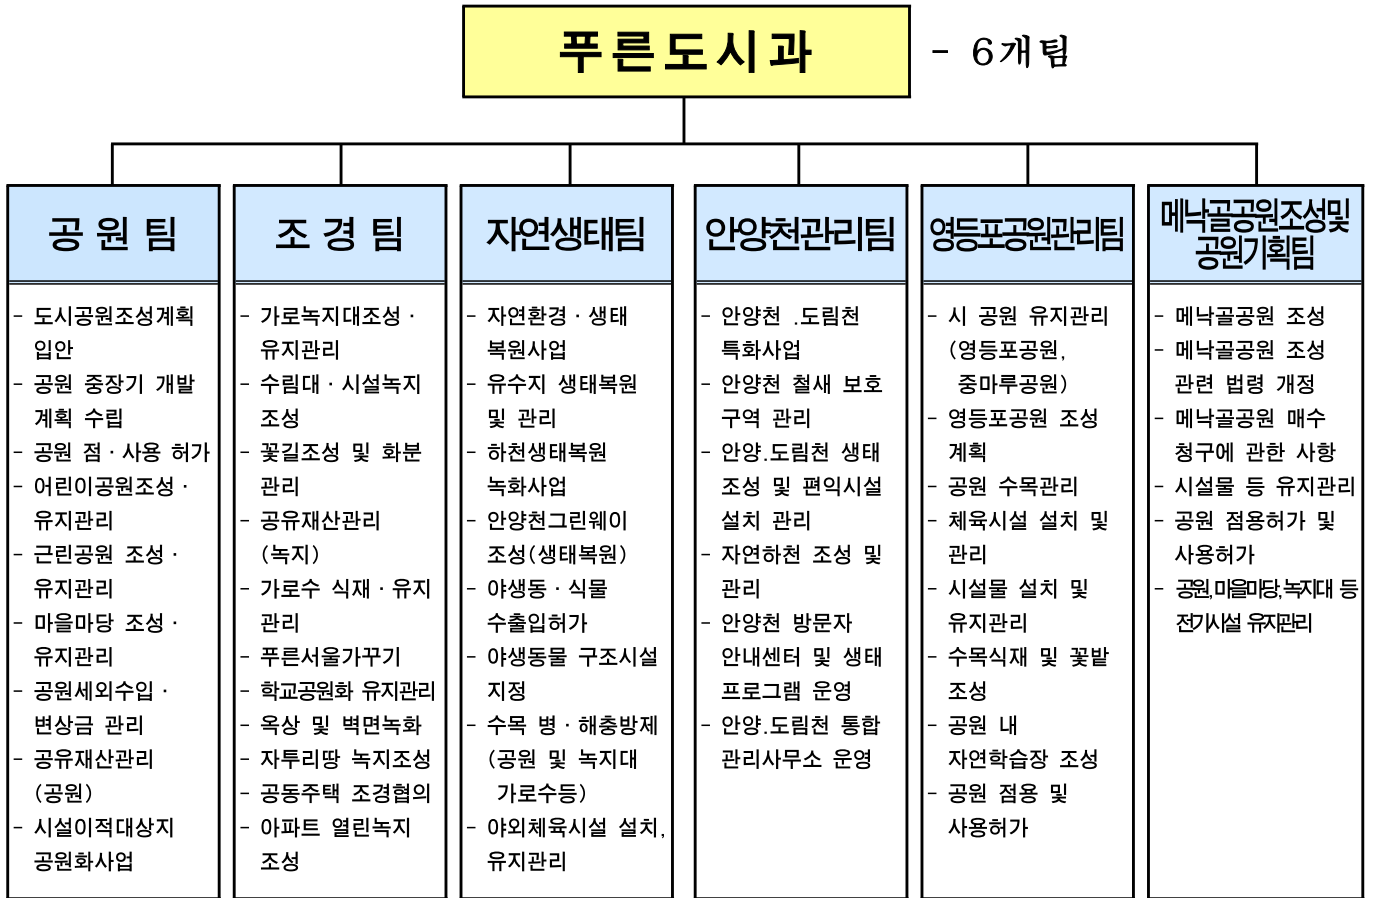

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	30	0	1	6	8	6	7	0	1	1	0	0	0	0	0
현 원	27	0	1	6	12	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0
과부족	△3	0	0	0	4	△3	△4	0	1	△1	0	0	0	0	0

## 3

## 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속
시설	근린공원	10개소/549,377㎡ (구공원 6개소/141,431㎡, 시공원 4개소/407,946㎡)	공원팀
	어린이공원	18개소/54,637㎡	공원팀
	소공원	11개소/14,074㎡	공원팀
	마을마당	31개소/18,011㎡	공원팀
	녹지대	339개소/719,087㎡	조경팀
	가로수	103개노선 17,709주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	자연생태팀
	체육시설	72개소 22종 792점	자연생태팀
장비	화물차	마이티(2.5t) 80모 5681(2005년)	조경팀
		마이티(2.5t) 80모 5698(2005년)	조경팀
	승합차	스타렉스(9인승) 03모 9050(2005년)	공원팀
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원팀
	소형화물	포터2(1.0t) 86우 4171(2011년)	안양천관리팀
		포터2(1.0t) 80모 7630(2005년)	공원팀
		포터2(1.0t) 80모 7614(2005년)	자연생태팀

## 4

## 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	7,441,832 (사고이월 : 국비 90,000, 구비 237,627) (보조금 : 국비 42,108 / 시비 1,504,552)	5,505,663 (사고이월 : 국비 89,989, 구비 41,792) (보조금 : 국비 21,854 / 시비 1,152,156)	74%
공원관리 수준향상	3,026,054 (사고이월 : 국비 90,000, 구비 195,835) (보조금 : 시비 465,979)	2,351,905 (사고이월 : 국비 90,000) (보조금 : 시비 296,008)	78%
가로녹지 수준향상	2,546,690 (사고이월 : 구비 41,792) (보조금 : 시비 821,288)	1,784,464 (사고이월 : 구비 41,792) (보조금 : 시비 705,626)	70%
자연생태 수준향상	557,999 (보조금 : 국비 26,108 / 시비 122,285)	380,134 (보조금 : 국비 21,854 / 시비 81,931)	68%
안양·도림천 특화	489,130 (보조금 : 시비 80,000)	343,431 (보조금 : 시비 68,591)	70%
인력운영비	520,503	477,157	92%
기본경비	214,322 (보조금 : 국비 16,000 / 시비 15,000)	130,210 (보조금 : 국비 0원 / 시비 0원) ※ 전기자동차 10월초 집행완료	61%
보전지출	48,737	0	
내부거래지출	38,397	38,362	99.9%

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선 .....	4
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충 .....	6
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리 .....	9
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선 .....	12
⑤	안양천·도림천 생태복원 및 정비 .....	14
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성 .....	16
⑦	공원내 위험요소 사전 정비 .....	18
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비사업 .....	20
⑨	도심 유휴공지 활용 녹지 확충 .....	22

의자, 목재 데크, 산책로 탄성포장 등 노후시설을 교체하고 생태놀이터를 만들어 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

## □ 사업개요

- 공원 보수정비(영등포공원 리모델링)
  - 위 치 : 신길로 275(영등포본동) 영등포공원
  - 내 용 : 산책로 탄성포장 교체, 풋살경기장 정비
  - 예 산 : 600,000천원(시비)
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2016. 2. 15. : 실시설계용역 착수
    - 2016. 3. 31. : 서울특별시 설계심의 완료
    - 2016. 4. 22. : 특정제품심사위원회 개최(인조잔디)
    - 2016. 5. 20. : 서울특별시 계약심사 완료
    - 2016. 6. 27. : 공사 착공
    - 2016. 10. 31. : 공사 준공(예정)
- 중마루공원 정비(완료)
  - 위 치 : 영등포동2가 222(영등포동) 중마루공원
  - 내 용 : 흙막이 원주목 교체, 연못 정비 등
  - 예 산 : 200,000천원(시 주민참여)
  - 추진실적
    - 2016. 3. 07. : 실시설계용역 착수
    - 2016. 4. 14. : 서울특별시 설계심의 완료
    - 2016. 5. 12. : 서울특별시 계약심사 완료
    - 2016. 6. 10. : 공사 착공
    - 2016. 9. 12. : 공사 준공
- 공원 시설물 정비(완료)
  - 위 치 : 문래소공원(문래동), 당산공원(당산1동), 그린마을마당(신길5동)
  - 내 용 : 수목 식재, 목재웬스, 파고라, 탄성포장, 목교, 목재데크, 앉음벽, 파고라 정비 등
  - 예 산 : 220,000천원(구비)
  - 추진실적
    - 2016. 3. 07. : 공사 발주
    - 2016. 3. 30. : 공사 착공
    - 2016. 5. 18. : 공사 준공

○ 양평어린이공원 생태놀이터 조성(사고이월)(완료)

- 위 치 : 양평동4가(양평2동) 301-7 양평어린이공원
- 내 용 : 자연소재 놀이요소 도입 및 생태 휴식공간 조성
- 예 산 : 300,000천원(국비 90,000, 구비 210,000)
- 추진실적
  - 2015. 10. 30. : 공사 발주
  - 2016. 3. 07. : 공사 착공
  - 2016. 4. 25. : 공사 준공

□ 소요예산 : 1,320,000천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,320,000 (국 90,000, 시 800,000, 구 430,000)	849,282 (국 89,994, 시 371,079 구 388,209)	64.34

□ 현황사진



중마루공원 공사전



중마루공원 공사후



생태놀이터 공사전



생태놀이터 공사후

관내 학교, 아파트, 도로변 등 주요 생활권에 보다 아름답고 쾌적하도록 다양한 테마의 특색있는 녹색 공간으로 조성함으로써 도시경관 향상

## □ 사업개요 및 추진실적

### ○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위 치 : 대림2동 영림초교
- 내 용 : 학교 수목 및 초화류 식재로 자연친화적 환경 제공
- 예 산 : 100,000천원(시비)
- 추진실적
  - 2016. 4. 28. : 공사발주
  - 2016. 5. 23. : 공사착공
  - 2016. 7. 01. : 공사준공

### ○ 아파트 열린녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : 당산1동 삼익/ 양평2동 거성파스텔, 문래동 문래현대3차 /여의동 광장아파트(사고이월)
- 내 용 : 담장 철거 786m, 수목식재 왕벚나무 등 12,960주, 초화류 식재 34,990본 등
- 예 산 : 676,268천원(시비 300,000, 구비 376,268 ※사고이월 50,000)
- 추진실적
  - 2015. 10. 27. : 공사발주(광장A)
  - 2015. 11. 09. : 공사착공(광장A)
  - 2016. 4. 30. : 공사준공(광장A)(완료)
  - 2016. 4. 25. : 공사발주(거성, 현대3차A)
  - 2016. 5. 16. : 공사착공(거성, 현대3차A)
  - 2016. 7. 14. : 공사준공(거성, 현대3차A)(완료)
  - 2016. 5. 16. : 공사발주(삼익A)
  - 2016. 6. 13. : 공사착공(삼익A)
  - 2016. 10. 07. : 공사준공(삼익A)(완료)

### ○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위 치 : 여의동 국회의사당역(9호선) 3, 4번 출구 국민은행, 이룸센터 앞
- 내 용 : 포켓정원, 초화원, 띠녹지 조성 등
- 예 산 : 220,000천원(시비)
- 추진실적
  - 2016. 4. 26. : 공사발주
  - 2016. 5. 23. : 공사착공
  - 2016. 7. 06. : 공사준공



○ 걷고싶은 그린로드 조성

- 위 치 : 당산1동 당산공원, 문래동 문래공원, 대림3동 대림운동장
- 내 용 : 갈대, 나비 조명기구 등 설치
- 예 산 : 50,000천원(시비-주민참여사업)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 9. 06. : 공사발주
  - 2016. 9. 21. : 공사착공
  - 2016. 11. 20. : 공사준공(예정)

○ 옥상녹화·텃밭 조성

- 위 치 : 선유동1로 80 영등포구청 별관 옥상
- 내 용 : 바닥 방수, 휴게시설 설치 및 녹지 조성 등
- 예 산 : 60,000천원(시비 42,000천원/ 구비 18,000천원)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 9. 23. : 공사발주
  - 2016. 9. 28. : 공사착공
  - 2016. 11. 16. : 공사준공(예정)

□ 소요예산 : 1,106,268천원

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,106,268 (시 712,000, 구 394,268)	954,825 (시 605,019, 구 349,806)	86.3

□ 위치도



□ 현황사진(가로정원 조성사업)



□ 현황사진(아파트 열린녹지조성사업)



□ 현황사진(에코스쿨 조성사업)



관내 가로수를 비롯한 주요 수목에 대한 생육환경개선사업을 통해 가로수의 건전한 생육을 도모하고, 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공

#### □ 사업개요

##### ○ 가로수 보호관 정비사업(완료)

- 위 치 : 여의동 여의대로, 영등포동 영등포로, 신길7동 여의대방로  
신길6동 대방천로, 문래동 선유로, 여의동 국회대로
- 내 용 : 노후 보호관 교체 566조, 뿌리용기 보도 정비 등
- 예 산 : 300,000천원(시비)
- 추진실적
  - 2016. 4. 18. : 공사발주
  - 2016. 5. 01. : 공사착공
  - 2016. 8. 30. : 공사준공

##### ○ 가로수 식재(완료) 및 생육환경개선사업

(가로수 식재/가로수 생육환경개선/가마산로 바뀌심기)

- 위 치 : 문래동 문래북로, 문래로, 영등포본동 도신로29길 /  
대림3동 가마산로/여의동 국회대로, 도림동 도신로 등
- 내 용 : 가로수 식재10주/가마산로 수종 교체 130주/  
띠녹지 조성50m, 가로수 식재 20주, 보호관 20조
- 예 산 : 320,000천원(시비 300,000, 구비 20,000)
- ※ 가로수식재(20,000/구비), 가마산로(210,000/시비), 생육환경(90,000/시비)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 2. 23. : 공사발주(가로수 식재사업)
  - 2016. 3. 02. : 공사착공(가로수 식재사업)
  - 2016. 3. 23. : 공사준공(가로수 식재사업)(완료)
  - 2016. 5. 23. : 공사발주(가로수 생육환경 개선)
  - 2016. 6. 01. : 공사착공(가로수 생육환경 개선)
  - 2016. 7. 22. : 공사준공(가로수 생육환경 개선)(완료)
  - 2016. 5. 16. : 공사발주(가마산로 가로수 바뀌심기)

- 2016. 5. 27. : 공사착공(가마산로 가로수 바뀌심기, 공정율 10%)
  - ※ 하절기 그늘제공 및 왕벚나무 활착을 위해 가을철로 공사 연기
- 2016. 10. 30. : 공사준공(가마산로 가로수 바뀌심기)(예정)
- 왕벚나무 등 수세회복(시,구) / 보호수 생육환경개선 사업
  - 위 치 : 여의동 여의동서로, 의사당대로, 여의대로, 영등포동 경인로(시비) / 신길6동 벚꽃길(구비) / 당산2동 보호수 등
  - 내 용 : 왕벚나무 1,736주, 소나무 1,197주, 보호수 1주 등 수세회복 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등
  - 예 산 : 215,000천원(시비 205,000, 구비 10,000)
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2016. 2. 18. : 공사발주(신길6동 왕벚나무 수세회복-구비)
    - 2016. 3. 07. : 공사착공(신길6동 왕벚나무 수세회복-구비)
    - 2016. 3. 25. : 공사준공(신길6동 왕벚나무 수세회복-구비)(완료)
    - 2016. 2. 22. : 공사발주(보호수 생육환경 개선)
    - 2016. 2. 25. : 공사착공(보호수 생육환경 개선)
    - 2016. 7. 23. : 공사준공(보호수 생육환경 개선)(완료)
    - 2016. 4. 01. : 공사발주(왕벚나무 등 수세회복-시비)
    - 2016. 4. 19. : 공사착공(왕벚나무 등 수세회복-시비, 공정율 70%)
    - 2016. 10. 31. : 공사준공(왕벚나무 등 수세회복-시비)(예정)
- 친수공간 수경시설 유지관리
  - 위 치 : 여의동 여의나루 벽천, 신길6동 벽천 등 5개소
  - 내 용 : 노후 수경시설(노즐, 펌프 등) 교체 정비 등
  - 예 산 : 20,000천원(구비)
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2016. 4. 25 ~ 5.14. : 1차 공사 완료(신길6동 벽천 등 5개소)
    - 2016. 9. 26. : 2차 공사 착공 (여의나루 벽천 방수 작업)
    - 2016. 10. 15. : 2차 공사 준공(예정)

□ **소요예산 : 855,000천원**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
855,000 (시 805,000, 구 50,000)	433,705 (시 389,296, 구 44,409)	50.7

# □ 위치도



# □ 현황사진



도로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지 조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로 경관을 조성하여 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품도시 영등포 이미지 향상

□ 사업개요

○ 가로변 녹지량 확충사업

- 위 치 : 신길3동 대방천가로녹지/도림로 우성아파트사거리 등 6개소  
(구로경계 도림천녹지, 대림3동사거리, 강남성심병원 앞 등)
- 내 용 : 녹지대 시설물 및 수목 정비, 교통섬 녹화 등
- 예 산 : 420,000천원(시비)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 6. 24. : 공사발주(대방천가로녹지)
  - 2016. 8. 22. : 공사착공(대방천가로녹지)
  - 2016. 10. 31. : 공사준공(대방천가로녹지)(예정)
  - 2016. 5. 19. : 공사발주(도림로)
  - 2016. 6. 13. : 공사착공(도림로)
  - 2016. 10. 31. : 공사준공(도림로)(예정)

○ 영등포 꽃으로 피다(완료)

- 위 치 : 신길4동 209-97 외 1개소(탄탄어린이집 주변/신길역 주변)
- 내 용 : 화단 꽃묘 식재, 자투리땅 꽃·나무 식재 등
- 예 산 : 20,000천원(구비)
- 추진실적
  - 2016. 5. 09. : 공사발주
  - 2016. 5. 16. : 공사착공
  - 2016. 6. 09. : 공사준공

○ 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비(완료)

- 위 치 : 양평가로녹지(양평2동) 등
- 내 용 : 노후 시설물(계단) 정비, 수목 보식 등
- 예 산 : 20,000천원(구비)
- 추진실적
  - 2016. 2. 24. : 공사발주 및 착공
  - 2016. 3. 18. : 공사준공

□ 소요예산 : 460,000천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
460,000 (시 420,000, 구 40,000)	79,998 (시 51,124, 구 28,874)	17.4

## □ 위치도



## □ 현황사진



안양천 서울둘레길 중 흙길을 보다 편안하고 쾌적한 환경에서 산책할 수 있도록 조성하고 도림천 제방사면의 위해식물을 제거하고 다양한 초화류 등을 식재하여 생태복원, 하천경관 향상 및 주민 여가공간 조성

## □ 사업개요 및 추진실적

### ○ 안양천 둘레길 정비 사업

- 위 치 : 안양천 제방 상부(신정교~오목교, 양평교)
- 내 용 : 보행환경 개선 및 노후 시설물 교체 등
- 예 산 : 250,000천원(시 주민참여)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 2. 01. : 실시설계용역 발주
  - 2016. 5. 27. : 실시설계용역 준공
  - 2016. 6. 14. : 공사 발주
  - 2016. 10. 18. : 공사 준공(예정)

### ○ 도림천 생태복원 사업(완료)

- 위 치 : 대림동 640-2 일대(대림3동 빗물펌프장 인근)
- 내 용 : 유해식물 제거 및 식재기반 조성, 식생매트(맥문동 등) 식재 등  
느릅나무 40주, 숙근코스모스 등 2,754㎡, 송악 등 15,785본
- 예 산 : 200,000천원(시비)
- 추진실적
  - 2016. 3. 22. : 공사발주
  - 2016. 4. 11. : 공사착공
  - 2016. 5. 20. : 공사준공

## □ 소요예산 : 450,000천원

(단위: 천원)


예 산 액	집 행 액	집행율(%)
450,000 (시 450,000)	242,431 (시 242,431)	53.87



□ 위치도



안양천(신정교 ~ 오목교)

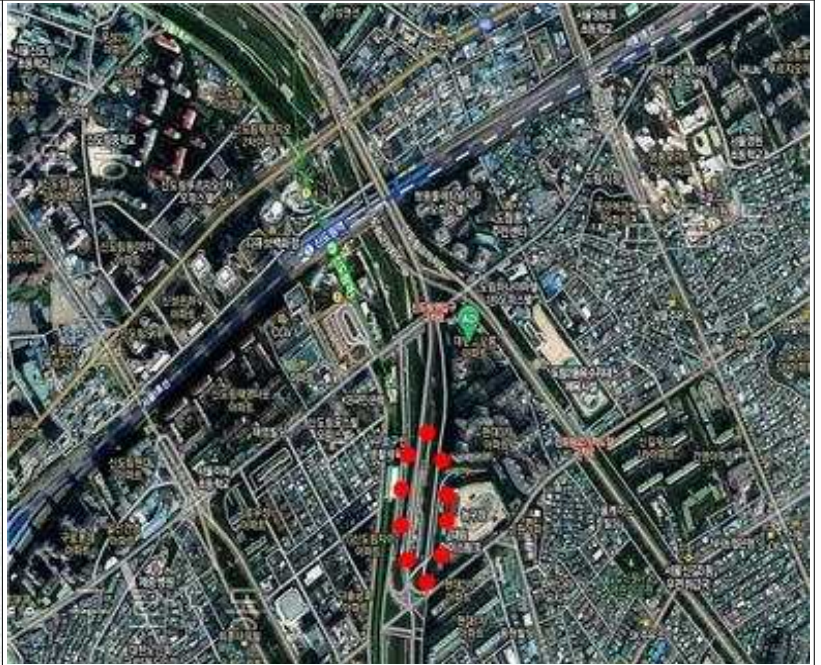

도림천(대림3동 빗물펌프장 인근)

□ 현황사진



안양천 둘레길



도림천 제방사면

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 위험수목 제거 및 수형조절 가지치기를 통해 위험요소를 사전 정비하여 쾌적하고 안전한 가로환경 제공

## □ 사업개요

- 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)
  - 위 치 : 문래로 등 관내 전노선, 양평가로녹지대 등 500주
  - 내 용 : 위험목, 민원 및 가로수 등 / 녹지대 수목제거 및 수형조절
  - 예 산 : 90,000천원(구비)
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2016. 1. 27. : 공사발주
    - 2016. 2. 15. : 공사착공
    - 2016. 12. 31. : 공사준공(예정)
- 겨울철 및 배전선로 하부 가로수 가지치기(완료)
  - 위 치 : 당산로 등 관내 약 57개 노선 5,811주  
(겨울철 990주, 배전선로 4,821주)
  - 내 용 : 시도로 및 한전 고압선 하부 가로수 가지치기 수형조절
  - 예 산 : 545,200천원(시 144,700, 한전 400,500)
  - 추진실적
    - 2016. 1. 28. : 공사발주(겨울철 가로수 가지치기)
    - 2016. 2. 01. : 공사착공(겨울철 가로수 가지치기)
    - 2016. 3. 17. : 공사준공(겨울철 가로수 가지치기)
    - 2016. 1. 28. : 공사발주(배전선로 하부 가로수 가지치기)
    - 2016. 2. 16. : 공사착공(배전선로 하부 가로수 가지치기)
    - 2016. 4. 06. : 공사준공(배전선로 하부 가로수 가지치기)
- 열린학교(학교공원) 수목정비사업(완료)
  - 위 치 : 대영초등학교 등 5개교
  - 내 용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 76주

- 예산 : 10,000천원(구비)
- 추진실적
  - 2016. 2. 04. : 공사발주
  - 2016. 2. 15. : 공사착공
  - 2016. 2. 22. : 공사준공

**□ 소요예산 : 645,200천원**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
645,200 (시 144,700, 구 100,000 한전 400,500)	615,053 (시 140,130, 구 100,000 한전 374,923)	95.32

**□ 현황사진**



가로수 가지치기 공사전



가로수 가지치기 공사후



위험수목 공사전



위험수목 공사후

공원 내 전기시설, 수경시설, 위험수목을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

## □ 사업개요

- 전기시설물 유지관리(연간단가)
  - 위 치 : 관내 공원, 마을마당, 녹지대 등
  - 내 용 : 공원등(740본/948등), 분전함 등 전기시설에 대한 연중 정비
  - 예 산 : 27,000천원(구비)
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2016. 1. 05. : 공사발주
    - 2016. 1. 12. : 공사착공
    - 2016. 12. 31. : 공사준공(예정)
- 공원내 CCTV 시스템 구축(완료)
  - 위 치 : 나루마을마당(당산2동)
  - 내 용 : CCTV 1개소 설치
  - 예 산 : 15,000천원(시비)
  - 추진실적
    - 2016. 7. 06. : 공사착공
    - 2016. 7. 30. : 공사준공
- 공원등 개선(완료)
  - 위 치 : 메낙골근린공원(신길동)
  - 내 용 : 노후 공원등 교체 6대 , 신규설치 4대로 쾌적한 공원 환경 조성
  - 예 산 : 63,000천원(시비)
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2016. 8. 30. : 공사착공
    - 2016. 10. 07. : 공사준공
- 공원 수경시설 유지관리(완료)
  - 위 치 : 영등포동 647-3 영일어린이공원 외 7개소  
(영등포동 중앙어린이공원, 당산1동 당산근린공원, 당산2동 꽃담  
소공원, 문래동 문래근린공원, 현대1·2차 차없는 거리, 신길5동  
꽃섬길마을마당, 대림3동 신우어린이공원)

- 내 용 : 노후 펌프 2개소, 밸브 5개소, 수위감지조절기 3개소 교체 등
- 예 산 : 25,000천원(구비)
- 추진실적
  - 2016. 4. 27. : 공사 발주
  - 2016. 5. 02. : 공사 착공
  - 2016. 5. 26. : 공사 준공

○ 공원내 수목 가지치기(완료)

- 위 치 : 자매공원 외 9개소(여의동 자매공원, 평화어린이공원, 영등포동 중마루공원, 서강어린이공원, 신길5동 신길공원, 당산2동 강마을어린이공원, 꽃담소공원, 노들마을마당, 도림동 고추말어린이공원, 신길3동 감나무마을마당)
- 내 용 : 가지치기 160주
- 예 산 : 20,000천원(구비)
- 추진실적
  - 2016. 3. 16. : 공사 발주
  - 2016. 3. 21. : 공사 착공
  - 2016. 4. 15. : 공사 준공

□ 소요예산 : 150,000천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
150,000 (시비 78,000, 구비 72,000)	111,780 (시비 76,440, 구비 35,340)	74.52

□ 현황사진(공원내 수목 가지치기)



주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

## □ 사업개요

### ○ 어린이공원 정비(완료)

- 위 치 : 대림3동 두암·신우, 대림2동 다사랑, 대림1동 대림어린이공원
- 내 용 : 조합놀이대 교체 1개소, 탄성포장 447m<sup>2</sup>/ 벤치 설치 14개소 / 영화상영게시대 설치 등
- 예 산 : 235,400천원(구비)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 3. 25. : 공사 발주
  - 2016. 4. 18. : 공사 착공
  - 2016. 7. 20. : 공사 준공

### ○ 공중화장실 환경개선(완료)

- 위 치 : 당산1동 당산근린공원, 영등포동 중앙어린이공원, 대림2동 다사랑어린이공원
- 내 용 : 양변기 5개소, 칸막이 교체 24m<sup>2</sup>, 세면기수전교체 9개 등
- 예 산 : 15,000천원(구비)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 5. 25. : 공사 발주
  - 2016. 5. 31. : 공사 착공
  - 2016. 8. 29. : 공사 준공

### ○ 도림로63길 가로수 바꿔심기

- 위 치 : 신길5동 도림로63길
- 내 용 : 은행나무 → 이팝나무 교체 73주
- 예 산 : 130,000천원(구 주민참여예산 50,000, 구비 추경 80,000)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 3. 10. : 공사발주
  - 2016. 4. 01. : 공사착공
  - 2016. 4. 28. : 공사준공(상반기 1단계 완료)
  - 2016. 9. 20. : 하반기 2단계 공사 발주
  - 2016. 10. 7. : 공사착공(공정율 20%)
  - 2016. 11. 5. : 공사준공(예정)

○ 은행나무 가로수 암, 수 교체(완료)

- 위 치 : 여의동 의사당대로, 여의대방로, 선유서로, 선유동1로 등
- 내 용 : 은행나무 암나무 → 수나무 교체 64주
- 예 산 : 100,000천원(구비)
- 추진실적
  - 2016. 4. 01. : 공사착공
  - 2016. 7. 13. : 공사준공

○ 마을단위 야외체육시설 설치

- 위 치 : 문래동 홈플러스 사잇길 등 13개소
- 내 용 : 체육시설 및 의자 설치, 수목 식재 등
- 예 산 : 230,000천원(시비 115,000, 구비 115,000)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2016. 4. 08. : 문래동 홈플러스 사잇길 야외체육시설 설치 완료(5점)
  - 2016. 6. 16. : 신길근린공원 내 노후 야외체육시설물 교체 완료(5점)
  - 2016. 8. 09. : 신길근린공원 체육시설물 설치공사 준공
  - 2016. 8. 16. : 도림배드민턴장 그늘막 정비공사 준공
  - 2016. 9. 01. : 원지어린이공원 등 야외체육시설물 설치 완료(4점)
  - 2016. 11.30. : 마을단위 야외체육시설 13개소 설치완료(예정)

□ 소요예산 : 710,400천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
710,400 (시비 115,000, 구비 595,400)	461,780 (시비 75,214, 구비 386,566)	65.0

□ 현황사진



어린이공원 정비 공사전



어린이공원 정비 공사후

도심 유휴공지를 활용하여 쉼터 및 녹지 등 녹색환경을 조성함으로써 생활 환경을 쾌적하게 하여 주민 만족도 증대

□ 사업개요

- 도시구조물 벽면녹화 사업(완료)
  - 위 치 : 대림3동 대림역7번 출구 주변
  - 내 용 : 식재기반조성, 벽면녹화 등
  - 예 산 : 30,000천원(시비-주민참여사업)
  - 추진실적
    - 2016. 6. 08. : 공사발주
    - 2016. 6. 15. : 공사착공
    - 2016. 8. 12. : 공사준공
- 생활주변 자투리땅 녹화사업(완료)
  - 위 치 : 당산1동 현대아파트 앞 공지
  - 내 용 : 녹지대 정비, 수목보식 등
  - 예 산 : 15,000천원(구비)
  - 추진실적
    - 2016. 3. 28. : 공사발주
    - 2016. 4. 11. : 공사착공
    - 2016. 4. 25. : 공사준공

□ 소요예산 : 145,000천원

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
45,000 (시 30,000, 구 15,000)	40,098 (시 27,598, 구 12,500)	89.1



□ 위치도 및 현황사진(생활주변 자투리땅 녹화사업)



□ 현황사진



자투리땅 녹화 - 공사전



자투리땅 녹화 - 공사후

### Ⅲ . 중점사업 추진실적

#### 1 영등포공원 유아숲 체험장 조성

영등포공원팀

도시공원 내 유아숲 체험장을 조성·운영하여 자연을 접하기 어려운 도시 아이들이 창의적이고 건강하게 성장할 수 있도록 숲체험 및 숲교육 기회를 제공하고자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 신길로 275(영등포본동) 영등포공원(물놀이장 인근)
- 규 모 : 약 2,000㎡
- 기 간 : 2016. 1. ~ 10.
- 내 용 : 자연형 놀이터, 숲체험 보조시설, 휴게시설 조성 등

#### □ 주요 추진실적

- 2016. 2. ~ 4. : 실시설계용역 시행
- 2016. 5. 19. : 서울시 설계심의
- 2016. 8. 25. : 계약심사 및 공사발주
- 2016. 9. 19. : 공사착공(10월15일 기준 : 공정율 80%)

#### □ 향후계획

- 2016. 10. 28. : 공사준공(예정)

#### □ 소요예산 : 100,000천원

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
100,000 (시 100,000)	6,980 (시 6,980)	6.91

□ 위치도 및 현황사진(영등포공원 유아숲체험장 조성)



위 치 도



현황사진

시설이 낙후되고 안전사고 위험이 있는 기존 친수공간을 오감이 즐거운 체험형 물놀이장으로 조성하여 주민 여가 활용 및 소통, 화합하는 공간으로 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 도림로47길 28(대림3동) 원지어린이공원
- 규 모 : 4,845 $m^2$ (물놀이장 약 200 $m^2$ )
- 기 간 : 2016. 1. ~ 6.
- 내 용 : 체험형 물놀이장 조성

### □ 주요 추진실적

- 2016. 1. 13. : 실시설계 용역 시행
  - 2016. 3. 15. : 추진계획 수립 및 공사발주
  - 2016. 4. 05. : 공사착공
  - 2016. 4. 28. : 조달청 우수조달제품 계약 체결
  - 2016. 4. 18. : 폐기물처리 용역 발주
  - 2016. 6. 30. : 공사준공
  - 2016. 7. 09. : 원지물놀이장 가동
  - 2016. 8. 31. : 물놀이장 가동 종료
- ※ 운영기간 중 연 이용 인원 약 27,800명

### □ 소요예산 : 320,000천원

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
320,000 (구 320,000)	289,321 (구 289,321)	90.41

□ 현황사진(원지어린이공원 물놀이장 조성)



조성 전



조성 후

매년 개최하고 있는 ‘도림동 장미마을 축제’ 와 연계하여 도림유수지 내 공지에 장미를 식재하고 노후 시설물을 정비함으로서 주민 커뮤니티 공간 제공 및 쾌적하고 아름다운 유수지 환경을 조성하고자 함

**□ 사업개요**

- 위    치 : 도림유수지(도림동 254)
- 규    모 : 2,000m<sup>2</sup>
- 기    간 : 2016. 1. ~ 6.
- 내    용 : 장미식재 및 노후시설물 정비 등

**□ 주요 추진실적**

- 2016. 2. 23. : 시 설계심의
- 2016. 3. 24. : 공사 발주
- 2016. 4. 18. : 공사 착공
- 2016. 6. 06. : 공사 준공

**□ 소요예산: 200,000천원**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
200,000 (시 200,000)	199,359 (시 199,359)	99.68

□ 위치도 및 현황사진(도림유수지 내 장미식재 사업)



위 치 도



현황사진 (공사 후)
