

제179회 영등포구의의회

제2차 정례회

교육·복지·사람 중심 새 영등포 

# 2013년 주요업무 보고



푸른 도시 과


# 보고 순서

I . 일 반 현 황	..	1
II . 2013 주요업무 실적	..	3
III . 2014 주요업무 계획	..	45

# I. 일반 현황

1

## 조직

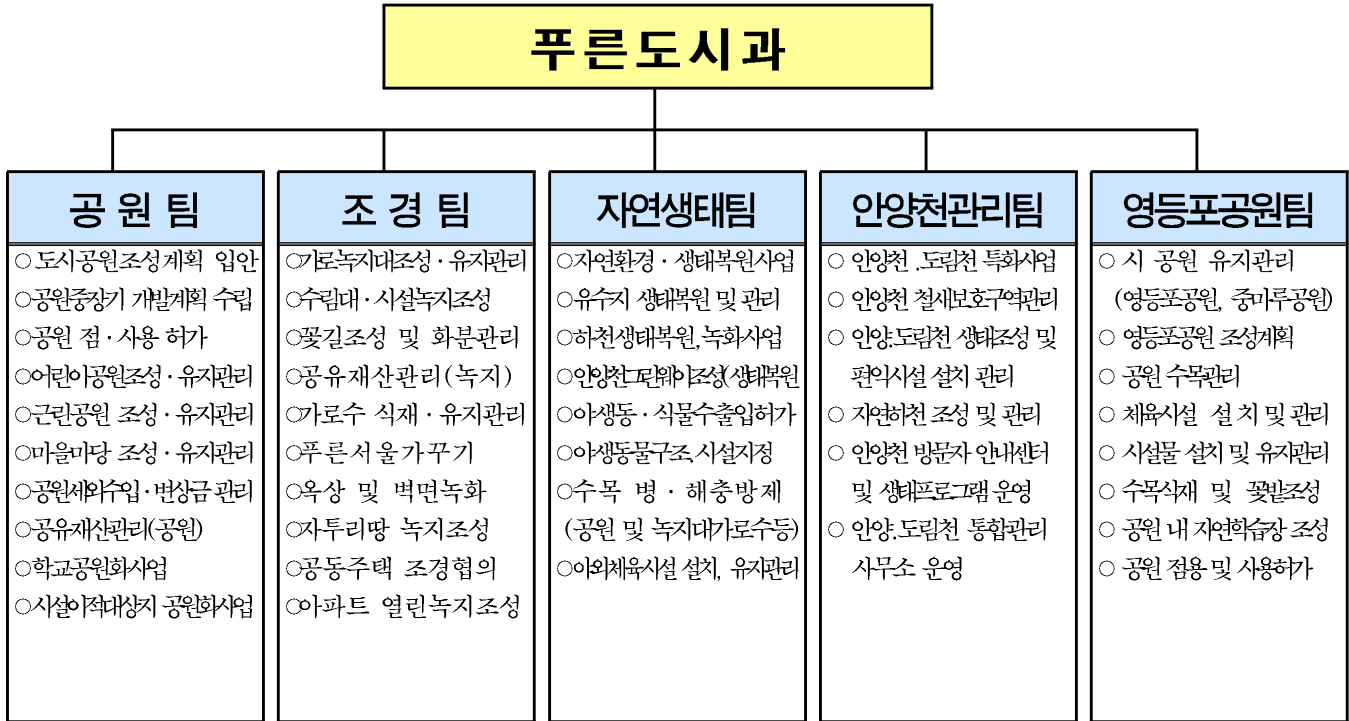

2

## 인력

구 분	계	일 반 직						기 능 직				별 정 · 계 약 직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	29		1	5	4	4	6		4	3	2				
현 원	29		1	5	6	7	1		6	3					
과부족	0				2	3	-5		2	0	-2				

### 3

### 주요시설 및 장비

구 분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	33	10	6	4	18	5	29	143	86개 노선	2종	54개소
면 적 (㎡)	605,645	543,463	135,517	407,946	54,637	7,545	15,151	581,482	16,094주	2주	22종 704점

### 4

### 예산 집행현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액		이 월 예상액	예 상 잔 액
		집행액 (10.31까지)	집행예정액 (12.31까지)		
계	7,737,176	5,217,536	1,505,599	0	1,014,041
공원녹지관리 수준향상	2,977,574	2,240,386	386,355	0	350,833
아름다운 환경 및 편리한시설 만들기	2,568,268	1,915,213	382,260	0	270,795
안양·도림천 특화	474,663	336,643	96,556	0	41,464
푸른공간 늘리기	987,113	270,910	479,090	0	237,113
행정운영 경비	664,653	403,603	147,214	0	113,836
보 전 지 출 (시도비반환금)	64,905	50,781	14,124	0	0

## II . 2013 주요업무 실적

연 번	사 업 명	쪽
①	문래동 물놀이장 조성 .....	5
②	영등포 올레길(생태순환길) 조성 .....	6
③	양평동 불량주택 밀집지역 공원화 .....	7
④	어린이공원 정비 .....	8
⑤	열린학교(학교공원화) 유지관리 .....	9
⑥	공중화장실 환경개선 사업 .....	10
⑦	공원시설물 정비 .....	11
⑧	노후마을마당 보수정비 사업 .....	12
⑨	경부제3녹지 조성사업 .....	13
⑩	대림로 가로수 바꿔심기 사업 .....	14
⑪	가로변 녹지량 확충사업 .....	15
⑫	가로수 생육환경 개선사업 .....	16
⑬	아파트 열린녹지 조성사업 .....	17
⑭	도시구조물 벽면녹화사업 .....	18
⑮	공공건물 옥상녹화사업 .....	19

연 번	사 업 명	쪽
-----	-------	---

16	가로수 보식 및 식재 .....	20
17	생활주변 자투리땅 녹화사업 .....	21
18	녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사 .....	22
19	양평유수지 생태복원 특화사업 .....	23
20	안양천 그린웨이 5차 조성사업 .....	24
21	마을단위 야외체육시설 설치 .....	25
22	문래동 게이트볼장 조성사업 .....	26
23	당산동 지정보호수 쉼터 조성사업 .....	27
24	안양천 제방산책로 수목보식공사 .....	28
25	영등포공원 배드민턴장 정비사업 .....	29
26	영등포공원 시설 정비사업 .....	30
27	시공원 보수정비사업 .....	31

도심 내 접근이 편리하고 다양한 계층이 이용 가능한 물놀이장을 조성하여 가족과 함께 여가를 즐기면서 주민 소통, 화합을 위한 공간으로 제공함으로써 주민 만족도를 향상함

### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 문래동 3가 94-1번지(문래 목화마을마당)
- 사업내용 : 물놀이시설 7종 11개, 막구조 파고라 1개, 등 의자 23개소, 고무칩 포장 211㎡, 종합안내판 1개소 등
- 규 모 : 3,311㎡(물놀이장 조성 500㎡)
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 7.

### □ 추진실적

- 2013. 1. 15 ~ 3.25 : 실시설계용역 시행
- 2013. 3. 12 : 물놀이장 조성 변경계획 수립
  - 구청장 동 신년인사회(2013.01.28)시 주민 반대 및 재검토 요구
  - 주민 의견 반영 및 위치 변경(문래공원 → 문래 목화마을마당)
- 2013. 4. 4 : 공사 발주
- 2013. 4. 22 : 공사 착공
- 2013. 7. 10 : 공사 준공
- 2013. 7. 15 ~ 8.31 : 물놀이장 운영 및 유지관리

### □ 소요예산 : 550,000천원 - 구비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
550,000천원 (구비)	488,476천원 (구비)	89%

한강, 샛강, 여의도 지역의 명소 및 경관이 우수한 지역에 노약자, 어린이 등을 포함한 구민 모두가 편안하게 이용할 수 있는 영등포 올레길을 조성하여 구민 건강 증진에 기여함

### □ 사업개요

- 위 치 : 한강, 샛강, 여의도 구간 11.3km
- 사업내용 : 휴게시설 및 안내시설 설치
  - 휴게시설 : 야외탁자 2개, 등 의자 8개 설치
  - 안내시설 : 102개(종합안내판 5개, 노선안내판 12개, 시설안내판 10개, 방향안내판 15개, 길안내판 60개) 설치
- 사업기간 : 2013. 2. ~ 11.

### □ 추진실적

- 2013. 2. 6 : 계약심사 의뢰(감사담당관)
- 2013. 2. 15 : 실시설계용역 시행(2.21~6.10)
- 2013. 6. ~ 9. : 한강사업본부 및 서울지방국토관리청 협의
- 2013. 9. 17 : 공사 발주
- 2013. 9. 24 : 공사 착공

### □ 소요예산 : 320,000천원 - 구비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
320,000천원 (구비)	124,460천원 (구비)	39%

※ 기관(한강사업본부) 협의사항(시설물 설치 축소) 반영 및 예산절감

### □ 향후계획

- 2013. 11. 22 : 공사 준공



양평동 2가 41-5일대는 노후불량주택 밀집지역으로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성함으로써 주민에게 쾌적한 녹지환경 제공함

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동2가 41-5번지 외 31필지
- 규 모 : 1,109.5 $m^2$
- 사업기간 : 2009. 4. ~ 2013. 11.
- 내 용 : 불량주택 밀집지역 내 토지보상 및 마을마당 조성

#### □ 추진실적

- 2009. 4. 29 : 영등포구 투자사업 결정
- 2009. 9. 7 : 도시계획시설(공공공지)결정 및 지적고시
- 2011. 10. 6 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획 인가고시
- 2012. 12. 24 : 양평동 불량주택 밀집지역 공원화사업 조경공사 착공
- 2013. 4. 3 : 토지, 지장물, 영업권 등 보상 완료
- 2013. 5. 22 : 양평동 공원화사업 지장물 철거공사 착공
- 2013. 8. 30 : 양평동 공원화사업 지장물 철거공사 준공

#### □ 소요예산 : 3,959,000천원 - 특별교부금 93%, 구비 7%

- 2012년 : 사고이월 737,000천원  
(공사비 339,000, 보상비 392,000, 시설부대비 6,000)
- 2013년 : 250,000천원(지장물 철거공사)

예산액	집행액	집행율(%)
3,959,000천원 (특별교부금3,700,000, 구비259,000)	3,240,935천원 (특별교부금3,172,475, 구비68,460)	82%

※ 공사비 461,103천원(조경 418,484천원/전기 32,119천원/통신 10,500천원)

#### □ 향후계획

- 2013. 11. 30 : 시설공사 준공(조경, 전기, 통신)

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상

#### □ 사업개요

- 위 치 : 신우어린이공원 외 4개소
- 사업내용
  - 신우공원(대림3동) : 소규모 물놀이장(56㎡) 조성
  - 다사랑공원(대림2동) : 조합놀이대 1조 교체, 모래철거, 고무매트설치
  - 양남공원(양평1동) : 조합놀이대 정비, 데크 정비 등
  - 대림공원(대림1동) : 조합놀이대 미끄럼틀 정비
  - 고추말공원(도림동) : 운동공간 내 횡단배수로 설치 등
- 사업기간 : 2013. 2 ~ 6

#### □ 추진실적

- 2013. 2. 4 : 실시설계용역 시행 (02.07~03.18)
- 2013. 4. 29 : 공사착공
- 2013. 6. 27 : 공사 준공

#### □ 소요예산 : 184,000천원 - 구비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
184,000천원 (구비)	161,497천원 (구비)	88%

열린학교 조성사업 대상 학교 내 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지 환경 제공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 윤중중학교 외 5개소
- 사업내용 : 학교공원화사업 수목 버즘나무 외 6종 141주 정비
  - 윤중중(여의동) : 낙엽수 30주, 상록수 1주 가지치기
  - 영림초(대림2동) : 낙엽수 16주 가지치기, 위험수목 2주 제거
  - 대길초(신길6동) : 낙엽수 34주 가지치기
  - 여의도초교(여의동) : 낙엽수 34주 가지치기, 위험수목 4주 제거
  - 도신초교(대림3동) : 낙엽수 18주 가지치기
  - 당산서중(당산2동) : 낙엽수 2주 가지치기
- 사업기간 : 2013. 2 ~ 4.

#### □ 추진실적

- 2013. 2. 28 : 현장 조사
- 2013. 3. 6 : 계약심사 요청
- 2013. 3. 11 : 공사발주
- 2013. 3. 14 ~ 4. 2 : 공사 시행 및 준공

#### □ 소요예산 : 20,000천원 - 구비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
20,000천원 (구비)	17,800천원 (구비)	89%

도시공원 내 노후한 공중화장실 시설을 개선하여 이용주민에게 편안하고 쾌적한 공원환경 제공

**사업개요**

- 위 치 : 대림어린이공원(대림로 106,대림1동) 등 4개소
  - 당산근린공원(당산로 27길13,당산동3가)
  - 양남어린이공원(양평1동 205)
  - 동심어린이공원(대림3동 742)
- 규 모 : 노후시설 교체 등
- 사업기간 : 2013. 2. ~ 6.
- 내 용

연번	공 원 명	공 종	내 용
1	동심공원	건축	타일붙임 22㎡, 강화도어 1개, 칸막이 1세트, 천장재 4㎡ 등
		설비	배기휀 1대, 방열기 1세트, 대변기/소변기 1세트 등
2	양남공원	건축	타일붙임 15㎡, 강화도어 1개, 칸막이 8㎡, 천장재 8㎡ 등
		설비	배기휀 2대, 방열기 2세트, 대변기/소변기 2세트 등
3	대림공원	건축	타일붙임 3㎡, 강화도어 2개, 칸막이 31㎡, 천장재 34㎡ 등
		설비	배기휀 2대, 방열기 2세트, 화장지걸이 6개 등
4	당산공원	시설	잔디보호휀스 80경간

**추진실적**

- 2013. 2. 5 : 실시설계 용역 시행
- 2013. 4. 3 : 실시설계 용역 준공
- 2013. 5. 2 : 공사 착공
- 2013. 6. 12 : 공사준공

**소요예산 : 65,000천원 - 구비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
65,000천원 (구비)	56,286천원 (구비)	86%

파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의시설을 확충하여 공원환경 개선에 기여함

### □ 사업개요

- 위 치 : 당산근린공원 등 15개소
- 규 모 : 도시공원 및 마을마당 시설정비
- 사업기간 : 2013. 2. ~ 9.
- 내 용 : 노후시설 교체 및 보수, 바닥포장, 체력단련시설 설치 등

연 번	공 원 명	위 치	정 비 대 상
1	당산공원	당산1동 385	고무매트포장 95㎡, 안내판 설치 등
2	신길공원	신길5동 341-3	고무칩포장 297㎡, 투수블럭포장 283㎡ 등
3	메낙골공원	신길1동 4934-4	바닥분수 정비, 회양목 등 4종 670주 등
4	평화공원	여의도동 50-2	사각파고라 2개소, 등의자 12개소 등
5	차없는거리	문래동 45-1	차없는거리 132경간, 투수블럭포장 38㎡ 등

### □ 추진실적

- 2013. 2. 14 ~ 3. 19 : 실시설계용역 시행
- 2013. 4. 22 ~ 6. 20 : 상반기 공원시설물 정비공사 시행
- 2013. 8. 28 ~ 9. 21 : 하반기 공원시설물 정비공사 시행

### □ 소요예산 : 355,816천원 - 구비 100%

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
355,816천원 (구비)	314,157천원 (구비)	88%

시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 찾고 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소인 마을마당을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소로 제공함

□ 사업개요

- 위 치 : 분수마을마당(양평2동 3가 97-2) 등 2개소  
- 나루마을마당(당산2동 121-101)
- 규 모 : 마을마당 2개소 시설 정비
- 사업기간 : 2013. 3 ~ 6.
- 내 용

연번	공 원 명	공 종	내 용
1	나루마을 마당	식재공	관목(회양목 등 2종 800주), 초화류(맥문동 등 7종 4,720본)
		시설공	사각파고라 1개소, 등의자 9개소, 체육시설 2개소, 블라드 3개소, 안내판 1개소, 수목표찰 9개소, 태양광정원등 7개소
2	분수마을 마당	식재공	관목(동근주목이식 등 3종 330주), 초화류(구절초 등 5종 660주)
		시설공	데크계단 1개소, 정자도색 1개소, 등의자 2개소 체육시설 2개소, 수목보호판 5개소, 블라드 2개소, 태양광블럭 5개소, 안내판 1개소, 수목표찰 8개소
		포장공	투수콘크리트블럭 165㎡, 판석포장 3㎡

□ 추진실적

- 2013. 4. 4 : 자체설계 완료
- 2013. 4. 18 : 공사 발주
- 2013. 4. 29 : 공사 착공
- 2013. 6. 12 : 공사 준공

□ 소요예산 : 100,000천원 - 시비 100%

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000천원 (시비)	92,210천원 (시비)	92%

장기미집행 도시계획시설인 경부제3녹지에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 녹지 기능을 회복시킴으로써 철도변 소음, 진동 등 공해를 완화하고 쾌적한 도시환경을 조성함

### □ 사업개요

- 위 치 : 경부제3녹지(신길1동 68-3번지 일대 대방역 ~ 신길역 구간)
- 규 모 : 7,912 $m^2$
- 기 간 : 2007. 11. 15 ~ 2013. 12. 31.(계속사업)
- 내 용 : 소나무, 철쭉 등 26종 20,594주 식재(교목 1,744주 / 관목 18,850주), 성토 8,163 $m^3$ , 집수정 4개소, 배수로 688m 등

### □ 추진실적

- 2013. 1. ~ 3. : 실시설계, 설계심의(서울시 조경과), 계약심사
- 2013. 3. 22 : 공사 발주
- 2013. 4. 12 : 공사 계약
- 2013. 4. 15 : 공사 착공
- 2013. 7. 25 : 텃밭조성 및 분양완료(배추 3,500, 무 1,500)
- 2013. 10. 15 : 설계변경사항 검토보고(지하주차장 건립 등)  
- 텃밭 조성, 수목식재, 배수로 설치 중

### □ 소요예산 : 988,000천원 - 시비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
988,000천원 (시비 도시개발특별회계)	931,640천원 (시비 도시개발특별회계)	94%

### □ 향후계획

- 2013. 12. 31 : 공사 준공

대림로의 기존 버즘나무 가로수를 왕벚과 이팝나무로 바꿔 심어 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 대림로(대림3동 빗물펌프장~대림2동 시흥대로)
- 규 모 : 297주(제거 147주, 식재 150주)
- 기 간 : 2013. 1. ~ 5.
- 내 용 : 버즘나무 147주 제거, 가로수 150주 식재  
(왕벚 127주, 이팝 23주 식재, 가로수보호관 150조 설치)
- ※ 2012년 실적 : 왕벚나무 84주, 이팝나무 133주 식재, 가로수보호관 229조 설치

**□ 추진실적**

- 2013. 2. 1 : 계약심사 및 일상감사 의뢰
  - 2013. 2. 18 : 공사 발주
  - 2013. 3. 18 : 공사 착공
  - 2013. 5. 26 : 공사 준공
- [버즘 147주 제거, 왕벚 127주, 이팝 23주 식재(이식포함), 보호관 150조 설치]

**□ 소요예산 : 300,000천원 - 구비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
300,000천원 (구비)	273,148천원 (구비)	91%



차량 통행이 빈번한 영등포로터리 및 서부간선로 사면에 꽃과 단풍이 아름다운 다양한 수목을 식재하여 녹지량을 확충하고 쾌적한 가로경관을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포동 영등포로터리 사면(신길역 방향),  
양평2동 서부간선로 사면(양평교 ~ 성산대교구간 방향)
- 규 모 : 3,900m<sup>2</sup>(영등포로 1,100m<sup>2</sup> / 서부간선로 2,800m<sup>2</sup>)
- 기 간 : 2013. 1. ~ 8.
- 내 용 : 왕벚나무, 조팝나무 등 10종 3,617주  
수크림, 맥문동 등 10종 129,370본  
법면블럭 철거 및 옹벽 설치 등

□ 추진실적

- 2013. 1 ~ 4월 : 실시설계, 설계심의(서울시 조경과), 계약심사
- 2013. 4. 18 : 공사 발주
- 2013. 5. 16 : 공사 계약
- 2013. 5. 20 : 공사 착공
- 2013. 8. 2 : 공사 준공

□ 소요예산 : 300,000천원 - 시비 100%

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
300,000천원 (시비)	257,591천원 (시비)	86% (42,409)

도심 가로수의 정상적인 성장을 위한 생육환경을 개선하고 떠죽지 보식 및 정비를 통하여 쾌적한 보행환경을 조성

**사업개요**

- 위 치 : 국회대로(여의도동) 등 4개노선(국회대로, 여의서로, 여의동로, 당산로)
- 규 모 : 1,610m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 1. ~ 11.
- 내 용
  - 1) 국회대로 : 둥근소나무 등 7종 2,027주, 식생매트 96m<sup>2</sup> 식재 등
  - 2) 여의서로 : 산수유 등 7종 15,110주, 줄사철 10,000본 등
  - 3) 여의동로 : 왕벚나무 등 7종 3,278주, 식생매트 160m<sup>2</sup> 식재 등
  - 4) 당산로 : 떠죽지보호판 115m 설치 등

**추진실적**

- 2013. 3. 11 : 실시설계용역 발주
- 2013. 3. 27 : 실시설계용역 착수
- 2013. 4. 11 : 설계심의
- 2013. 5. 09 : 용역 준공
- 2013. 8. 22 : 공사발주
- 2013. 9. 23 : 공사착공
  - 국회대로 떠죽지 조성 등 진행 중

**소요예산 : 400,000천원 - 시비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
400,000천원 (시비)	332,455천원 (시비)	83%

**향후계획**

- 2013. 11월 : 공사 준공

아파트 담장을 철거하고 부족한 생활권 녹지를 확충하여 녹시율을 높이고 쾌적한 주거환경을 조성하여 주민에 대한 행정 신뢰도 제고

**□ 사업개요**

- 위 치 : 문래동 유원아파트(문래북로 22)-1개동 134세대
- 규 모 : 370m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 3. 7 ~ 5. 5
- 내 용
  - 시설물공사 : 조경석 쌓기 100m, 평의자 2개소, 등의자 2개소, 웬스 51경간 등, 파고라 정비 1동
  - 식재공사 : 관목(사철나무·철쭉 등) 6종 3,420주, 교목(왕벚나무) 10주, 초화류 아이비 600본
  - 철거공사 : 담장철거 36경간, 철제웬스 철거 31경간, 향나무 제거 34주, 평의자 7개소 등

**□ 추진실적**

- 2013. 1. 28 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2013. 2. 14 : 공사 발주
- 2013. 3. 7 : 공사 착공
- 2013. 5. 5 : 공사 준공

**□ 소요예산 : 100,000천원 - 구비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000천원 (구비)	74,960천원 (구비)	75%

도시미관을 저해하는 콘크리트 담장, 건축물 및 옹벽 등 녹화사업을 시행하여 도시미관 향상 및 쾌적한 가로경관을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 4개소
  - 대림3동 우성2차아파트 담장(87m),
  - 당산2동 당서초등학교 방음벽(112m)
  - 당산1동 국립농산물품질관리원 시험연구소(101m)
  - 양평1동 오목교 방음벽(50m)
- 규 모 : 350m(224m<sup>2</sup>)
- 기 간 : 2013. 1 ~ 9월
- 내 용 : 식재기반조성 후 관목류(덩굴장미 등 2종, 982주) 및 덩굴식물(담쟁이 등 7종 13,610본) 식재

□ 추진실적

- 2013. 5. 2 : 시 설계심의(서울시 조경과)
- 2013. 5. 20 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2013. 7. 1 : 공사착공
- 2013. 9. 30 : 공사준공

□ 소요예산 : 65,393천원 - 시비 100%

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
65,393천원 (시비)	55,226천원 (시비)	84%

별도의 토지보상 없이 공공기관 옥상의 빈 공간을 이용하여 녹화를 함으로 도심지내 녹지 및 생물서식공간 확보, 대기질 개선, 에너지 절약을 하는 등 도심 열섬화 현상 완화

**□ 사업개요**

- 위 치 : 영등포동 서울시 근로자복지관(영신로 200)
- 규 모 : 154.8m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 1. ~ 8.
- 내 용 : 구조안전진단, 옥상방수·방근처리, 수목(교목: 산수유 등 2종 6주, 관목: 사철나무 등 7종 975주) 및 초화류 (꽃무릇 등 10종 585본) 식재 등

**□ 추진실적**

- 2013. 3. 18 : 구조안전진단용역 시행
- 2013. 4. 17 : 실시설계용역 시행
- 2013. 5. 8 : 시 설계심의(서울시 조경과)
- 2013. 5. 27 : 계약심사 및 일상감사 요청
- 2013. 7. 1 : 공사착공
- 2013. 8. 29 : 공사준공

**□ 소요예산 : 58,000천원 - 시비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
58,000천원 (시비)	49,619천원 (시비)	85%

**※ 민간 옥상 녹화 : 돈보스고 유치원(도림동 성당)**

- 소요예산 : 65,610천원(시비 32,805, 자비 32,805)
- 공사내용 : 식재기반(배수처리 등) 조성 및 수목식재 등

관내 가로수 결주지에 수목식재 및 보행에 지장을 주는 저축 수목을 정비하여 쾌적한 보행환경 조성하고 도림로의 가로수를 바꿔심어 혹병으로 인한 안전사고를 예방하고 민원을 해소함.

**□ 사업개요**

- 위 치 : 도림로 등 관내 11개 노선
- 규 모 : 75주(보식 27주, 바꿔심기 48주)
- 기 간 : 2013. 2. ~ 11.
- 내 용 : 가로수 보식 27주, 도림로 가로수 바꿔심기(회화→왕벚) 48주

**□ 추진실적**

- 가로수 보식 및 정비공사
  - 2013. 2. 7 ~ 3. 8 : 실시설계용역 시행
  - 2013. 4. 19 : 공사발주
  - 2013. 5. 8 : 공사착공
  - 2013. 7. 16 : 공사준공
- 도림로 가로수 바꿔심기사업
  - 2013. 3. 28 : 서울시 도시공원위원회 심의 상정
  - 2013. 3. 29 : 예산배정요구
  - 2013. 5. 1 : 도시공원위원회 심의
  - 2013. 5. 9 : 심의결과시달 - 부결
  - 2013. 9. 16 : 도림로 가로수 바꿔심기 사업계획 수립
  - 2013. 9. 30 : 공사발주
  - 2013. 11.15 : 공사준공

**□ 소요예산 : 120,000천원 - 구비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
120,000 (구비)	86,616 (구비)	72%

도심 생활권의 자투리 땅에 쓰레기 무단 투기로 지속적인 민원이 유발됨에 따라 이 지역을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸어 주민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른도시를 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양평2동 당산초등학교 옆(선유로 55길32) 등 5개소  
 당산2동 강마을 삼성아파트 입구, 신길로 우성아파트 담장길,  
 신길6동 남서울교회 앞, 신길1동 동산선원 앞
- 규 모 : 400m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 1. ~ 6.
- 내 용 : 바닥테크 철거 및 점토블럭 포장 145m<sup>2</sup>,  
 수목 식재(덩굴장미 등 6종 650주, 수크령 등 6종 1,600본) 등

□ 추진실적

- 1차 공사 : 신길6동 남서울교회 앞 외 3개소
  - 2013. 3. 18 : 공사 발주
  - 2013. 3. 25 : 공사 착공
  - 2013. 4. 19 : 공사 준공
- 2차 공사 : 양평2동 당산초교
  - 2013. 5. 3 : 공사 발주
  - 2013. 5. 9 : 공사 착공
  - 2013. 6. 5 : 공사 준공

□ 소요예산 : 50,000천원 - 구비 100%

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
50,000천원 (구비)	40,245천원 (구비)	92%

기상이변으로 고사하거나 교통사고로 훼손된 녹지대 수목을 연중 수시로 보식하고 노후 시설물을 정비하여 아름답고 쾌적한 녹지대 환경을 조성

**사업개요**

- 위    치
  - 도림천 가로녹지
  - 양평2동 양평가로녹지 등 관내 녹지대
- 규    모 : 300m<sup>2</sup>
- 기    간 : 2013. 1. ~ 11.
- 내    용 : 녹지대 수목 보식 300m<sup>2</sup>, 노후 시설물 정비 등 수시 시행

**추진실적**

- 구비 예산 여건을 고려하여 시비로 추진중인 ‘가로변 녹지량 확충사업’에 양평2동 양평가로녹지 목재 계단 정비 및 철쭉류 보식

**소요예산 : 30,000천원 - 구비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
30,000천원 (구비)	21,500천원 (구비)	72%

**향후계획**

- 2013. 11. 30. : 공사 준공



양평유수지의 저수기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 오염토양치환, 토양정화 수생초화류 및 수목식재, 시설보완을 통해 유수지 악취를 저감하고 자연생태를 복원하여 주민휴식공간으로 재조성함

□ 사업개요

- 위 치 : 양평1동 양평동3가 57 (국회대로 22길 20) 양평제1유수지
- 규 모 : 34,000 $m^2$
- 기 간 : 2012. 1. ~ 2013. 5. (사고이월)
- 내 용
  - 토목공사 : 토양치환 1,400 $m^2$ (T30cm), 성토 및 면고르기 6,900 $m^2$
  - 시설공사 : 연못조성 500 $m^2$ , 분수 2기, 상수도인입 1식, CCTV 3대, 보행데크 난간보수 1,258경간, 태양광정원등 62개소, 수목터널 4개소, 화단 8개소, 등 의자 10개소 설치 등
  - 식재공사 : 교목 낙우송 등 4종 125주, 관목 갯버들 등 3종 5,500본, 초화류 창포 등 9종 36,450본, 덩굴식물 덩굴장미 등 3종 180본

□ 추진실적

- 2012. 1.11 : 사업추진계획수립
- 2012. 2. 3 ~ 3.28 : 기술용역타당성심사, 설계용역비재배정
- 2012. 3.28 ~ 9.17 : 설계용역시행, 주민설명회, 설계심의, 계약심사
- 2012.11.28 : 공사착공
- 2013. 5.15 : 공사준공

□ 소요예산 : 627,000천원 - 시비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
627,000천원 (시비)	503,581천원 (시비)	80.3%

안양천 제방사면의 환삼덩굴, 쇠뜨기 등 생태계 교란·유해식물 제거, 다양한 초화류 및 화목류 식재를 통해 자연생태를 복원하고 하천경관을 향상시켜 자연과 사람이 어우러지는 산책로를 조성함

□ 사업개요

- 위 치 : 양평2동 안양천 우안 제방사면 목동교~양평교 구간
- 규 모 : 15,682 $m^2$  (L=1,075m)
- 기 간 : 2012. 1. ~ 2013. 6. (사고이월)
- 내 용
  - 철거공사 : 호안블록면정리 5,646 $m^2$ , 콘크리트경계석철거 205m
  - 토 공 사 : 외부토사운반 1,412 $m^3$ , 성토 1,412 $m^3$ , 성토면고르기 5,646 $m^2$
  - 식재공사 : 금계국 등 5종 식물매트식재 5,574 $m^2$ , 조팝나무 2,200주, 줄사철 240본, 버드나무전정 278주, 버드나무벌목 25주
  - 시설물공 : 식재기반조성 5,646 $m^2$ , 쓸라블록 110개소, 종합안내판 1개소
  - 포장공사 : 탄성포장 2,950 $m^2$ , 화강석경계석 1,023m
  - 우배수공 : 배수관설치 유공관 1,017m, PVC관 589m
  - 관수공사 : 옥외관로배관공사 1식, 펌프설치 1식 등

□ 추진실적

- 2012. 1.10 : 사업추진계획수립
- 2012. 1.30~ 2.21 : 기술용역타당성심사, 설계용역비재배정
- 2012. 3. 5~ 8.28 : 설계용역시행, 주민설명회, 설계심의, 계약심사
- 2012. 8.24~10.19 : 서울지방국토관리청 하천점용허가
- 2012.11.21 : 공사착공
- 2013. 6.14 : 공사준공

□ 소요예산 : 950,000천원 - 시비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
950,000천원 (시비)	800,722천원 (시비)	84.3%

늘어나는 웰빙인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 생활권 녹지대, 근린공원, 어린이공원 등에 야외체육시설을 설치하고 노후화된 시설물을 새롭게 정비하여 구민건강 증진 및 생활체육 활성화에 기여함

**사업개요**

- 위 치 : 거성체련장 외 12개소
- 규 모 : 5,500㎡
- 기 간 : 2013. 4. ~ 10.
- 내 용 : 공원, 녹지대 등 야외운동기구 설치 및 정비

연번	위치	기구명	수량	비고
1	거성체련장	마라톤운동기구	1	
		허리돌리기	1	
2	영일어린이공원	등허리지압기	1	
		옆파도타기	1	
3	고추말어린이공원	온몸근육풀기	1	
4	중마루공원	온몸근육풀기	1	
5	신길근린공원	윗몸일으키기	1	
		거꾸로매달리기	1	
6	영등포공원	양팔줄당기기	1	
7	대방천체련장	옆파도타기	1	
8	신선마을마당	옆파도타기	1	
9	쌍용플래티넘씨티	양팔줄당기기	1	
10	메낙골공원	양팔줄당기기	1	
11	당산근린공원	허리돌리기	1	
12	문래근린공원	허리돌리기	1	
13	양평유수지	평행봉	1	
	계		16	

**추진실적**

- 2013. 4. : 대상지 조사
- 2013. 5. : 설치공사 시행
- 2013. 10. : 공사준공

**소요예산 : 50,000천원 - 구비 100%**

예산액	집행액	집행율(%)
50,000천원 (구비)	42,500천원 (구비)	85%

문래동에 노년층이 쉽게 이용할 수 있는 게이트볼장을 조성하여 이용객의 건강 및 여가생활 공간을 확보하고자 함

**□ 사업개요**

- 위 치 : 문래동 3가 66 문래근린공원
- 규 모 : 300m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2013. 8. ~ 11.
- 내 용 : 게이트볼장 1면 설치(15×20m)

**□ 추진실적**

- 2013. 8. 27 : 사업추진계획 수립
- 2013. 8. 28 ~ 9. 13 : 실시설계용역
- 2013. 9. 16 : 공사발주
- 2013.10.16 : 공사착공
- 2013.11.20 : 공사준공

**□ 소요예산 : 100,000천원 - 구비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000천원 (구비)	80,000천원 (구비)	80%

지정보호수의 건전한 성장을 위하여 생육환경을 개선하고 주민의 쾌적하고 편안한 이용을 위한 휴게공간을 조성함

**□ 사업개요**

- 위 치 : 당산2동 강마을공원(당산동6가 10-7) - 은행나무  
양평동4가 양평교회(양평로20길 7) - 둥근잎느티나무
- 규 모 : 270㎡, 지정보호수 2주
- 기 간 : 2013. 2. ~ 9.
- 내 용
  - 쉽터조성공사 : 계단정비 3개소, 점토블럭포장 309㎡, 웬스설치 34m, 목재계단 집입부 이설, 구절초 등 7종 초화류 식재 등
  - 생육환경개선 : 외과수술, 전정, 영양제 수간주사, 병해충방제 등

**□ 추진실적**

- 2013. 1. 25 : 사업추진계획시달
- 2013. 1. 31 : 기술용역타당성심사의뢰
- 2013. 2. 7 : 설계용역부적정통보, 자체설계시행시달
- 2013. 4. 17 : 설계심의요청
- 2013. 5. 27 : 일상감사 및 계약심사요청
- 2013. 6. 28 : 당산동 지정보호수 쉽터조성공사 발주
- 2013. 7. 17 : 지정보호수 쉽터조성공사 발주
- 2013. 8. 31 : 지정보호수 쉽터조성공사 준공
- 2013. 9. 30 : 당산동 지정보호수 쉽터조성공사준공

**□ 소요예산 : 75,500천원 - 시비 100%**

예산액	집행액	집행율(%)
75,500천원 (시비)	69,438천원 (시비)	92%

안양천 제방산책로에 왕벚나무를 보식하여 관내 걷고싶은길 명소로 조성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 안양천 제방산책로(신정교~오목교 구간)
- 규 모 : 왕벚나무 16주(B15)
- 기 간 : 2013. 4. ~ 5.
- 내 용 : 왕벚나무 보식

**□ 추진실적**

- 2013. 4. 25 : 계약 심사
- 2013. 5. 2 : 공사 발주
- 2013. 5. 9 : 공사 착공
- 2013. 5. 29 : 공사 준공

**□ 소요예산 : 20,000천원 - 구비 100%**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
20,000천원 (구비)	14,850천원 (구비)	74%

**□ 향후계획**

- 미보식 구간(오목교~양화교 사이)은 예산 반영후 순차적 보식 계획

영등포공원 이용객의 다수를 차지하고 있는 청·장년층을 배려한 배드민턴장의 노후 시설을 개선하여 이용주민에게 편의제공 및 공원이용 활성화

#### □ 사업개요

- 위 치 : 신길로 275(영등포동) 배드민턴장
- 규 모 : 1,200 $m^2$
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 5.
- 내 용 : 배드민턴장 라인벨트 및 폴대 교체, 물품보관함 설치 등

#### □ 추진실적

- 2013. 1. 30 : 추진계획 수립
- 2013. 3. 15 : 서울시 설계심의(공원녹지정책과)
- 2013. 3. 26 : 계약심사
- 2013. 4. 8 : 공사착공
- 2013. 5. 2 : 공사준공

#### □ 소요예산 : 18,384천원 - 시비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
20,000천원 (시비)	18,384천원 (시비)	92%

공원내 노후된 음악분수 및 생태개울 등의 수경시설을 새롭게 정비하고 잔디광장에 수목과 잔디를 식재하여 주민들의 활용도 높은 공원으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길로 275(영등포동) 영등포공원 일대
- 규 모 : 3,700m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2013. 2. ~ 9.
- 내 용 : 음악분수대 및 생태개울 정비, 잔디광장 및 원형광장 정비 등

□ 추진실적

- 2013. 2. 26 : 기술용역 타당성 심사
- 2013. 3. 18 : 실시설계 용역계약
- 2013. 5. 4 : 실시설계용역 준공
- 2013. 5. 6 : 서울시 설계심의(공원녹지정책과)
- 2013. 5. 21 : 계약심사 및 일상감사
- 2013. 6. 14 : 공사발주
- 2013. 7. 4 : 공사계약
- 2013. 7. 15 : 공사착공
- 2013. 9. 12 : 공사준공

□ 소요예산 : 145,587천원 - 시비 100%

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
150,000천원 (시비)	145,587천원 (시비)	97%



시공원(영등포공원)의 게이트볼장에 인조잔디를 설치하고, 배드민턴장 옆에 방풍용 수목을 식재하며 공원 전기시설을 정비코자 함

사업개요

- 위 치 : 신길로 275(영등포동) 영등포공원 일대
- 규 모 : 8,000m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2013. 5. ~ 11.
- 내 용 : 게이트볼장 인조잔디 설치, 배드민턴장 수목 식재 등

추진실적

- 2013. 5. 16 : 추진계획 수립
- 2013. 5. 28 : 기술용역타당성심사(기술심사담당관)
- 2013. 6. 24 : 실시설계 용역 계약
- 2013. 8. 2 : 서울시 설계심의 개최
- 2013. 8. 5 : 주민설문조사 실시
- 2013. 8. 28 : 서울시 예산 재배정 통보
- 2013. 9. 3 : 일상감사 및 계약심사
- 2013. 9. 5 : 공사발주
- 2013. 10. 4 : 공사착공

소요예산 : 100,000천원 - 시비 100%

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000천원 (시비)	84,226천원 (시비)	84%

향후계획

- 2013. 11. 22 : 공사준공

### Ⅲ . 2014 주요업무 계획

연 번	사 업 명	쪽
①	공원시설물 정비 .....	33
②	어린이공원 정비 .....	34
③	공원 내 수목 가지치기 및 식재공사 .....	35
④	열린학교(학교공원화) 유지관리 .....	36
⑤	공중화장실 환경 개선 .....	37
⑥	물놀이장 편의시설 조성 .....	38
⑦	노후마을마당 보수정비사업 .....	39
⑧	차없는 거리 조성사업(주민참여예산) .....	40
⑨	가로수 생육환경 개선 .....	41
⑩	가로변 녹지량 확충 .....	42
⑪	‘영등포 꽃으로 피다’ 실시체계 및 시범사업 추진 .....	43
⑫	녹지대 위험수목 정비 .....	44
⑬	녹지대 수목보식 및 시설물 정비 사업 .....	45
⑭	가로수 보식 및 식재 .....	46
⑮	에코스쿨 조성 .....	47
⑯	양평유수지 생태복원 특화사업 .....	48
⑰	안양천 그린웨이 성산대교 남단~양화교 구간 조성사업 .....	49
⑱	안양천 장미꽃길 조성사업 .....	50
⑲	마을단위 야외체육시설 설치 .....	51
⑳	2014시공원 보수정비사업 .....	52

노후되고 파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의 시설을 확충하여 공원환경 개선에 기여하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 마을마당 60개소
- 사업기간 : 2014. 2. ~ 10.
- 내 용

연 번	공 원 명	위 치	정 비 대 상
1	당산공원	당산로27길 13(당산1동)	잔디보호웬스 설치 등
2	신길공원	도림로80길 6(신길5동)	투수블럭포장, 우레탄코트 정비 등
3	메낙골공원	신길1동 4934-4	테크계단 및 분수 정비 등
4	문래공원	문래동 66	고무칩포장 및 잔디보호웬스 설치 등
5	너섬마을마당	여의도동 14-1	공원 경계 수목 식재
6	그린마을마당	신길5동 4937-3	원형무대 철거 및 블럭 포장 등
7	신흥역소공원	신길6동 3599	원형의자 2개소, 관목식재 등

## □ 추진방향

- 노후되고 파손된 시설물을 정비하여 각종 안전사고 예방
- 쾌적한 휴식공간 제공 및 공원이용 활성화 도모

## □ 추진계획

- 2014. 2. ~ 3. : 상반기 공원시설물 정비공사 실시설계용역 시행
- 2014. 4. ~ 6. : 상반기 공원시설물 정비공사 시행
- 2014. 7. ~ 8. : 하반기 공원시설물 정비공사 실시설계용역 시행
- 2014. 9. ~ 10. : 하반기 공원시설물 정비공사 시행

## □ 예 산 액 : 201,000천원(구비)

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공하여 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 활성화에 기여코자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 고추말어린이공원 외 8개소  
(양평2동 양평 / 양평1동 양남 / 대림3동 신우, 동심 / 대림2동 다사랑 / 신길5동 꿈에그린 / 여의도동 평화)
- 규 모 : 어린이공원 8개소 정비
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 6.
- 내 용 : 공원 내 노후 산책로 · 배수로 및 편익시설 정비

### □ 추진방향

- 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 공원 이용 활성화 도모
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

### □ 추진계획

- 2014. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2014. 3. ~ 4. : 일상감사, 계약심사
- 2014. 4. ~ 6. : 공사발주, 공사 시행 및 완료

### □ 예 산 액 : 52,000천원(구비)

공원 내 수목 중 무성한 수관 형성으로 공원 인접 주택에 민원을 야기 및 공원 이용에 위해가 되는 수목에 대하여 정비공사를 시행하여 안전사고 예방 및 쾌적한 공원 환경 제공코자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 다사랑어린이공원 등 29개소
- 규 모 : 근린공원 6개소, 어린이공원 18개소, 소공원 5개소
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 6.
- 내 용 : 주택가 피해 수목 정비 (전지, 이식 및 식재 등)

#### □ 추진방향

- 공원 내 주택가 인접 대형 및 위험 수목을 전지하여 안전사고 예방
- 수목의 불필요한 가지를 전지하여 수목생리 활성화를 통한 공원경관 향상 추진

#### □ 추진계획

- 2014. 1. ~ 2. : 현장조사
- 2014. 2. ~ 3. : 공사발주, 공사 시행 및 완료

#### □ 예 산 액 : 40,000천원(구비)

열린학교 조성사업 대상 학교 내 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지 환경 제공코자 함

#### □ 사업개요

- 규 모 : 학교공원화사업 시행학교 4개교
- 위 치 : 양평1동 관악고교, 신길5동 대영초교, 문래동 영등포초교, 여의동 윤중중학교
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 12.
- 내 용 : 학교공원화사업 대상으로 노후·파손 시설물 보수 및 정비, 수목보식 등

#### □ 추진방향

- 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전 사고 예방
- 아름답고 쾌적한 녹지 환경 제공으로 주민 삶의 질 향상에 기여

#### □ 추진계획

- 2014. 3. : 현장조사
- 2012. 4. ~ 12. : 공사발주, 공사 시행 및 완료

#### □ 예산액 : 14,400천원(구비)

도시공원내 공중화장실을 정비하고 편의시설을 확충하여 이용주민에게 안전하고 편리한 공원 환경 제공

#### □ 사업개요

- 위    치 : 당산근린공원 등 3개소
  - 당산 근린공원 (당산1동 385)
  - 중앙 어린이공원 (영등포로35길 13, 영등포동6가)
- 사업기간 : 2014. 2. ~ 6.
- 내    용 : 노후시설 보수, 편의시설 확충 등

#### □ 추진방향

- 도시공원내 공중화장실 정비로 공원을 이용하는 이용주민에 대한 편익 증진 도모
- 아름답고 쾌적한 공원 조성으로 주민숙원사업 해결 및 구민의 삶의 질 향상 추진

#### □ 추진계획

- 2014. 2. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2014. 4. ~ 6. : 공중화장실 환경개선공사 시행

#### □ 예 산 액 : 20,000천원(구비)

밭 디딜 틈이 없을 정도로 이용자가 많은 물놀이장 시설 주변에 그늘 제공 및 휴식시설을 추가로 설치하여 편안하게 여가를 즐기면서 주민 소통, 화합을 위한 공간으로 제공함으로써 주민 만족도를 향상하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 문래동3가 94-1 목화마을마당 물놀이장
- 규 모 : 3,311㎡(물놀이장 500㎡)
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 6.
- 내 용 : 그늘막, 벤치 추가 설치

### □ 추진방향

- 물놀이장 주변 휴식시설 확충으로 주민 이용 편의 향상
- 주민소통 및 화합을 위한 공간 제공

### □ 추진계획

- 2014. 1. ~ 2. : 현장조사 및 방침수립
- 2014. 2. ~ 3. : 설계 및 공사 발주
- 2014. 4. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

### □ 예산액 : 50,000천원(구비 100% - 주민참여예산)



시민 생활권에 위치하여 다양한 계층이 쉽게 찾고 이용할 수 있는 휴식과 만남의 장소인 마을마당이 조성된 지 오래되어 노후된 상태로 수목보식 및 편의시설 등을 정비하여 지역 주민의 커뮤니티 공간과 쾌적한 휴식장소로 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 위    치
  - 선유봉마을마당(양평2동 4가 287-6)
  - 달맞이마을마당(신길3동 296-65)
- 사업기간 : 2014. 2. ~ 6.
- 내    용 : 노후시설 보수, 편의시설 확충, 수목식재 등

## □ 추진방향

- 노후도가 심한 대상지를 대상으로 수목보식 및 노후 시설물 정비
- 수목 보식시 주민들의 의견을 반영하여 식재
- 지역 커뮤니티 공간 및 녹음이 있는 쾌적한 마을쉼터로 정비

## □ 추진계획

- 2014. 2. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2014. 4. ~ 6. : 노후마을마당 보수정비공사 시행

## □ 예 산 액 : 120,000천원(시비)

차량 통행이 적은 도로를 폐쇄한 후 숲길 및 주민 쉼터를 조성하여 생활권 녹지를 확충하고 지역 주민 소통과 휴식을 위한 열린공간으로 제공하여 살기 좋은 영등포를 구현하고자 함

**□ 사업목표**

- 차 없는 거리 조성을 통한 생활권 주변 녹지 확충
- 지역 주민 소통과 화합, 휴식을 위한 열린공간 제공

**□ 사업개요**

- 위 치 : 문래동6가 43-1 외 1필지(문래동6가 49-1)
- 규 모 : 710㎡(길이 88m, 폭 8m)
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 6.
- 내 용 : 도로 폐쇄 후 녹지 및 쉼터 조성

**□ 추진방향**

- 유관부서(도로과, 교통행정과, 주차문화과) 협업을 통한 주민 불편 최소화
- 쾌적하고 아름다운 생활권 녹지 확충

**□ 추진계획**

- 2014. 1. ~ 2. : 현장조사 및 방침수립
- 2014. 2. ~ 3. : 실시설계 및 공사 발주
- 2014. 4. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

**□ 예 산 액 : 300,000천원(구비 100% - 주민참여예산)**

도시경관의 주요 요소인 가로수 하부공간에 조성된 선형의 띠녹지 보식 및 가로수 보호판을 정비하여 쾌적한 보행환경 및 풍요롭고 아름다운 도시경관 조성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 국회대로 외 1개소
  - 국회대로(당산동3가 구청사거리~ 당산동 4가 삼성2차아파트),
  - 영 중 로(영등포동8가 당산푸르지오아파트 앞)
- 기 간 : 2014. 1. ~ 6.
- 규 모 : 600m<sup>2</sup>
- 내 용 : 띠녹지 조성, 보호판 교체 등

**□ 추진방향**

- 띠녹지 보식 및 보행에 불편을 주는 가로수 보호판 정비
- 빗물 관리 개념이 도입된 서울시 레인가든 조성 지침 반영

**□ 추진계획**

- 2014. 1. : 가로수 생육환경 개선사업 추진계획 수립
- 2014. 2. ~ 3. : 실시설계용역 및 계약심사
- 2014. 4. ~ 6. : 공사시행

**□ 예 산 액 : 180,000천원(시비)**

단풍과 열매, 꽃이 아름다운 수종과 초화류를 식재하여 녹지량을 확충하고 주민이 만족하는 쾌적한 녹지공간을 조성하고자 함.

**□ 사업개요**

- 위 치 : 도림천 가로녹지 등 2개소
  - 도림천 가로녹지 : 대림역~대림운동장 구간
  - 문래동 삼환아파트 남측 도림천 고가 아래
- 기 간 : 2014. 1. ~ 12.
- 규 모 : 4,500㎡
- 내 용 : 화관목, 초화류 식재 등

**□ 추진방향**

- 차량 소음, 분진, 매연 저감을 위한 수목을 식재하여 차폐수림 조성
- 도보 및 차량 통행 시 심미적 효과 제고와 주택가에서 바라보는 경관 향상 도모

**□ 추진계획**

- 2014. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2014. 4. ~ 6. : 녹지량 확충공사 시행

**□ 예산액 : 100,000천원(시비)**

## 11 '영등포 꽃으로 피다' 실시설계 및 시범사업 추진 조경팀

'영등포 꽃으로 피다' 기본계획 용역의 세부적이고 구체적인 실행을 위한 실시설계 용역을 시행하여 액션 플랜을 마련, 시범사업을 시행하여 아름다운 영등포 만들기에 최선을 다하고자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 여의도 환승센터 앞
- 내 용 : 걸이형 화분 설치, 녹음 및 휴게공간 조성 등
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 10.
- 소요예산 : 50,000천원(구비)

### □ 추진방향

- '영등포 꽃으로 피다' 기본계획용역에 따른 액션 플랜 마련
- 각종 시설공사 시행시 반영
- 여의도 환승센터, 영등포역 앞 등 시범사업 시행

### □ 추진계획

- 2014. 1. : 계획수립
- 2014. 2. : 실시설계용역 발주
- 2014. 2. ~ 4. : 실시설계용역 시행
- 2014. 5. ~ 6. : 시범사업 시행

### □ 예산액 : 50,000천원(구비)

녹지대 및 간선도로 주변의 위험수목을 사전에 정비하여 태풍, 폭우 등 기상이변으로 인한 녹지대 수목의 쓰러짐을 예방함으로써 안전하고 쾌적한 가로환경을 조성하고자 함.

**□ 사업개요**

- 위 치 : 관내 녹지대, 주택가 주변
- 기 간 : 2014. 1. ~ 11.(연간단가)
- 규 모 : 350주
- 내 용 : 위험수목 제거 및 전지 등

**□ 추진방향**

- 기상이변 및 태풍에 의한 위험요소 사전 정비로 안전사고 예방
- 쾌적하고 안전한 녹지대 환경 조성

**□ 추진계획**

- 2014. 1. : 설계 시행
- 2014. 2. : 공사 발주
- 2014. 3. ~ 11. : 위험수목 정비공사 시행

**□ 예산액 : 63,600천원(구비)**

기상이변으로 고사하거나 교통사고로 훼손된 녹지대 수목을 연중 수시로 보식하고 노후 시설물을 정비하여 아름답고 쾌적한 녹지대 환경을 조성

**□ 사업개요**

- 위 치 : 관내 녹지대
- 기 간 : 2014. 1. ~ 12.
- 규 모 : 3,000 $m^2$
- 내 용 : 수목식재 및 시설물 정비 등

**□ 추진방향**

- 도로변 녹지에 수목 및 숙근초화류를 보식하여 가로경관 향상 및 공해 저감
- 녹지대 노후 시설물 정비로 주민 이용 불편사항 해소

**□ 추진계획**

- 2014. 1. ~ 2. : 실시 설계
- 2014. 3. : 공사 발주
- 2014. 5. : 공사 준공

**□ 예 산 액 : 27,000천원(구비)**

관내 가로수 중 교통사고, 신설도로, 자연고사 등으로 가로수가 없는 지역, 가로수 식재 민원요청지 등에 수목을 식재하여 가로변 녹지량 확충 및 쾌적한 가로경관을 조성코자 함

**□ 사업개요**

- 위 치 : 국제금융로8길(여의도동) 등
- 기 간 : 2014. 1. ~ 11.
- 규 모 : 왕벚나무 등 가로수 보식 70주, 가로수보호판 설치
- 내 용 : 고사 등으로 비어있는 가로수분 내 가로수 식재

**□ 추진방향**

- 가로변 녹지량 확충을 통한 녹음 제공
- 공해 완화를 통한 쾌적한 가로환경 제공

**□ 추진계획**

- 2014. 1. : 가로수 보식공사 추진계획 수립
- 2014. 2. ~ 3. : 실시설계용역
- 2014. 4. ~ 6. : 공사시행

**□ 예 산 액 : 108,000천원(구비)**

(보식 48,000천원, 도림로 가로수(왕벚 40주) 바뀌심기 60,000천원)



서울시교육청에서 시행중인 아름다운 학교가꾸기 사업과 에코스쿨 조성 사업을 연계하여, 교내 텃밭가꾸기 등의 환경교육을 통한 인성교육 강화 및 생태체험교육의 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 대영고등학교(도림로86길 16)
- 기 간 : 2014년 1. ~ 10.
- 규 모 : 유희공지 300 $m^2$ , 담장녹화 100 $m^2$ , 옥상조경 260 $m^2$  등
- 내 용 : 운동장 주변 유희공지, 담장 및 옥상 녹화

### □ 추진방향

- 학생들의 자연학습 및 휴식공간으로 조성
- 기존의 공간과 새로운 녹지공간의 조성을 통해 공원 같은 면학 분위기 조성

### □ 추진계획

- 2014. 1. : 사업추진계획 수립
- 2014. 2. : 구조안전진단 및 실시설계용역 시행
- 2014. 2. ~ 3. : 설계심의(시 조경과), 공사발주
- 2013. 4. ~ 10. : 공사착공 및 준공

### □ 예 산 액 : 80,000천원(시비)

유수지 본래의 저수기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 토양정화 수생 초화류 및 수목을 식재하고 보행데크 연장, 정자 설치 등 시설을 보완하여 자연생태를 복원하고 주민휴식공간을 조성하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 양평1동 양평동3가 57 (국회대로 22길 20) 양평제1유수지
- 규 모 : 34,000 $m^2$
- 기 간 : 2014. 1 ~ 12
- 내 역
  - 안양천 연결 보행데크연장 120m, 정자설치 2동, 파골라 지붕정비 4동,
  - 연못확장 600 $m^2$ , 수로정비 100m
  - 수생 초화류, 수목 및 향토작물 식재 등

## □ 추진방향

- 토양치환, 식생기반조성, 수생초화류 및 수목식재 통한 자연생태복원
- 보행데크연장, 정자설치, 파골라정비, 연못확장 등 주민편의시설 보완

## □ 추진계획

- 2014. 1. : 사업추진계획 수립, 기술용역타당성 심사
- 2014. 2. : 계약심사 및 설계용역 발주
- 2014. 3. ~ 4. : 실시설계용역 시행 및 완료, 설계심의
- 2014. 5. ~ 6. : 공사 시행 및 준공

## □ 예 산 액 : 500,000천원(시비)

안양천 제방사면의 유해식물제거, 다양한 초화류 및 수목식재를 통하여 자연생태복원, 하천경관향상 및 주민여가 공간 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 제방사면 성산대교 남단~양화교 구간
- 규 모 : 20,000 $m^2$  (L=500m)
- 기 간 : 2014. 1. ~ 12.
- 내 용 : 초화류 식물매트 식재 1,000 $m^2$  등

## □ 추진방향

- 유해식물제거, 식생기반조성 및 식물매트식재를 통한 하천 제방 사면 녹화

## □ 추진계획

- 2014. 1. : 사업추진계획 수립, 기술용역타당성 심사
- 2014. 2. : 계약심사 및 설계용역 발주
- 2014. 3. ~ 4. : 실시설계용역 시행 및 완료, 설계심의, 하천점용 허가
- 2014. 5. ~ 6. : 공사시행 및 준공

## □ 예 산 액 : 40,000천원(시비)

안양천 그린웨이 산책로 주변에 장미를 식재하여 하천경관을 향상시키고 이용주민의 정서함양을 위한 쾌적하고 아름다운 장미꽃길을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 안양천 그린웨이 산책로 주변(신정교~양화교)
- 규 모 : L=4,500m
- 기 간 : 2014. 1. ~ 6.
- 내 용 : 기반조성 및 성토작업, 장미탑, 장미아치 설치, 장미식재 등  
- 도입(장미)수종 : 사계장미(클레오파트라, 블루리버, 골데스, 핑크퍼퓸, 엘로퍼흠, 슈와르쯔마돈나, 슈터스골드 등)

### □ 추진방향

- 하천제방 환경개선, 녹지량 확충 및 계절별 꽃이 피는 하천경관 조성
- 식생의 다양화로 하천생태계 보전 및 자연학습장으로 활용
- 기초성 구간과 산책로 연계조성을 통해 주민여가공간 조성

### □ 추진계획

- 2014. 1. : 사업추진계획 수립, 기술용역타당성 심사
- 2014. 2. : 계약심사 및 설계용역 발주
- 2014. 3. ~ 4. : 실시설계용역 시행 및 완료, 설계심의
- 2014. 5. ~ 6. : 공사 시행 및 준공

### □ 소요예산 : 200,000천원(시비)

늘어나는 웰빙인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 생활권 녹지대, 근린공원, 어린이공원 등에 야외체육시설을 설치하고 배드민턴장 등의 노후화된 시설물을 새롭게 정비하여 구민건강 증진 및 생활체육 활성화에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 문래공원 등 7개소
- 규 모 : 운동기구 설치 13점, 배드민턴장 1개소 시설정비
- 기 간 : 2014. 1. ~ 10.
- 내 용 : 공원 및 체련장 등에 야외운동기구 설치 및 정비

### □ 추진방향

- 공원 및 생활권 녹지대 등에 야외체육시설 설치로 웰빙인구 수용 충족
- 노후화된 야외체육시설 정비로 주민 만족도 향상

### □ 추진계획

- 2014. 1. ~ 2. : 사업대상지 현장조사
- 2014. 2. ~ 4. : 실시설계 발주 및 용역시행
- 2014. 4. : 계약심사 및 공사발주
- 2014. 5. ~ 10. : 공사시행 및 완료

### □ 예산액 : 70,000천원(구비)

시공원 인근 주민들의 오랜 불편사항을 해소하고 공원내 각종 노후 시설 등을 새롭게 정비하여 공원을 이용하는 주민들의 삶의 질을 향상에 기여코자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 신길로 275(영등포동) 영등포공원 외 1개소
- 기 간 : 2014. 2. ~ 9.
- 규 모 : 61,544m<sup>2</sup>
- 내 용 : 공원내 탄성포장 산책로 및 하수관 정비, 화장실 시설 개선 등

### □ 추진방향

- 노후되어 안전사고가 우려되는 시설물 우선 정비
- 공원을 이용하는 주민들의 삶의질 향상을 위한 시설 개선

### □ 추진계획

- 2014. 2. ~ 3. : 현장조사, 사업추진계획 수립
- 2014. 3. ~ 4. : 실시설계용역(용역보고회 등)
- 2014. 5. ~ 9. : 공사착공 및 준공

### □ 예 산 액 : 300,000천원(시비)
