

제172회 영등포구의회

제 2 차 정 려 회

교육·복지·사람 중심 새 영등포 

2012년 주요업무 보고



푸 른 도 시 과

보 고 순 서


I. 일 반 현 황	••••	1
II. 2012 주요업무 실적	••••	3
III. 2013 주요업무 계획	••••	26
IV. 특 수 사 업	••••	47

I . 일반현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직(계약직 포함)						기 능 직				대체 인력
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	29		1	5	4	4	6		2	3	4	
현 원	28		1	5	4	8	1		3	6		
과부족	-1					4	-5		1	3	-4	

2 조 직

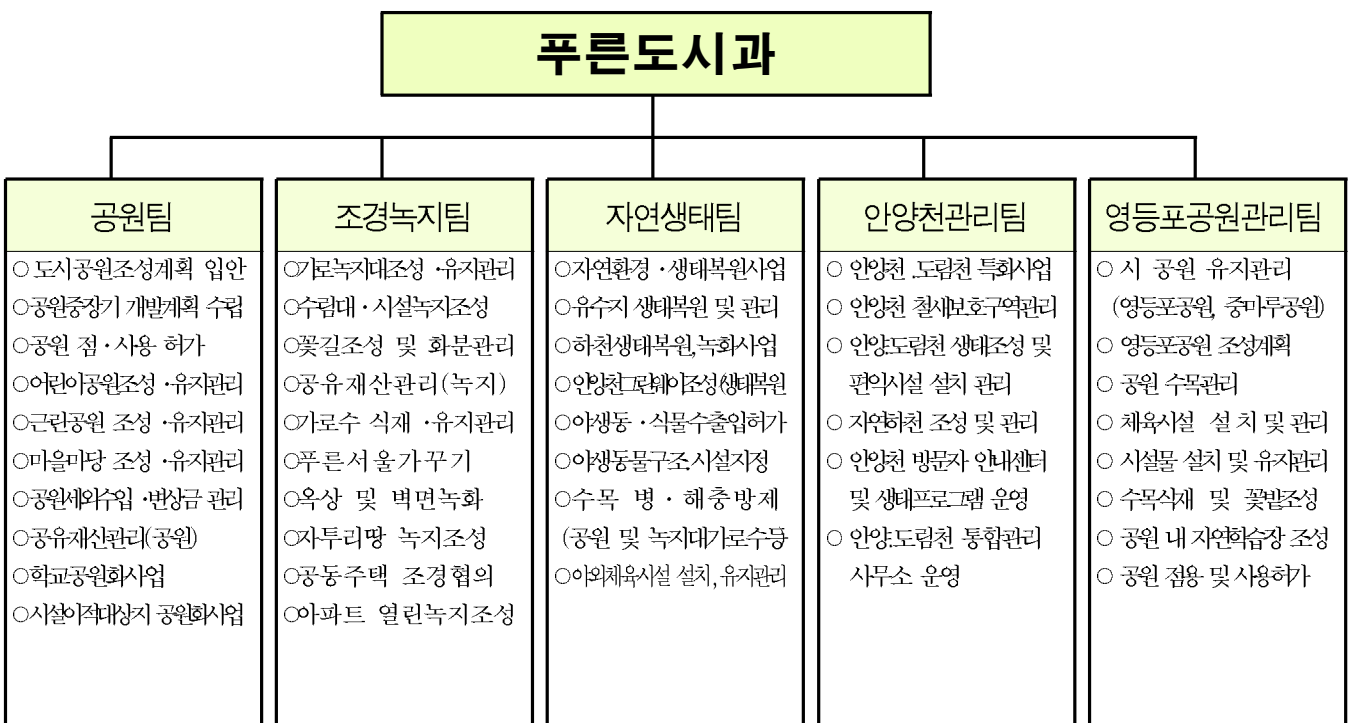

3

주요시설 및 장비

구 분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	33	10	6	4	18	5	29	143	54개 노선	2종	54개소
면 적 (㎡)	605,645	543,463	135,517	407,946	54,637	7,545	15,151	581,482	15,976주	2주	22종 621점

4

예산 현황

(2012.10.31.현재)

사 업 별

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
계	12,463,467	8,844,568	71.0%
공원녹지관리수준향상	3,261,811	1,988,559	61.0%
아름다운 환경 및 편리한 시설만들기	3,656,696	2,655,467	72.6%
안양·도림천 특화	560,753	355,813	63.5%
푸른공간 늘리기	4,201,630	3,225,779	76.8%
행정운영 경비	666,453	503,164	75.5%
보전지출(시도비반환금)	116,124	115,785	99.7%

II. 2012 주요업무 실적

연 번	사 업 명	쪽
1	현대 1·2차아파트 차없는거리 조성	5
2	영등포 올레길 조성	5
3	영등포 친환경 물놀이장 조성	6
4	대림유수지 생태공원 조성	7
5	어린이공원 정비	8
6	공원 내 무장애 편의시설 확충	8
7	공원 내 수목 정비	9
8	열린학교(학교공원화) 유지관리	9
9	양평동 불량주택 밀집지역 공원화	10
10	공원 내 친환경화장실 설치	10
11	공중화장실 환경개선	11
12	공원시설물 정비	11
13	공원시설물 유지관리(연간단가)	12
14	전기시설물 유지관리(연간단가)	12
15	공원등 개선공사	13
16	공원내 CCTV 구축	13
17	녹지대 위험수목 정비	14
18	녹지초소 이전 및 녹지복원	14
19	경부제3녹지 조성사업(보상)	15
20	가로변 녹지량 확충	15

연 번	사 업 명	쪽
21	가로수 보식 및 식재	16
22	가로수 생육환경 개선	16
23	왕벚나무 수세회복	17
24	가로수 가지치기	17
25	아파트 열린녹지 조성	18
26	공공기관 옥상녹화	18
27	도시구조물 벽면녹화	19
28	천수공간 수경시설 유지관리	20
29	생활주변 자투리땅 녹화	20
30	대림로 가로수 바꿔심기	21
31	안양천 그린웨이 4차 조성	21
32	마을단위 야외체육시설 설치	22
33	양평유수지 생태복원 특화	22
34	공원내 청소년 문화마당 조성	23
35	영등포공원내 게이트볼장 조성	24
36	영등포공원 북카페 설치	24

1

현대1·2차아파트 차없는거리 조성

□ 사업개요

- 위치 : 문래동 6가 45-1(도)외 3필지(45-2도, 45, 46번지)
(문래동 현대1·2차APT 열린녹지 - 글마당길 차없는 거리)
- 규모 : 1,200m²
- 사업기간 : 2011. 1 ~ 2012. 7
- 내용
 - 도로폐쇄 120m×8m=960m², 담장철거 100m, 교통표지판 5개소
 - 기반조성 1,200m², 수목식재공사(소나무 등 11종), 포장공사, 생태연못 및 습지조성(71m²), 편의시설 설치(정자, 의자, 운동기구), 공원등(7등), CCTV설치(1개소) 등

□ 추진실적

- 2011. 01 ~ 06 : 추진계획수립 및 실시설계용역 시행
- 2012. 03. 21 : 설계심의(서울시 조경과)
- 2012. 04. 02 : 계약심사(서울시 계약심사과)
- 2012. 04. 17 : 공사 발주 및 계약(2012.05.04)
- 2012. 05. 07 : 공사 착공
- 2012. 07. 31 : 공사 준공

□ 소요예산 : 600,000천원(시비50%, 구비50%)

2

영등포 올레길 조성

□ 사업개요

- 위치 : 안양천, 도림천, 한강, 샛강, 여의도공원, 선유도공원
- 규모 : 8.2km(안양천 5.2km, 도림천 3km)
- 사업기간 : 2012년 1월 ~ 2012년 12월
- 내용
 - 기 조성된 산책로, 편의시설 이용 및 편의시설 설치
 - 특화된 안내체계 도입, 단절된 산책로 연결, 노면불량구간 재정비, 탐방 및 표지판 설치, 쉼터 및 전망대 조성

□ 추진실적

- 2012. 02. 14 : 계약심사(실시설계용역)
- 2012. 02. 15 : 실시설계용역 발주/착수
- 2012. 05. 21 : 용역보고회
- 2012. 06. 08 : 실시설계용역 준공
- 2012. 08~10 : 서울지방국토관리청 하천점용허가
- 2012. 10. 30 : 공사발주

□ 소요예산 : 670,000천원(구비)

□ 향후계획

- 2012. 11. 09 : 공사계약
- 2012. 11 ~ 12 : 공사착공 및 준공
- 연차별 시행계획

구분	소요예산(천원)	위치(구간)	거리(km)	비고
계	1,014,000	2개소	24.9	
2011년	22,000	-	-	기본설계용역
2012년	670,000	안양천그린웨이(5.2km)~도림천생태하천(3.0km)	8.2	영등포 수변둘레길 8.2km
2013년	322,000	한강여의도지구(4.0km)~샛강생태공원(3.7km)~여의도공원(2.4km)~한강양화지구(3.6km)~선유도공원(3.0km)	16.7	한강 생태순환길 16.7km

3 영등포 친환경 물놀이장 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 431-28번지 일대 (꽃섬길 마을마당)
- 규 모 : 430m²
- 사업기간 : 2011. 9 ~ 2012. 7
- 내 용
 - 벽천폭포(H3.5×L7.2), 앓음벽, 목계단, 음수전, 수목식재 및 이식
 - 기반조성공사(구체, 마감, 포장), 바닥포장 철거, 포장공사 등
 - 물놀이장 : 226.8m², 물놀이시설(코끼리 물총 등 5종), 펌프 4대
 - 물놀이장 기계설비(배관, 수질여과장치, 오버플로우, 점검구)

□ 추진실적

- 2011. 09~11 : 추진계획수립 및 실시설계용역 시행
- 2012. 02. 10 : 영등포 도시디자인위원회 심의

- 2012. 03. 07 : 계약심사(감사담당관)
 - 2012. 03. 09 : 공사 발주 및 계약(2012. 03. 30)
 - 2012. 04. 02 : 공사 착공
 - 2012. 06. 30 : 공사 준공
 - 2012. 07. 10 : 물놀이장 준공식
 - 2012. 07. 10~08.31 : 물놀이장 개장 및 운영
- 소요예산 : 500,000천원(구비)

4 대림유수지 생태공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 대림3동 611번지(대림유수지)
- 규 모 : 3,840m²
- 사업기간 : 2012년 1월 ~ 2012년 12월
- 내 용
 - 기반시설 : 성토 및 토양개량, 흙콘크리트포장(782m²), 우배수시설 등
 - 시설공사 : 데크로드34.5M, 공원등13개소, CCTV2대, 운동시설물8종, 육각정자, 등의자, 장미아치, 안내판 등
 - 수목 및 초화식재 : 장미원, 철쭉동산, 피톤치드 숲, 녹지정비 등

□ 추진실적

- 2012. 01. 31 : 현장조사 및 추진계획 수립
- 2012. 02. 27 : 기술용역 타당성심의(서울시 기술심사담당관)
- 2012. 04. 02 : 실시설계용역 발주
- 2012. 04. 05 : 실시설계용역 시행(2012.08.02)
- 2012. 07. 20 : 설계심의(서울시 자연생태과)
- 2012. 08. 13 : 계약심사(서울시 계약심사과)
- 2012. 09. 04 : 시설공사 발주 및 입찰공고(2012.09.06)
- 2012. 09. 11 : 낙찰자 선정 및 적격심사
- 2012. 09. 20 : 공사착공

□ 소요예산 : 1,000,000천원(시비)

□ 향후계획

- 2012. 12. 08 : 공사준공

5 어린이공원 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 평화어린이공원(여의동동 50-2) 외 3개소
 - 자유어린이공원(여의도동 50-3), 대림어린이공원(대림1동 870)
 - 다사랑어린이공원(대림2동 703-6)
- 규 모 : 어린이공원 4개소
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 6월
- 내 용 : 노후 및 파손 편익시설물 정비

□ 추진실적

- 2012. 01. 16 ~ 03. 26 : 실시설계용역 시행
- 2012. 03. 30 : 일상감사
- 2012. 04. 04 : 계약심사
- 2012. 04. 05 : 공사발주
- 2012. 04. 23 ~ 06. 22 : 공사 시행 및 완료

□ 소요예산 : 169,509천원(구비)

6 공원 내 무장애 편익시설 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 신우어린이공원 외 11개소
- 규 모 : 도시공원 12개소
- 사업기간 : 2012. 2월 ~ 5월
- 내 용 : 무장애시범공원 1개소 조성, 도시공원 12개소 정비

□ 추진실적

- 2012. 02. 06 ~ 03. 06 : 실시설계용역 시행
- 2012. 02. 28 : 계약심사
- 2012. 03. 20 : 공사발주
- 2012. 03. 30 ~ 05. 13 : 공사시행 및 완료

□ 소요예산 : 80,511천원(구비)

7 | 공원 내 수목 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 문래근린공원 외 10개소
- 규 모 : 버즘나무 외 3종 292주 정비
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 9월
- 내 용 : 고사지, 도장지, 도복수목, 위험수목, 병해충 피해목 제거

□ 추진실적

- 2012. 02. 06 : 계약심사
- 2012. 02. 09 : 1차 정비공사 발주
- 2012. 02. 15 ~ 03. 05 : 1차 정비공사 시행
- 2012. 05. 15 : 계약심사
- 2012. 05. 16 : 2차 정비공사 발주
- 2012. 05. 18 ~ 06. 06 : 2차 정비공사 시행
- 2012. 09. 30 : 2차 정비공사 준공

□ 소요예산 : 35,404천원(구비)

8 | 열린학교(학교공원화) 유지관리

□ 사업개요

- 위 치 : 대길초교 외 2개소
- 규 모 : 3개소 정비
- 사업기간 : 2012. 9월 ~ 10월
- 내 용 : 학교공원화사업 노후·파손시설 정비, 보식 등 사후관리

□ 추진실적

- 2012. 09. 01 ~ 09. 10 : 현황 조사 및 자체 설계
- 2012. 09. 12 : 계약심사
- 2012. 09. 20 : 공사발주
- 2012. 09. 25 ~ 10. 24 : 공사 시행

□ 소요예산 : 22,164천원(구비)

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동2가 41-5번지 외 31필지
- 규 모 : 1,109.5m²
- 사업기간 : 2009. 4월 ~ 2013. 9월
- 내 용 : 불량주택 밀집지역 내 토지보상 및 마을마당 조성

□ 추진실적

- 2009. 04. 29 : 영등포구 투자사업 결정
- 2009. 09. 07 : 도시계획시설(공공공지)결정 및 지적고시
- 2011. 04. 04 : 특별교부금 확보(교부액 20억원)
- 2011. 10. 06 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획 인가고시
- 2011. 12. 27 : 보상계획 수립(건설관리과)
- 2012. 04. 17 : 특별교부금 추가확보(교부액-17억원)
- 2012. 07. 02 : 수용재결신청 열람공고
- 2012. 09. 25 : 서울시지방토지수용위원회 수용재결 보상금 결정통지

□ 소요예산 : 3,959,000천원(특별교부금 93% , 구비 7%)

□ 향후계획

- 2012. 11 ~ 2013. 2 : 보상절차 이행
- 2013. 3 ~ 9 : 마을마당 조성

□ 사업개요

- 위 치(3개소) : 문래근린공원(문래동 3가 60-2)
- 다사랑어린이공원(대림2동 703-6)
- 양평가로녹지(양평동 5가 121-1)
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 7월
- 내 용 : 공원·녹지 내 이동식 공중화장실 설치

□ 추진실적

- 2012. 01. 25 : 실시설계용역 시행
- 2012. 04. 27 : 공사 발주
- 2012. 05. 16 : 공사 착공
- 2012. 07. 21 : 공사 준공

□ 소요예산 : 214,591천원(구비)

11 | 공중화장실 환경개선

□ 사업개요

- 위 치 : 신길근린공원(신길5동 341-3일대) 등 3개소
 - 원지어린이공원(대림3동 690)
 - 신우어린이공원(대림3동 657)
- 규 모 : 공중화장실 내·외부 도색, 전기시설 개선 및 노후시설 보수 등
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 5월
- 내 용 : 노후 공중화장실 정비 및 편의시설 확충

□ 추진실적

- 2012. 01. 30 : 실시설계용역 시행
- 2012. 04. 03 : 공사 발주
- 2012. 04. 18 : 공사 착공
- 2012. 05. 16 : 공사 준공

□ 소요예산 : 58,704천원(구비)

12 | 공원시설물 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 마을마당 58개소
- 규 모 : 도시공원 및 마을마당 시설정비
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 5월
- 내 용 : 노후시설 교체 및 보수, 바닥포장, 체력단련시설 설치 등

□ 추진실적

- 2012. 01. 25 : 실시설계용역 시행
- 2012. 03. 19 : 공사 발주
- 2012. 04. 03 : 공사 착공
- 2012. 05. 22 : 공사 준공

□ 소요예산 : 151,920천원(구비)

13 | **공원시설물 유지관리(연간단가)**

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 마을마당 58개소
- 규 모 : 관내 도시공원 및 마을마당
- 사업기간 : 2012. 3월 ~ 11월
- 내 용 : 노후시설 교체 및 보수, 어린이놀이시설, 체육시설 등 공원이용 주민 불편사항의 긴급보수 시행

□ 추진실적

- 2012. 03. 09 : 사업추진계획 수립
- 2012. 03. 23 : 사업 착공
- 2012. 11. 02 : 사업 준공

□ 소요예산 : 18,500천원(구비)

14 | **전기시설물 유지관리(연간단가)**

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 녹지대
- 기 간 : 2012. 02월 ~ 09월
- 규 모 : 공원등 500여등, 전기시설물 정비
- 내 용 : 공원및녹지대의 전기시설물 이상발생시 즉각조치

□ 추진실적

- 2012. 1. 18 : 공사발주
- 2012. 2. 1 : 공사시행
- 2012. 9. 25 : 준공

□ 소요예산 : 16,860천원(구비)

15 □ 공원등 개선공사

□ 사업개요

- 위 치 : 자유,평화어린이공원(2개소)
- 기 간 : 2012. 02월 ~ 09월
- 규 모 : 공원등 설치(12본 신규, 8본 이설), 분전함개량 등
- 내 용 : 노후된 전기시설물 교체공사

□ 추진실적

- 2012. 3. 20 : 공사발주
- 2012. 4. 10 : 공사착공
- 2012. 5. 4 : 준공

□ 소요예산 : 35,000천원(구비)

16 □ 공원내 CCTV구축

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포근린공원 등 8개소
- 기 간 : 2012. 4월 ~ 10월
- 규 모 : 공원 8개소 20대설치
- 내 용 : 통합관제센터와 연동하여 CCTV 설치 20대 구축

□ 추진실적

- 2012. 4. 27 ~ 5. 1 : 사업발주 및 조달청의뢰
- 2012. 8. 7 : 낙찰자 선정
- 2012. 8. 7 ~ 10. 22 : 공사시행
- 2012. 10. 22 : 준공

□ 소요예산 : 283,800천원(시비 54, 구비 46%)

17 녹지대 위험수목 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 성산IC, 양화IC, 양평가로녹지, 대방천 가로녹지 등
- 규 모 : 480주
- 기 간 : 2012. 1 ~ 11월
- 내 용 : 위험수목 제거 및 전지

□ 추진실적

- 2012. 2. 29 : 공사 발주(1차)
- 2012. 3. 17 ~ 4. 10 : 공사 시행
- 2012. 4. 10 : 공사 준공
- 2012. 6. 25 : 태풍 대비 위험수목정비공사 발주(연간단가)
- 2012. 7. 5 ~ 11. 1 : 공사 시행
- 2012. 11. 1 : 공사 준공

□ 소요예산 : 130,000천원 - 구비 100%

18 녹지관리초소 이전 및 녹지복원

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도동 1-6(산업은행 앞), 2-9번지(윤중초등학교 옆)
- 규 모 : 200m²
- 기 간 : 2012. 1 ~ 3월
- 내 용 : 녹지관리초소 이전 및 후생복리시설 설치

□ 추진실적

- 2012. 2. 13 : 공사 발주
- 2012. 2. 17 ~ 2. 26 : 공사 시행
- 2012. 2. 26 : 공사 준공

□ 소요예산 : 30,000천원 - 구비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 68-3일대
- 규 모 : 7,912m²(보상 토지 42필지, 지장물 25건, 영업권 49건)
- 기 간 : 2007.11.17 ~ 2013.12.31.
- 내 용 : 보상 및 녹지 조성

□ 추진실적

구 분	총 보상대상	보상완료	미 보 상	실적	비고
토 지	42필지 (3,857m ²)	40필지 (3,821m ²)	2필지 (36m ²)	99%	
건물(지장물)	25동	25동	0	완료	
영 업 권	49건	49건	0	완료	

□ 소요예산 : 22,388,000천원 - 시비 100%

(단위:백만원)

계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
22,388	2,500	4,000	4,000	4,300	4,000	2,600	988

□ 향후계획

- 2012. 10 ~ 2013. 1 : 경부제3녹지 조성사업 실시설계용역 시행
- 2012. 2 ~ 2012. 12 : 공사 발주 및 녹지조성공사 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 도림2동 263번지 일대 대방천길
- 규 모 : 3,000m²
- 기 간 : 2012. 2 ~ 10월
- 내 용 : 수목 및 초화류 식재, 급수시설 설치 등

□ 추진실적

- 2012. 6. 7 : 공사 발주
- 2012. 7. 10 ~ 10. 7 : 공사 시행
- 2012. 10. 7 : 공사 준공

□ 소요예산 : 200,000천원 - 시비 100%

21 가로수 보식 및 식재

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동·서로 등 25개노선
- 기 간 : 2012. 1 ~ 6월
- 규 모 : 은행나무 등 가로수 보식 68주 및 회양목 560주 식재
- 내 용 : 교통사고 및 고사 등으로 인한 가로수 등 공분 지역에 수목 식재

□ 추진실적

- 2012. 2. 21 ~ 3. 21 : 실시설계용역 시행
- 2012. 4. 5 : 계약심사 및 일상감사 시행
- 2012. 4. 10 : 공사발주
- 2012. 6. 28 : 공사준공

□ 소요예산 : 131,043천원 - 구비 100%

22 가로수 생육환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 여의서로, 국회대로, 의사당대로
- 기 간 : 2012. 1 ~ 12월
- 규 모 : 가로수 보호판 정비 및 띠녹지 보식 2,563m²
- 내 용 : 가로수 보호판 정비(여의서로) 및 띠녹지 내 수목보식

□ 추진실적

- 2012. 1. 25 : 가로수 생육환경 개선사업 추진계획 수립
- 2012. 2. 21 ~ 3. 21 : 실시설계 시행

- 2012. 4. 18 : 설계심의 시행(서울시 조경과)
- 2012. 7. 11 : 서울시 가로수 생육환경 개선 사업계획 변경 통보
 ※ 당초 설계심의된 띠녹지 보식 및 가로수 보호판 정비를 새로운 빗물관리 개념이 도입된 서울시 레인가든 조성 지침에 맞게 사업 변경 설계요청
- 2012. 10. 12 : 서울시 설계심의 재시행
- 2012. 10. 31 : 서울시 계약심사 시행

□ 소요예산 : 450,000천원 - 시비 100%

□ 향후계획

- 2012. 11 ~ 12 : 공사 시행

23 왕벚나무 수세회복

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동·서로 등 관내 4개소
- 기 간 : 2012. 1월 ~ 8월
- 규 모 : 왕벚나무 3,731주
- 내 용 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충 방제

□ 추진실적

- 2012. 2. 29 ~ 3. 29 : 왕벚나무 외과수술 공사 시행
- 2012. 3. 29 : 공사 준공
- 2012. 5. 2 : 왕벚나무 수세회복 공사 발주
- 2012. 5. 7 ~ 8. 31 : 왕벚나무 수세회복 공사 시행
- 2012. 8. 31 : 공사 준공

□ 소요예산 : 50,450천원 - 구비 100%

24 가로수 가지치기

□ 사업개요

- 위 치 : 여의나루로2길 등 관내 5개 노선
- 기 간 : 2012. 1월 ~ 8월

- 규 모 : 381주
- 내 용 : 버즘나무 등 가로수 381주에 대하여 약전지 시행

□ 추진실적

- 2012. 1. 16 : 동절기 가로수 가지치기 공사 발주
- 2012. 2. 1 ~ 2. 16 : 동절기 가로수 가지치기 공사 시행
- 2012. 2. 16 : 공사 준공
- 2012. 8. 7 : 가로수 위험수목 정비 공사 발주
- 2012. 8. 17 ~ 8. 26 : 가로수 위험수목 정비 공사 시행
- 2012. 8. 26 : 공사 준공

□ 소요예산 : 80,000천원 - 구비 100%

25 아파트 열린녹지 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동4가 12번지 성원아파트
- 규 모 : 담장철거 260m, 녹지조성 260m²
- 기 간 : 2012. 1. ~ 12.
- 내 용 : 아파트 담장 철거 후 녹지조성

□ 추진실적

- 2012. 9. 11 : 공사 발주
- 2012. 10. 8 ~ 12. 6 : 공사 시행

□ 소요예산 : 210,000천원 - 시비 50, 구비 50%

□ 향후계획

- 2012. 12. 6 : 공사 준공

26 공공기관 옥상녹화

□ 사업개요

- 위 치 : 양화동 1-43 자원순환센터
- 규 모 : 300m²
- 기 간 : 2012. 1. ~ 12.
- 내 용 : 옥상 방수·방근 공사 후 수목식재 및 조경시설 설치

□ 추진실적

- 2012. 2. 2 : 신길5동 주민자치센터 구조안전진단용역 계약심사 요청
- 2012. 2. 13 : 대상지 변경(신길5동 주민자치센터 → 자원순환센터)
- 2012. 2. 13 : 자원순환센터 구조안전진단용역 계약심사 요청
※옥상녹화 대신 배드민턴장 설치 검토로 보류
- 2012. 10.25 : 자원순환센터 구조안전진단용역 계약심사 재요청
- 2012. 11. 1 : 자원순환센터 구조안전진단용역 발주

□ 소요예산 : 105,000천원 - 시비 50, 구비 50%

□ 향후계획

- 2012. 11 : 구조안전진단용역 결과에 따라 옥상녹화 실시설계용역 발주
- 2012. 12 : 옥상녹화 시행

27 도시구조물 벽면녹화

□ 사업개요

- 위 치 : 당산동4가 80-2일대(당산역 2호선 방음벽)
- 규 모 : 152.25㎡(연장 304.5m)
- 기 간 : 2012. 1. ~ 6.
- 내 용 : 방음벽 주변 녹지에 기반조성 후 관목류 및 덩굴식물 식재

□ 추진실적

- 2012. 2. ~ 3 : 자체설계 시행
- 2012. 3. 21 : 서울시 설계심의(우리구 → 조경과)
- 2012. 4. 2. ~ 4. 8 : 교통소통대책수립용역 시행
- 2012. 5. 4. ~ 6. 2 : 공사 시행
- 2012. 6. 2 : 공사 준공

□ 소요예산 : 110,000천원 - 시비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 대방로 친수공간 등 16개소
- 규 모 : 2,018m²
- 기 간 : 2012. 4. ~ 11.
- 내 용 : 관내 수경시설 유지관리

□ 추진실적

- 2012. 4. 17 : 수경시설 관리계획 수립
- 2012. 4. ~ 5 : 자체설계 시행
- 2012. 5. 25. ~ 6. 3 : 수경시설 정비공사 시행 및 준공
- 2012. 10. 31 : 분수대 우량계 설치 및 보완 공사 발주

□ 소요예산 : 30,000천원 - 구비 100%

□ 향후계획

- 2012. 11 : 분수대 우량계 설치 및 보완 공사 준공

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 1532-4 등 6개소
- 규 모 : 390m²
- 기 간 : 2012. 1 ~ 5월
- 내 용 : 기반시설 조성 및 수목식재 등

□ 추진실적

- 2012. 2. 3 ~ 3. 3 : 실시설계용역 시행
- 2012. 3. 22 : 계약심사 및 일상감사 시행
- 2012. 3. 30 : 공사 발주
- 2012. 4. 20 ~ 5. 29 : 공사 시행
- 2012. 5. 29 : 공사 준공

□ 소요예산 : 150,000천원 - 구비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 대림로(대림3동 빗물펌프장 앞 ~ 대림사거리 앞)
- 기 간 : 2011. 11월 ~ 2012. 6월
- 규 모 : 연장 1.9km(총 3.8km)
- 내 용 : 기존 버즘나무 가로수를 왕벚나무 및 이팝나무로 수종 변경

□ 추진실적

- 2011. 12. 23 ~ 2012. 2. 17 : 실시설계 시행
- 2012. 4. 3 : 공사 발주
- 2012. 4. 24 ~ 7. 22 : 공사 시행
- 2012. 7. 22 : 공사 준공

□ 소요예산 : 400,000천원 - 시비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 양평2동 안양천 우안 제방사면 목동교~양평교 구간
- 추진기간 : 2012. 1 ~ 12
- 사업내역
 - 철거공사 : 호안블럭 면정리 외 1종, 토공사 : 성토 외 2종,
 - 식재공사 : 버드나무 전정 외 3종, 시설물공사 : 식재기반조성 외 2종,
 - 포장공사 : 탄성포장 외 1종, 우배수공사 : 배수관(PVC) 설치 외 1종,
 - 관수공사 : 옥외관로 배관공사 외 1종 , 부대공사 : 콘테이너 창고 외 2종 ,
 - 관급자재 : 금계국 식재매트 외 8종

□ 추진실적

- 2012. 01 ~ 02 : 사업대상지 현장조사 및 방침수립
- 2012. 03 ~ 08 : 실시설계용역 발주, 시행 및 완료
- 2012. 05 ~ 07 : 용역보고회 및 자문회의, 주민설명회
- 2012. 07 ~ 10 : 설계심의(서울시), 계약심사(서울시),

하천점용허가(서울지방국토관리청),
예산 재배정(서울시), 일상감사(우리구)

○ 2012. 10 ~ 11 : 공사 발주 및 입찰공고

□ 소요예산 : 930,000천원 - 시비 100%

□ 향후계획

- 물품선정위원회 구성 및 운영 후 관급자재 조달구매
- 입찰집행(개찰) 및 공사시행

32 마을단위 야외체육시설 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동 배드민턴장 외 10개소
- 기 간 : 2012. 1 ~ 7
- 규 모 : 7,000m²
- 내 용 : 배드민턴장 및 게이트볼장 정비,
공원 및 체련장 등에 야외운동기구 설치 및 정비

□ 추진실적

- 2012. 01. 31 : 사업추진 계획 수립(방침)
- 2012. 03. 20 : 실시설계 용역 시행
- 2012. 05. 17 : 계약심사 완료
- 2012. 06. 11 : 공사발주
- 2012. 07. 30 : 공사준공

□ 소요예산 : 126,734천원 - 구비 100%

33 양평유수지 생태복원 특화

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동 3가 57 (양평유수지)
- 추진기간 : 2012. 1 ~ 12
- 사업내역

- 토양치환 : 8,000m², 시설물 설치 : 등 의자, 난간보수, 수목터널 등 6종, 식재공 : 낙우송, 메타세콰이어, 수양버들 등 20종, 관급자재 : 식생매트(갈대, 물억새), 합성목재, 태양광정원등

□ 추진실적

- 2012. 01 ~ 02 : 사업대상지 현장조사 및 방침수립
- 2012. 03 ~ 08 : 실시설계용역 발주, 시행 및 완료
- 2012. 05 ~ 07 : 용역보고회 및 자문회의, 주민설명회
- 2012. 07 ~ 10 : 설계심의(서울시), 계약심사(서울시), 예산 재배정(서울시), 일상감사(우리구)
- 2012. 10 ~ 11 : 공사 발주 및 입찰공고

□ 소요예산 : 627,000천원 - 시비 100%

□ 향후계획

- 물품선정위원회 구성 및 운영 후 관급자재 조달구매
- 입찰집행(개찰) 및 공사시행

34 | **공원내 청소년 문화마당 조성**

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동 582-3(영등포공원 내)
- 규 모 : 무대설치1개소(12m×4m), 탁구조파고라 1개소
- 사업기간 : 2012. 3월 ~ 6월
- 내 용 : 공원내 청소년을 위한 문화마당 1개소 조성

□ 추진실적

- 2012. 03~04 : 실시설계용역 시행 및 계약심사
- 2012. 05. 02 : 공사발주
- 2012. 06. 11 : 공사준공

□ 소요예산 : 47,612천원 - 구비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동 582-3(영등포공원 내)
- 기 간 : 2012. 3월 ~ 11월
- 규 모 : 게이트볼장 조성 1면(20m×15m)
- 내 용 : 게이트볼장을 조성하여 노년층 공원이용활성화 기여

□ 추진실적

- 2012. 3~4 : 서울시 기술용역 타당성 심사
- 2012. 5. 7 : 영등포공원 조성계획변경(안) 열람공고
- 2012. 6. 1 : 서울시 도시공원위원회 심의 요청
- 2012. 8. 7 : 서울시 도시공원위원회 소위원회 심의결과 통보
- 2012. 8. 17 : 영등포공원 조성계획 변경 및 지형도면 고시
- 2012. 9. 19 : 서울시 설계심의
- 2012. 9. 24 : 일상감사 및 공사 계약심사
- 2012. 9. 25 : 공사발주
- 2012. 10. 15 : 공사계약
- 2012. 10. 16 : 공사착공 ※ 준공 11/24 (예정)

□ 소요예산 : 57,729천원 - 시비 100%

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동 582-3(영등포공원 관리사무실 1층)
- 기 간 : 2012. 6월 ~ 11월
- 규 모 : 북카페 조성 37.8㎡
- 내 용 : 관리사무실내 유휴공간을 활용하여 북카페 조성

□ 추진실적

- 2012. 6. 04 : 영등포공원내 북카페 설치계획 방침
- 2012. 7. 17 : 추가경정 예산 확보
- 2012. 9. 20 : 계약심사
- 2012. 9. 24 : 공사발주
- 2012. 10. 10 : 공사계약
- 2012. 10. 11 : 공사착공 ※ 준공 11/19 예정

□ 소요예산 : 17,302천원 - 구비 100%

Ⅲ. 2013 주요업무 계획

연 번	사 업 명	쪽
①	어린이 공원 정비	28
②	공원 내 수목 정비	29
③	열린학교(학교공원화) 유지관리	30
④	양평동 불량주택 밀집지역 공원화	31
⑤	공원시설물 정비	32
⑥	공중화장실 환경 개선	33
⑦	전기시설물 유지관리(연간단가)	34
⑧	가로수 생육환경 개선	35
⑨	가로변 녹지량 확충	36
⑩	녹지대 위험수목 정비	37

연 번	사 업 명	쪽
-----	-------	---

11	가로수 보식	38
12	옥상공원화	39
13	띠녹지 보식 및 정비	40
14	도시계획시설(녹지)조성 - 경부제3녹지	41
15	안양천 그린웨이 5차 조성	42
16	마을단위 야외 체육시설 설치	43
17	도림천 음수대 설치	44
18	안양천 제방 수목(왕벚나무) 보식	45
19	안양천·도림천 꽃묘 식재	46

1 어린이공원 정비

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공하여 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 활성화에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 고추말어린이공원 외 2개소 (평화, 다사랑)
- 규 모 : 어린이공원 3개소
- 사업기간 : 2013. 1월 ~ 6월
- 내 용 : 공원 내 노후 산책로 · 배수로 및 편익시설을 정비

□ 추진방향

- 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 공원 이용 활성화 도모
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 추진계획

- 2013. 01 ~ 03 : 실시설계용역 시행
- 2012. 03 ~ 04 : 일상감사, 계약심사
- 2012. 04 ~ 06 : 공사발주, 공사 시행 및 완료

□ 예 산 액 : 185,000천원(구비)

□ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

2 | 공원 내 수목 정비

공원 내 수목 중 무성한 수관 형성으로 공원 인접 주택에 민원을 야기 및 공원 이용에 위해가 되는 수목에 대하여 정비공사를 시행하여 안전사고 예방 및 쾌적한 공원 환경 제공코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 다사랑어린이공원 등 29개소
- 규 모 : 근린공원 6개소, 어린이공원 18개소, 소공원 5개소
- 사업기간 : 2013. 1월 ~ 6월
- 내 용 : 주택가 피해 수목 정비 (전지, 이식 및 식재 등)

□ 추진방향

- 공원 내 주택가 인접 대형 및 위험 수목을 전지하여 안전사고 예방
- 수목의 불필요한 가지를 전지하여 수목생리 활성화를 통한 공원경관 향상

□ 추진계획

- 2013. 01 ~ 02 : 현장조사
- 2012. 02 ~ 03 : 공사발주, 공사 시행 및 완료

□ 예 산 액 : 40,000천원(구비)

□ 기대효과

- 안전한 공원 환경 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

열린학교 조성사업 대상 학교 내 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지 환경 제공코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 영림초교 외 26개교
- 규 모 : 학교공원화사업 시행학교 27개교
- 사업기간 : 2013. 9월 ~ 10월
- 내 용 : 학교공원화사업 대상으로 노후 · 파손 시설물 보수 및 정비, 수목보식 등

□ 추진방향

- 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고 예방
- 아름답고 쾌적한 녹지 환경 제공으로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 추진계획

- 2013. 08 ~ 09 : 현장조사
- 2012. 09 ~ 10 : 공사발주, 공사 시행 및 완료

□ 예산액 : 20,000천원(구비)

□ 기대효과

- 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고예방
- 아름답고 쾌적한 녹지환경 제공으로 주민 삶의 질 향상에 기여

양평동 2가 41-5일대는 노후불량주택 밀집지역으로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성함으로써 주민에게 쾌적한 녹지환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동2가 41-5번지 외 31필지
- 규 모 : 1,109.5m²
- 사업기간 : 2009. 4월 ~ 2013. 9월
- 내 용 : 토지보상 및 마을마당조성

□ 추진방향

- 도시경관 향상 및 공원녹지 확충
- 저지대 노후 불량주택지를 개량함으로써 침수 피해 예방 효과

□ 추진계획

- 2012. 11 ~ 2013. 2 : 보상절차 이행
- 2013. 3 ~ 9 : 마을마당 조성

□ 예 산 액 : 250,000천원(구비)

□ 기대효과

- 공원·녹지가 부족한 불량주택(판자촌) 밀집지역에 주민들의 숙원 사업인 공원을 조성하여 시민의 여가 및 휴식 공간 제공
- 주거환경을 개선하여 주민들의 정서함양 및 삶의 질 향상에 기여
- 공원면적이 절대적으로 부족한 영등포에 공원을 조성함으로써 지역간 불균형 해소

노후되고 파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의시설을 확충하여 공원환경 개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 마을마당 58개소
- 사업기간 : 2013. 2월 ~ 2013. 11월
- 내 용 : 노후·파손시설물 교체 및 보수, CCTV 유지보수 등

□ 추진방향

- 노후되고 파손된 시설물을 정비하여 각종 안전사고 예방
- 쾌적한 휴식공간 제공 및 공원이용 활성화 도모

□ 추진계획

- 2013. 2 ~ 3 : 상반기 공원시설물 정비공사 실시설계용역 시행
- 2013. 4 ~ 6 : 상반기 공원시설물 정비공사 시행
- 2013. 7 ~ 8 : 하반기 공원시설물 정비공사 실시설계용역 시행
- 2013. 9 ~ 11 : 하반기 공원시설물 정비공사 시행

□ 예산액 : 270,000천원(구비)

□ 기대효과

- 도시공원내 공원시설 정비로 공원을 이용하는 이용주민 편의증진
- 쾌적한 휴식공간 제공 및 공원 이용 활성화 도모
- 공원 내 노후 시설물 정비로 각종 안전사고 사전예방

도시공원내 공중화장실을 정비하고 편의시설을 확충하여 이용주민에게 편리한 공원 환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 대림어린이공원(대림1동 870) 등 2개소
- 양남어린이공원(양평1동 205)
- 사업기간 : 2013. 2월 ~ 2013. 6월
- 내 용 : 노후시설 보수, 편의시설 확충 등

□ 추진방향

- 도시공원내 공중화장실 정비로 공원을 이용하는 이용주민 편익증진
- 아름답고 쾌적한 공원 조성으로 주민숙원사업 해결 및 삶의 질 향상

□ 추진계획

- 2013. 2 ~ 3 : 실시설계용역 시행
- 2013. 4 ~ 6 : 공중화장실 환경개선공사 시행

□ 예산액 : 65,000천원(구비)

□ 기대효과

- 공원내 공중화장실 정비로 공원을 이용하는 이용주민 편익증진

7 전기시설물 유지관리(연간단가)

공원 및 녹지대에 설치되어 있는 전기시설물(공원등, 전력시설)의 유지 관리를 위해 전기공사 연간단가를 시행함으로써 민원발생시 신속한 민원처리에 만전을 기하고자 하며 전기시설물 사전점검을 통하여 전기안전사고를 미연에 방지하여 효율적인 전기시설물 유지관리를 하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 녹지대
- 기 간 : 2013. 01월 ~ 12월
- 규 모 : 공원등 500여등, 전기시설물 정비
- 내 용 : 공원및녹지대의 전기시설물 이상발생시 즉각조치

□ 추진방향

- 노후된 공원등 및 분전함 개량 공원환경 개선
- 부점등 처리 및 전기시설 안전점검하여 공원이용객 편의제공

□ 추진계획

- 2013. 01 : 설계 및 공사발주
- 2013. 02 ~ 12 : 공사시행

□ 예산액 : 35,000천원(구비)

□ 기대효과

- 전기시설물 사전점검을 통하여 전기안전사고를 미연에 방지하여 효율적인 전기시설물 유지관리

8 가로수 생육환경 개선

도시경관의 주요 요소인 가로수 하부공간에 선형의 띠녹지를 보식 및 가로수 보호판을 정비하여 쾌적한 보행환경 및 풍요롭고 아름다운 도시경관 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 1 ~ 6.
- 위 치 : 여의동로, 국회대로, 영등포로, 당산로
- 규 모 : 4,670m²
- 내 용 : 띠녹지 신설 및 띠녹지 내 수목보식

□ 추진방향

- 띠녹지 보식 및 보행에 불편을 주는 가로수 보호판 정비
- 빗물 관리 개념이 도입된 서울시 레인가든 조성 지침 반영

□ 추진계획

- 2013. 1 : 가로수 생육환경 개선사업 추진계획 수립
- 2013. 2 ~ 3 : 실시설계용역 및 계약심사
- 2013. 4 ~ 6 : 공사시행

□ 예 산 액 : 490,000천원(시비)

□ 기대효과

- 가로 녹지량 확충 및 쾌적한 도시환경 제공

단풍과 열매, 꽃이 아름다운 수종과 초화류를 식재하여 녹지량을 확충하고 주민이 만족하는 쾌적한 녹지공간을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 서부간선도로변, 영등포로변
- 기 간 : 2013. 1 ~ 12.
- 규 모 : 14,400m²
- 내 용 : 화관목, 초화류 식재 등

□ 추진방향

- 차량 소음, 분진, 매연 저감을 위한 차폐수림 조성
- 도보 및 차량 통행 시 심미적 효과 제고와 주택가에서 바라보는 경관 향상

□ 추진계획

- 2013. 1 ~ 3 : 실시설계용역 시행
- 2013. 4 ~ 12 : 녹지량 확충공사 시행

□ 예산액 : 300,000천원(시비)

□ 기대효과

- 차량 통행 및 보행시 심미적 효과 제고
- 화관목 및 초화류 식재로 인한 쾌적한 거리환경 조성

녹지대 및 간선도로 주변의 위험수목을 사전에 정비하여 태풍, 폭우 등 기상이변으로 인한 녹지대 수목의 쓰러짐을 예방함으로써 안전하고 쾌적한 녹지대 환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 서부간선도로, 경인고속도로입구, 경부제4녹지, 노들로 주변 등
- 기 간 : 2013. 1 ~ 12.
- 규 모 : 380주
- 내 용 : 위험수목 제거 및 전지 등

□ 추진방향

- 기상이변 및 태풍에 의한 위험요소 사전 정비로 안전사고 예방
- 쾌적하고 안전한 녹지대 환경 조성

□ 추진계획

- 2013. 1 : 설계 시행
- 2013. 2 : 공사 발주
- 2013. 3 ~ 12 : 위험수목 정비공사 시행

□ 예산액 : 75,000천원(구비)

□ 기대효과

- 태풍에 의한 위험요소 사전 정비로 안전사고 예방
- 쾌적하고 안전한 녹지대 환경 조성

관내 가로수 중 교통사고, 신설도로, 자연고사 등으로 가로수가 없는 지역, 가로수 식재 민원요청지 등에 수목을 식재하여 가로변 녹지량 확충 및 쾌적한 가로경관을 조성코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 대방천로 등
- 기 간 : 2013. 1 ~ 6.
- 규 모 : 왕벚나무 등 가로수 보식 30주, 가로수보호판 설치
- 내 용 : 고사 등으로 비어있는 가로수분 내 가로수 식재

□ 추진방향

- 가로녹지량 확충을 통한 녹음제공
- 공해 완화를 통한 쾌적한 가로환경 제공

□ 추진계획

- 2013. 1 : 가로수 보식공사 추진계획 수립
- 2013. 2 ~ 3 : 실시설계용역
- 2013. 4 ~ 6 : 공사시행

□ 예산액 : 50,000천원(구비)

□ 기대효과

- 가로 녹지량 확충 및 녹음제공 등 쾌적한 가로환경 제공

도심권 녹지부족 지역으로 집중녹화가 필요한 공공기관 옥상에 옥상녹화 사업을 추진하여 도심 녹화량 확충 및 대기질 개선 등 쾌적한 도심환경에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포동7가 57 서울시 근로자복지관
- 기 간 : 2013. 1 ~ 10.
- 규 모 : 옥상조경 158m²
- 내 용 : 옥상녹화

□ 추진방향

- 생물서식공간 확보 및 시민 휴식공간 제공
- 도시열섬화 현상 완화 및 에너지 절약에 기여

□ 추진계획

- 2013. 1 : 사업추진계획 수립
- 2013. 2 ~ 4 : 구조안전진단 및 실시설계용역 시행
- 2013. 5 ~ 6 : 설계심의(시 조경과), 공사 발주
- 2013. 7 ~ 10 : 공사 착공 및 준공

□ 예 산 액 : 58,000천원(시비)

□ 기대효과

- 도심 열섬화 완화 및 주민휴게쉼터 조성
- 생활주변에 근접한 소규모 생물서식공간 확보
- 냉난방 에너지 절약, 대기질 개선 등 환경개선에 기여

보행자 등에 의한 답압 피해 및 겨울철 제설작업 후 염화칼슘 피해로 인하여 고사된 띠녹지에 수목을 보식하고 정비하여 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길로
- 기 간 : 2013. 1. ~ 6.
- 규 모 : 띠녹지 400m²
- 내 용 : 훼손이 심각한 상가 앞 띠녹지 철거 및 비어있는 띠녹지 수목식재

□ 추진방향

- 띠녹지 유지관리 및 철거 등 구분 시행
- 고사된 수목 보식으로 가로경관 향상

□ 추진계획

- 2013. 1 : 띠녹지 보식 및 정비공사 추진계획 수립
- 2013. 2. ~ 3 : 실시설계용역
- 2013. 4. ~ 6 : 공사시행

□ 예산액 : 50,000천원(구비)

□ 기대효과

- 상가 앞 훼손된 띠녹지를 철거하여 답압 등 사전에 방지하고 비어있는 띠녹지 내 수목을 보식하여 쾌적한 가로환경 제공

장기 미집행 도시계획시설 경부제3녹지에 대하여 연차적으로 보상 후 녹지를 조성함으로써 녹지 기능을 회복하여 장기 민원 해소 및 소음, 분진으로 인한 주거환경을 개선하고 도시 경관 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 68-3일대(신길역 ~ 대방역 구간)
- 기 간 : 2007. 11. 17. ~ 2013. 12. 31.
- 규 모 : 7,912m²
- 내 용 : 지장물 철거, 폐기물 처리, 녹지 조성 등

□ 추진방향

- 수목 식재를 위주로 한 녹지 복원
- 철로변 소음, 분진 완화로 주거환경개선

□ 추진계획

- 2013. 1월 : 녹지조성 실시설계용역 완료
- 2013. 2월 : 녹지조성공사 발주
- 2013. 3월 : 공사 착공
- 2013. 12월 : 사업 준공

□ 예 산 액 : 988,000천원(시비)

□ 기대효과

- 소음, 분진 요인을 제거하여 쾌적한 주거환경 조성
- 노후 건물 철거 후 수목식재로 인한 가로경관 향상

기조성된 안양천 그린웨이 1, 2, 3, 4차 구간과 연계하여 안양천 우안 제방사면 양평교~한강합류부 구간을 유해식물을 제거하고 다양한 화목과 초종이 자라는 자연경관지역으로 조성함.

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안 제방사면 양화교~한강합류부 구간
- 규 모 : 3,650m² (730m×5m)
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 12
- 사업내역
 - 철거공사, 토공사, 식재공사, 시설물공사, 포장공사, 우배수공사, 관수공사, 부대공사, 관급자재 조달구매 등

□ 추진방향

- 기 조성된 그린웨이 1, 2, 3, 4차 구간과 연계하여 조성함으로써 우리구 안양천 전구간 그린웨이 완성

□ 추진계획

- 2013. 01 ~ 02 : 사업대상지 현장조사 및 방침수립
- 2012. 02 ~ 07 : 실시설계용역 발주, 시행 및 완료
- 2012. 04 ~ 06 : 용역보고회 및 자문회의, 주민설명회
- 2012. 07 ~ 08 : 설계심의(서울시), 하천점용허가(서울지방국토관리청), 계약심사(서울시), 예산 재배정(서울시), 일상감사(우리구)
- 2012. 09 ~ 12 : 공사 발주 및 시행

□ 예 산 액 : 280,000천원(시비) (※ 가내시액)

□ 기대효과

- 하천제방 환경개선, 녹지량 확충 및 계절별 꽃이 피는 하천경관 조성
- 식생의 다양화로 하천생태계 보전 및 자연학습장으로 활용

늘어나는 웰빙인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 생활권 녹지대, 근린공원, 어린이공원 등에 야외체육시설을 설치하고 배드민턴장 등의 노후화된 시설물을 새롭게 정비하여 구민건강 증진 및 생활체육 활성화에 기여코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 거성체련장 외 4개소
- 규 모 : 5,500m²
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 6.
- 내 용 : 공원 및 체련장 등에 야외운동기구 설치 및 정비

□ 추진방향

- 공원 및 생활권 녹지대 등에 야외체육시설 설치로 웰빙인구 수용 충족
- 노후화된 야외체육시설 정비로 주민 만족도 향상

□ 추진계획

- 2013. 2월 : 실시설계 용역 시행
- 2013. 3월 : 계약 심사
- 2013. 4월 : 공사 발주
- 2013. 6월 : 공사 준공

□ 예 산 액 : 50,000천원(구비)

□ 기대효과

- 구민의 건전한 여가선용 및 생활체육을 통한 삶의 질 향상
- 생활주변의 체육시설 설치로 구민건강 증진 및 체육인구 저변 확대

17 도림천 음수대 설치

도림천(4.1km) 구간에 음수대가 전혀없어 도림천 이용자의 불편민원이 초래됨에 따라 시민불편 해소 및 편익 증진을 위하여 음수대를 신설코함

□ 사업개요

- 위 치 : 도림천 둔치(대방천합류부) 농구장 인근
- 기 간 : 2013. 3 ~ 4
- 규 모 : 음수대 1개소 신설
- 내 용 : 음수대 설치 및 주변정비

□ 추진방향

- 접근성 및 이용 편리성 등을 중점 고려하여 설치
- 자연친화적인 시설물 최대 반영

□ 추진계획

- 2013. 3 : 음수대 물품 조달구매 및 설치공사 발주
- 2013. 4 : 공사착공 및 완료

□ 예 산 액 : 12,000천원(구비)

□ 기대효과

- 도림천 전구간 4.1km내 음수대가 없어 이용에 불편하다는 주민 민원해소 및 이용자 편익증진

안양천의 산책로 및 각종 시설물 이용자가 날로 증가하고 있으나 산책로(벚꽃길) 구간에 식재된 벚나무 일부가 고사된 구간이 있어 보식 및 정비를 실시하므로서 안양천 벚꽃길 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 제방상단 산책로
- 기 간 : 2013. 4 ~ 5
- 규 모 : 수목(왕벚나무)보식 약 20그루
 - 오목교 ~ 목동교 구간 : 10그루
 - 목동교 ~ 양평교 구간 : 10그루
- 내 용 : 안양천 제방 벚꽃길 일부구간에 벚나무 보식 및 정비

□ 추진방향

- 벚나무 고사구간에 대한 보식 및 주변 정비
- 병충해 종합방제 및 약전지 등을 통한 지속적 수목관리

□ 추진계획

- 2013. 4~5 : 안양천 제방 수목보식

□ 예 산 액 : 20,000천원(구비)

□ 기대효과

- 고사된 벚나무를 보식하고 안양천 벚꽃길 유지관리에 만전을 기하여
관내명소 도약

자전거도로변 및 화단에 계절감 있는 꽃묘식재를 통하여 안양천 및 도림천 이용자의 쾌적한 하천이용 공간을 제공코자함

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천, 도림천 녹지공간
- 기 간 : 2013. 3월 ~ 12월
- 규 모 : 주민 접근이 용이한 주요지점에 꽃밭조성 관리
- 내 용 : 자전거도로변 및 화단에 계절감 있는 꽃묘식재

□ 추진방향

- 계절별 꽃묘 적기 식재 및 관리를 통한 쾌적한 하천환경 조성
- 자원봉사자의 지원활동을 통한 코스모스밭 사후관리

□ 추진계획

- 3~4월 : 칸나 등 20,000본, 메밀밭 조성
- 6~7월 : 베고니아 등 20,000본
- 8~9월 : 코리우스 등 20,000본, 코스모스밭 조성
- 11월 : 꽃양배추 5,000본

□ 예산액 : 25,000천원(구비)

□ 기대효과

- 도림천 이용자의 쾌적한 하천 이용공간 제공으로 주민만족도 제고

IV. 특수사업

1 영등포 올레길 조성

한강, 샛강, 안양천 등 기 조성된 하천의 산책로 활용 및 구민건강 걷기 코스로 재조성하고 기존의 공원, 하천, 산책로 등을 연계하여 걷기코스 발굴 및 테마가 있는 도심속 올레길 조성

□ 사업목표

- 우리구 외곽의 양호한 수자원 환경과 지역적 특성을 살려 녹지가 풍부하고 쾌적한 아름다운도시 영등포구 조성
- 웰빙시대에 걷기열풍으로 인한 사회적 이슈화 등 주민요구에 적극적인 대처로 대민행정의 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 한강, 샛강, 여의도공원, 선유도공원
- 기 간 : 2013년 1월 ~ 2013년 12월
- 규 모 : 총길이 24.9km(2012년도 8.2km 조성, 2013년도 16.7km)
 - 영등포수변둘레길(8.2km), 한강생태순환길(16.7km)

□ 추진방향

- 기 조성된 산책로, 편의시설 이용 및 필요시 추가 편의시설 설치
- 특화된 안내체계 도입, 단절된 산책로 연결, 노면불량구간 재정비, 탐방 및 표지판 설치, 쉼터 및 전망대 조성

□ 추진계획

- 2013. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 및 방침수립
- 2013. 2 ~ 5 : 실시설계용역(용역보고회 및 자문회의 등)
- 2013. 5 ~ 7 : 설계심의 및 계약심사 의뢰
- 2013. 8 ~ 9 : 하천점용 허가(서울지방국토관리청) 및 서울시 협의
- 2013. 9~10 : 공사발주
- 2013.10~11 : 공사착공 및 준공

□ 예 산 액 : 322,000천원(구비)

2 목화마을 물놀이장 조성

도심내 접근이 편리하고 다양한 계층이 이용 가능한 친수시설을 도입함으로써 가족과 함께 여가를 즐기고 사계절 활용이 가능한 물놀이장을 조성하여 주민들의 화합하는 커뮤니티 공동체 형성

□ 사업목표

- 다양한 계층이 이용 가능한 친수시설을 도입함으로써 가족과 함께 여가를 즐기고 주민들의 화합하는 커뮤니티 공동체 형성

□ 사업개요

- 위 치 : 문래동 3가 94-1번지 일대(목화마을마당)
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 6월
- 사업규모 : 3,311m²(물놀이장 조성 600m²)
- 시설내역 : 물놀이시설, 벽천, 분수, 휴식시설 등 테마공간 조성

□ 추진방향

- 친환경 물놀이장으로 조성하여 지역주민 및 가족친지 등 다양한 계층이 생활의 쉼터로 이용 할 수 있는 테마공원으로 조성
- 어린이놀이공간과 물놀이를 동시에 즐길 수 있는 수변공간으로 조성함으로써 사계절 활용할 수 있는 명소로 개발

□ 추진계획

- 2013. 1 ~ 2 : 현장조사, 사업추진계획 수립
- 2013. 2 ~ 3 : 실시설계용역(용역보고회 등)
- 2013. 4 ~ 6 : 공사착공 및 준공
- 2013. 7 ~ 8 : 물놀이장 개장 및 운영

□ 예산액 : 622,000천원(구비)
