

제185회 구의회 제2차 정례회

국 보고자료

청림 영등포

# 2014년 주요업무 보고



안 전 건 설 국

# 보고 순서

**1. 일반 현황**

**2. 2014 주요업무 추진실적**


**3. 2015 주요업무 추진계획**

**4. 신규 · 주요투자 사업**

# I. 일반 현황

■ 기 구 : 6과, 26팀

■ 조직도

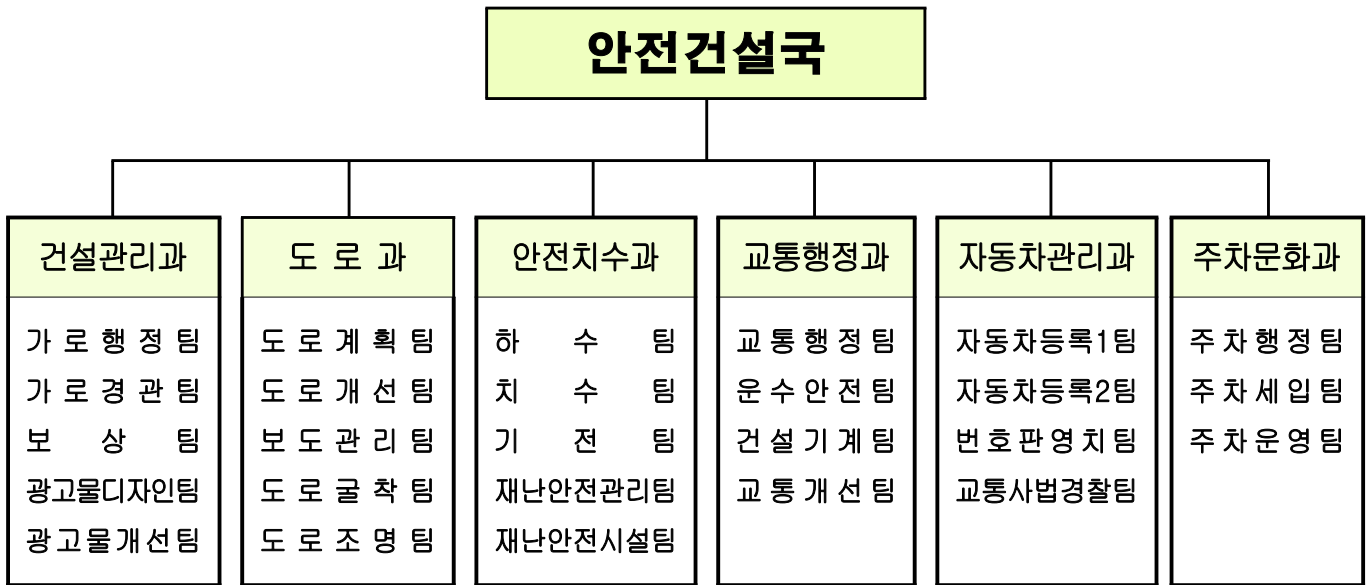

■ 인 력 : 현원 182명 / 정원 189명

팀 별	계	일 반 직					
		4급	5급	6 급	7 급	8 급	9급
계	182 /189	1/1	6/6	42 /40	83/65	32 /67	18/10
과부족	△7	-	-	2	18	△35	8
건설관리과	39 /39	1/1	1/1	9/8	15/13	7/16	6/0
도 로 과	31 /32		1/1	7/5	15/13	7/9	1/4
안전치수과	38 /41		1/1	11/8	22/15	3/14	1/3
교통 행정 과	27 /28		1/1	4/8	12/8	6/10	4/1
자동차관리과	24 /23		1/1	6/6	10/7	3/9	4/0
주차 문화 과	23 /26		1/1	5/5	9/9	6/9	2/2

## ■ 주요시설 현황

### 건설관리과

○ 가로 시설물 현황 (단위 : 개소)

보도상 영업시설물			광고물 시설물		
소 계	가로 판매대	구두 수선대	소 계	현수막 게시대	시민게시판
153	77	76	70	36	34

### 도 로 과

○ 도로 현황 : 주요간선도로 (경인로 외 27개 노선)

연장 387.794km		도 로 율
시도 76.0km	구도 311.9km	23.35% (서울시 : 22.32%)

○ 시설물 현황 (단위 : 개소)

구 분	교 량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	입체교차로
계	50	20	6	12	1	6

○ 조명시설

가 로 등	보 안 등
8,576등	9,670등

### 안전치수과

○ 시설물 현황

구 분	빗물펌프장	간이펌프장	수 문	원격감시시설	하수관거	하 천
시설개요	8 개소	7 개소	21개소 (57문)	26 개소	473,220m	4 개소 (16.94km)

## 교통행정과

### ○ 교통시설물현황

(단위 : 개소)

구 분	도로안내표지	보행자안내표지	도로반사경	자전거보관대	무인자전거시설
계	457	57	205	129 (3,938대)	3 (302대)
851					

### ○ 건설기계등록

(단위 : 대)

구 분	영 업 용	자 가 용	관 용	비 고
계	15,770	1,719	16	서울시 전체(45,913대)의 38%
17,505				

## 자동차관리과

### ○ 자동차 등록 현황

(단위 : 대)

구 분	승용차	승합차	화물차	특수자동차	이륜자동차
계	109,279	6,729	21,745	559	18,268
156,580					

## 주차문화과

### □ 주차장 현황

(단위 : 개소)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소 계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소 계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소 계	그린 파크	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	11,998	5,641	5,590	41	10	75	29	3	43	6,282	1,785	1,885	958	1,654
면수	161,477	6,916	5,590	938	388	6,772	2,664	1,235	2,873	147,789	2,916	4,418	67,697	72,758

### ○ CCTV 현황

(단위 : 대)

구 분	불법 주정차 단속용	그린파크	계도용
계	108	92	
200			

## ■ 예산집행 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	집 행 액		이 월 예상액	예상잔액
		집행액 (10.31 기준)	집행예정액 (12.31까지)		
계	48,794,415	23,414,027	6,329,841	5,702,061	13,348,486
건설관리과	641,964	477,051	109,116	0	55,797
도로과	6,687,242	4,536,767	1,335,405	592,331	222,739
안전치수과	5,766,928	4,829,491	908,951	0	28,486
교통행정과	1,068,431	764,390	165,980	0	138,061
자동차관리과	372,833	253,237	61,249	0	58,347
주차문화과	34,257,017	12,553,091	3,749,140	5,109,730	12,845,056

## Ⅱ. 2014 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	도로·하천 등 재산관리 .....	7
②	주민통행불편 해소 및 도시미관 조성 .....	8
③	도림로 확장공사 .....	9
④	신도림역~도림동 연결로 개선공사 .....	11
⑤	쾌적한 도로환경 조성을 위한 도로정비 .....	13
⑥	안전한 도로환경 조성을 위한 시설물 정비 .....	15
⑦	사각형로 보수·보강 및 개량공사 .....	17
⑧	하수관로 유지관리 .....	19
⑨	재난 및 안전관리 .....	20
⑩	교통시설물 설치 및 유지관리 .....	21

연 번	사 업 명	쪽
-----	-------	---

11	친환경 녹색교통 사업 .....	22
12	과태료 체납자 번호판 영치 .....	25
13	공영주차장 확충 추진 .....	26
14	지속적인 불법주정차 단속을 통한 주차질서 확립 .....	27



국·공유 행정재산의 사용자에 대한 사용료 부과와 무단사용자에 대해 권리보존 및 변상금을 부과하여 세원 발굴 및 체계적인 재산관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2014.1.1 ~ 12.31
- 방 법 : 국·공유지에 대한 정기 및 수시 실태조사 → 사용료부과/ 변상금 사전통지 → 징수·체납자 관리
- 징수목표 (단위 : 천원)

계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	징수교부금	가로판매대사용료
5,890,376	4,468,389	11,708	66,840	1,303,191	40,248

□ 추진실적

부 과	징 수	체 납	징수율
2,330건/5,676,338	2,075건/4,894,455	781,883	86.23%

- 도로사용료 부과 : 841건 3,189,618천원(징수 807건 3,111,299천원)
- 도로변상금 부과 : 193건 803,571천원(징수 166건 130,672천원)
- 기타 부과 : 1,296건 1,683,149천원(징수 1,102건 1,652,484천원)

□ 문제점 및 대책

- 어려운 경제여건과 예상치 못한 금전적 부담에 따른 체납자 증가  
 ⇨ 고액 및 상습체납자에 대한 체계적인 관리로 세외 수입 증대

□ 예 산 액 : 총56,078천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
56,078 (구비)	33,670 (구비)	60

주민생활에 불편을 초래하고 있는 도로상 불법 거리가게 및 불법 옥외 광고물에 대한 효율적인 정비와 지속적인 관리로 가로환경 수준 향상과 아름다운 도시 미관을 조성하고자 함

### □ 사업개요

- 기 간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
- 대 상 : 거리가게(402개소), 불법광고물(고정·유동)
- 정비방법 : 자율정비 유도와 지역별 여건 고려하여 단계적으로 추진

### □ 추진실적

- 거리가게 정비 실적
  - 특별정비 : 73회(마늘시장, 봄꽃축제, 공휴일·야간 등 특별가로정비)
  - 정비실적
    - 거리가게 정비 : 27,703건
    - 강제수거 : 825건(노점 443건, 노상적치물 382건)
    - 과태료 및 변상금 부과 : 395건 137,004천원(고발 : 5건)
- 불법광고물 정비 및 행정처분 현황 (2014.10.31 현재, 단위 : 건, 천원)

유동광고물					고정광고물			행 정 처 분					
계	현수막	입간판	에어 라이트	벽보 등	계	가로형 간판등	기타 (창문,지주)	합 계		이행강제금		과 태 료	
								건수	금액	건수	금액	건수	금액
34,909	33,574	1,099	96	140	366	177	189	1,994	1,574,653	54	55,015	1,940	1,519,638

### □ 향후계획

- 대형·기업형 거리가게 집중 단속과 반복·상습 위반자 행정조치
- 지속적인 정비와 불법광고주에 대한 행정처분으로 불법행위 근절

### □ 예산액 : 총356,754천원(구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
356,754천원	247,836	69.5

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

#### □ 사업개요

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동421-16간(신길광장)
  - ※ 금회 ㄱ 공사 - 신길동 373-1(도림사거리) ~ 355-677(성락주유소)
  - ㄴ 보상 - 신길동 401-11 ~ 399
- 규 모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m
  - ㄱ 신길5동사무소측 : 기확장 850m, 미확장 300m(신길재정비촉진지구 내)
  - ㄴ 성락교회측 : 기확장 710m, 미확장 440m
  - ※ 금회 ㄱ 공사 - 도로확장 폭 25→30m, 연장 360m(성락교회측)
  - ㄴ 보상 - 토지 7필지(466㎡), 연장 90m(성락교회측)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 총사업비 : 44,650백만원(시비:보상비 39,200 공사비 5,300 설계비 150)
- 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장래	비고
추진내용	용역	150	150					
	보상	39,200	29,100	3,500	500	6,100		
	공사	5,300	2,800	1,000	500	1,000		
총사업비		44,650	32,050	4,500	1,000	7,100		

#### □ 추진실적

- '14.2.27~12. : (성락교회측) 90m 실시계획인가고시 및 보상시행
- '14. 3. 5 : (성락교회측) 360m 공사착공
- '14. 11. 5 : (성락교회측) 360m 공사완료


□ 문제점 및 대책

- 2009년부터 연차별로 사업비가 집행되다보니 사업구간내 아직 보상받지 못한 토지 및 건물의 소유주들의 조속한 사업시행(보상)을 요청하는 민원이 발생하고 있는 실정임.
- 조속한 사업시행을 위해 서울시와 지속적으로 협의

□ 예산액 : 총4,500,000천원 (시비 4,500,000)

예산액	집행액	집행율(%)
4,500,000 (시비 4,500,000)	3,529,835 (시비 3,529,835)	78.5

□ 위치도

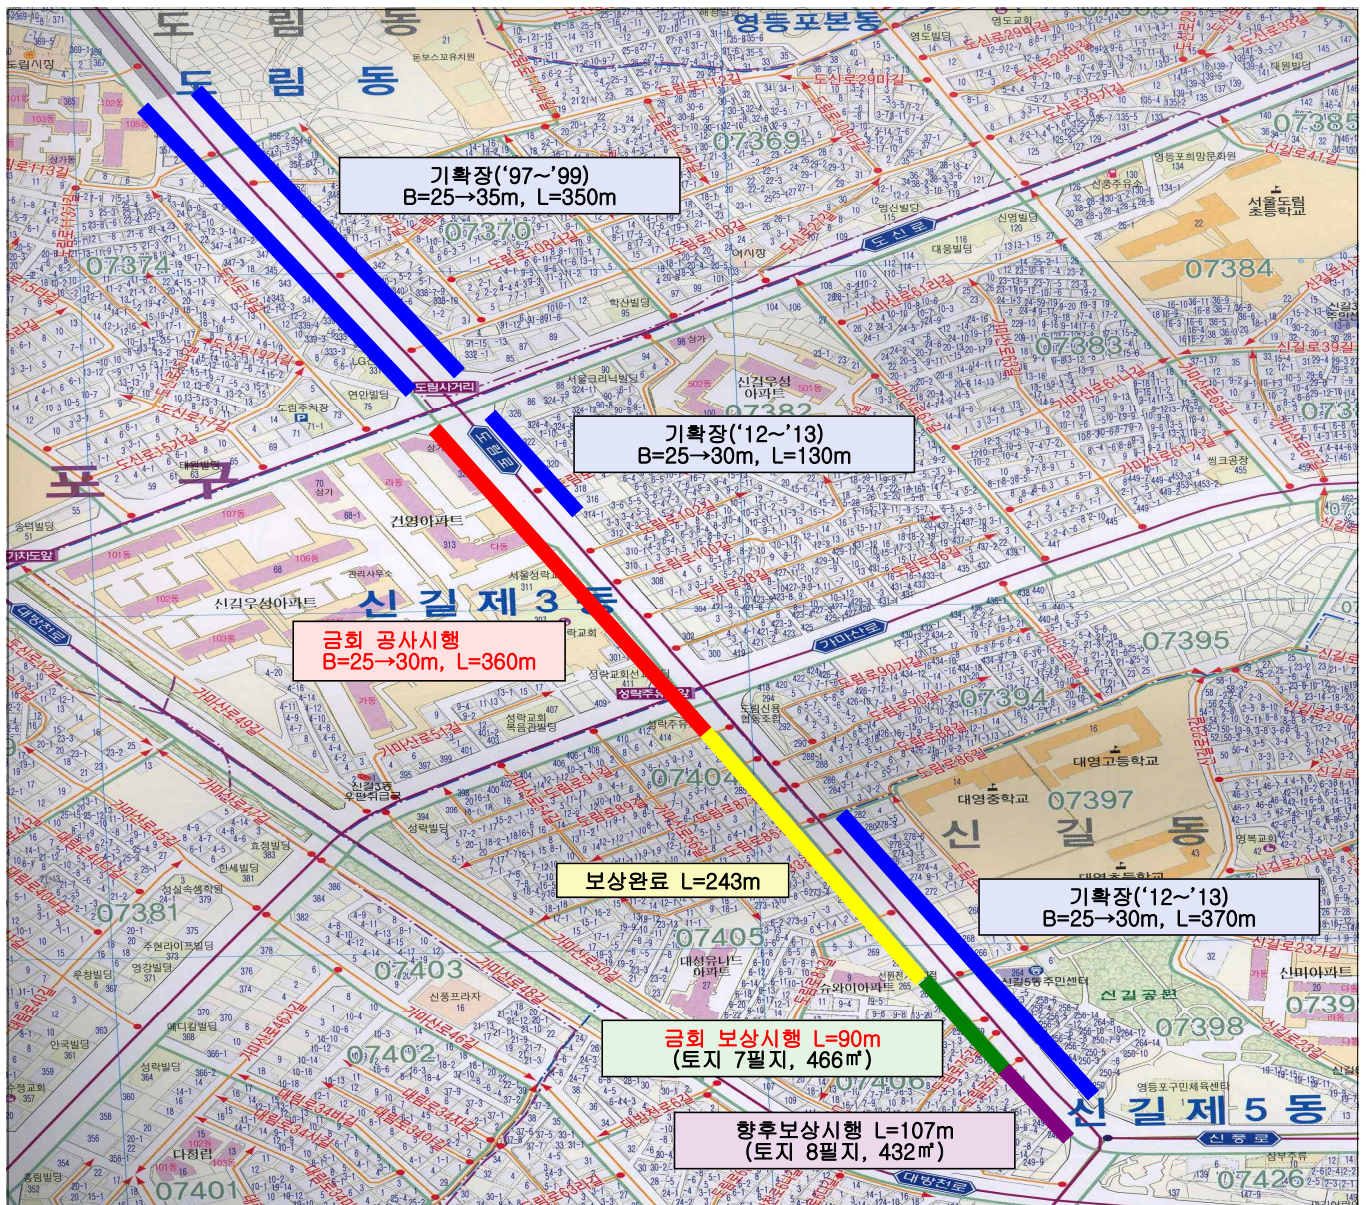

도림천으로 단절되어 있는 신도림역과 아파트 단지 간의 연결로의 설치로 보행로를 확보하여 신도림역의 보행접근로 및 편의성 향상을 도모코자 함.

#### □ 사업개요

- 위 치 : 신도림역 1호선 ~ 도림동 아파트단지간
- 규 모 : 연결로 폭 2.5m, 연장 100.45m
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 총사업비 : 2,880백만원(시비)

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비 고
추진 내용	용역	180	50	130				
	보상							
	공사	2,700		123	2,577			
총사업비		2,880	50	253	2,577			

#### □ 추진실적

- '13. 5.13~10.24 : 타당성조사 용역 시행
- '14. 3.11 : 기본 및 실시설계 용역 착공
- '14. 5.~ 6. : 구기술자문회의 2회 개최
- '14. 9.19 : 교량형식선정위원회 개최
- '14.10.15 : 서울시민 디자인 위원회 심의이행
- '14.12. : 기본 및 실시설계 용역 준공예정


#### □ 문제점 및 대책

- 서울시 디자인 심의 결과 보도폭 2.5m→3.6m이상으로 조건부 승인 되었으나, 사업비가 12억 증가되어 이에 따른 비용편익비(B/C)감소로 경제적 타당성이 결여됨.
- 당초 원안(보도폭2.5m)대로 사업 추진 예정임.

□ 예 산 액 : 총253,000천원 (시비 253,000)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
253,000 (시비 253,000)	56,900 (시비 56,900)	22.5

□ 위 치 도

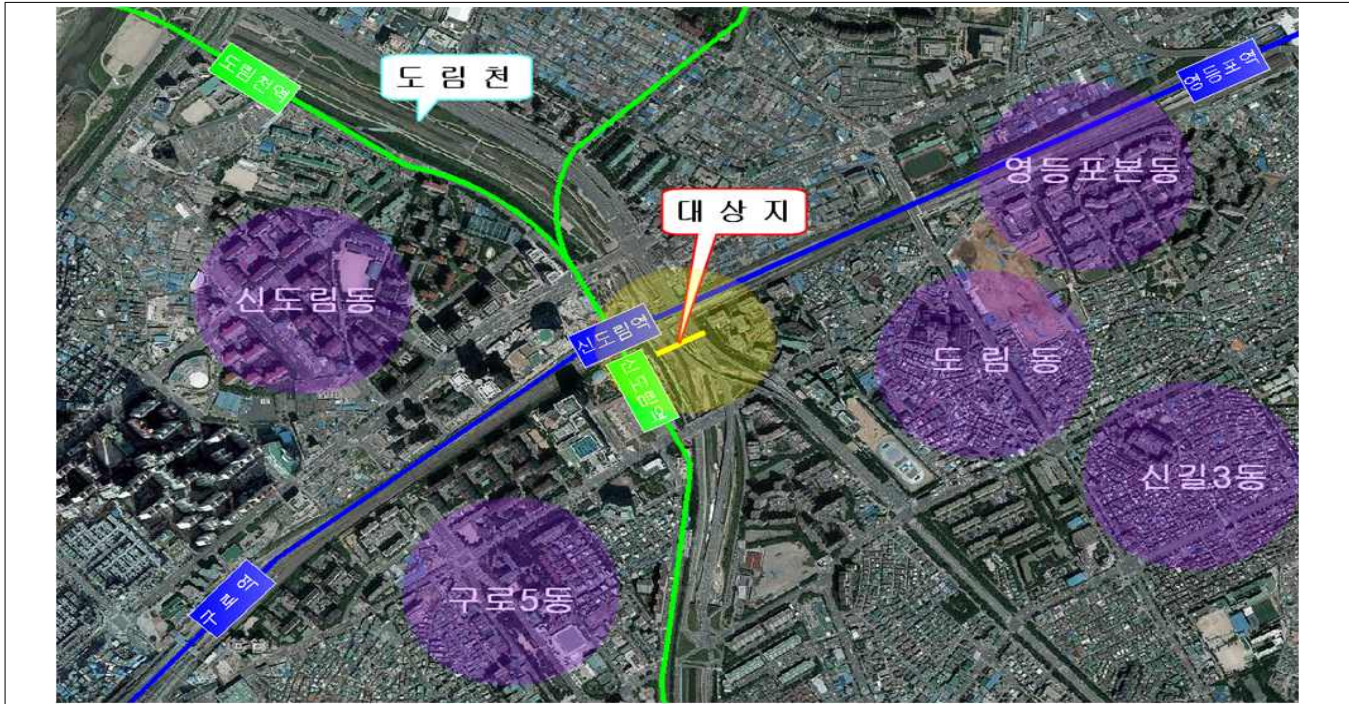

노후훼손 및 상태가 불량한 도로 및 도로시설물을 신속히 보수·정비하여 주민통행 불편을 해소하고 지속적인 도로 및 도로시설물 정비로 도로의 기능성 유지 및 안전사고를 사전예방 하고자 함

□ 포장도로 정비 등 소파보수공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 아스팔트포장 190a, 콘크리트포장 9a, 보도포장 60a
- 기 간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28
- ※ “사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사” 포함 시행
- 추진실적 : 포장도로의 노후·파손·침하 등 주민불편사항 해소 205개소  
- 아스팔트, 콘크리트, 보도블록, 측구, 경계석 등 보수
- 소요예산 : 1,135,000천원 (구비)
- 집 행 액 : 1,092,927천원 (96%)

□ 영등포동6가 35주변 도로포장공사

- 위 치 : 영등포동6가 35-1 ~ 32-8번지 간
- 규 모 : 아스팔트포장 7.6a
- 기 간 : 2014. 3. 3 ~ 5. 1
- 소요예산 : 74,000천원 (구비)
- 집 행 액 : 73,423천원 (73%)

□ 보라매역 주변 투수블록포장공사

- 위 치 : 신길6동 보라매역 주변
- 규 모 : B=2~4m, L=340m, A=11.6a
- 기 간 : 2014. 3. 14 ~ 6. 14
- 추진실적 : 보도 정비 B=2~4m, L=340m, A=11.6a
- 소요예산 : 160,000천원 (시비50%:구비50%)
- 집 행 액 : 144,302천원 (90%)

□ 예산액 : 총1,369,000천원 (시비 80,000, 구비 1,289,000)

사업명	예산액	집행액	집행율(%)
합 계	1,369,000 (시 80,000 구비 1,289,000)	1,309,997 (시 72,151 구비 1,23,7846)	95.7
포장도로정비 등 소파 보수공사(연간단가)	1,135,000 (구비 1,135,000)	1,092,972 (구비 1,092,972)	96
영등포동6가 35주변 도로포장공사	74,000 (구비 74,000)	73,423 (구비 73,423)	99
보라매역 주변 투수블록포장공사	160,000 (시 80,000, 구비 80,000)	144,302 (시 72,151, 구비 72,151)	90



□ 도로시설물 설치 및 보수공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 보도육교, 과속방지턱, 안전웬스 등 도로시설물 유지관리
- 기 간 : 2014. 3. 5 ~ 12. 31
- 추진실적 : 보도육교 보수 14개소, 과속방지턱 신설 및 도색 등 320개소  
지하보도· 안전웬스 등 기타 도로시설물 유지관리
- 소요예산 : 442,000천원 (구비)
- 집행액 : 441,667천원 (99%)

□ 방음벽교체공사

구 분 \ 공사명	여의도고등학교 앞	영등포초등학교 앞	비 고
위 치	여의도 국제금융로7길37	경인로77길3	
규 모	H=4~5m, L=56m	H=8m, L=55m	
사업기간	2014. 3.3 ~ 6.19	2014. 8.4 ~ 8.20	
사업예산	287,000천원 (시비)	120,000천원 (시비)	
집행액	260,143천원 (91%)	120,000천원 (100%)	

□ 여의대방로(시흥대로) 안전웬스 설치

- 위 치 : 여의대방로(원효대교 남단 ~ 구로디지털단지지역)
- 규 모 : 방호울타리 설치 및 교체(L=1,639m)
- 기 간 : 2014. 3. 1 ~ 5. 31
- 소요예산 : 310,800천원 (시비)
- 집행액 : 310,535천원 (99%)

□ 오목교 엘리베이터 설치공사

- 위 치 : 양평동2가 오목교 앞
- 규 모 : 엘리베이터 설치, 주변 보행환경 개선
- 기 간 : 2014. 5. 8 ~ 11. 24
- 추진실적 : 엘리베이터 설치 및 보행환경 개선 공사중(현공정 97%)
- 소요예산 : 350,000천원 (시주민참여예산)
- 집행액 : 340,101천원 (97%)

□ LED 보안등 설치공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 기 간 : 2014. 7. 31 ~ 10. 23
- 규 모 : 확산대형 나트륨등(100W)을 LED보안등으로 137등 교체
- 추진실적 : LED 50W 137등 교체 설치
- 소요예산 : 142,000천원 (국30,000, 시32,000,구비 80,000)
- 집행액 : 142,000천원 (100%)

□ 경인로 가로등 개량공사

- 위 치 : 경인로(영등포로타리 ~ 도림교)
- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 기 간 : 2014. 5. 26 ~ 11. 27
- 규 모 : 가로등 138등을 LED 155등으로 개량
- 추진실적 : 가로등 LED120W 43등, 80W 57등 교체 (공정율 : 80%)
- 소요예산 : 870,000천원 (시비870,000)
- 집행액 : 232,787천원 (26.8%)

□ 예 산 액 : 총2,521,800천원 (국비 30,000, 시비 1,969,800, 구비 522,000)

사업명	예산액	집행액	집행율(%)
합 계	2,521,800 (국 30,000, 시 1,969,800, 구비 522,000)	1,847,233 (국 30,000, 시 1,295,566, 구비 521,667)	73.3
도로시설물 설치 및 보수공사(연간단가)	442,000 (구비 442,000)	441,667 (구비 441,667)	99
방음벽 교체공사	407,000 (시비 407,000)	380,143 (시비 380,143)	93.4
여의대방로(시흥대로) 안전휀스 설치	310,800 (시비 310,800)	310,535 (시비 310,535)	99
오목교 엘리베이터 설치공사	350,000 (시비 350,000)	340,101 (시비 340,101)	99
관내 LED보안등 설치공사	142,000 (국 30,000, 시 32,000, 구비 80,000)	142,000 (국 30,000, 시 32,000, 구비80,000)	100
경인로 가로등 개량공사	870,000 (시비 870,000)	232,787 (시비 232,787)	26.8

노후 불량 사각형거의 심각한 손상 부위를 보수·보강 및 개량하여 구조물의 내구성 및 안전성을 확보함으로써 안전사고를 사전에 예방하고 원활한 배수기능 및 관거 수명을 연장함

□ 사업개요 및 추진실적

공사명	규모	사업비	추진실적	공정율
<b>8건</b>	<b>총사업비</b>	<b>17,642</b>		
신길동 400-17 ~ 355-698간 사각형거 보수·보강공사	하수박스 보수 ■2.0×1.5~2~■2.5×2.4m L=853m	800	○ 공사준공	100%
신길동 100-4 ~ 139-9외 7개소 사각형거 보수보강 공사	하수박스 보수 ■1.2×1.4~2■2.5×2.0m L=2,144m	1,500	○ 예비준공검사 완료 ○ 보수·보강공사 완료	99%
영등포7가 62-3 ~ 63-2외 3개소 하수관 개량공사	하수관개량 D600~1,200mm, L=1,387m	1,600	○ 하수관 개량 D1,200mm, L=120m ○ 비굴착 개량 D600~800mm, L=239m	35%
도림1배수분구 하수관거 종합 정비공사	하수관 신설,개량 D300mm ~ ■2.0×2.0m, L=49.87km 보수·보강 ■1.0×1.0m ~■2.4×2.4m, L=3.2km	9,272	○ 1,2구역 공사완료 ○ □1.5×1.0m, L=115m ○ D600~1,000mm, L=1,219m	60%
양평동 77 ~ 265간 사각형거 개량공사	하수박스 보수 ■1.2×2.0~1.5m L=750m	1,520	○ 사각형거 개량 L=429m ○ 아스팔트 포장 A=23a	95%
신길동 도신로 하수관 개량공사	하수관개량 및 보수 D450~1,200mm L=490m	500	○ 공사준공	100%
신길역 주변 하수관 이설공사	하수관개량 D800~1,200mm L=240m	1,450	○ 하수관로 부설 220m 완료	80%
여의도 국회의사당 앞 사각형거 개량공사	사각형거 개량 □1.5×1.5m, L=80m	1,000	○ 공사착공 ○ 가시설 및 복공판 설치	5%

□ 향후계획

○ 2014년 11월 준공 : 3건

- 신길동 100-4 ~ 136-9외 7개소 사각형거 보수·보강 공사
- 양평동 77 ~ 265간 사각형거 개량공사
- 신길역 주변 하수관 이설공사

○ 2015년 준공 : 3건

- 여의도 국회의사당 앞 사각형거 개량공사(1월준공)
- 영등포7가 62-3 ~ 63-2외 3개소 하수관 개량공사(2월준공)
- 도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역(3,5블럭)/4월준공)

□ 예산액 : 총17,642,000천원 (시비 17,642,000)

예산액	집행액	집행율(%)
17,642,000 (시비 17,642,000)	15,005,124 (시비 15,005,124)	85.1

노후·불량 하수도 개량과 빗물받이 등 하수시설의 철저한 유지관리로 수해예방 및 『구민의 삶의 질 향상』에 기여하고자 함

#### □ 사업개요

##### ○ 노후·구배불량 하수도 개량

- 하수관로 개량 : D300mm~D900mm, L=1,070m
- 맨홀 및 빗물받이 개량 및 설치 : 185개소

##### ○ 하수도 준설 및 빗물받이

- 하수관로 준설 : 총 연장 51.3km(중점관리구역 12.6km, 일반지역 38.7km)
- 빗물받이 준설 : 총 15,571개소(간선 11,500, 지선 3,500)

#### □ 추진실적

##### ○ 하수관로 및 맨홀, 빗물받이 개량 및 신설(공정율 95%)

- 하수관로 개량 : D300mm~D600mm, L=1,010m
- 맨홀 및 빗물받이 개량 및 신설 : 190개소
- 민원사항 처리건수 : 150건

##### ○ 하수관로 준설

- 중점관리구역(대림동) : L=12.6km 5월말 준설완료
- 일반지역(저지대 등) : L=33.4km 준설완료

##### ○ 빗물받이 준설

- 중점관리구역(대림동) : 2,180개소 완료
- 일반지역 : 간선 13,192개소, 지선 4,162개소 준설

#### □ 향후계획

- '14.12.30 : 하수관로(일반지역)준설 및 민원처리
- '14.12.30 : 빗물받이 준설 및 민원처리

#### □ 예산액 : 총3,087,000천원 (구비 2,428,000, 시비 659,000)

예산액	집행액	집행율(%)
3,087,000 (구비 2,428,000, 시비 659,000)	2,191,668 (구비 1,565,185, 시비 626,483)	71

재난사고 유형의 다양화에 대비한 재난 유형별 안전관리계획 수립하여 각종 재난 및 안전사고를 사전에 대비하고 안전문화운동의 지속적 추진으로 구민의 안전 관리에 만전을 기하고 함

□ 사업개요

- 재난 유형별 안전관리계획 수립으로 각종 재난 및 안전사고 사전대비
- 안전관리계획을 검증하고 재난위기대응 매뉴얼의 구체성 확보

□ 추진실적

- 2014 영등포구 안전관리계획수립 및 책자 제작 배부 100부
- 영등포구 재난현장 통합지휘소 설치·운영에 관한 조례제정(2월)
- 지진가속도 계측기 설치 (11월 준공)
- 안전점검의 날 지정 운영(캠페인 실시 등) : 10회
- 저지대 주민 풍수해보험 지원 : 107세대
- 어린이 안전교육 순회 실시 : 65개소 2,100명
- 특정관리대상시설물 안전점검 실시 : 상반기 1,270개소
- 지역자율방재단 소양교육 : 2회 486명

□ 향후계획

- 재난유형별 안전관리계획 및 재난대응 매뉴얼 정비 추진
- 안전문화운동 영등포구 안전문화운동협의회 구성, 선도과제 발굴 추진
- 안전점검의 날 운영(매월 4일)
- 하반기 특정시설대상 일제(전수)조사

□ 예산액 : 총88,729천원 (시비 27,261, 구비 61,531)

예산액	집행액	집행율(%)
88,729 (시 27,261, 구비 61,531)	73,837 (시 26,481, 구비 47,356)	83

우리구 관내에 교통시설물 중, 노후·파손된 시설은 교체 정비하고, 민원 요구사항이나 필요시에는 신규 설치함으로써 도로를 이용하는 주민들에게 편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 관내
- 기 간 : 2014년 년중
- 추진내용
  - 버스승차대 및 교통시설물 유지관리를 통한 구 이미지 개선
  - 도로안내표지판 정비를 통한 주변지역의 차량소통 원활
  - 봄꽃축제를 찾는 상춘객의 교통사고예방 및 원활한 행사운영 도모
  - 어린이보호구역 내 차량통행속도 저감을 통한 어린이 교통사고예방

□ 추진실적

- 버스승차대 유지보수 및 마을버스승차대 이전설치 7개소
- 도로안내표지판 문안수정 39개, 시선유도봉 정비 교체 41건
- 봄꽃축제 교통통제에 따른 입간판 설치 54개
- 스쿨존 과속 경보시스템 신설 1개소 (여의도 초등학교)
- 도로반사경 정비 신설 및 교체 16개 등

□ 문제점 및 대책

- 스쿨존 과속 경보시스템 신설로 어린이 교통사고 예방
- 교통시설물 유지관리 정비를 통한 교통사고 예방
- 버스승차대 유지관리를 통한 버스이용객들의 대중교통편의 증진

□ 소요예산 : 총 432,973천원(시비 210,000, 구비 222,973)

예산액	집행액	집행율(%)
432,973 (시210,000, 구222,973 )	302,733 (시198,398, 구104,335 )	69.92

자전거 이용 활성화로 환경오염을 줄이고 국민의 건강 증진 및 레저 문화 수준 향상을 위한 자전거 이용 시설물에 대한 관리를 철저히 함으로써 국민의 건강과 행복증진에 기여코자 함

#### □ 자전거이용 시설 정비

##### ○ 자전거 시설 현황

- 자전거 도로 : 총 19개구간 21.4km
- 무인 자전거 이용시설 : 3개소 (구청, 당산, 영등포역)
- 수리소 운영 현황 : 3개소 (구청, 당산, 대림)

##### ○ 추진실적

- 2014. 3. : 대림수리소 및 대여소 홍보물 제작 및 배포(비치)
- 2014. 6. : 어린이 자전거 교통안전체험장 전기공사 시행
- 2014. 7. : 자전거도로 시선유도봉 정비공사 시행  
(설치 232개 철거/이전 168개, 반사지교체 67개)
- 2014. 8. : 교통안전체험장 차량진입 방지공사 및 자전거도로 미끄럼방지 포장(L=130m, B=1.6m)

##### ○ 소요예산 : 49,000천원 (구비)

##### ○ 집행액 : 38,169천원 (77.9%)

##### ○ 향후계획

- 상시 자전거 시설물 현장 점검을 통한 조기 시설정비 완료

#### □ 자전거 주차타워 운영

##### ○ 무인 자전거 이용시설 현황

구 분	운영규모	운영방법	설치연도/비용
영등포구청	120대	보관(80대) 대여(40대)	2008년/780백만원
당산역	20대	대여만	2009년/83백만원
영등포역	162대	보관만	2010년/762백만원 (구청-5억, 시비, 철도-262백만원)



- 영등포역 시설은 구청과 철도 50:50으로 유지비용 분담
- 영등포구청 및 당산역 이용시설은 유지보수 추진
- 추진실적
  - 개인자전거 주차 5,981대, 대여자전거 이용 11,442대
- 소요예산 : 63,600천원 (구비)
- 집행액 : 29,157천원 (45.84%)
- 향후계획
  - 대여자전거 노후로 교체시기가 도래하여 기증을 통한 대여자전거 확보 노력

#### □ 방치 자전거 수거

- 사업개요
  - 관련근거 : 자전거이용활성화에 관한 법률 제20조 및 동법 시행령 제11조
  - 수거대상 : 10일이상 공공장소에 무단으로 방치되어 통행을 방해하는 자전거
  - 추진절차 : 방치자전거 스티커부착(10일) → 수거 → 고시공고(14일) → 매각
  - 매각업체 : 2014년 초 서울시로부터 통보된 우리구 지정업체
- 추진실적 : 505대
  - ※ 방치자전거 수거 총 513대중 공고 기간내 8대 반환조치
- 소요예산 : 3,000천원 (구비)
- 집행액 : 2,837천원 (94.57%)
- 향후계획
  - 방치자전거 현장순찰 인력을 일자리사업의 일환으로 확보하여 순찰 강화 및 방치자전거 수거실적 거양

#### □ 자전거보관대 유지관리

- 규모 : 관내 129개소 3,938대
- 추진실적
  - 2014. 3. : 자전거보관대 설치 및 유지관리 정비공사(연간단가) 시행
  - 2014. 7. : 작업지시 (1차)
  - 2014. 8. : 1차 작업완료 (신설 15대, 철거 40대 등) 및 작업지시 2차
  - 2014. 9. : 2차 작업완료(신설 35대, 이설 20대 등)
  - 2014. 10. : 3차 작업완료(신설 15대 등)

- 소요예산 : 13,000천원 (구비)
- 집행액 : 11,900천원 (91.5% - 원인행위)
- 향후계획
  - 늘어나는 자전거 수요에 비해 신규 설치 장소 부족
  - 기존 시설물 확대 정비로 추가 물량 확보

□ 예산액 : 총128,600천원(구비)

(단위:천원)

사업명	예산액	집행액	집행율(%)
합 계	128,600	70,163	54.56
자전거이용 활성화	49,000	38,169	77.90
자전거 주차타워 운영	63,600	29,157	45.84
방치자전거 수거	3,000	2,837	94.57
자전거 보관대 유지관리	13,000	0 (원인행위 11,900)	0 (91.50)

자동차 관련 과태료 상습 체납자의 자동차 변호판 영치를 통해 과태료 체납 징수율을 제고하는 한편 의무보험 미가입 및 검사 미필차량의 운영을 제한함으로써 시민의 안전을 도모하고자 함

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
- 사업대상
  - 「질서위반행위규제법」 개정 이후 발생한 과태료 체납자 중 세목별 체납액이 30만 원 이상, 체납발생일로부터 60일 경과한 자
- 사업근거
  - 「질서위반행위규제법」 개정(2011. 7. 6.)
  - 서울시 및 25개 자치구 상호간 「자동차과태료 상호징수에 따른 협약」 체결
  - 촉탁비 : 징수금액의 30%

#### □ 추진실적

- 자동차 변호판 영치(2014.10월말 현재)
  - 대상 대수 : 2,586대
  - 영치 대수 : 512대
  - 총 과태료 징수금액 : 276,242천원
    - 우리구 소관 : 99,525천원
    - 타구 소관 : 176,717천원

#### □ 예산액 : 총 55,318천원 (구비)

예산액	집행액	집행율(%)
55,318	14,385	26

주차난이 심각한 주택 밀집 지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영 주차장을 건설하여 주차난을 해소하고 주민생활 편의를 증진하고자 함

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업위치 : 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 사업내용
  - 주택 밀집 지역 내 주차장 건설부지 확보
  - 주차 가능 도로 전수조사로 공영주차장 확보

#### □ 추진실적

- 별관청사 공영주차장 건설
  - 위 치 : 선유동1로 80
  - 규 모 : 평면식 61면(997.73 $m^2$ )
  - 급 지 : 3급지
  - 운영일자 : 2014. 8. 11
  - 운영방법 : 영등포구시설관리공단 위탁 운영
- 경부 제3녹지 지하공영주차장 실시설계용역 준공 : 2014. 8.22
  - 지하2층 자주식 143면(5,622 $m^2$ )

#### □ 문제점 및 대책

- 감정평가액 부지매입에 따른 토지 선정의 어려움
- 도로, 공원 등 공공용지 적극 활용 주차장 건설

#### □ 예 산 액 : 총11,182,513천원 (시비 3,018,000, 구비 8,164,513)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
11,182,513천원 (시비 3,018,000, 구비 8,164,513)	304,712천원 (시비 0, 구비 304,712)	2.7

무질서한 주차질서를 바로잡아 차량의 원활한 통행과 보행인의 안전을 확보하고, 도로 기능을 유지하는 등 시민이 자발적으로 참여하는 올바른 주차질서를 확립하고자 함

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 단속지역 : 6개 지역(권역별 단속조 책임구역제 순환지정 운영)
- 단속인력 : 31명(주차단속원 28명, 기동반 3명)
- 단속방법 : 일반·이면도로 등 계도 위주, 중점단속구역은 단속 후 견인

#### □ 추진실적

- 주차단속 실적

구 분	계	단 속 반	CCTV	계 도	비 고
단속건수	117,965	67,380	23,512	27,073	

- 봄꽃축제(4. 3 ~ 4.10) : 2,077건(과태료·견인 1,272건, 계도 805건)
- 세계불꽃축제 행사(10. 4) : 618건(과태료·견인 539건, 계도 79건)
- 주차단속 관련 의견진술처리 : 3,856건
- 휴대폰 문자알림서비스 제공 : 23,880건
- 주차단속 민원처리(응답소, 새올상담, 구청장에 바란다 등) : 5,399건

#### □ 문제점 및 대책

- 중점단속구역, 소통장애 유발 구간, 취약지역 집중 단속 실시
- 주차단속원 조별 책임구역제로 불법주정차 단속 전문성 제고
- 무인단속지역 휴대폰 문자알림서비스 제공으로 행정의 신뢰성 확보

#### □ 예 산 액 : 총1,440,661천원 (구비)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,440,661천원	898,721천원	62.4

### Ⅲ. 2015 주요업무 추진계획

연 번	사 업 명	쪽
①	도로·하천 등 재산관리 .....	30
②	주민통행불편 해소 및 도시미관 조성 .....	31
③	도림로 확장공사 .....	32
④	대림동812-12번지 도로개설공사 .....	34
수	쾌적한 도로환경 조성을 위한 도로정비 .....	35
⑥	안전한 도로환경 조성을 위한 시설물 정비 .....	36
⑦	2014/15 제설대책 추진 .....	37
⑧	영등포동8가 59-1 ~ 17-1번지간 하수관로 개량공사 .....	39
⑨	도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역) .....	40
⑩	재난 및 안전관리 계획 .....	41

연 번	사 업 명	쪽
-----	-------	---

11	어린이 교통안전체험장 운영 .....	42
12	차없는거리 조성 .....	43
13	과태료 체납자 변호판 영치 .....	44
14	공영주차장 건설 적극 추진 .....	45
15	함께 참여하고 지켜지는 올바른 주차질서 확립 .....	46

국·공유 행정재산의 사용자에 대한 사용료 부과와 무단사용자에 대해 권리보존 및 변상금을 부과하여 세원 발굴 및 체계적인 재산관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업목표

- 국·공유 행정재산 전수조사를 통한 신규세원 발굴
- 조세저항 완화 및 민원발생 최소화로 징수율 제고

□ 추진방향

- 국·공유 무단점용 예상지 실태조사를 통한 신규세원 발굴
- 고액 및 상습체납자에 대한 체계적인 관리로 세외 수입 증대

□ 추진개요

- 기 간 : 2015.1.1~12.31
- 방 법 : 국·공유지에 대한 정기 및 수시 실태조사 → 사용료부과/ 변상금 사전통지 → 징수·체납자 관리

- 징수목표 (단위 : 천원)

계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	징수교부금	가로판매대사용료
6,456,137	4,377,733	12,340	60,050	1,967,056	38,958

□ 추진일정

- 국·공유 행정재산 실태조사 및 신규 세원발굴(1월 ~ 12월)
- 서울도시가스 정압시설, 지하매설물, 지상시설물 일제조사 실시(2월)
- 불법 차량진출입로 일제조사(2회 : 상·하반기)
- 행정재산 무단점유 변상금 부과 자료조사(10월 ~ 11월)

□ 소요예산 : 총45,066천원 (구비)



거리가게 및 불법 옥외광고물 등에 대한 체계적이고 지속적인 관리체계를 구축하여 시행함으로써 쾌적한 보행권 확보와 깨끗한 도시이미지를 조성하고자 함

#### □ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○ 정비대상

- 거리가게 및 노상적치물 등 시민불편사항
- 불법광고물

(단위:건)

구 분	정비물량	정비대상	비고
고정 광고물	1,000	무허가·신고, 표시위반 광고물	
유동 광고물	30,000	불법현수막, 벽보, 에어라이트 등	

#### □ 추진방향

- 거리가게에 대한 정비방법을 지역별 여건을 고려하여 단계적으로 추진하고 반복적 상승적 행위자에 대하여는 과태료 부과 또는 고발조치
- 불법광고물 단속 및 사후 관리 강화로 『불법광고물이 없는 거리』 조성

#### □ 추진계획

- 도시환경저해 거리가게 및 노상적치물 정비
  - 유동인구 많은 지역이나 통행에 지장을 주는 거리가게 우선 정비
  - 신규발생 거리가게 억제 등 강력한 단속 실시
  - 새벽·야간·휴일 등 취약시간대 특별단속 연중 실시
- 불법광고물 정비
  - 취약시간대(주말, 야간) 불법광고물 특별 정비
  - 학교주변 청소년 유해 광고물 등 집중정비 및 특수시책 추진

#### □ 기대효과

- 도시미관 수준향상과 공중(公衆)에 대한 위해 방지
- 쾌적한 생활환경 조성과 아름다운 도심이미지 창출

#### □ 소요예산 : 총351,776천원 (구비)

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ **사업목표**

- 도로확장사업을 통한 보행환경 및 교통여건 개선

□ **추진개요**

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단)~신길동421-16간(신길광장)
  - ※ 금회 ㄱ 공사 - 신길동355-677 ~ 신길동355-663
  - ㄴ 보상 - 2014년 인가구간(신길동420-192)
- 규 모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m
  - ㄱ 신길5동사무소측 : 기확장 850m, 미확장 300m(신길재정비촉진지구 내)
  - ㄴ 성 락 교 회 측 : 기확장 710m, 미확장 440m
  - ※ 금회 ㄱ 공사 - 도로확장 폭 25→30m, 연장 160m(성락교회측)
  - ㄴ 보상 - 2014년 인가구간 1필지 64㎡
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 총사업비 : 44,650백만원(시비:보상비 39,200 공사비 5,300 설계비 150)
- 연차별 투자계획

(단위:백만원)


구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진 내용	용 역	150	150					
	보 상	39,200	29,100	3,500	500	6,100		
	공 사	5,300	2,800	1,000	500	1,000		
총사업비		44,650	32,050	4,500	1,000	7,100		

□ 추진일정

○ '15. 1. : 공사 및 보상시행

□ 소요예산 : 총1,000,000천원 (시비)

□ 위치도

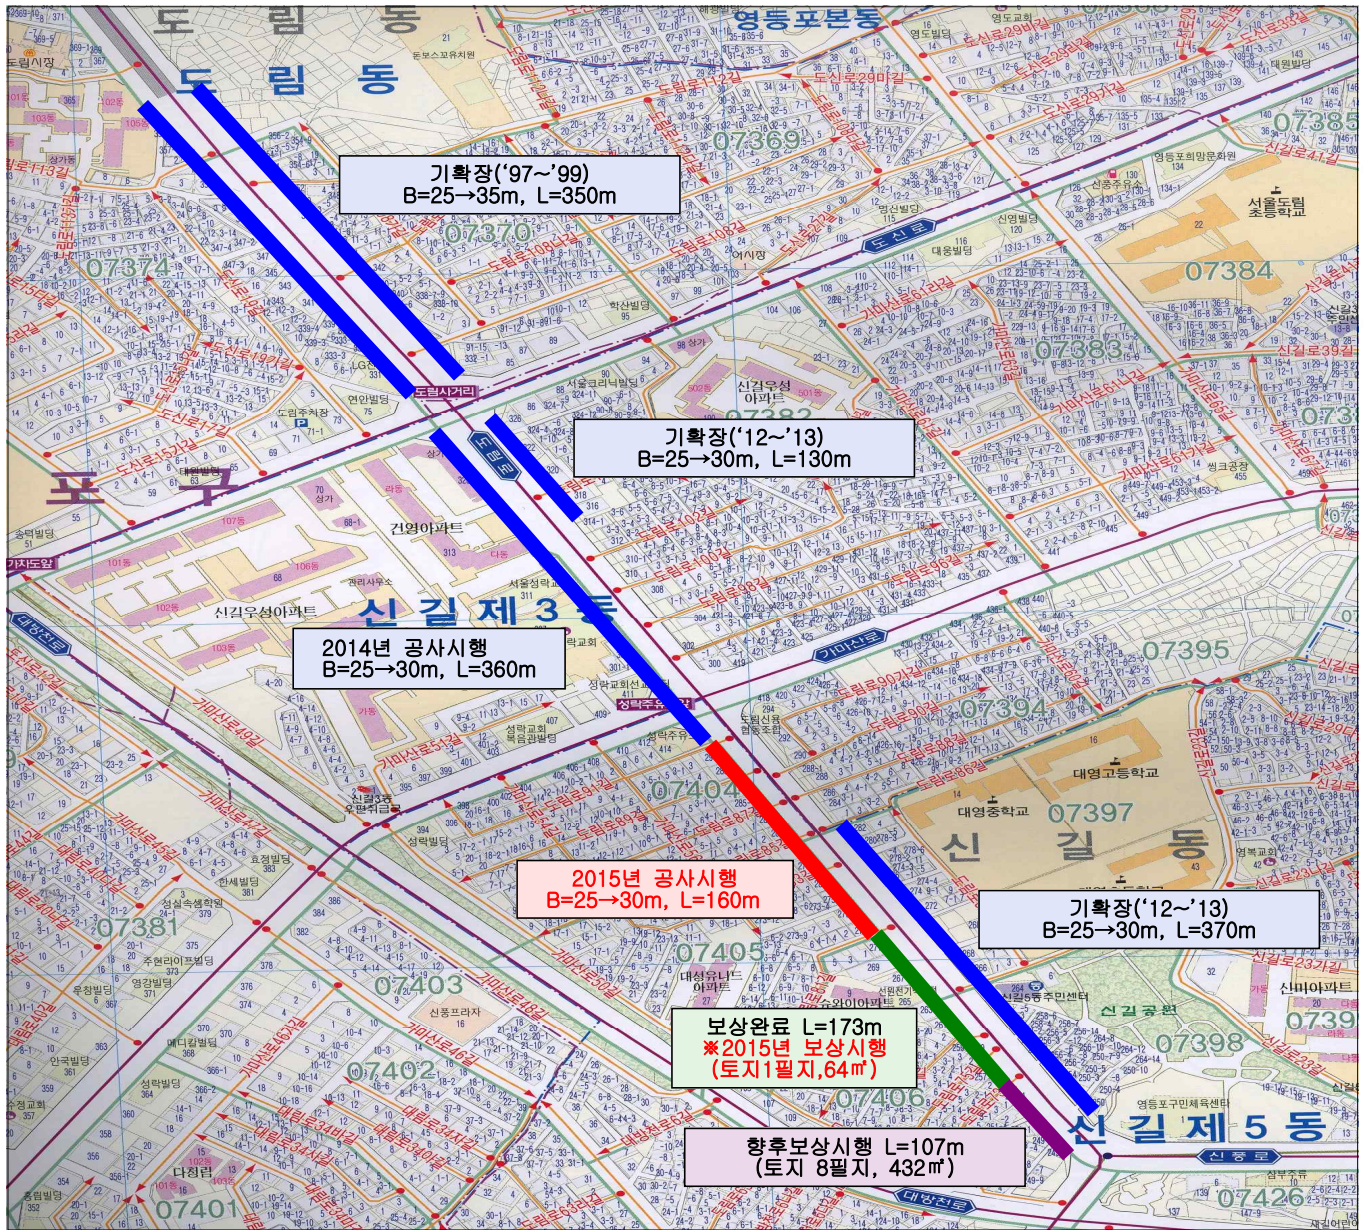

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업시행으로 주민숙원사업 해소 및 주거환경개선

**사업목표**

- 미집행 도시계획시설(도로)사업 시행

**추진개요**

- 위 치 : 대림동 812-12번지
- 규 모 : 도로개설 B= 6m, L= 14m
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 총사업비 : 1,226백만원(구비) (단위:백만원)


구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진내용	용역							
	보상	1,156	200	481	475			
	공사	70			70			
총사업비		1,226	200	481	545			

**추진일정**

- 2015. 1. : 보상시행
- 2015. 6. : 공사시행

**소요예산 : 총545,000천원 (구비)**

**위 치 도**

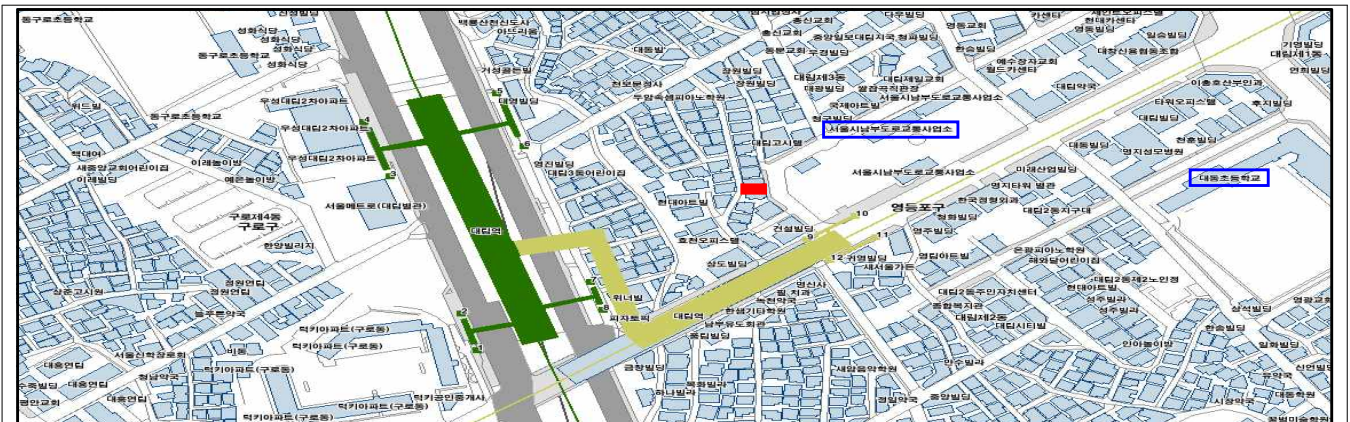

노후훼손 및 상태가 불량한 도로 및 도로시설물을 신속히 보수·정비하여 주민통행 불편을 해소하고 지속적인 도로 및 도로시설물 정비로 도로의 기능성 유지 및 안전사고를 사전예방 하고자 함

□ 포장도로정비등 소파보수공사

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 아스팔트포장 120a, 콘크리트포장 10a, 보도포장 10a
- 기 간 : 2015. 3. ~ 12.
- 소요예산 : 902,700천원 (구비)

□ 영등포푸르지오A 주변 산책로 설치공사

- 위 치 : 영등포동 647번지(영등포푸르지오A 주변)
- 규 모 : 탄성포장(B=1.5m, L=600m, A=9a), 주변 보도정비  
※ 전체 1,300m 중 600m 시행(잔여 700m 향후 시행)
- 기 간 : 2015. 1. ~ 6.
- 소요예산 : 100,000천원 (구비)

□ 보도정비 공사

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 보도블록 정비 16a
- 기 간 : 2015. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 80,700천원 (구비)

□ 소요예산 : 총1,083,400천원 (구비)

도로시설물 설치 및 보수공사

- 위 치 : 관내 전 지역
- 규 모 : 지하보도, 보도육교, 과속방지턱 등 도로시설물 유지관리
- 기 간 : 2015. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 401,000천원 (구비)

여의도중학교 방음벽 교체공사

- 위 치 : 국제금융로 7길(여의도동, 여의도중학교 앞)
- 규 모 : 방음벽 교체 H = 4m, L = 260m
- 기 간 : 2015. 1. ~ 11.
- 소요예산 : 479,000천원 (시비)

가로등시설물 정비공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 가로등정비 10본, 분전함 정비 4면, 기타 정비 1식
- 기 간 : 2015. 3. ~ 12.
- 소요예산 : 172,000천원 (구비)

보안등 설치개량 및 유지보수 공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 대 상 : 18개동 9,670등
- 규 모 : 보안등 설치·개량 30등, 기타 고장등 보수 1식
- 기 간 : 2015. 3. ~ 12.
- 소요예산 : 242,400천원 (구비)

LED 보안등 설치공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 기 간 : 2015. 3. ~ 12.
- 규 모 : 확산대형 나트륨등(100W)을 LED보안등으로 155등 교체
- 소요예산 : 175,000천원 (국52,500, 시52,500, 구비 70,000)

소요예산 : 총1,469,400천원 (국비 52,500, 시비 531,500, 구비 885,400)

동절기 강설 시 이면도로 및 제설 취약 지역 등 초동 제설작업 시행으로  
주민 생활불편 최소화 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

사업개요

- 추진기간 : 2014.11.15 ~ 2015.3.15(4개월 간)
- 제설구간 : 도로연장 374.5km
  - 간선도로 57개 노선 88.7km, 이면도로 285.8km

추진방향

- 제설작업 기능향상을 위한 습염식 염수 제설작업 병행 시행
  - 염화칼슘 수용액과 소금을 혼합하여 살포하는 제설방식
- 내 집 내 점포앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상
- 단계별 비상근무시 각 실과에서는 지정된 담당동 제설작업 지원
- 이면도로(12m 미만) 일부 노선에 대하여 민간용역 제설작업 확대시행

추진실적

- 2014. 7. ~ 10 : 제설장비 점검
- 2014.11. 3 : 2014/15년 제설종합 계획 수립
- 2014.11.14 : 제설함 355개소 설치(주요간선도로 및 취약지점 등)

향후 계획

- 2014.11.15 ~ 2015.3.15 : 재난상황실 운영 및 상시근무

소요예산 : 총198,511천원 (구비)

제설자재 및 장비현황

구 분	다목적 차량(대)	살포기(대)			제설삽날 (대)	제설자재(톤)	
		소형	중형	대형		염화칼슘	소금
계	3	32	5	4	11	470	1,150
기 존	3	29	4	4	11	407	616
추가확보		3	1			63	534

제설민간장비 확보현황(2014년 현재)

(단위:대)

구 분	굴삭기	덤프트럭	페이로더	비 고
계	50	150	50	
남경건설중기			30	☎) 832-6860
천일건설중기	50			☎) 833-0684
서신건기		50		☎)2055-0156

인접 자치단체 경계지역 제설공조체제 확립

- 제설작업 노선 중복기관 : 3개 도로사업소, 3개 구청  
(강서·서부·남부도로사업소, 양천·구로·동작구청)



영등포구 영동초등학교 주변 일대는 집중호우시 통수능 부족에 따른 노면수 침수로 인한 교통불편이 있고 노후 구배불량으로 침하로 인한 민원이 자주 발생되고 있어 통수능력을 향상 시키고자 기존의 하수관거를 개량하여 안전사고 예방과 쾌적하고 편리한 도시환경을 조성하고자 함

#### □ 사업개요

- 위 치 : 영중로 134-1 ~ 국회대로 655-1
- 규 모 : 하수관로 개량 D1,200mm, L=372m
- 사업기간 : 2015.1 ~ 2015.12
- 총사업비 : 740,000천원(시비)

#### □ 추진실적

- 2014. 7.15 : 서울시 예산배정 요구

#### □ 향후계획

- 2015. 1. ~ 3 : 실시설계용역 시행
- 2015. 3. ~ 12 : 공사시행

#### □ 소요예산 : 총740,000천원 (시비)

#### □ 위 치 도



도림1배수분구의 노후 및 불량 하수관로를 개량하는 등 종합계획에 의한 정비를 함으로써 통수능 확보와 수해예방 및 효율적인 하수처리로 수질 개선에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 대림2,3동 전체
- 규 모 : 하수관로 개량 D300~D1500mm, L=11.72km  
하수암거 신설 ■1.5×1.0m, L=121m
- 사업기간 : 2014. 6. 12 ~ 2015. 4. 7
- 총사업비 : 9,837,000천원(시비)

추진실적


- 2014. 6.12 : 5구역(3,5블럭) 공사착공(1차분)

향후계획

- 2015. 3 ~ 12 : 공사시행(2차분)

소요예산 : 총9,837,000천원 (시비)

위 치 도

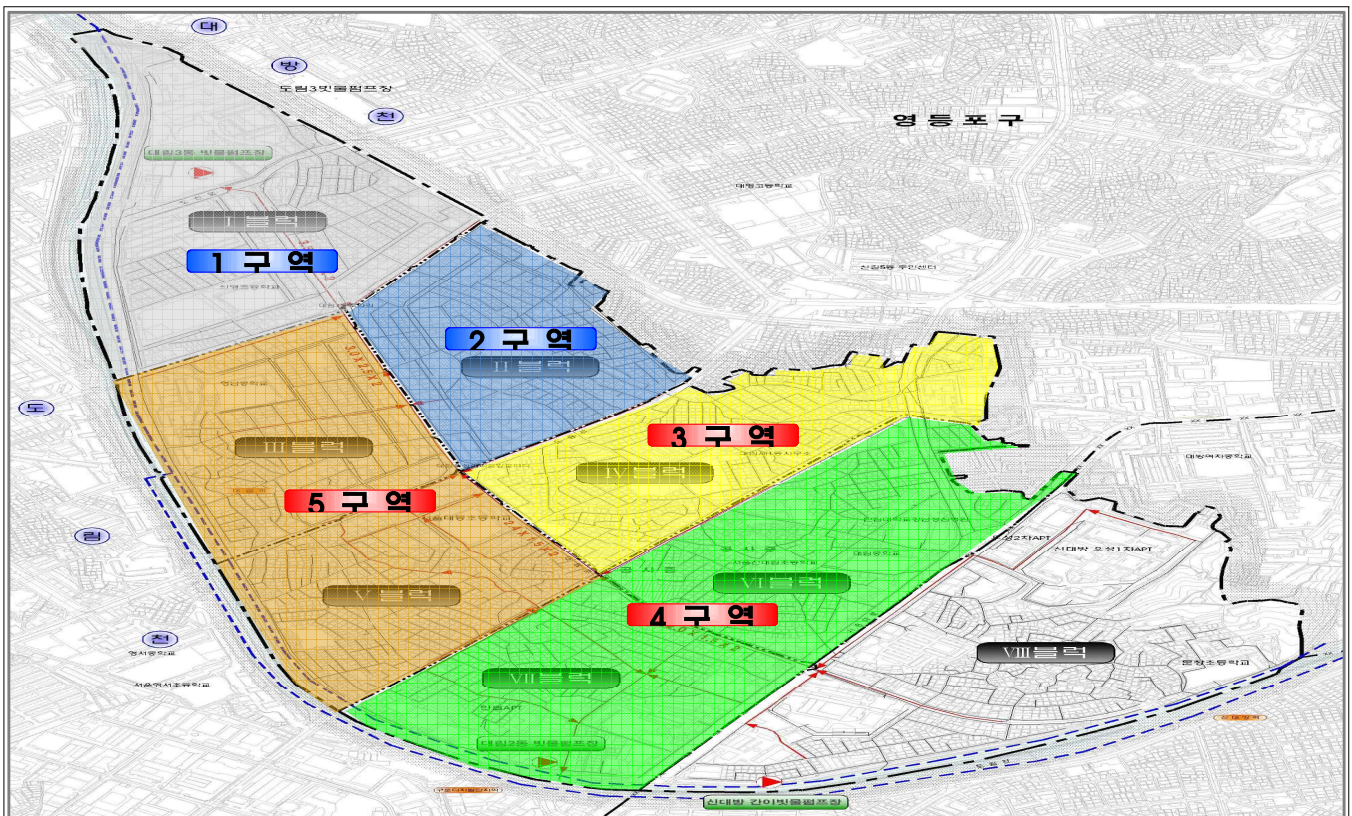

각종 재난으로부터 주민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 재난이 발생한 경우 안전을 최우선으로 고려함으로써 안전한 사회에서 생활할 수 있도록 하고자 함.

□ **사업목표**

- 선제적, 예방적, 근원적 안전관리체계 구축

□ **추진배경**

- 사회전반의 안전 불감증 심각, 안전문화의식 제고 필요
- 민·관이 협력하여 자기 지역에 대해 안전사고가 발생하지 않도록 교육 및 홍보를 통하여 안전한 영등포를 만드는데 공감대 형성

□ **추진방향**

- 재난예방 체계의 확립
- 안전문화 확산 및 안전교육 활성화

□ **추진개요**

- 현장 위주의 재난 유형별 현장조치 행동매뉴얼 통합 관리
  - 재난유형별 구 행동매뉴얼 관리, 개인별 행동지침 작성
- 「안전문화운동 추진 영등포구협의회」 출범('14. 9.) 및 민·관협력위원회구성
  - 단체장, 시민단체 등 위원회 구성
  - 4개분과 구성 분과별 실무위원회 개최 / 실천과제 발굴 토의
- “서울특별시 영등포구 재난 및 안전관리기본 조례” 개정
- 공무원 및 주민 대상 보라매 안전체험장 안전체험 실시(2회)
- 자연재난 대책본부 운영

□ **추진일정**

- 2015. 2 : 서울특별시 영등포구 재난 및 안전관리 기본 조례 개정
- 2015. 6 : 영등포구 안전관리계획수립 및 책자 제작 배부
- 2015. 6. 1 ~ 9.30 : 폭염 대책본부 운영
- 2015.12. 1 ~ 2016. 3.15 : 한파 대책본부 운영
- 안전문화운영 영등포구협의회 실무위원회 개최(반기 1회)
- 현장 위주의 재난 유형별 현장조치 행동매뉴얼 통합 관리 : 수시
- 공무원 및 주민 대상 보라매 안전체험장 안전체험 : 상·하반기

□ **소요예산 : 총7,677천원 (구비)**

2013년도에 안양천에 조성된 어린이 교통안전체험장을 금년부터 전문 교육 기관에 위탁 추진하여 어린이 교통사고 예방과 올바른 교통문화 의식을 고취하고자 함

사업목표

- 어린이 교통사고 예방과 올바른 교통문화 정착을 위한 안전교육 시행

추진배경

- 2014년도에 조성된 안양천 교통안전체험장 시설에 대하여 2015년 5월부터 위탁교육 시행을 지속적으로 추진함

추진방향

- 2014년 5월 최초 위탁시 결정된 단체에 교통안전체험장 위탁교육 추진
- 사업홍보를 통해 많은 구민(어린이, 성인, 단체등)들의 참여를 유도

추진개요

- 위 치 : 양화동 10-8번지 (안양천 갈대1구장 옆) 2,378 $m^2$
- 운영방식 : 위탁운영 (자전거문화발전연구소, 2014.5 ~ 2017.4)
- 교육기간 : 매년 7개월 (3월~6월, 9월~11월)
- 위탁사업내용 : 교통안전교육 및 자전거타기 기본교육 실시
- 교육신청방법 : 교육 예약 사이트([www.riverbike.co.kr](http://www.riverbike.co.kr))에 신청

추진일정

- 2015년 1. ~ 2. : 교통안전체험장 교육실시 홍보
- 2015년 3. : 교통안전체험장 위탁교육 실시

소요예산 : 총 27,200천원 (구비)

우리구 보행환경개선사업의 일환으로 차없는거리 조성을 지속적으로 추진하여 보행자들의 안전과 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

사업목표

- 보행자 안전 및 쾌적한 보행환경 조성

추진방향

- '14년도 영등포로22길 북단 잉여공간에 차없는거리 추가 조성
- 우리시장(대림1동)내 도림로64길 일부구간에 대하여 재래시장 활성화와 연계하여 시간제 차없는거리를 조성 시행  
(운영시간대는 별도 시장측과 협의후 결정)

추진개요

구 분	문래북로 (영등포로22길 북단 잉여공간)	도림로74길 (우리시장-대림1동)
사업형태	전일제 차없는거리 (24시간 365일 통제)	시간제 차없는거리 (12:00~22:00)
규 모	L=20m (73㎡)	B=5m L=120m
시설물 내역	노면표시, 표지판, 볼라드	노면표시, 표지판, 입간판
추진방법	설문조사 → 경찰서 규제심의 → 서울지방경찰청 규제승인 → 상세 시설물 설치 경찰협의 → 시설물 설치(시행)	

추진일정

- 2015년 3. ~ 4 : 주민설문조사 실시
- 2015년 5. ~ 6 : 경찰서 규제심의 위원회 안전심의
- 2015년 7. : 서울지방경찰청 규제 최종 승인
- 2015년 8. ~ 10 : 시설물 상세설치 경찰 협의후 시행

소요예산 : 총 4,000천원 (구비)

자동차 관련 과태료 상습 체납자의 자동차 번호판 영치를 통해 과태료 체납 징수율을 제고하는 한편 의무보험 미가입 및 검사 미필차량의 운영을 제한함으로써 시민의 안전을 도모하고자 함

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31
- 사업대상
  - 「질서위반행위규제법」 개정 이후 발생한 과태료 체납자 중 세목별 체납액이 30만 원 이상, 체납발생일로부터 60일 경과한 자
- 사업근거
  - 「질서위반행위규제법」 개정(2011. 7. 6.)
  - 서울시 및 25개 자치구 상호간 「자동차과태료 상호징수에 따른 협약」 체결
  - 촉탁비 : 징수금액의 30%

#### □ 사업추진내용

- 번호판 영치 대상 차량 선정을 통한 사전 안내문 발송
  - 번호판 영치 10일 전 사전안내문 발송
- 3인 1개조 편성 현장단속을 통한 체납차량의 운행제한
- 영치차량의 번호판 관리 및 과태료 징수
  - 체납과태료 납부 시 번호판 반납
  - 의무보험 가입 및 자동차 검사 여부 확인 후 번호판 반납

#### □ 기대효과

- 체납과태료 징수율 제고 및 불법명의자동차(속칭 대포차) 운영을 제한하여 시민 안전 도모

#### □ 소요예산 : 총 47,837천원 (구비)

주차난이 심각한 주택 밀집지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장을 건설하여 주차난을 해소하고 주민생활 편의를 증진하고자 함

□ 사업목표

- 주차환경이 열악한 대림동, 영등포본동, 신길동 중심 주차장 건설부지 확보
- 주차장(거주자, 노상)설치 가능한 도로에 대한 조사로 주차 공간 확보
- 부설주차장 야간개방, 자투리땅 활용, 주차환경개선지구 추가지정 등 다양한 홍보로 주차장 부지 확보

□ 추진방향

- 주차장 건설부지 확보 : 주택밀집지역, 공공용지
- 주차 가능도로 전수조사로 노상공영주차장 확보

□ 추진개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 추진내용
  - 주택 밀집지역 내 주차장 건설부지 확보
  - 주차가능도로 전수조사로 공영주차장 확보
  - 부설주차장 야간개방 추진

□ 추진일정

- 정부 제3녹지 지하공영주차장 건설 완료 : 2015.11
- 주차장(거주자우선주차, 노외, 노상) 부지확보 : 연중
- 부설주차장 야간개방 추진 : 3개소 20면

□ 소요예산 : 총8,404,504천원 (구비)

무질서한 주차질서를 바로잡아 차량의 원활한 통행과 보행인의 안전한 보행로를 확보하고자 하며, 아울러 민원불편지역은 지속적인 불법주정차 지도단속을 실시하여 시민생활 불편을 최소화하고자 함

#### □ 사업목표

- 불법주정차 단속으로 도로상 장애 제거 및 보행자의 안전 확보
- 불법주정차 계도 실시로 시민이 자발적으로 참여하는 주차문화질서 확립

#### □ 추진방향

- 반복민원 신고 지역 집중단속 하여 주차질서 개선
- 주택가 심각한 주차난 해소를 위한 불법주정차 지도단속 지속 추진
- 획일적인 과잉단속을 지양하고 시민정서 반영된 사람중심 주차질서 확립

#### □ 추진개요

- 추진기간 : 연중
- 단속 인력 및 장비
  - 인력 : 31명(주차단속원 28명, 기동단속반 2명, 장애인주차단속 1명)
  - 장비 : 단속차량 7대, CCTV 108대
- 추진내용
  - 중점단속 : 보도, 어린이보호구역, 자전거도로, 민원 다발지역 등
  - 일반단속 : 편도3차로 미만 도로, 소통장애 지역, 다중집합장소 등
  - 계도단속 : 주택가 이면도로, 행사장 주변 우선계도
  - 불법주정차 CCTV 단속 문자알림 서비스 신청·접수
  - 주민불편 및 민원사항 적극 해소
  - 주차단속원, 견인업체 종사자 등 직무 및 친절교육 실시

#### □ 소요예산 : 총1,460,425천원 (구비)



## IV. 신규 · 주요투자 사업

연 번	사 업 명	쪽
①	영등포로 에너지절약형 LED간판 교체사업 .....	48
②	당산동~샛강생태공원간 연결로 설치공사 .....	49
③	영등포역 횡단보도육교 보수공사 .....	51
④	도신로39길 3 노후계단 정비공사 .....	52
수	양평1 우수지 악취저감 저류조 설치 .....	53
⑥	영등포 빗물펌프장 배수펌프 개량 .....	55
⑦	경부 제3녹지 지하공영주차장 건설 .....	56

사람중심의 쾌적하고 아름다운 거리를 조성하고자 무질서하게 난립되어 있는 불법 광고물을 일제 정비하고, 작고 아름답게 디자인된 광고물로 교체 설치함으로써 가로경관을 개선하고자 함

#### □ 사업개요

- 사업명 : 영등포로 에너지절약형 LED간판 교체사업
- 사업구간 : 오목교 ~ 영등포유통상가 사거리 양쪽 1.2km구간
- 사업기간 : 2015. 2 ~ 9월
- 대상시설 : 150점포(1개 점포당 최대 2,500천원 지원)

#### □ 추진계획

- '15. 2 : 정비시범구역 지정 및 표시제한 고시
- '15. 3 : 區와 영등포로 간판개선주민위원회 간 사업추진 협약체결
- '15. 4 : 간판디자인 및 제작·설치 업체 모집 공고
- '15. 5 : 제안서 평가 및 업체선정
- '15. 6~9 : 간판 시공 및 사후정산

- 소요예산 : 총 375,000천원 (시비 225,000, 구비 150,000)

당산동~셋강생태공원간 보행자 및 자전거 연결로를 설치하여 셋강생태공원 및 여의도 방면 이용에 편의를 제공하여 한강시민공원 및 여의도 공원 등의 휴식 공간 및 문화 공간의 접근성 향상에 기여하고자 함

사업목표

- 셋강생태공원 및 한강시민공원의 접근성 향상

추진배경

- 노들길 및 올림픽대로로 인한 지역단절로 셋강생태공원 접근성 결여

추진방향

- 당산동~셋강생태공원간 보행자 및 자전거 연결로 설치

추진개요

- 위 치 : 영등포구 당산동 버드나루로14길 ~ 셋강생태공원
- 규 모 : 연결로 설치 폭 5.0m, 연장 138m
- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년

추진일정

- '10. 2.17 ~ 10.14 : 타당성 조사 및 기본계획 용역시행
- '10.12. 7 ~ '11. 2.10 : 보도육교 설계 현상공모 공고시행
- '13.10.10 : 투자심사 결과 통보(조건부)
- '14. 2. 7 ~ : 기본 및 실시설계 용역 시행중
- '14.12 : 기본 및 실시설계 용역 준공

소요예산 : 총7,500백만원 (시비3,500, 구비4,000)

- 연차별투자계획

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진 내용	용역(구비)	472	182	290				
	공사	시비	3,500	1,000	2,500			
		구비	3,528				3,528	
총사업비		8,500	182	1,290	2,500	3,528		

○ 위치도



○ 조감도



영등포역 앞 지하철 1호선을 횡단하는 보도육교의 난간 등 전반적 노후로 인한 안전사고를 사전 예방하고, 쪽방촌 등 우범지역으로 인한 이용불편을 해소하여 시민들의 보도육교 이용편의 증대 및 리모델링으로 도시미관 향상

#### □ 사업개요


- 위 치 : 영등포본동 618-6
- 규 모 : 보도육교 리모델링, 계단 신설 등
- 기 간 : 2015. 1. ~ 11.

□ 소요예산 : 총800,000천원 (시비 800,000 시 주민참여예산)

#### □ 기대효과

- 노후 시설물의 리모델링으로 보도육교의 내구연한 확대 및 안전사고 예방
- 계단 신설로 우범화 해소 및 도시미관 향상

#### □ 위치도 및 현황사진

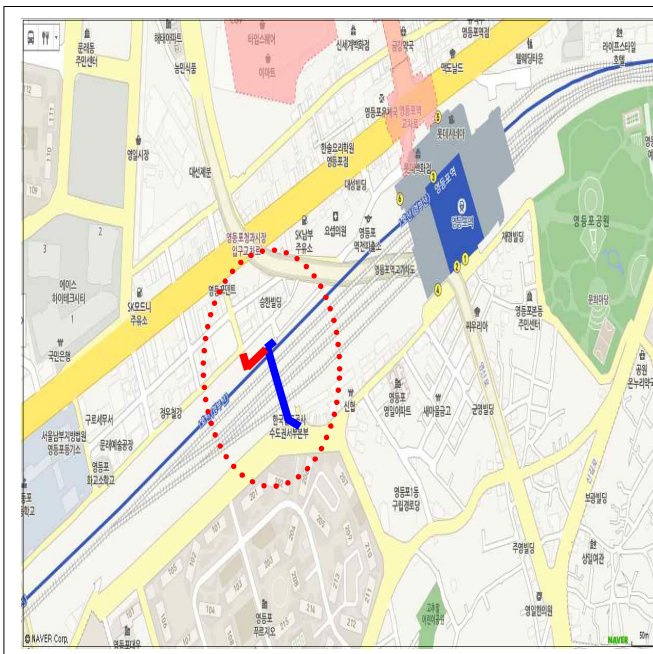

연립주택 등 주택 밀집지역으로 시민들의 통행이 잦은 노후계단을 정비하여, 노약자 등에 대한 안전하고 편리한 보행환경과 휴식공간으로 재조성하여 주민생활 편의와 도시미관 향상

#### □ 사업개요


- 위 치 : 도신로39길 3
- 규 모 : 계단정비(L=12m, H=5m), 법면보강, 주변 도로정비
- 기 간 : 2015. 1. ~ 11.

#### □ 소요예산 : 총300,000천원 (시 주민참여예산 300,000)

#### □ 기대효과

- 노약자 및 어린이 등에 대한 안전한 보행환경 조성
- 시민들의 휴식공간으로 재조성하여 주민생활 편의 및 도시미관 향상

#### □ 위치도 및 현황사진

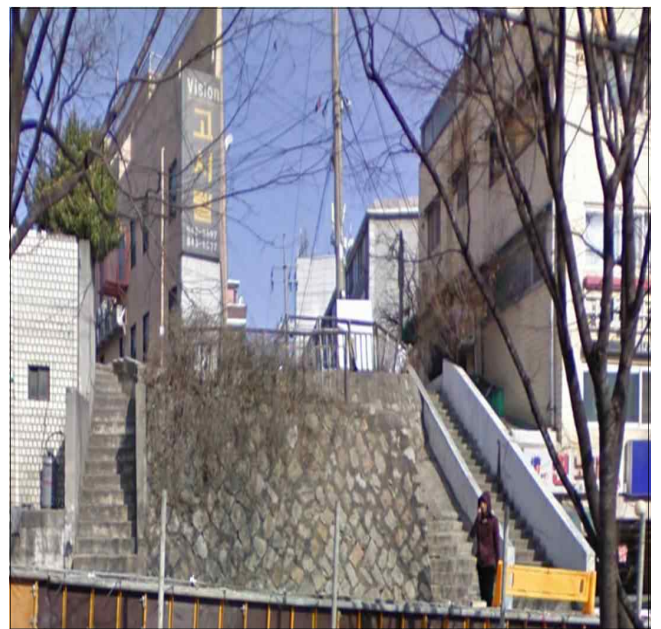

방류 후 잔류수가 처리되지 않아 인근 주민들에게 악취로 인한 혐오시설로 인식되고 있어 유수지 지하에는 저류조 설치, 지상에는 생태공원 및 체육 공간을 조성하여 악취저감 및 안양천 등 공공수역 수질개선을 통하여 쾌적한 생활공간을 제공하고자 함

#### □ 사업목표

- 유수지 지하에는 악취저감 저류조 설치
- 지상에는 생태공원 및 체육공원 조성 주민편익 증진

#### □ 사업개요

○ 사업기간 : '13. 7. ~ '16. 12.

○ 사업대상 : 양평1유수지

○ 사업규모

- 지하저류조 46,000 $m^3$
- 상부체육시설 30,000 $m^2$

#### ■ 유수지 현황

- 저수용량 : 115,000 $m^3$
- 유연면적 : 4.525 $km^2$ (양평동,당산동,문래동,영등포본동,영등포동)
- 수혜세대 : 41,000세대

#### □ 추진내용

현장시장실 운영('13. 6.10~11)결과, 당초 2019년 준공 예정인 사업시기를 **3년 단축** ⇒ '13년 타당성조사, '14년 설계, '15년 착공, '16년 준공


- '13. 7. 4 ~ '14. 7. 3 : 타당성조사 및 기본계획수립용역(서울시)
  - '13.12.18 ~ '14. 6.23 : 1,2,3차 자문회의 시행
  - '14. 7.12 : 용역 준공
- '14. 9. ~ '15. 5. : 기본 및 실시설계 용역(서울시 1,000백만원)
- '15. 6. ~ '16.12. : 공사착공 및 시행

#### □ 소요예산 : 총31,194,000천원 (시비)

※ 2015년 예산 1,900백만원(물관리정책과)

□ 타당성조사 및 기본계획 수립용역(안)

○ 지하저류조(저류조면적 9,200 $m^2$ , 저수용량 46,000 $m^3$ )

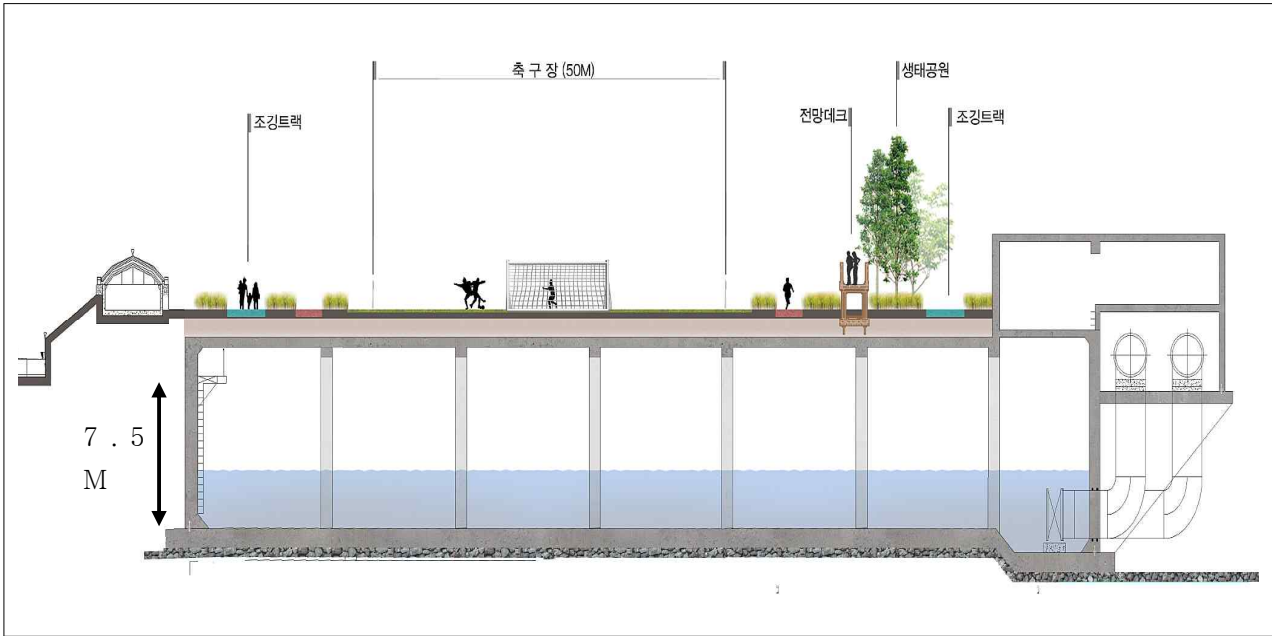

○ 체육시설 및 공원조성(안)





1990년도에 설치된 배수펌프 3대가 모두 24년이 경과되었으며 2013년에 1대는 노후로 인한 고장발생으로 수리한 바 있어 안정적인 수방을 위해서는 배수펌프의 개량이 필요함

추진배경

- 24년이 경과된 노후 배수펌프의 개량 필요
- 중장기 및 연차적 노후설비 개량계획
- 주요 부속품의 교체시기 경과

추진방향

- 최신 성능과 고효율 펌프로 개량
- 2015년도 수방에 지장이 없도록 교체계획 수립

추진개요

- 대 상 : 영등포 빗물펌프장
- 규 모 : 입축사류펌프 800hp×3대 교체
- 기 간 : '15. 1. ~ 12.

추진일정

- '15. 1. ~ 3. : 설계 및 계약심사
- '15. 3. : 발주 및 계약
- '15. 4. ~ 12. : 납품 및 설치

소요예산 : 총1,290,000천원 (시비)

경부 제3녹지 지하에 공영주차장을 건설하여 주택가 주차난을 해소하고 지하철 1호선 대방역 이용객들이 환승주차장으로 이용할 수 있도록 함으로써, 토지 이용의 효율성을 높이고 이면도로 통행권 확보로 지역 주민들의 생활 편익을 도모하고자 함

#### □ 사업목표

- 주택가 주차난 해소
- 대방역 이용객들의 환승주차장 이용
- 녹지를 활용하여 토지이용 극대화

#### □ 추진개요

- 위 치 : 영등포로 407 일대(신길동 70-50호)
- 규 모 : 지하2층 자주식 143면(건축연면적 5,622 $m^2$ )
- 대지면적 : 3,745 $m^2$
- 총사업비 : 9,040백만원
- 사업기간 : 2014. 11. ~ 2015. 11.

#### □ 추진경과 및 일정

- 1978년 8. : 도시계획시설 ‘녹지’ 결정(서울시 고시 제429호)
- 2013년 5. : 서울시 투자심사 완료
- 2013년 11. : 서울시 2014년 예산 반영 (3,018백만원 중 1,600백만원)
- 2013년 10. ~ 2014. 8. : 실시설계용역 추진 완료
- 2014년 11. : 공사발주 및 계약
- 2014년 12. ~ 2015 11. : 공사착공 및 준공

□ 소요예산 : 총9,040,000천원 (시비 3,018,000, 구비 6,022,000)
