

제211회 구의회 제2차 정례회

2018. 11. 20. ~ 12. 21.

청림 영등포

# 2018년 주요업무 보고



푸른도시과

# **보고 순서**


---

---

<b>I . 일 반 현 황</b>	<b>· · · 1</b>
<b>II . 주요업무 추진실적</b>	<b>· · · 3</b>
<b>III . 2019년 주요업무 추진계획</b>	<b>· · · 23</b>
<b>IV . 신규·주요투자 사업</b>	<b>· · · 41</b>

# I. 일 반 현 황

## 1 조 직

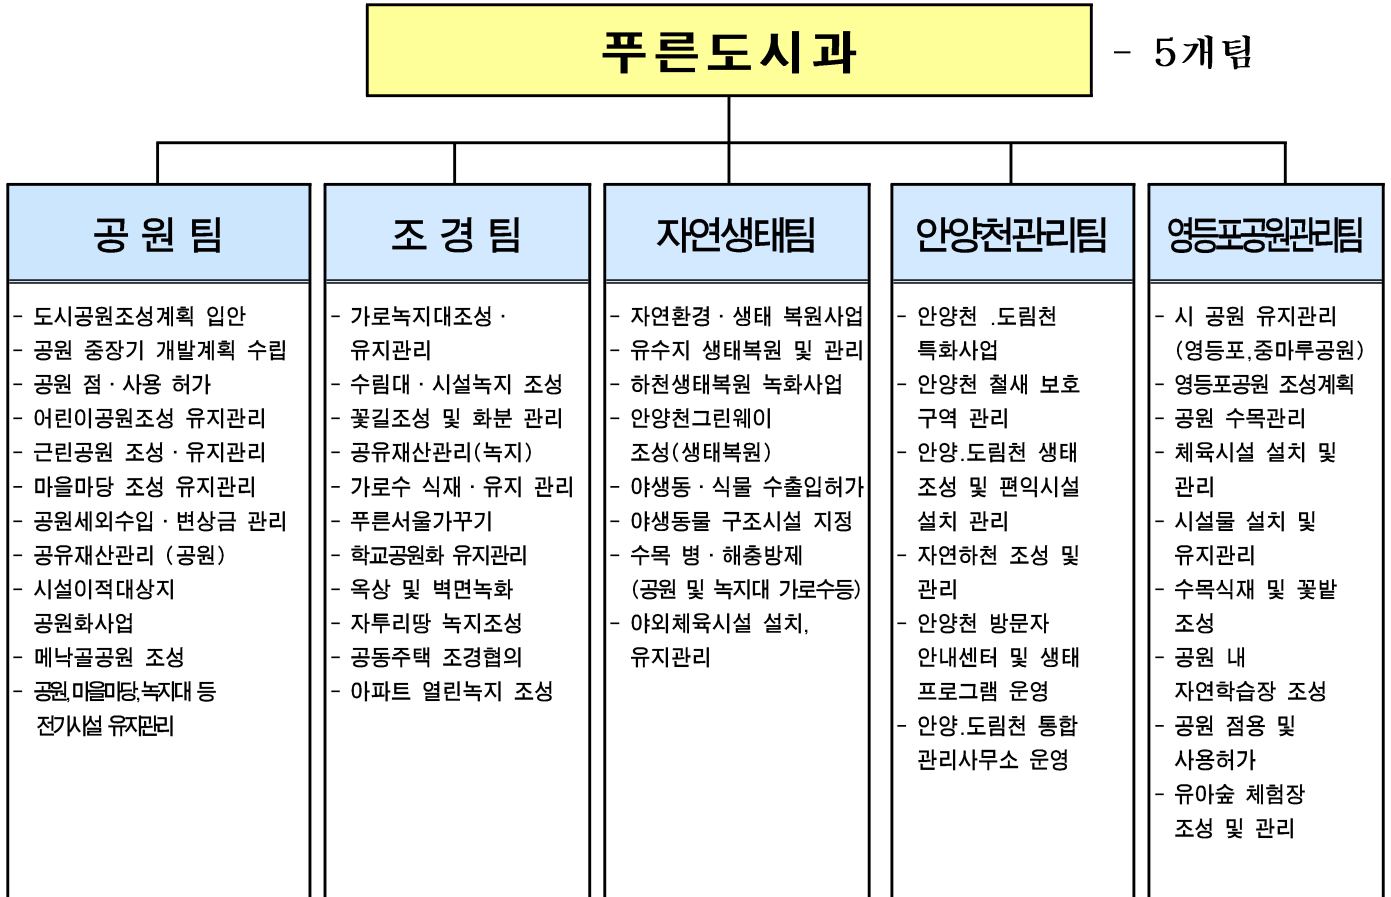

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제				
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	29	0	1	6	7	7	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0
현 원	28	0	1	7	11	4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
과부족	△1	0	0	1	4	△3	△4	0	2	△1	0	0	0	0	0	0

### 3

### 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	근린공원	10개소/549,377 <sup>m²</sup> (구공원 6개소/141,431 <sup>m²</sup> , 시공원 4개소/407,946 <sup>m²</sup> )	공원팀
	어린이공원	18개소/54,637 <sup>m²</sup>	공원팀
	소공원	11개소/13,931 <sup>m²</sup>	공원팀
	마을마당	31개소/18,011 <sup>m²</sup>	공원팀
	녹지대	352개소/727,517 <sup>m²</sup>	조경팀
	가로수	109개노선 26종 18,423주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	자연생태팀
	체육시설	78개소 22종 840점	자연생태팀
장비	화물차	마이티(2.5t) 87루 7056(2017년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두 5244(2018년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 84두 5224(2018년)	자연생태팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루 8982(2018년)	공원팀
	승합차	스타렉스(12인승) 70루 8935(2018년)	조경팀
	소형화물	포터2(1t) 86우 4171(2011년)	안양천관리팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7630(2005년)	공원팀
	소형화물	포터2(1t) 80모 7614(2005년)	자연생태팀
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원팀

### 4

### 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액		집행율(%) (10.31기준)
		10.31기준	12.31까지	
계	11,498,359	7,887,415	11,486,137	69
공원관리 수준향상	3,426,483	2,696,078	3,420,000	79
가로녹지 수준향상	6,507,508	4,043,966	6,507,000	62
자연생태 수준향상	522,060	395,447	522,000	76
안양·도림천 특화	664,550	402,278	660,000	61
인력운영비	162,700	162,700	162,700	100
기본경비	174,232	146,509	174,000	84
내부거래지출	40,826	40,437	40,437	99

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선 .....	4
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충 .....	7
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리 .....	9
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선 .....	11
⑤	하천변 녹지 확충 및 정비 .....	14
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성 .....	15
⑦	공원 내 위험요소 사전 정비 .....	17
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비 .....	19
⑨	중점사업 추진실적 .....	21

의자, 목재데크, 산책로 탄성포장 등 공원 노후시설을 정비 및 교체하고 새로운 시설을 도입하여 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요 및 주요추진실적**

○ 영등포공원 보수정비사업(완료)

- 위 치 : 신길로 275 영등포공원(영등포본동)
- 규 모 : 5,000 $m^2$
- 내 용 : 주차장 초소 주변 화단 정비, 물놀이장 및 배드민턴장 바닥 정비, 나대지 수목 식재, 잔디 유지관리 등
- 추진실적
  - 2018. 1. 31. ~ 3. 30. : 실시설계용역(영등포공원 보수정비사업)
  - 2018. 5. 4. ~ 6. 12. : 공사착공 및 준공(영등포공원 보수정비사업)
  - 2018. 2. 27. : 잔디유지관리용역 착공
  - 2018. 9. 15. : 잔디유지관리용역 준공
- 예 산 : 172,000천원(시비) ※ 집행액 : 146,592천원(시비)

○ 노후 마을마당 보수정비사업(완료)

- 위 치 : 덕천길마을마당(신길4동), 너섬마을마당(여의동)
- 규 모 : 2,722 $m^2$
- 내 용 : 조합놀이대 보수, 수목보식, 투수포장, 배수로정비, 화단정비 등
- 추진실적
  - 2018. 3. 13. ~ 3. 26. : 실시설계용역 시행
  - 2018. 4. 12. : 공사발주
  - 2018. 5. 27. : 공사준공
- 예 산 : 80,000천원(시비) ※ 집행액 : 79,038천원(시비)

○ 생활권 공원 녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : 영등포구 문래동5가 22-1 일대(문래동), 문래현대5차 앞
- 규 모 : 약 500 $m^2$
- 내 용 : 폐쇄도로 녹화, 아스팔트 철거, 수목식재, 휴게시설 조성 등

- 추진실적
  - 2018. 1. 25. ~ 3. 25. : 실시설계용역 시행
  - 2018. 4. 10. : 공사발주
  - 2018. 6. 15. : 공사준공
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 : 289,178천원(시비)
- 공원 시설물 정비사업(완료)
  - 위 치 : 문래, 당산, 신길, 메낙골, 자매공원, 새말, 인스빌소공원, 덕천길
  - 규 모 : 111,972.8m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 노후 정자 등 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비, 수목식재
  - 추진실적
    - 2018. 1. 19. ~ 3. 17. : 실시설계용역 시행
    - 2018. 4. 4. : 공사발주
    - 2018. 6. 9. : 공사준공
  - 예 산 : 290,000천원(구비) ※ 집행액 : 254,214천원(구비)
- 어린이공원 정비사업(완료)
  - 위 치 : 신우공원 등 6개소(대림, 양남, 영일, 평화, 신길광장)
  - 규 모 : 20,000m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 노후 어린이 놀이시설 및 휴게시설 교체, 수목식재 등
  - 추진실적
    - 2018. 1. 29. ~ 3. 9. : 실시설계용역 시행 및 준공
    - 2018. 4. 19. ~ 6. 26. : 공사 착공 및 준공
  - 예 산 : 235,400천원(구비) ※ 집행액 : 204,667천원(구비)
- 공원 시설 확충 및 개선사업(완료)
  - 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등 68개소
  - 규 모 : 5,000m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 문래공원 노외주차장 주차관제시스템 설치,  
노후·훼손 공원시설 정비, 수목/초화류 보식 및 긴급 보수정비사항 처리
  - 추진실적
    - 2018. 3. 29. ~ 4. 20. : 한마음마을마당 개선공사 시행
    - 2018. 4. 3. ~ 6. 26. : 문래공원 노외주차장 주차관제시스템 설치
    - 2018. 6. 15. : 강마을공원 철봉설치
    - 2018. 7. 4. : 물놀이장 이용안내판 설치
  - 예 산 : 110,000천원(구비) ※ 집행액 : 99,540천원(구비)

○ 공원 소나무 생육환경개선사업(완료)

- 위 치 : 문래공원 등 4개소(자매, 신길, 대림)
- 규 모 : 전정 227주, 방제 284주, 영양제 수간주사 60병
- 내 용 : 소나무 전지, 영양공급, 병해충방제
- 추진실적
  - 2018. 3. 27. : 공사 발주
  - 2018. 3. 30. : 공사 착공
  - 2018. 9. 18. : 공사 준공
- 예 산 : 25,000천원(구비) ※ 집행액 : 21,058천원(구비)

□ 현황사진(생활권 공원녹지 조성공사)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,212,400 (시 552,000, 구비 660,400)	1,094,287 (시 514,808, 구비 579,479)	90.3



관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 녹색공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 이용주민에게 다양한 볼거리와 휴식공간을 제공하고자 함

## □ 사업 추진실적

### ○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위 치 : 영월중(영등포동), 양화중(문래동)
- 규 모 : 1,200 $m^2$ (영월중:600 $m^2$ , 양화중:600 $m^2$ )
- 내 용 : 쉼터 조성, 야생화정원, 잔디정원, 그늘목 식재 등
- 추진실적
  - 2018. 2. 5. ~ 4. 15. : 실시설계 및 서울시 설계심의
  - 2018. 4. 24. ~ 6. 27. : 영월중 공사시행
  - 2018. 5. 4. ~ 6. 27. : 양화중 공사시행
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 : 299,917천원(시비)

### ○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위 치 : 여의도역(5호선) 2번 출구 앞 등
- 규 모 : 1,000 $m^2$
- 내 용 : 그늘목 식재, 띠녹지 조성, 야생초화 식재, 산책로 정비 등
- 추진실적
  - 2018. 2. 8. ~ 3. 10. : 실시설계용역 시행
  - 2018. 6. 4. : 공사발주
  - 2018. 7. 18. : 공사준공
- 예 산 : 110,000천원(시비) ※ 집행액 : 105,375천원(시비)

### ○ 아파트 열린녹지 조성사업(완료)

- 위 치 : 문래공원한신(문래동), 신길우성1차(신길3동), 양평현대2차(양평2동)
- 규 모 : 약2,500 $m^2$
- 내 용 : 담장 철거, 수목이식 및 식재, 편익시설 설치 등

- 추진실적

- 2018. 1. 26. ~ 4. 11. : 실시설계 및 주민의견 수렴
- 2018. 4. 25. ~ 6. 23 : 문래공원한신 공사시행
- 2018. 4. 26. ~ 6. 24 : 양평현대2차 공사시행
- 2018. 5. 23. ~ 6. 29 : 신길우성1차 공사시행

- 예 산 : 690,000천원(시비 345,000, 구비 345,000)

※ 집행액 : 594,000천원(시비 297,000, 구비 297,000)

□ 현황사진(가로정원 조성공사)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,100,000 (시 755,000, 구비 345,000)	999,292 (시 702,292, 구비 297,000)	90.8

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공하고자 함

#### □ 사업 추진실적

##### ○ 가로수 생육환경 개선사업(진행중)

- 위 치 : 영등포로(오목교 ~ 영등포시장 4, 신길3거리~대방역)  
도림로(문래대림A~대림역), 경인로(영등포R ~ 영등포역),  
영중로(국회대로~양평로)

- 규 모 : 가로수 메워심기 60주, 보호판 500조 정비

- 내 용 : 가로수 메워심기, 보호판 정비 등

- 추진실적 및 향후계획

- 2018. 2. 21. ~ 6. 07. : 실시설계 용역 및 서울시 설계심의
- 2018. 8. 29. ~ 11. 26. : 공사시행

- 예 산 : 345,000천원(시비) ※ 집행액 8,660천원(시비)

##### ○ 왕벚나무 수세회복사업(완료) / 보호수 생육환경개선 사업(완료)

- 위 치 : 여의도 봄꽃길 / 당산2동 보호수 등

- 규 모 : 왕벚나무 100주, 보호수 1주

- 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등

- 추진실적

- 2018. 2. 28. : 공사발주(왕벚나무 수세회복사업 )
- 2018. 3. 16. : 공사준공(10,000천원(구비)※집행액 9,200천원
- 2018. 7. 16. : 공사발주(보호수 생육환경 개선사업)
- 2018. 7. 16. : 공사착공
- 2018. 9. 05. : 공사준공 ※집행액 13,142천원

- 예 산 : 23,600천원(시비 13,600 구비 10,000)※집행액 22,342천원

○ 가로수 식재 및 은행나무 바꿔심기사업(진행중)

- 위 치 : 국제금융로(여의동) 등 관내 노선
- 규 모 : 가로수 식재(교체) 60주, 보호판 정비교체 60조 등
- 내 용 : 가로수 보식 및 교체, 보호판 정비 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2018. 2. 13. ~ 3. 12. : 대상수목 현장조사 및 실시설계
  - 2018. 5. 03. : 공사착공
  - 2018. 10. 31. : 공사준공
- 예 산 : 150,000천원(구비) ※ 집행액 39,600천원(구비)

□ 현황사진(왕벚나무 수세회복)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
518,600 (시 358,600, 구비 160,000)	70,602 (시 21,802, 구비 48,800)	13.6

※은행나무 바꿔심기 공사는 11월10일 준공, 가로수 생육환경 개선사업은 11월말 준공예정

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화도시 영등포 이미지에 걸맞는 거리환경을 조성하고자 함

## □ 사업 추진실적

- 가로변(의사당대로) 녹지량 확충사업(완료)
  - 위 치 : 여의도동 의사당대로
  - 규 모 : 3,000 $m^2$
  - 내 용 : 녹지대 조성 및 정비, 휴게시설 조성 등
  - 추진실적
    - 2018. 2. 14. ~ 4. 5. : 실시설계용역 시행
    - 2018. 5. 4. : 공사발주
    - 2018. 5. 28~7.26. : 공사준공
  - 예 산 : 350,000천원(시비) ※ 집행액 : 329,222천원(시비)
- 가로변(여의대로) 녹지량 확충사업(진행중)
  - 위 치 : 여의도동 여의대로 등 3개소(여의서로, 국제금융로)
  - 규 모 : 5,000 $m^2$
  - 내 용 : 토양개량, 녹지대 조성 및 정비, 휴게시설 조성 등
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2018. 2. 9. ~ 5. 4. : 실시설계용역 시행
    - 2018. 6. 14. : 공사발주
    - 2018. 7. 9 ~ 11.15. : 공사준공(예정)
  - 예 산 : 750,000천원(시비) ※ 집행액 121,000천원(시비)
- 선유도역 걷고싶은 거리 조성사업(완료)
  - 위 치 : 양평로 22길(선유도역 2번출구 ~ 양평가로녹지)
  - 규 모 : 4,000 $m^2$
  - 내 용 : 데크 휴게쉼터 조성, 무단횡단방지웬스, 보도블럭 등 교체, 수목식재 등 녹지조성
  - 추진실적
    - 2018. 2. 5. ~ 4. 25. : 실시설계용역 시행
    - 2018. 6. 8. : 공사발주
    - 2018. 7. 3 ~ 10. 15. : 공사준공
  - 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 436,488천원(시비)

○ 도시구조물 벽면녹화사업(완료)

- 위 치 : (문래동)도림천고가 벽면
- 규 모 : 500 $m^2$
- 내 용 : 식생기반조성, 환토, 등반보조재 설치, 수목 및 덩굴식물 식재 등
- 추진실적
  - 2018. 2. 12. ~ 3. 13. : 실시설계, 서울시 설계심의
  - 2018. 4. 30. ~ 6. 21. : 공사시행
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 집행액 : 190,707천원(시비)

○ 사계절 꽃길 조성사업(완료)

- 위 치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 3개소
- 규 모 : 400 $m^2$
- 내 용 : 꽃길조성 200m, 장식화단 조성, 걸이화분 설치 등
- 추진실적
  - 2018. 5. 1. : 봄철 꽃길 조성 완료
- 예 산 : 36,626천원(시비) ※ 집행액 : 35,185천원(시비)

○ 영등포 꽃으로 피다 사업(완료)

- 위 치 : 서부간선도로 방음벽 아래 사면(문래현대5차~오목교)
- 규 모 : 1,700 $m^2$
- 내 용 : 가로변 사계절 장식화단 조성, 자투리땅 꽃·나무 식재 등
- 추진실적
  - 2018. 3. 21. ~ 4. 10. : 도면작성용역 시행
  - 2018. 4. 27. : 공사발주
  - 2018. 6. 1. : 공사준공
- 예 산 : 75,000천원(구비) ※ 집행액 : 69,020천원(구비)

○ 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업(진행중)

- 위 치 : 양남사거리 녹지대 등
- 규 모 : 500 $m^2$
- 내 용 : 녹지대 정비, 수목 식재 등
- 추진실적 및 향후계획
  - 2018. 10. 16. : 공사발주
  - 2018.10. 8. ~ 11.14. : 공사시행
- 예 산 : 50,000천원(구비)

○ 띠녹지 보식 및 정비(완료)

- 위치 : 여의동 국제금융로 등 관내 띠녹지구간
- 규모 : 300m
- 내용 : 가로변 띠녹지 정비, 식재기반, 아교목/관목류/초화류 등 식재
- 추진실적
  - 2018. 3. ~ 8. : 실시설계, 주민의견수렴
  - 2018. 10. 5. ~ 10.30. : 공사시행
- 예산 : 30,000천원(구비) ※ 집행액 : 26,500천원(구비)

○ 공개공지 되살리기(완료)

- 위치 : 여의대방로9길 5(보래매 두산위브, 신길6동)
- 규모 : 500m<sup>2</sup>
- 내용 : 쉼터조성, 수목식재, 노후시설물 보강 등
- 추진실적
  - 2018. 3. 21. ~ 4. 10. : 도면작성용역 시행
  - 2018. 5. 15. : 공사발주
  - 2018. 6. 26. : 공사준공
- 예산 : 30,000천원(시비) ※ 집행액 : 29,800천원(시비)

□ 현황사진(영등포 꽃으로 피다)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,021,626 (시 1,866,626, 구비 155,000)	1,237,922 (시 1,142,402, 구비 95,520)	61.2

※하절기 이상기온으로 공사중단에 따른 공기연장으로 다소 늦어졌으나 11월말 준공예정

안양천, 우수지에 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 제공하고자 함

□ 사업 추진실적

- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업(완료)
  - 위 치 : 안양천 제방 및 산책로 주변
  - 규 모 : 약 3km
  - 내 용 : 수목보식, 안내판 정비, 휴게시설 정비 등
  - 추진실적
    - 2018. 3. 6. : 공사 발주
    - 2018. 3. 8. ~ 3. 20. : 공사준공
  - 예 산 : 10,000천원(구비) ※ 집행액 : 9,200천원(구비)
- 안양천 화장실 설치사업(구 주민참여)(진행중)
  - 위 치 : 안양천 둘레길 (목동교~양평교)
  - 규 모 : 화장실 1동
  - 내 용 : 공중화장실 설치
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2018. 8. ~ 9. : 추경(20백만원) 확보 및 공사 발주
    - 2018. 10. 17. ~ 11. 14. : 공사시행
  - 예 산 : 70,000천원 (구비)
- 샛강생태공원 친환경 문화프로그램 운영사업(진행중)
  - 위 치 : 여의도동 4-5일대 샛강생태공원 내
  - 내 용 : 생태교육(140회) 및 소규모 문화행사(10회) 진행
  - 추진실적 및 향후계획
    - 2018. 4. ~ 10. : 잠자리 생태문화학교 생태프로그램(154회)
    - 2018. 11. ~ 12. : 잠자리 생태문화학교 생태프로그램(20회)
  - 예 산 : 15,000천원(구비) ※ 집행액 : 12,100천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
95,000 (구 95,000)	21,300 (구비 21,300)	22.4

※안양천 화장실 설치사업비 부족에 다른 추경예산 확보후 사업 추진으로 11월말 준공예정



관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 수목의 수형조절 가지치기 및 위험수목을 제거하여 안전사고 예방하고 가로경관을 향상시켜 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

## □ 사업 추진실적

### ○ 품격있는 가로수 관리사업(완료)

- 위 치 : 경인로 등 시도로 9개 노선, 배전선로 노선 50개 노선
- 규 모 : 여름/겨울철 1,056주, 배전선로 4,791주
- 내 용 : 시도로 및 한전 고압선 하부 가로수 가지치기 수형조절
- 추진실적

- 2018. 2. 26. ~ 4. 06. : 겨울철 시도로 가지치기사업
- 2018. 3. 07 ~ 4. 20. : 배전선로 하부 가로수 가지치기사업
- 2018. 8.30. ~ 9. 26. : 여름철 가로수 수형조절사업

- 예 산 : 114,500천원(시비 114,500천원, 한전예산 별도)

※ 집행액 : 114,200천원(시비)

### ○ 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)(완료)

- 위 치 : 문래로 등 관내 103개 노선, 양평가로 녹지대 등 300개소
- 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 600주
- 내 용 : 위험목/민원/신호등/표지판 저축수목/ 녹지대 수목제거 및 수형조절
- 추진실적

- 2018. 2.26. ~ 6. 8. : 가로수 가지치기사업(연간단가)
- 2018. 2.26. ~ 10. 31. : 녹지대 위험수목 정비사업(연간단가)

- 예 산 : 100,000천원(구비)※ 집행액 : 91,700천원(구비)

○ 열린학교(학교공원) 수목정비사업(진행중)

- 위 치 : 영림초교 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 15개소
- 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 150주
- 내 용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 150주
- 추진실적 및 향후계획
  - 2018. 2. 12. ~ 2. 27. : 열린학교 수목정비사업(완료)
  - 2018. 10. ~ 11. : 하반기 수목정비사업 시행(예정)
- 예 산 : 30,000천원(구비)※ 집행액 : 19,000천원(구비)

□ 현황사진(겨울철 가로수 가지치기)



□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
244,500 (시 114,500, 구비 130,000)	224,900 (시114,200, 구비 110,700)	91.9

공원 내 공원등과 전기시설 및 CCTV, 위험수목 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

## □ 사업 추진실적

### ○ 공원 방송 음향시설 정비(완료)

- 위 치 : 당산공원(당산1동), 신길공원(신길5동)
- 규 모 : 공원 안내방송시설 정비 2개소 등
- 내 용 : 안내방송용 앰프, 스피커 설치, 안내방송시스템 구축
- 추진실적
  - 2018. 4. 5. : 공사발주
  - 2018. 4. 12. : 공사계약
  - 2018. 4. 12. : 공사착공
  - 2018. 5. 21. : 공사준공
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 집행액 : 18,085천원(구비)

### ○ 공원등 LED 조명 교체사업(완료)

- 위 치 : 중앙어린이공원 등 8개소
- 규 모 : 공원등 132등 교체
- 내 용 : 공원등 LED 등으로 교체하여 전기요금 절감 등
- 추진실적
  - 2018. 2. 1. : 공사발주
  - 2018. 2. 5. : 공사계약
  - 2018. 2. 6. : 공사착공
  - 2018. 3. 13. : 공사준공
- 예 산 : 80,000천원(구비) ※ 집행액 : 72,967천원(구비)

### ○ 전기시설물 유지관리사업(연간단가)(진행중)

- 위 치 : 관내 공원, 녹지대 등(문래공원 등 68개소, 녹지대 등)
- 규 모 : 공원등 764본 978등, 분전함 62면, 기타 전기시설 정비
- 내 용 : 공원등, 분전함, 기타 전기시설 정비 유지관리

- 추진실적 및 향후계획

- 2018. 1. 18. : 공사발주
- 2018. 1. 23. : 공사계약
- 2018. 5. 21. : 1차기성 준공
- 2018. 12. 31. : 준공(예정)

- 예 산 : 27,000천원(구비) ※ 집행액 : 16,454천원(구비)

○ 공원 내 수목 가지치기 및 식재사업(완료)

- 위 치 : 신갈근린공원 등 9개소(자매, 문래, 신우, 다사랑, 대림, 중앙, 양남, 달맞이)
- 규 모 : 158주
- 내 용 : 수목 가지치기 150주, 이식 6주, 뿌리분제거 2주
- 추진실적

- 2018. 3. 9. : 공사발주
- 2018. 3. 15. ~ 4. 3. : 공사 착공 및 준공

- 예 산 : 30,000천원(구비) ※ 집행액 : 28,958천원(구비)

○ 공원 내 수경시설 유지관리(완료)

- 위 치 : 신갈5동 신갈광장 물놀이장 등 13개소
- 규 모 : 물놀이장5개소, 조형분수 2개소, 바닥분수4개소, 계류2개소
- 내 용 : 수경시설 노후부품교체 및 정비 등
- 추진실적

- 2018. 3. 15. ~ 4. 4. : 현장조사 및 설계
- 2018. 4. 17. : 공사 시행(공원 내 수경시설 유지관리공사)
- 2018. 5. 3. : 공사 준공
- 2018. 6. 14. : 공사 시행(영일어린이공원 바닥분수 정비공사)
- 2018. 6. 28. : 공사 준공
- 2018. 10.11. : 수경시설 안내판 설치

- 예 산 : 25,000천원(구비) ※ 집행액 : 23,145천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
182,000 (구비 182,000)	159,609 (구비 150,609)	87.7

주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

## □ 사업 추진실적

### ○ 공중화장실 환경개선(완료)

- 위 치 : 신길근린공원 등 4개소(원지, 신우, 대림)
- 규 모 : 공중화장실 4개소
- 내 용 : 소변기 장애인손잡이 등 화장실 노후시설 교체 등
- 추진실적
  - 2018. 4. 13. : 공사 발주
  - 2018. 4. 19. ~ 5. 16. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 19,000천원(구비) ※ 집행액 : 14,600천원(구비)

### ○ 마을단위 야외체육시설 설치(진행중)

- 위 치 : 도림게이트볼장 등 10개소
- 규 모 : 흙먼지털이기 및 운동기구 30점 설치 및 교체
- 추진실적 및 향후계획
  - 2018. 3. 2. : 공사발주(도림게이트볼장 등 휴게시설 정비공사)
  - 2018. 4. 2. : 공사준공(도림게이트볼장 등 휴게시설 정비공사)
  - 2018. 5. 9. : 구매발주(양평1동 흙먼지털이기 설치)
  - 2018. 6. 15. : 설치완료(양평1동 흙먼지털이기 설치)
  - 2018. 3. ~ 10. : 공사준공(신우어린이공원 등 10개소)
  - 2018. 11. : 노후체육시설물 교체 설치 완료(예정)
- 예 산 : 130,000천원(추경30,000천원)(구비) ※ 집행액 103,185천원

### ○ 공원녹지포지 폐기물처리사업(완료)

- 위 치 : 양평2동 1-29(아리수정수센터 옆)
- 규 모 : 2,500ton

- 내 용 : 공원녹지 발생 각종 혼합폐기물 반출처리
- 추진실적
  - 2018. 3. 29 ~ 4.22 : 폐기물처리용역 1차 시행(완료)
  - 2018. 6. 14 ~ 7. 5. : 폐기물처리용역 추가 시행(완료)
  - 2018. 8. 29. ~ 9. 13. : 폐기물처리용역 하반기 시행(완료)
- 예 산 : 75,000천원(구비) ※ 집행액 : 65,292천원(구비)

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
224,000 (구비 224,000 )	183,077 (구비 183,077)	81.7

푸른도시과 중점 사업 추진을 통해 편리하고 쾌적한 공원, 녹지, 하천환경을 조성하여 주민 삶의 질을 높이고자 함.

## □ 사업 추진실적

### ○ 생활권 공원녹지 조성공사(완료)

- 위 치 : 문래동5가 22-1 일대(문래동, 문래현대5차 앞)
- 규 모 : 약500 $m^2$
- 내 용 : 이면도로 폐쇄구간 차 없는 거리조성, 쉼터, 산책로 조성  
운동기구, 휴게시설설치, CCTV설치, 수목 및 초화류 식재 등
- 추진실적
  - 2018. 4. 13. : 공사 발주
  - 2018. 4. 19. ~ 5. 16. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 집행액 289,178천원

### ○ 선유도역 걷고싶은 거리 조성(완료)

- 위 치 : 양평로 22길(선유도역 2번출구 ~ 양평가로녹지)
- 규 모 : 약 4,000 $m^2$
- 내 용 : 데크 휴게쉼터 조성, 무단횡단 방지웬스, 보도블럭 등 교체,  
수목식재 등 녹지조성
- 추진실적
  - 2018. 6. 8. : 공사 발주
  - 2018. 7. 3. ~ 10. 15. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 집행액 436,488천원

### ○ 띠녹지 보식 및 정비사업(진행중)

- 위 치 : 여의동 국제금융로 등
- 규 모 : 300m
- 내 용 : 가로변 띠녹지 조성 및 정비, 아교목/관목류/초화류 식재 등
- 추진실적
  - 2018. 3. ~ 8. : 실시설계 및 주민의견 수렴
  - 2018. 9. ~ 11. : 공사발주 및 시행(예정)
- 예 산 : 30,000천원(구비) ※ 집행액 26,500천원

○ 신길로33길 가로수길 조성사업(완료)

- 위 치 : 신길로33길 래미안 프레비뉴아파트 앞
- 규 모 : 270m
- 내 용 : 느티나무 14주 이식, 이팝나무 41주 식재 등
- 추진실적
  - 2018. 5. 29. : 공사발주
  - 2018. 6. 14. ~ 6. 27. : 공사착공 및 준공
- 예 산 : 90,000천원(구비-주민참여) ※ 집행액 72,405천원

○ 공원등 LED조명 교체사업(완료)

- 위 치 : 중앙어린이공원 등 9개소
- 규 모 : LED조명 132등 교체
- 내 용 : 공원안전등급(R,Y)이 낮은 공원 우선적으로 LED조명 교체하여 안전하고 쾌적한 공원환경 제공
- 추진실적
  - 2018. 2. 1. : 공사발주
  - 2018. 3. 13. : 공사준공
- 예 산 : 80,000천원(구비) ※ 집행액 72,967천원

○ 공원 방송음향시설 정비(완료)

- 위 치 : 당산공원(당산1동), 신길공원(신길5동)
- 규 모 : 당산공원(노후 스피커 교체 및 앰프 설치)  
신길공원 : 스피커 및 앰프 신설
- 내 용 : 공원 이용객이 많은 당산·신길공원에 공원 기초질서 계도를 위한 안내방송 시스템을 구축하여 쾌적한 공원환경을 제공
- 추진실적
  - 2018. 4. 5. : 공사발주
  - 2018. 5.21. : 공사준공
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 집행액 18,085천원

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,020,000 (시 800,000, 구 220,000)	915,623 (시 725,666, 구 189,957)	89.8



### Ⅲ . 2019년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선 .....	24
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충 .....	27
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리 .....	28
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선 .....	30
⑤	하천변 녹지 확충 및 정비 .....	33
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성 .....	36
⑦	공원내 위험요소 사전 정비 .....	38
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비 .....	40

의자, 목재데크, 산책로 탄성포장 등 공원 노후시설을 교체하고 새로운 시설을 도입하여 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

## □ 사업개요

### ○ 영등포공원 보수정비사업

- 위 치 : 신길로 275 영등포공원(영등포본동)
- 규 모 : 5,000 $m^2$
- 내 용 : 농구장, 게이트볼장 주변 방음벽 설치, 게이트볼장 인조잔디 교체, 물놀이장 이용자 편의를 위하여 그늘목 식재 및 쉼터 추가 설치, 노후된 공원등 교체 및 신규 설치, CCTV 카메라 교체, 잔디광장 유지관리 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 4. ~ 7. : 공사 시행 및 준공
  - 2019. 2. ~ 9. : 잔디 유지관리용역 시행
- 예 산 : 730,000천원(시비)

### ○ 공원 시설물 정비사업

- 위 치 : 문래, 당산, 신길, 메나골근린공원 등 5개소
- 규 모 : 100,000 $m^2$
- 내 용 : 노후, 훼손된 공원 시설물 교체 및 정비, 수목식재 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 285,000천원(구비)

### ○ 어린이공원 정비사업

- 위 치 : 다사랑어린이공원 등 10개소
- 규 모 : 2,000 $m^2$
- 내 용 : 노후 어린이놀이기구, 휴게시설, 포장 등 정비, 수목 식재
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
  - 2019. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 250,000천원(구비)

○ 너와 나 우리 모두의 놀이터 조성사업

- 위 치 : 어린이놀이터가 있는 공원 중 1개소(미정)

※ 민+관+전문가로 구성된 워킹그룹, 주민 의견 등을 반영하여 대상지 선정 예정

- 규 모 : 1,000 $m^2$

- 내 용 : 장애인과 비장애인이 함께 어울려 놀 수 있는 어린이놀이터 조성, 공원 내 출입구, 보행로, 음수대 등 다양한 시설을 정비하여 무장애 친화공원으로 재조성

- 일 정

· 2019. 1. ~ 5. : 사업대상지 선정 및 실시설계용역 시행

· 2019. 6. ~ 10. : 공사 시행 및 준공

- 예 산 : 250,000천원(시 170,000, 구 80,000)

○ 창의어린이놀이터 재조성사업

- 위 치 : 영일어린이공원

- 규 모 : 900 $m^2$

- 내 용 : 천편일률적인 놀이터를 감수성과 모험심을 키울 수 있는 창의놀이터 및 지역 커뮤니티 공간으로 재조성

- 일 정

· 2018. 10. ~ 2019. 2. : 실시설계용역 시행

· 2019. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공

- 예 산 : 300,000천원(시비)

○ 대림어린이공원 어린이놀이터 재정비사업(신규)

- 위 치 : 대림어린이공원

- 규 모 : 500 $m^2$

- 내 용 : 양분되어 있는 어린이놀이터를 1개소로 합쳐서 재정비, 다양한 연령층의 아이들을 위한 놀이시설물 설치, 녹지/화단이설, 토공 등

- 일 정

· 2019. 1. ~ 4. : 실시설계용역 시행

· 2019. 5. ~ 10. : 공사 시행 및 준공

- 예 산 : 300,000천원(구비)

○ 공원 시설 확충 및 개선사업

- 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등 68개소
- 규 모 : 5,000 $m^2$
- 내 용 : 공원내 긴급보수 정비사항, 민원사항 등 정비사업 시행
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 6. : 긴급보수, 정비사항, 민원사항 처리
  - 2019. 1. ~ 12. : 보수 정비 수시 시행
- 예 산 : 70,000천원(구비)

○ 공원 소나무 생육환경개선사업

- 위 치 : 신길공원 등 5개소(신길, 영일, 자유, 평화, 목화)
- 규 모 : 230주
- 내 용 : 소나무 수목전지, 영양제 수간주사, 병해충방제, 토양개량 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 2. : 사업대상지 조사 및 설계
  - 2019. 3. ~ 9. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 22,000천원(구비)

○ 공원 화장실 설치(신규)

- 위 치 : 메낙골근린공원(신길1동)
- 규 모 : 간이화장실 1개동
- 내 용 : 간이화장실 1개동, 기반공사, 주변 녹화공사 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 4. : 사업대상지 조사, 주민의견 수렴
  - 2019. 5. ~ 8. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 75,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총 2,282,000천원(시 1,200,000, 구 1,082,000)**

관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 녹색공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 이용주민에게 다양한 볼거리와 휴식공간을 제공하고자 함

## □ 사업개요

### ○ 에코스쿨 조성사업

- 위 치 : 선유고(양평2동), 영문초(문래동), 관악고(양평1동)
- 규 모 : 학교 3개소
- 내 용 : 학교 숲, 천연잔디밭 조성 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 4. : 실시설계 및 서울시 설계심의
  - 2019. 4. ~ 10. : 공사시행
- 예 산 : 463,000천원(시비)

### ○ 가로정원 조성사업

- 위 치 : 신길동 28-5(샛강다리 앞 광장), 41-49(신길역 1,2번출구)일대
- 규 모 : 2,500 $m^2$
- 내 용 : 식재기반조성, 수목식재 및 등외자 등 시설물설치
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 4. : 실시설계 및 시 설계심의
  - 2019. 5. ~ 10. : 공사시행
- 예 산 : 300,000천원(시비)

### ○ 아파트 열린녹지 조성사업

- 위 치 : 문래동3가 54(문래동) 문래 힐스테이트아파트(1,100 $m^2$ )  
양평동3가 79(양평2동) 양평현대3차아파트(500 $m^2$ )
- 규 모 : 약 1,600 $m^2$
- 내 용 : 담장철거 330m, 수목이식 및 식재, 편의시설 설치 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 4. : 실시설계 및 주민의견 수렴
  - 2019. 4. ~ 5. : 서울시 설계심의 및 계약심사
  - 2019. 6. ~ 10. : 공사시행
- 예 산 : 450,000천원(시비 225, 구비 225)

□ 소요예산 : 총 1,213,000천원(시 988,000, 구 225,000)

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관을 제공하고자 함

#### □ 사업개요

- 가로수 생육환경 개선사업
  - 위치 : 버드나루로, 경인로, 여의동서로, 의사당대로 등 4개소
  - 규모 : 띠녹지 정비 250m, 메워심기 30주
  - 내용 : 띠녹지 정비 및 가로수 메워심기, 보호판 교체, 신설
  - 일정
    - 2019. 1. ~ 4. : 실시설계 용역
    - 2019. 4. ~ 10. : 공사시행
  - 예산 : 600,000천원(시비)
- 왕벚나무 수세회복사업 / 보호수 생육환경개선 사업
  - 위치 : 안양천 제방산책로 / 당산2동 보호수 등
  - 규모 : 왕벚나무 100주, 보호수 1주
  - 내용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등
  - 일정
    - 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 및 공사발주
    - 2019. 3. ~ 7. : 공사시행
  - 예산 : 25,000천원(시비 15,000 구비 10,000)
- 가로수 보식 및 식재사업
  - 위치 : 여의동 등 관내 주요노선
  - 규모 : 가로수 식재(교체) 250주, 보호판 정비교체 등
  - 내용
    - 여의동 등 주요노선 은행나무 암->수 바꿔심기 250주
    - 문래로, 양산로 수목보호판 정비교체, 뿌리융기정비 등
  - 일정
    - 2019. 1. ~ 3. : 대상수목 현장조사 및 실시설계
    - 2019. 4. ~ 12. : 공사시행
  - 예산 : 500,000천원(구비)

○ 당산로 녹지 환경정비 및 확충사업(신규)

- 위 치 : 당산로 일대(구청앞 사거리~영등포구청역 사거리)
- 규 모 : 약 0.4km(양방향)
- 내 용 : 노후 가로식수대 정비, 떠녹지 정비, 무궁화 거리 조성 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
  - 2019. 4. ~ 10. : 공사시행
- 예 산 : 100,000천원(구비)

○ 신길6동 벚꽃길 노후조명 개선사업(신규)

- 위 치 : 대방천로14길 일대 (신길6동 벚꽃길)
- 규 모 : 조명등 43등 교체 및 경관조명 설치
- 내 용 : LED조명 교체 및 경관조명을 설치하여 안전하고 아름다운 거리제공
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
  - 2019. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 98,500천원(구비-주민참여)

□ **소요예산 : 총 1,323,500천원(시 615,000, 구 708,500)**

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화 도시 영등포 이미지 향상하고자 함

## □ 사업개요

- 가로변 녹지량 확충사업
  - 위 치 : 대방천로 녹지대 등 3개소
  - 규 모 : 4,500m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 녹지 조성, 수목 및 초화류 식재, 편의시설 설치 등
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 4. : 실시설계 및 서울시 설계심의
    - 2019. 4. ~ 10. : 공사시행
  - 예 산 : 750,000천원(시비)
- 사계절 꽃길 조성사업
  - 위 치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 3개소
  - 규 모 : 500m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 테마화단(490m<sup>2</sup>), 길이화분(3,000m), 가로화분(250EA)
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 10. : 봄, 가을 꽃길조성(연2회)
  - 예 산 : 85,000천원(시비)
- 영등포 꽃으로 피다 사업
  - 위 치 : 서부간선도로 아래 사면(문래현대5차아파트 ~ 신정교 사이)
  - 규 모 : 1,500m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 식생기반 조성 및 수목, 초화류 식재 등
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 10. : 실시설계 및 공사시행
  - 예 산 : 84,500천원(구비)



○ 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업

- 위 치 : 관내 가로녹지대 등

- 규 모 : 500m<sup>2</sup>

- 내 용 : 노후 시설물(의자 등)정비, 수목 보식 등

- 일 정

· 2019. 1. ~ 4. : 대방천 녹지 사면정비, 편의시설 보수/교체

· 2019. 1. ~ 12. : 녹지대 시설물 정비, 수목보식 등

- 예 산 : 50,000천원(구비)

○ 띠녹지 보식 및 정비

- 위 치 : 여의공원로 등 주요 노선

- 규 모 : 1,200m

- 내 용 : 띠녹지 정비 1,200m<sup>2</sup>, 수목/초화류 식재 등

- 일 정

· 2019. 1. ~ 4. : 실시설계, 주민의견수렴

· 2019. 4. ~ 10. : 공사시행

- 예 산 : 30,000천원(구비)

○ 공개공지 되살리기

- 위 치 : 당산로 26(문래자이아파트, 문래동)

- 규 모 : 500m<sup>2</sup>

- 내 용 : 수목 식재, 아치웬스 등 시설물 정비 등

- 일 정

· 2019. 1. ~ 4. : 실시설계, 주민의견수렴

· 2019. 5. ~ 10. : 공사시행

- 예 산 : 30,000천원(시비)

○ 도림천변 사면 정비사업

- 위 치 : 도림동 쌍용플래티넘시티 옆 사면(영등포구 도영로7길 15)

- 규 모 : 500m<sup>2</sup>

- 내 용 : 사면 피복, 운동기구 및 산책로 정비 등

- 일 정

· 2019. 1. ~ 3. : 실시설계, 주민의견수렴

· 2019. 4. ~ 6. : 공사시행

- 예 산 : 150,000천원(구비)

○ 여의도 봄꽃축제장 재정비사업(신규)

- 위 치 : 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대 등)
- 규 모 : 5,000 $m^2$
- 내 용 : 경관/휴게데크로 조성, 소규모 쉼터 조성, 개나리/철쭉 등 화목류 식재, 왕벚나무 결주지 추가 식재, 포토존 조성 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 5. : 실시설계, 주민의견수렴
  - 2019. 6. ~ 10. : 공사시행
- 예 산 : 300,000천원(구비)

○ 도로변 녹지량 확충사업(신규)

- 위 치 : 도림천로 일대(대림동 616-1 일대)  
영등포로 사면 녹지(영등포동2가 11-26일대)
- 규 모 : 6,000 $m^2$
- 내 용 : 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 화목류 꽃밭조성 등 도로변 사면 녹화, 다양한 화목류 식재 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 5. : 실시설계, 주민의견수렴
  - 2019. 6. ~ 10. : 공사시행
- 예 산 : 300,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총 1,779,500천원(시 865,000, 구 914,500)**

안양천, 우수지에 수목식재, 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업
  - 위 치 : 안양천 제방 산책로 (신정교~양화교)
  - 규 모 : 4km
  - 내 용 : 나대지 관목 식재 및 휴게시설(파고라) 정비 1식
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 2. : 현장조사 및 실시설계
    - 2019. 2. ~ 4. : 공사시행
  - 예 산 : 20,000천원(구비)
- 안양천 화장실 설치사업
  - 위 치 : 안양천 오목교 주변
  - 규 모 : 간이화장실 1동
  - 내 용 : 노후 간이화장실 1동 교체 및 주변 환경 정비
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
    - 2019. 4. ~ 10. : 공사시행
  - 예 산 : 70,000천원(구비)
- 안양천 음수대 설치사업
  - 위 치 : 안양천 목동교 주변
  - 규 모 : 음수대 1개소
  - 내 용 : 음수대 1개소 및 상수도 인입, 수도계량기, 내부 전기배선 설치 등
  - 일 정
    - 2019. 3. ~ 5. : 현장조사 및 자체설계
    - 2019. 5. ~ 6. : 공사시행
  - 예 산 : 30,000천원(구비)

- 안양, 도림천 수목 가지치기
  - 위 치 : 안양천 · 도림천 사면, 안양천 제방 상단 벚꽃길
  - 규 모 : 양버즘나무 외 2종 2,500주
  - 내 용 : 위험수목 가지치기 약 200주
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 2. : 현장조사 및 실시설계
    - 2019. 2. ~ 3. : 공사시행
  - 예 산 : 50,000천원(구비)
- 안양천 제방 산책로 정비사업 (구주민참여)(신규)
  - 위 치 : 안양천 제방 산책로 (오목교~신정교)
  - 규 모 : 산책로 약 0.7km
  - 내 용 : 안양천 노후 산책로 정비(야자매트길 조성) 및 체육시설 정비 등
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
    - 2019. 4. ~ 10. : 공사시행
  - 예 산 : 100,000천원(구비)
- 안양천 둔치 식생 복원사업 (구주민참여)(신규)
  - 위 치 : 안양천 둔치 (오목교 ~ 신정교)
  - 규 모 : 둔치 약 2,000m<sup>2</sup>
  - 내 용 : 외래 위해수종 제거 및 물억새 등 하천식물 식재 등
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
    - 2019. 4. ~ 10. : 공사시행
  - 예 산 : 95,000천원(구비)
- 안양천·도림천 생태복원사업
  - 위 치 : 안양천(양화교~한강합수부), 도림천(도림천합수부~신도림역)
  - 규 모 : 4km
  - 내 용 : 하천변 그늘목 식재 및 식재기반 조성 및 초화류 식재 등
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
    - 2019. 4. ~ 11. : 공사시행
  - 예 산 : 500,000천원(시비)

○ 수변 생태순환길 조성사업(신규)

- 위 치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규 모 : 20.3km
- 내 용 : 안전한 산책 환경 조성 및 순환산책길 안내 표지판 설치 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
  - 2019. 4. ~ 11. : 공사시행
- 예 산 : 400,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총2,665,000천원(시 500,000,구 2,165,000)**

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 수목의 수형조절 가지치기 및 위험수목을 제거하여 안전사고 예방하고 가로경관을 향상시켜 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

## □ 사업개요

- 품격 있는 가로수 관리사업
  - 위 치 : 노들로 등 10개노선
  - 규 모 : 가로수 가지치기 4,700주, 수형조절 200주 등
  - 내 용 : 배전선로 근접 가로수 가지치기, 여름철/겨울철 수형조절 등
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 3. : 겨울철 시도로 가지치기사업 시행
    - 2019. 2. ~ 4. : 배전선로 하부 가로수 가지치기사업 시행
    - 2019. 8. ~ 9. : 여름철 가로수 수형조절사업 시행
  - 예 산 : 207,000천원(시비 207,000천원, 한전예산 별도)
- 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)
  - 위 치 : 문래로 등 관내 103개 노선, 양평가로 녹지대 등 200개소
  - 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 600주
  - 내 용 : 위험목/민원/신호등/표지판 저촉수목/ 녹지대 수목제거 및 수형조절
  - 일 정
    - 2019. 1. ~12. : 가로수, 녹지대 수목 가지치기사업(연간단가) 시행
  - 예 산 : 100,000천원(구비)
- 열린 학교(학교공원) 수목정비사업
  - 위 치 : 영원중 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 15개소
  - 규 모 : 위험수목 가지치기 및 제거 200주
  - 내 용 : 학교공원화 사업지 위험수목 제거 및 가지치기 200주
  - 일 정
    - 2019. 1. ~ 12. : 열린 학교(학교공원) 수목정비사업 시행
  - 예 산 : 30,000천원(구비)

○ 노들로 녹지대 정비사업

- 위 치 : 노들로 녹지대(양화교~여의교)
- 규 모 : 교목 및 하층식생
- 내 용 : 위험수목 정비, 제초작업 등 녹지대 정비
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 10. : 수목정비 및 제초작업 시행
- 예 산 : 40,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총 377,000천원(시 207,000, 구 170,000, 한전별도)**

공원 내 공원등 등 전기시설 및 CCTV, 위험수목 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

## □ 사업개요

### ○ 영등포공원 공원등 교체사업(신규)

- 위 치 : 신길로 275호 영등포공원
- 규 모 : 노후 공원등 교체 및 신설
- 내 용 : 노후 공원등을 교체 및 신설하여 안전하고 쾌적한 공원환경 제공
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
  - 2019. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 400,000천원(시비-주민참여)

### ○ 공원등 LED 조명 교체사업

- 위 치 : 자매근린공원 등 7개소
- 규 모 : 공원등 126등 교체
- 내 용 : 공원등 LED등으로 교체하여 전기요금 절감 및 안전한 공원환경 제공
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
  - 2019. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 90,000천원(구비)

### ○ 전기시설물 유지관리사업(연간단가)

- 위 치 : 관내 공원, 녹지대 등(문래공원 등 82개소, 녹지대 등)
- 규 모 : 공원등 820본 1,031등, 분전함 68면, 기타 전기시설 정비
- 내 용 : 공원등, 분전함, 기타 전기시설 정비 유지관리
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 12. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 27,000천원(구비)



○ 공원내 수목 가지치기 및 식재사업

- 위 치 : 관내 공원, 마을마당 등 71개소
- 규 모 : 500주
- 내 용 : 수목 가지치기, 고사목 및 도복 수목 제거 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 2. : 현장조사 및 설계
  - 2019. 3. ~ 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 36,000천원(구비)

○ 공원내 수경시설 유지관리

- 위 치 : 신길5동 신길광장 물놀이장 등 13개소
- 규 모 : 물놀이장5개소, 조형분수 2개소, 바닥분수4개소, 계류2개소
- 내 용 : 수경시설 노후부품교체 및 정비 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계
  - 2019. 4. ~ 10. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 25,000천원(구비)

□ **소요예산 : 총 578,000천원(시 400,000,구 178,000)**

주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 녹색복지 실현

## □ 사업개요

### ○ 공중화장실 환경개선

- 위 치 : 대림3동 원지어린이공원 등 2개소(원지, 다사랑)
- 규 모 : 공중화장실 2개소
- 내 용 : 화장실 노후시설교체 등
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계
  - 2019. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 22,000천원(구비)

### ○ 마을단위 야외체육시설 설치

- 위 치 : 안양천, 양평가로녹지 등 6개소
- 규 모 : 체육시설 노후 고무칩 포장, 운동기구 40점 설치 및 시설물 정비 등
- 내 용 : 운동기구 설치, 노후 체육시설 교체정비
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 2. : 사업대상지 현장조사
  - 2019. 3. ~ 11. : 공사 시행 및 준공
- 예 산 : 100,000천원(구비)

### ○ 공원녹지포지 폐기물처리사업

- 위 치 : 양화동 1-29 성산대교 하부, 영등포정수센터 옆
- 규 모 : 폐기물 반출 1,000톤(연간단가)
- 내 용 : 적재 혼합폐기물 완전반출 및 주변 환경 정비
- 일 정
  - 2019. 1. ~ 3. : 사업대상지 현장조사
  - 2019. 3. ~ 12. : 폐기물반출 처리
- 예 산 : 80,000천원(구비)

□ 소요예산 : 총 202,000천원(구 202,000)

## IV. 신규·주요 투자사업

### 1 | 공원 화장실 설치(신규)

공원팀

지역주민의 장기 민원사항인 메낙골공원 내 화장실을 주민의견을 수렴후 설치하여 공원이용자 편의를 도모하고 주민 숙원사업을 해소하고자 함.

#### □ 추진방향

- 주민 숙원사업 해소
  - 10여년 된 오랜 주민 요구사항에 대한 적극적인 해소
- 지역주민, 공원이용객 의견 수렴을 통한 최적의 방안 마련

#### □ 사업개요

- 위 치 : 메낙골근린공원(게이트볼장 주변 등)
- 규 모 : 간이화장실 1개동(남여)
- 기 간 : 2019. 1. ~ 8.
- 내 용 : 간이화장실 1개동 설치, 화장실 바닥 토목공사, 화장실 차폐식재 주변 수목정비 등 조경공사 등

#### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 2. : 설치대상지 현장 점검 및 조사
- 2019. 2. ~ 4. : 지역주민의견 수렴(동 주민센터 협조)
- 2019. 5. ~ 8. : 화장실 구매 및 설치공사 시행

#### □ 기대효과

- 공원 내 화장실 이용 수요 충족 및 공원이용 만족도 개선
- 오랜 주민 민원 해소 및 공원 편익시설 확충

#### □ 소요예산: 총 75,000천원(구비 75,000)

우리구 영등포공원에 설치된 공원등을 고효율, 친환경 LED조명으로 교체하여 에너지 및 전기요금을 절감하고자 함.

### □ 추진방향

- 공원등을 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지 및 전기요금 절감
- 조도개선을 통한 야간 공원 이용객에게 안전한 공원환경 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 신길로 275호 영등포공원
- 규 모 : 노후 공원등 교체 및 신설
- 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
- 내 용 : 노후 공원등을 교체 및 신설하여 안전하고 쾌적한 공원환경 제공

### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 2. : 설치대상지 현장 점검 및 조사
- 2019. 2. ~ 3. : 좋은 빛 심의 및 설계
- 2019. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공

### □ 기대효과

- 노후 공원등을 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지 절약 및 예산절감
- 우범지역 조도를 개선하여 안전하고 쾌적한 공원환경 제공

□ 소요예산 : 총400,000천원(시비 400,000-시주민참여)

우리구 신길6동 벚꽃길에 설치된 노후조명을 교체하여 전기요금을 절감하고 다양한 경관조명등을 설치하여 안전하고 아름다운 거리를 제공하고자 함.

#### □ 추진방향

- 노후조명을 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지 및 전기요금 절감
- 다양한 경관조명등을 설치하여 안전하고 아름다운 거리 제공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 대방천로14길 일대 신길6동 벚꽃길
- 규 모 : 조명등 43등 교체 및 경관조명 설치
- 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
- 내 용 : LED조명 교체 및 경관조명을 설치하여 안전하고 아름다운 거리제공

#### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 2. : 설치대상지 현장 점검 및 조사
- 2019. 2. ~ 3. : 좋은 빛 심의 및 설계
- 2019. 3. ~ 6. : 공사 시행 및 준공

#### □ 기대효과

- 고효율 LED조명으로 교체하여 에너지 절약 및 예산절감
- 다양한 경관조명등을 설치하여 안전하고 아름다운 거리 제공

#### □ 소요예산 : 총98,500천원(구비 98,500-구 주민참여)

다양한 연령층의 아이들이 이용할 수 있도록 대림어린이공원 어린이놀이기설을 재정비하여 어린이들의 놀 권리를 보장해주고 보다 흥미로운 놀이환경을 조성하고자 함

#### □ 추진방향

- 다양한 연령층의 아이들이 즐겁게 뛰어놀 수 있는 기반 시설 마련 및 기회 제공으로 건전한 놀이문화 확산의 발판 마련
- 어린이들과 어른들이 함께 이용할 수 있는 공원 환경 정비

#### □ 사업개요

- 위치 : 대림1동 대림어린이공원
  - 규모 : 500m<sup>2</sup>
  - 기간 : 2019. 1. ~ 10.
  - 내용 : 양분되어 있는 어린이놀이터를 1개소로 합쳐서 재정비, 다양한 연령층의 아이들을 위한 놀이시설물 설치, 녹지/화단이설, 토공 등
- ※ 구청장 탁트인 현장행정 지시사항(2018.09.13.)  
 ~ 영등포종합사회복지관 소속 초록우산 탐구소년단(7명) 의견 수렴

#### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 실시설계용역 시행
- 2019. 4. : 공사 발주
- 2019. 5. ~ 10. : 공사 시행 및 준공

#### □ 기대효과

- 안전하고 쾌적한 어린이 놀이환경 조성

#### □ 소요예산: 총 300,000천원(구비 300,000)

도로변에 방치된 공지 등의 녹화 및 다양한 화목류 식재를 통하여 가로변 녹지량을 확충하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성하고자 함.

**□ 추진방향**

- 녹지량 부족 해소를 위해 방치되고 있는 공지 등을 활용
- 아름답고 쾌적한 녹지대를 조성하여 생활환경 개선

**□ 사업개요**

- 위치 : 향토꽃밭(영등포구 대림동 616-1 일대)
- 규모 : 5,000 $m^2$ (녹지대 재조성)
- 기간 : 2019. 2. ~ 8.
- 내 용
  - 도로변 방치 공지 녹화, 도시숲 조성, 화목류 꽃밭조성 등
  - 도로변 사면 녹화, 다양한 화목류 식재 등

**□ 추진일정**

- 2019. 1. ~ 3 : 현장 점검 및 실시설계 실시
- 2019. 3. ~10. : 공사시행

**□ 기대효과**

- 방치된 도로변 공지 녹화를 통한 가로변 녹지량 확충

**□ 소요예산: 총 300,000천원(구비 300,000)**

여의도 봄꽃축제장의 노후된 공간을 재정비하고 다양한 꽃들과 볼거리를 감상할 수 있도록 하여 서울을 대표하는 봄꽃축제의 장으로 조성하고자 함

### □ 추진방향

- 노후된 공간을 아름답고 쾌적한 거리로 조성
- 한강과 꽃이 어우러지는 봄꽃축제장 조성

### □ 사업개요

- 위치 : 여의동서로(국회 주변 한강사면, 여의동서로 벚꽃길 일대)
- 규모 : 5,000 $m^2$
- 기간 : 2019. 2. ~ 10.
- 내 용
  - 경관/휴게데크 조성, 소규모 쉼터 조성, 개나리/철쭉 등
  - 화목류 식재, 왕벚나무 결주지 추가 식재, 포토존 조성 등

### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 5. : 현장조사 및 실시설계 시행
- 2019. 6. ~10. : 공사시행

### □ 기대효과

- 봄꽃축제장 주변 환경 개선으로 축제효과 극대화
- 가로변 녹지량 확충, 도로환경 개선으로 영등포구 이미지 향상

### □ 소요예산: 총 300,000천원(구비 300,000)



영등포의 주요노선인 당산로 일대(구청역사거리)의 노후된 가로식수대 및 띠녹지를 정비하여 구청 앞 경관 향상 및 이미지 개선

### □ 추진방향

- 영등포구청 앞길의 노후된 공간 환경개선
- 무궁화 거리 조성으로 특색 있고 의미 있는 경관 향상

### □ 사업개요

- 위치 : 당산로 일대(구청앞 사거리~영등포구청역 사거리)
- 규모 : 약 0.4km(양방향)
- 기간 : 2019. 1. ~ 10.
- 내용 : 노후 가로식수대 정비, 띠녹지 정비, 무궁화 거리 조성 등

### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계 시행
- 2019. 4. ~10. : 공사시행

### □ 기대효과

- 구청사 주변 보행환경 개선으로 도로경관 향상 및 구 이미지 제고
- 가로변 녹지량 확충, 무궁화거리 조성으로 거리 환경 개선

### □ 소요예산: 총 100,000천원(구비 100,000)

한강, 샛강, 안양천, 도림천 등 관내 우수한 생태 환경을 활용, 수변 경관의 사계절 변화되는 모습을 감상하면서 지친 심신을 재충전 할 수 있도록 탁트인 영등포 생태순환길을 조성코자 함.

**□ 추진방향**

- 관내 우수한 생태 환경을 활용, 안전하고 쾌적한 산책 환경 조성
- 녹지 단절 구간 연결, 탁트인 영등포 생태순환길을 조성

**□ 사업개요**

- 위치 : 한강, 샛강, 안양천, 도림천
- 규모 : 20.3km
- 기간 : 2019. 1. ~ 11.
- 내용: 안전한 산책 환경 조성, 순환산책길 안내 표지판 설치, 녹지 단절 구간 연결 녹지 조성 등

**□ 추진일정**

- 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
- 2019. 4. ~ 11. : 공사 시행

**□ 기대효과**

- 수변 생태순환길 조성으로 주민 이용만족도 증진
- 하천변 경관향상 및 주민 건강 증진

**□ 소요예산: 총 400,000천원(구비 400,000)**

먼지가 날리고 비·눈이 오면 질퍽거리는 안양천 제방 산책로를 정비하여 사계절 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 정비하여 어르신 등 지역 주민의 편리하고 쾌적한 체육 활동을 위한 환경 조성으로 건전한 여가 활동 도모 및 탁트인 영등포 제고에 기여코자 함.

### □ 추진방향

- 안양천 노후 산책로 정비, 안전하고 쾌적한 산책 환경 조성
- 노후 체육시설 정비, 건전한 여가 활동 도모

### □ 사업개요

- 위치 : 안양천 제방 산책로 (오목교~신정교)
- 규모 : 0.7km
- 기간 : 2019. 1. ~ 11.
- 내용: 안전한 산책 환경 조성, 순환산책길 안내 표지판 설치, 녹지 단절 구간 연결 녹지 조성 등

### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
- 2019. 4. ~ 11. : 공사 시행

### □ 기대효과

- 하천변 제방 산책로 정비로 주민 편의제공
- 하천변 경관향상, 주민 건강증진

### □ 소요예산: 총 100,000천원(구비 100,000)

안양천의 위해 식물을 제거하고 그 곳에 하천변 경관을 느낄 수 있는 물억새 군락지를 조성하여 서울의 갈대밭 명소 안양천으로 재탄생하여 탁트인 영등포 제고에 기여코자 함.

### □ 추진방향

- 위해 식물을 제거, 물억새 군락지 조성으로 쾌적한 하천변 경관 조성
- 물억새 명소 안양천으로 재탄생하여 탁트인 영등포 제고에 기여

### □ 사업개요

- 위치 : 안양천 둔치 (오목교 ~ 신정교)
- 규모 : 2,000m<sup>2</sup>
- 기간 : 2019. 1. ~ 11.
- 내용: 외래 위해수종 제거 및 물억새 등 하천식물 식재 등

### □ 추진일정

- 2019. 1. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계
- 2019. 4. ~ 11. : 공사 시행

### □ 기대효과

- 하천변 외래식물 제거 및 식생 복원으로 하천 생태계 복원
- 하천변 경관향상, 주민 볼거리 제공 등

### □ 소요예산: 총 95,000천원(구비 95,000)
