

## 공원 녹지과

**I . 일 반 현 황**

**II . 2005 주요업무 추진실적**

**III . 2006 주요업무 추진계획**

**IV . 특 수 사 업**


# 1. 일반 현황

## 1. 이

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	고용직	비고
정 원	26	1	3	6	3	4	9	0	
현 원	24	1	3	5	3	3	9	0	
과부족	-2	-	-	-1	-	-1	-	-	

## 2. 조

### 공원 녹지과장

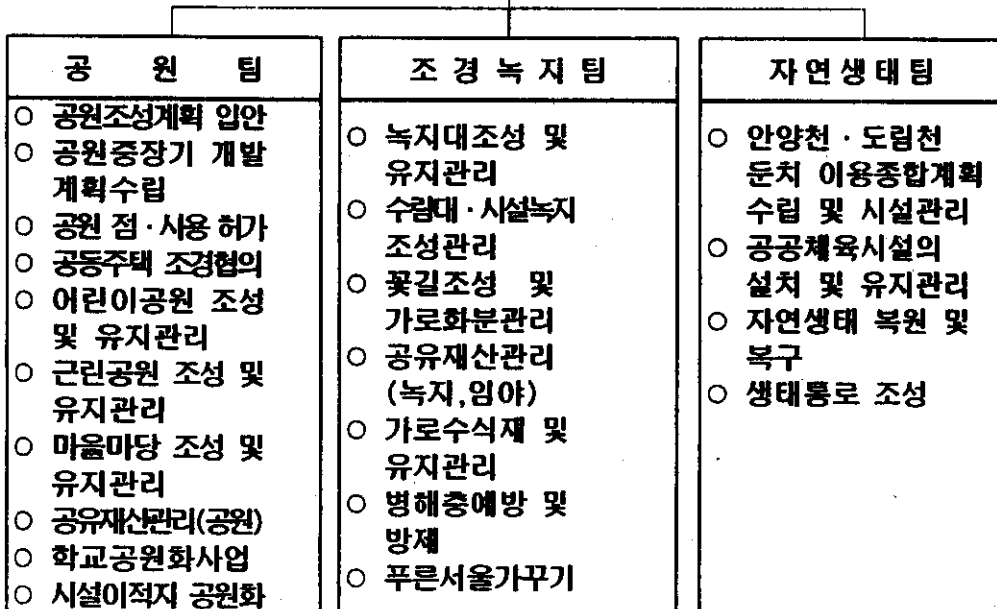

**3** **주요 시설현황**

**공 원**

구분		개수	면적(㎡)	비고
<b>계</b>		<b>29</b>	<b>624,620.2</b>	
근린공원	소 계	11	559,961.9	여의도 229,539, 선유도 110,407, 영등포 61,544, 매낙골 51,470, 문래 23,611, 신길 19,782, 자매 16,500, 대림운동장 16,498, 양화폭포 13,000, 당산 11,154.9, 증마루 6,456
	시 설	11	559,961.9	
어린이공원	소 계	18	54,082.9	대림 6,969, 영일 5,413.3, 자유 5,385, 원지 4,845.1, 평화 4,595, 중앙 3,671.8, 강마을 3,329.4, 산우 3,112.5, 고추밭 3,071, 양평 2,845, 동심 2,820.1, 서강 1,797.1, 다사랑 1,632.3, 무암 1,477.8, 양남 1,467.4, 산성 413, 산일 173.6, 당곡 1,064.5(미시설)
	시 설	17	53,018.4	
	미시설	1	1,064.5	
마을마당	시 설	19	10,575.4	야동 471, 당산동 747, 문래 1동 3,311.4, 양평 2동 2개소 594, 도림동 125, 도림동 100, 신일동 475, 신일동 2개소 388, 신일동 3개소 1,881, 신일동 161, 신일동 1,550, 신일동 3개소 611, 신일동 161.

**가로수 및 녹지대**

구분	개수	면적(㎡)	비고
가로수	54개 노선	16,070	○ 총 18종 16,070주 은행나무 5,415, 버즘나무 5,289, 느티나무 2,312, 빛나무 1,737, 단풍나무 119, 회화나무 203, 은단풍 665, 기타(메타, 이팝 등) 330
녹지대	99개소 (491,810㎡)	1,667,107	○ 느티나무 외 30종, 위령탑 1개소, 분수대 2개소, 파고라 등 11종 440점

□ 지정보호수

서19-1	은행나무	주	530년	20.5m	5.4m	12.8m	당산동6가 10번지	시	당산2동장
서19-2	동근잎 노타나무	주	100년	15m	2.7m	23.3m	양평동4가 184번지	양평동 교회	양평2동장

□ 수경시설

양 화 폭 포 (양화동153-8외필지)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○인조바위 : 면적 1,620㎡</li> <li>○폭 포 : 6개소</li> </ul>	
당산공원 분수대 (당산동3가 385)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○분수조면적 : 201㎡</li> <li>○모 타 : 1대(10HP)</li> <li>○시설 일자 : 1977.7.17.</li> </ul>	
여의나루역 벽천 (여의도동 8번지)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○분수조 면적 : 90㎡</li> <li>○조형벽천1조, 유리벽천2조</li> </ul>	
노들길 분수대 (당산2동삼성아파트)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○분수조 면적 : 70㎡</li> </ul>	

□ 체육시설

14개소 16종	66,986	158	72	6	4	9	5	3	8	37	86	10	9	8	11	10	19	6	13
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	---	----	----	----	---	----

## II. 2005 주요업무 추진실적

### □ 완료사업

1

대림어린이공원 조성

- 위 치 : 영등포구 대림1동 870번지 일대
- 사업규모 : 6,969㎡
- 사업기간 : 2005. 1 ~ 6
- 소요예산 : 900,000천원

2

중앙어린이공원 정비

- 위 치 : 중앙어린이공원등 12개 공원
- 사업규모 : 느티나무 식재 및 조합놀이대 설치
- 사업기간 : 2005. 1 ~ 6
- 소요예산 : 200,000천원

3

선길5동 341-3번지 관리동 신축

- 위 치 : 선길5동 341-3번지
- 사업내용 : 관리동 1동 1층 신축
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 7
- 소요예산 : 100,000천원

4

여의도중학교 방음벽외 3개소 담쟁이, 수목식재 및 화단조성

- 위 치 : 여의도 중학교 방음벽외 3개소
- 사업내용 : 담쟁이, 수목식재 및 화단조성
- 사업기간 : 2005. 3. ~ 6.
- 사업비 : 60,000천원(사비)

5

**안전지대 꽃밭조성**

- 위 치 : 여의도 안전지대 외 4개소
- 사업내용 : 꽃밭조성 406㎡, 초화류 30,000본 식재 등
- 사업기간 : 2005. 3 ~ 4
- 사 업 비 : 70,000천원

6

**가든스 보식**

- 위 치 : 영등포로 등 18개 노선
- 사업내용 : 느티나무 등 106주 식재
- 사업기간 : 2005. 2 ~ 3
- 사 업 비 : 60,000천원

8

**교차로 삼각형-중앙녹지대**

- 위 치 : 대림3동 유수지앞 교통섬
- 사업내용 : 금계국등 7종 111,724본 식재
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 6
- 사 업 비 : 150,000천원

9

**영등포시장 로터리 녹지대외**

- 위 치 : 영등포시장 로터리 녹지대외 1개소
- 사업내용 : 화양목등 5종 5,655주 식재
- 사업기간 : 2005. 4 ~ 5
- 사 업 비 : 50,000천원

10

공공기관 공원의 환경정비사업

- 위 치 : 당산로 124 영동포구청
- 사업내용 : 느티나무등 식재 및 시설설치
- 사업기간 : 2005. 4 ~ 8
- 사 업 비 : 500,000천원

11

지정투항수정비

- 위 치 : 당산동 6가 외 2개소
- 사업내용 : 외과수술 및 전정작업
- 사업기간 : 2005. 4 ~ 7
- 사 업 비 : 90,000천원

12

초화류 및 잔디식재

- 위 치 : 여의동로외 3개소
- 사업내용 : 초화류 및 잔디식재
- 사업기간 : 2005. 3 ~ 9
- 사 업 비 : 50,000천원

□ 진행중인 사업

1

신길동공화체육공원정비사업

- 위 치 : 신길동 341-3번지
- 사업내용 : 운동장 정비 1,711㎡
- 사업기간 : 2005. 11 ~ 12
- 사 업 비 : 171,000천원
- 추진실적 : 2005. 11. 6 공사착공
- 향후 추진계획 : 2005. 12. 5 공사준공

2

**당산2동 마을미닝 설치**

- 위 치 : 당산동6가 281-1번지
- 사업내용 : 소공원 조성 73㎡
- 사업기간 : 2005. 1 ~ 11
- 사업비 : 33,000천원
- 추진실적 :
  - 2005. 11. 1 : 공사착공
- 향후 추진계획 : 2005. 11. 26 공사준공

3

**계곡리농성초등학교**

- 위 치 : 양평동 베드민턴장외 3개소
- 사업내용 : 바람막이 85경간 설치
- 사업기간 : 2005. 11 ~ 12
- 사업비 : 263,000천원
- 추진실적 : 2005. 11. 14 공사발주
- 향후 추진계획
  - 2005. 11. 21 : 공사착공
  - 2005. 12. 20 : 공사준공

4

**당산1동사무소 화단등 15개소**

- 위 치 : 당산1동사무소 화단등 15개소
- 사업내용 : 소나무등 식재
- 사업기간 : 2005. 10 ~ 12
- 사업비 : 190,000천원
- 추진실적
  - 2005. 11. 9 : 공사발주
- 향후 추진계획
  - 2005. 11. 19 : 공사착공
  - 2005. 12. 18 : 공사준공



5

**천수공간조성**

- 위 치 : 당산동3가 370-3번지 일대
- 사업내용 : 천수공간조성 330㎡
- 사업기간 : 2005. 10 ~ 2006. 6
- 사업비 : 920,000천원(시비)
- 추진실적
  - 2005. 11 ~ 12 : 실시설계 완료
- 향후 추진계획
  - 2005. 12. 30 : 공사착공
  - 2005. 06. 30 : 공사준공

6

**안양천, 도림천 인라인스케이트장 설치**

- 위 치 : 안양천, 도림천
- 사업내용 : 인라인스케이트장 설치외 16개공종
- 사업기간 : 2005. 9.28 ~ 2005. 12. 26
- 사업비 : 2,176,000천원
- 추진실적
  - 2005. 9.28 : 공사착공
- 향후 추진계획
  - 2005. 12. 26 : 공사준공 예정

### Ⅲ. 2006 주요업무 추진계획

1

#### 안양·도림천 특화사업

안양·도림천 특화사업 계획에 의한 계속사업으로 시설이용지구내 체육시설을 설치하여 주민들의 웰빙문화와 삶의 질 향상에 대한 욕구 충족

추진목표

- 이용률 높은 체육시설 설치로 주민 체력 증진

사업개요

- 위 치 : 안양천(양화교)
- 규 모 : 인라인 스케이트장 설치 1개소(400m트랙)
- 사업기간 : 2005. 1 ~ 2006. 12(일부정비)-년차별 사업
- 소요예산 : 800,000천원

추진실적

- 특화사업 1차 시행 : 2005. 1 ~ 12

향후계획

- 2006. 1 ~ 3 : 실시설계
- 2006. 4 : 공사 발주
- 2006. 5 ~ 11 : 공사시행

연차별계획

(단위:백만원)

구 분		2003년 이전	2004년	2005년	2006년	2007년 이후
추진 내용	○ 실시설계 용역 시행			실시설계 용역 1식	실시설계 용역 1식	
	○ 특화사업 시행			인라인스케이트장 설치외 16개공종	인라인스케 이트장1면	
총사업비 : 20,000백만원				2,878	800	16,322

**2 당산근린공원 개선사업**

구청과 인접된 공원으로 내방 및 이용객이 많은 공원 내 시설물과 포장  
이 노후되고 파손되어 공원경관을 저해 시설개선과 담장 개방하여 친환경  
적인 공원을 조성 구청의 랜드마크 기능 제공과 주민들의 삶의 질 향상에  
기여

- 추진목표
  - 노후되고 난립된 시설을 개선하여 현대적이며 수준 높은 공원조성
  - 다양한 이용이 가능하도록 개선

- 사업개요
  - 위 치 : 당산동 3가 385번지
  - 면 적 : 11,154.9㎡(3,374평)
  - 사업기간 : 2004. 10 ~ 2006. 12
  - 소요예산 : 500,000천원(2006년 추경 확보계획)

- 추진실적
  - 2004.11.10 ~ 2005. 3.31 : 기본 및 실시설계
  - 2005.10. 6 : 당산근린공원 조성계획 변경결정

- 향후계획
  - 2005. 11 : 공사발주
  - 2006. 12 : 공사준공

□ 연차별 추진계획

구 분		2003년 이전	2004년	2005년	2006년	2007년 이후
추진 내용	○ 공원 재정비		공원재정비 11,154.9㎡			
	총사업비 : 1,250백만원		50	700	500	

3

**문래동주민운동장 재정비**

노후되고 이용형태가 단순한 공원으로 재정비 민원이 상존하고 있어 공원 이용성 증대 및 쾌적한 공원 환경을 제공하고 주민들의 다양한 욕구에 부응코자 공원이용프로그램과 시설을 발굴 정비하여 주민들의 삶의 질 향상에 기여

**추진목표**

- 많은 면적을 차지하는 운동장(3,228㎡)을 개선하여 다양한 공원이용이 가능하도록 정비
- 경로당, 화장실, 동물사 등 기존 건축물 통폐합으로 토지이용극대화

**사업개요**

- 위 치 : 문래동 6가 66번지 일대
- 면 적 : 23,611㎡(7,142평)
- 사업기간 : 2005. 3 ~ 2007. 6
- 소요예산 : 500,000천원

**추진실적**

- 2004. 09. 01 : 구 투자심사 실시
- 2005. 03. 30 : 기본 및 실시설계

**향후계획**

- 2005. 11 : 공원조성계획(변경) 심의
- 2005. 12 : 공사발주
- 2007. 10 : 공사완료

**연차별 계획**

(단위: 백만원)

구 분		2003년 이전	2004년	2005년	2006년	2007년 이후
추진 내용	○ 공원 재정비			공원재정비 23,611㎡		
	총사업비 : 2,900백만원		100	450	500	1,850

4

**4 동118회 공원조성**

주거환경이 열악한 지역에 어린이집, 지하주차장, 공원시설을 포함한 복합시설을 확충하여 지역간 불균형 해소 및 도시경관 향상과 삶의 질 향상 도모

**□ 추진목표**

- 「생활권녹지 100만평 늘리기」 사업 일환으로 녹지가 부족하고 주거 환경이 열악한 주택 밀집지역에 공원·주차장 등 복합시설을 설치하여 열악한 주거환경을 개선하고자 주민생활의 삶의 질 향상 도모

**□ 사업개요**

- 위 차 : 영등포구 신길4동 232-20
- 면 적 : 3,092㎡(935평)
- 사업내용
  - 공 원 조 성 : 2,251㎡
  - 주차장 건설 : 2,977㎡(지하2층/연면적4,602㎡, 주차면수140면)
  - 어린이집 건립 : 841㎡ ( 민자유치 추진중 )
- 사업기간 : 2003.12. 5 ~ 2006.12.31
- 소요예산 : 600백만원(2006년 추경확보예정)

**□ 추진실적**

- 2005. 3. 30 : 보상완료

**□ 향후계획**

- 2005. 7. 30 : 지장물(건물) 철거완료
- 2006. 7. 30 : 지하주차장 건립 완료
- 2006.12. 31 : 공원조성 완료

**□ 연차별 계획**

(단위: 백만원)

구 분		2003년 이전	2004년	2005년	2006년	2007년 이후
추진 내용	○ 보상	건물26동 토지 3,092㎡				
	○ 공원조성			공원조성 2,251㎡		
총사업비 : 8,453백만원		4,062	3,791		600	

5

**당산제2공원 조성**

준공업지역 공장이전지내 공동주택건설에 따라 확보된 공원부지가  
나대지로 방치 도시미관을 저해하고 있어 공원을 조성 주민들에게 쾌적한  
휴식공간을 제공하고 아름다운 영등포 조성에 만전을 기하고자 함

□ **추진목표**

- 경관과 보행공간의 질을 제고할 수 있는 아름답고 쾌적한 가로공원 조성
- 공원이용성 극대화 - 시설의 다변화, 기능 확보, 공원이용프로그램 개발
- 토지매입 - 3년 분납으로 구에서 매입
- 공원조성 - 2005년 토지주 주식회사 효성에서 조성 후 기부채납

□ **사업개요**

- 위 치 : 당산동 5가 4-23번지
- 면 적 : 2,582.3㎡(781평)
- 사업기간 : 2004. 11 ~ 2007. 12
- 추진내용 : 도시계획시설(공공공지) 결정(2005.1.3)
- 진행사항 : 시 투자심사 완료(2005.2.15) - 조건부 추진
- 소요예산 : 3,000,000천원(시특별교부금 1,500,000, 구비 1,500,000)  
[총사업비 7,400,000천원-토지매입비]  
\* 공원조성 - 토지주 부담(약 600백만원)

□ **추진실적**

- 2005. 5. 30 : 공원 조성 기공식
- 2005. 6. 13 : 1차분 보상비 지급(23억 8천만원)-시특별교부금

□ **향후추진계획**

- 2005. 11. 30 : 공원 준공예정
- 2006. : 2차분 토지매입비 지급
- 2007. : 3차분 토지매입비 지급

6

**경북지역 녹지 조성사업**

장기미집행 시설녹지에 대해 연차별 보상후 녹화하여 녹지의 기능을 회복시킴으로서 민원해소와 녹지의 체계적인 확충과 도시경관의 수준 향상을 도모

추진방향

- 장기미집행 시설녹지 녹화로 녹지 기능 회복
- 녹지의 체계적인 확충과 도시경과 수준 향상

추진목표

- 장기미집행 시설녹지 보상후 녹화로 철도변 불량가시권을 차폐·정비함으로써 소음·분진 저감으로 환경개선 및 쾌적한 도시경관 제공

사업개요

- 위 치 : 영동포구 영동포동 422, 423번지 일대
- 사업규모 : 1,708㎡
- 사업기간 : 2003. 6 ~ 2006. 12
- 사업내용 : 보상(1,251㎡)후 녹지조성
- 소요예산 : 493,000천원(시비)-2005예산 사고이월

추진실적

- 2005. 1 ~ 5 : 보상완료

향후계획

- 2005. 12 ~ 2006. 7 : 철거공사 시행
- 2006. 07 ~ 2006. 12 : 녹지조성

연차별 계획

(단위: 백만원)

		2003	2004	2005	2006	2007년 이월
추진 내용	○ 일부 녹지 조성	15,882㎡				
	○ 보상 및 녹지조성		보상	보상	녹지조성 1,708㎡	
총사업비: 20,186백만원		17,146	1,940	607	493	

7 학교 공원화 사업

학교운동장 주변과 유휴공지에 나무를 심어 녹음이 우거진 푸른 교정을 조성하여 학생들의 정서순화에 기여하고 학교담장 개방 및 시설보완을 통해 지역주민을 위한 녹지 및 공원기능으로 제공

□ 추진방향

- 학교숲, 야외교실 및 자연학습원을 조성하여 환경교육 프로그램과 연계
- 주민에게 학교를 개방하고 주민 휴식 공간 확보

□ 추진목표

- 2007년까지 총 24개교 공원화
- 신설(신축)학교에 학교담장개방 및 녹화 유도하여 학교공원화 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 대영초등학교동 3개소
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 12
- 추진내용 : 학교담장 철거, 유휴공지 녹화 등
- 소요예산 : 500,000천원(시비)

□ 향후계획

- 2006. 1 ~ 2 : 대상학교 선정 및 예산확정
- 2006. 3 ~ 5 : 기본 및 실시설계
- 2006. 6 ~ 12 : 공사시행



8

**체육시설 정비**

관내 야외 체육시설중 노후된 체육시설의 교체 및 정비로 주민 이용 편의 증대는 물론 주민 체력 증진에 기여 코자 함

추진목표

- 수준높은 체육시설 설치로 이용율 증가에 따른 주민 체력 증진
- 노후된 체육시설 정비로 이용주민 편의 증대

사업개요

- 위 치 : 양평동 체력단련장의 2개소
- 규 모 : 체육시설 교체 및 이설 34조, 평의자 30개 등
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2006. 7
- 소요예산 : 200,000천원

향후계획

- 2006. 1 ~ 3 : 실시설계
- 2006. 4 : 공사 발주
- 2006. 5 ~ 7 : 공사시행

9

**하천부착환경적인 화장실 개선**

안양천에 노후화된 간이 화장실을 친환경적인 화장실로 교체하여 하천 미관 향상 및 이용주민의 편의도모

□ 추진목표

- 친환경적인 화장실 설치로 이용주민 편의 증대
- 노후된 화장실 교체로 하천 미관 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천(신정교1, 양평교1)
- 규 모 : 화장실 설치 2동 설치
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2006. 8
- 소요예산 : 100,000천원

□ 향후계획

- 2006. 1 ~ 2 : 실시설계
- 2006. 3 : 공사 발주
- 2006. 5 ~ 8 : 공사시행

10

**안양·도림천 통합 관리사무소 조성**

안양천에 방문자 센터 및 관리창고등을 통합한 관리사무소를 신축하여 안양·도림천의 관리 수준을 높이고 방문주민들의 편의를 도모 코자 함

□ 추진목표

- 통합 관리사무소 설치로 안양·도림천 관리 수준향상
- 방문자센터 설치로 이용주민 편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천(오목교)
- 규 모 : 관리사무소1동설치 (방문자센터, 인부대기실, 관리창고)
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2006. 9
- 소요예산 : 200,000천원

□ 향후계획

- 2006. 1 ~ 2 : 실시설계
- 2006. 3 : 공사 발주
- 2006. 5 ~ 9 : 공사사행

11

공원녹지 향상

공원녹지가 부족하고 주거환경이 열악한 생활권 주변에 공원녹지 공간을 확충하여 쾌적한 주거환경 및 도시경관을 향상시켜 주민들의 삶의 질 향상에 기여

□ 추진목표

- 공원녹지가 부족한 행정동을 우선적으로 공원녹지 공간을 확보하여 지역간 균형개발에 따른 민원해소
- 공원녹지 확충으로 주거환경 및 쾌적한 도시경관 향상

□ 사업근거

- 구청장 지시사항 48호 (2005. 5. 18)
- 서울환경비전 21 실천과 관련 「생활권녹지 100만평 늘리기 사업」

□ 사업개요

- 위 치 : 신길3동 310-53 일대외 26개소
  - 마을마당 조성 : 신길3동 310-53외 3필지(330㎡)
  - 신길동 154-2외 2필지(112㎡)
  - 자투리땅 녹화 : 신풍역외 24개소(6,500㎡)
- 규 모 : 6,942㎡
  - 마을마당 조성 : 442㎡
  - 자투리땅 녹화 : 6,500㎡
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 12
- 소요예산 : 500,000천원

□ 향후계획

- 2006. 1 ~ 6 : 도시계획(공공공지)결정, 현장조사 및 설계
- 2006. 7 ~ 12 : 보상 및 공사시행

**12 어린이놀이대 고무매트 포장공사**

어린이공원내 조합놀이대 주변에 고무매트를 설치하여 어린이들의 개선  
충류 감염 및 안전사고를 예방하고 공원미관을 향상시키고자 함

- 추진방향
  - 어린이공원 조합놀이대 주변 기존 모래바닥을 고무매트 포장으로 안전성 확보
- 추진목표
  - 어린이공원 17개소 고무매트 포장 100% 완료
- 사업개요
  - 위 치 : 평화어린이공원등 3개소
  - 사업기간 : 2006. 2 ~ 4
  - 추진내용 : 고무매트포장 1,160㎡
  - 소요예산 : 128,000천원
- 향후계획
  - 2006. 1 ~ 2 : 기본 및 실시설계
  - 2006. 3 ~ 4 : 공사시행

**13 공원내 나대지 복구공사**

공원내 수목이 부족하여 나지가 노출되고 경관이 불량한 녹지대에 나무등을  
보식하여 공원경관 향상

- 추진방향
  - 공원내 나대지 수목보식으로 토사유출 및 비산먼지 발생 억제
- 추진목표
  - 연차적으로 공원 24개소 나지피복완료
- 사업개요
  - 위 치 : 근린공원 4개소, 어린이공원 13개소
  - 사업기간 : 2006. 2 ~ 5
  - 추진내용 : 키큰나무 및 키작은나무 식재
  - 소요예산 : 250,000천원
- 향후계획
  - 2006. 1 ~ 2 : 기본 및 실시설계
  - 2006. 3 ~ 5 : 공사시행

14

**가로수 전지**

경인로 등 6개 노선 가로수중 수고가 지나치게 높거나 가지가 울창하여 태풍 등에 도복되어 안전사고의 위험이 있는 수목 및 민원사항 등에 의해 정비가 필요한 수목에 대한 전지작업을 시행 함.

□ 추진목표

- 가로수 전지작업을 통한 균형있는 가로 경관 조성
- 가로수로 인한 민원해소

□ 사업근거

- 가로수의 생장에 따른 정비로 반복적인 사업
- 가로수 기본계획 수립용역(2005 ~ 2014)에 의한 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 경인로 등 13개 노선
- 규 모 : 버즘나무 등 1종 900주 가지치기 작업
- 사업기간 : 2006. 11 ~ 2007. 2
- 소요예산 : 100,000천원

□ 향후계획

- 2006. 1 ~ 1 : 현장 조사 및 설계
- 2006. 2 ~ 3 : 1차 공사 시행
- 2006. 10 ~ 11 : 현장 조사 및 설계
- 2006. 12 ~ 2007. 2 : 2차 공사시행

15

**가로변 꽃묘식재**

영등포 로타리등 꽃밭 및 가로화분 15개소에 계절별 꽃묘를 식재하여  
이용 주민들에게 다양한 볼거리를 제공하고 아름다운 영등포 조성에 기여

**추진목표**

- 가로변 화분내 꽃묘식재로 주민들의 생활권 환경개선
- 도로변 화단식재로 꽃이 있는 영등포 이미지 조성

**사업개요**

- 위 치 : 영등포 로타리 꽃밭 등 15개소
- 규 모 : 화단1,000㎡ / 화분 200개
- 사업기간 : 2006. 2 ~ 2006. 12
- 소요예산 : 200,000천원

**향후계획**

- 2006. 02 ~ 03 : 춘기 1차 꽃묘식재
- 2006. 04 ~ 06 : 춘기 3차 꽃묘식재
- 2006. 06 ~ 08 : 하절기 꽃묘식재
- 2006. 09 ~ 10 : 추기 꽃묘식재
- 2006. 11 ~ 12 : 동절기 꽃묘식재

16

**가로수 식재 및 보전**

관내 신설도로 및 가로수 중 교통사고, 자연고사 등으로 가로수가 없는 지역, 민원요청지역에 수목의 식재 및 가로수기본계획에 의한 가로수 정비를 체계적이고 합리적으로 시행하여 쾌적한 가로경관을 조성코자 함

□ 추진목표

- 노선별 같은 수종의 가로수 식재로 체계적인 가로경관 조성
- 도심내 수목 식재로 가로변 녹지량 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 도림로등 5개 노선
- 규 모 : 가로수 식재 100주
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2006. 4
- 소요예산 : 50,000천원

□ 향후계획

- 2006. 01 : 현장조사 및 설계
- 2006. 02 ~ 04 : 공사 시행



17

**생육불량수목 수세회복**

윤중로·안양천변·신길6동 벚나무길의 왕벚나무는 저하된 지력에 비하여 지상부의 엽량과다로 인한 불균형 상태에 있어 병해충방제, 생리증진, 외과수술, 엽면시비, 수형조절 등을 실시코자 함

□ 추진목표

- 노쇠한 왕벚나무의 외과수술 등을 통하여 건강한 생육여건 조성
- 병해충, 공해 등에 약한 왕벚나무의 생리적 특성을 고려한 생육여건 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 윤중로(여의동·서로), 안양천변, 신길6동 벚나무길
- 규 모 : 왕벚나무 2,690주
- 사업기간 : 2006. 2 ~ 9
- 사업내용 : 왕벚나무 2,690주 병충해방제, 생리증진, 외과수술 등
- 소요예산 : 50,000천원

□ 향후계획

- 2006. 2 ~ 3 : 현장조사 및 설계
- 2006. 4 ~ 9 : 수목 수세회복 실시

## IV. 특수사업

### 1 안양천 조류서식공간 조성

#### □ 추진목표

- 안양천 둔치에 야생조류 서식공간과 자연친화적인 시민 친수공간, 수생 식물원 등을 조성하여, 한강을 거쳐 안양천을 찾아오는 철새의 서식 환경을 보전하고 새와 사람이 공존하는 아름다운 수변공원으로 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 안양천(오목교 ~ 목동교) 동측 둔치
- 면 적 : 97,000㎡(연장 850m)
- 사업규모
  - 야생조수 서식처(Bird-Park) 조성
  - 연못주변 친수광장(Water-Amenity Park) 조성
  - 정화 수생식물원(River-Bio Park) 조성
- 사 업 비 : 2,096백만원(시비)
  - 기본 및 실시설계비 : 72백만원
  - 공 사 비 : 2,024백만원(2006년 예산반영)

#### □ 추진계획

- 설계용역 : 2005. 9 ~ 12
- 공사시행 : 2006. 1 ~ 12
