

2007. 제132회 임시회

2007. 11. 2 ~ 11. 12



2007년도

주요사업 추진실적



2007. 11.

건설교통국

순서


- 일반현황 1
- 사업추진 개요 4
- 2007 사업추진 실적 7

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	가로경관과	도 로 과	치수방재과	교통행정과	주차문화과
정 원	229	47	40	44	51	47
현 원	208	46	37	40	48	37
과부족	△21	△1	△3	△4	△3	△10

2 조 직

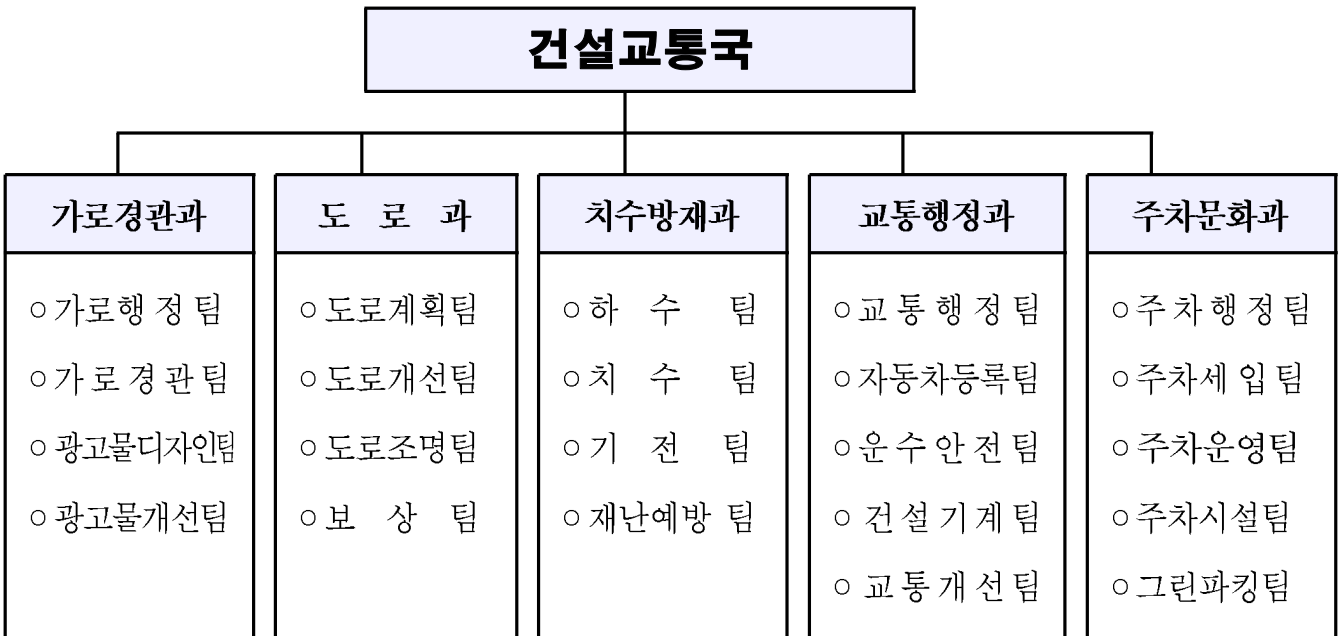

3**주요시설 및 장비 등****□ 가로시설물 현황 ----- (가로경관과)**

- 가로판매대 85, 교통카드판매대 39, 구두수선대 111,
노점상 단속초소 2, 하천감시초소 1

□ 현수막 지정 게시대 : 38개소 178면(공공용 5, 상업용 33)**□ 도로시설물 현황 ----- (도 로 과)**

- 도 로 : 387km [(도로율 23.16% 서울시 21.68%),포장율 100%]
- 간선도로 : 75.66km(경인로 외 27개소)
- 시 설 물 : 50개소 (교량12 고가차도6 보도육교11 지하차도10 지하보도3 입체교차로8)
- 가 로 등 : 7,436등
- 보 안 등 : 8,980등

□ 하수도시설 현황 ----- (치수방재과)

- 하수관거 452,519m 맨홀 8,775개소 빗물받이 21,206개소

□ 빗물펌프장 : 8개소 펌프 49대(영등포 양평1·2 문래 도림2 신길 대림2·3)**□ 간이펌프장 : 6개소 펌프14대****□ 하 천 현황 : 4개소 16.94km (한강,안양천,도림천,대방천)****□ 주차장 현황 : 7,979개소 164,599면----- (주차문화과)**

예산 현액

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (①+②)	①예 산 액		②이월액		비 고
		당초예산	추경 등	명 시	사 고	
계	78,032,412	64,323,195	5,434,064	870,000	7,405,153	
가로경관과	1,713,709	823,590	320,119	570,000	-	
도 로 과	19,103,267	13,569,805	2,238,911	300,000	2,994,551	
치수방재과	9,029,433	6,826,433	2,203,000	0	0	
교통행정과	2,467,579	1,270,237	1,197,342	0	0	
주차문화과 (특별회계)	45,718,424	41,833,130	△525,308		4,410,602	


집행 예상액


(단위 : 천원)


구 분	①예산현액	②집 행 액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집 행 액	집행예정액		
계	78,032,412	36,243,656	19,447,316	8,873,000	13,468,440
가로경관과	1,713,709	697,246	190,733	800,000	25,730
도 로 과	19,103,267	9,428,666	8,918,194		756,407
치수방재과	9,029,433	7,672,738	628,540		728,155
교통행정과	2,467,579	1,662,507	709,849		95,223
주차문화과 (특별회계)	45,718,424	16,782,499	9,000,000	8,073,000	11,862,925

II. 사업추진 개요

미션 깨끗하고 아름다운 청결도시 재난·재해 없는 행복도시
편리하고 쾌적한 교통도시 구축으로 살기 좋은 영등포 건설

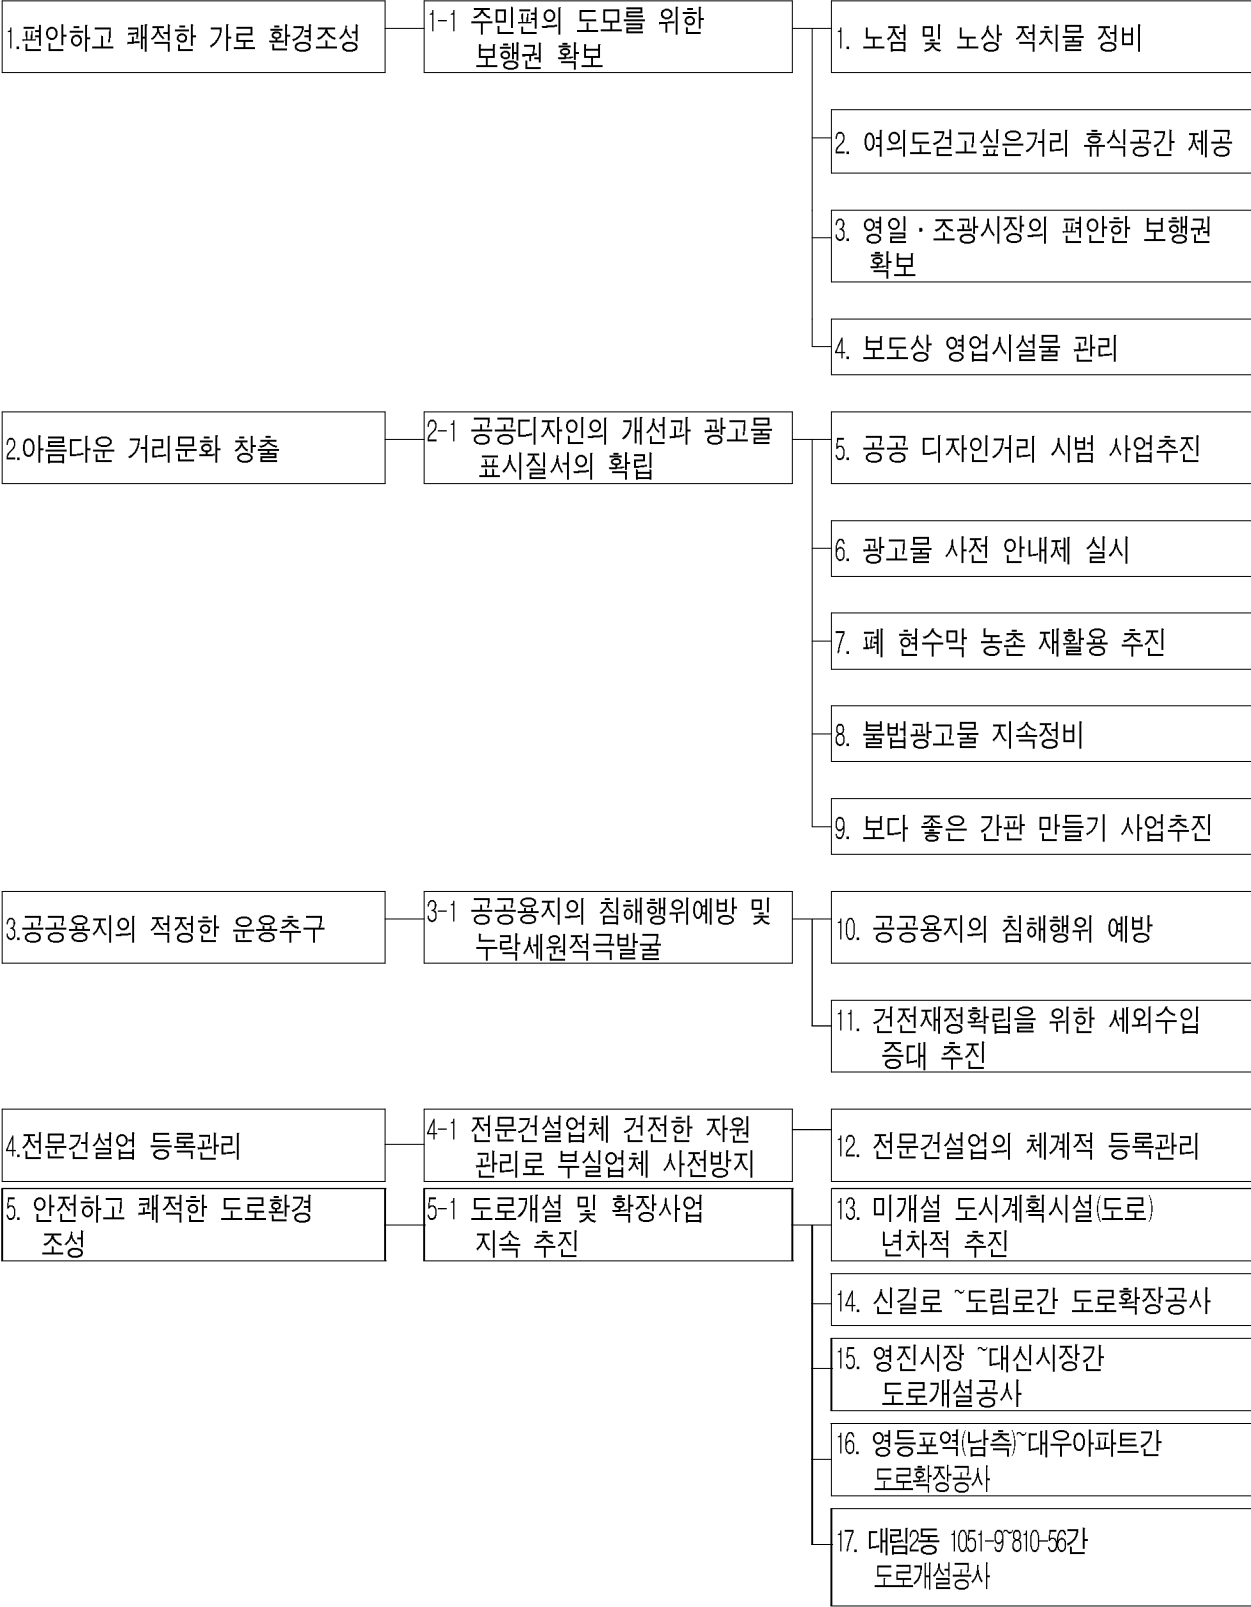

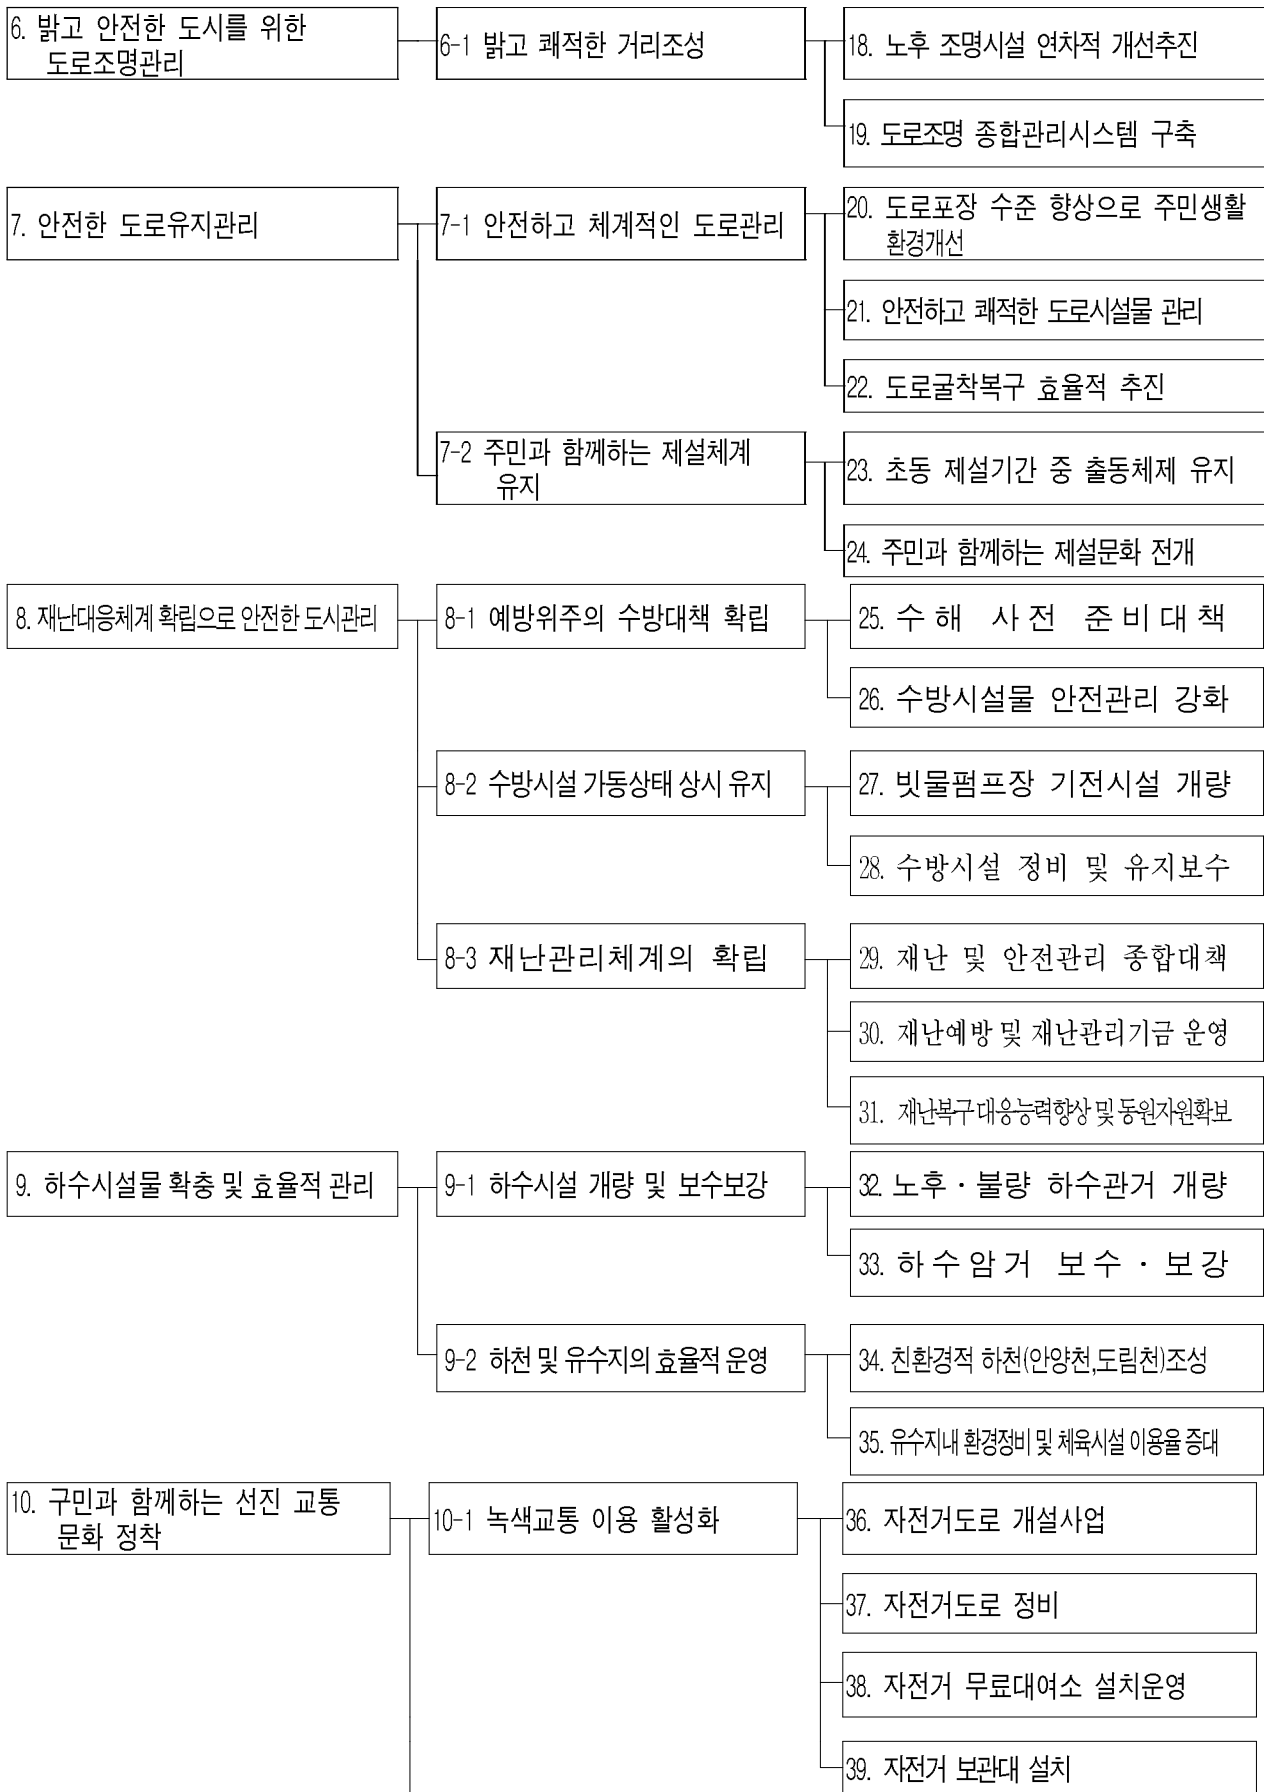

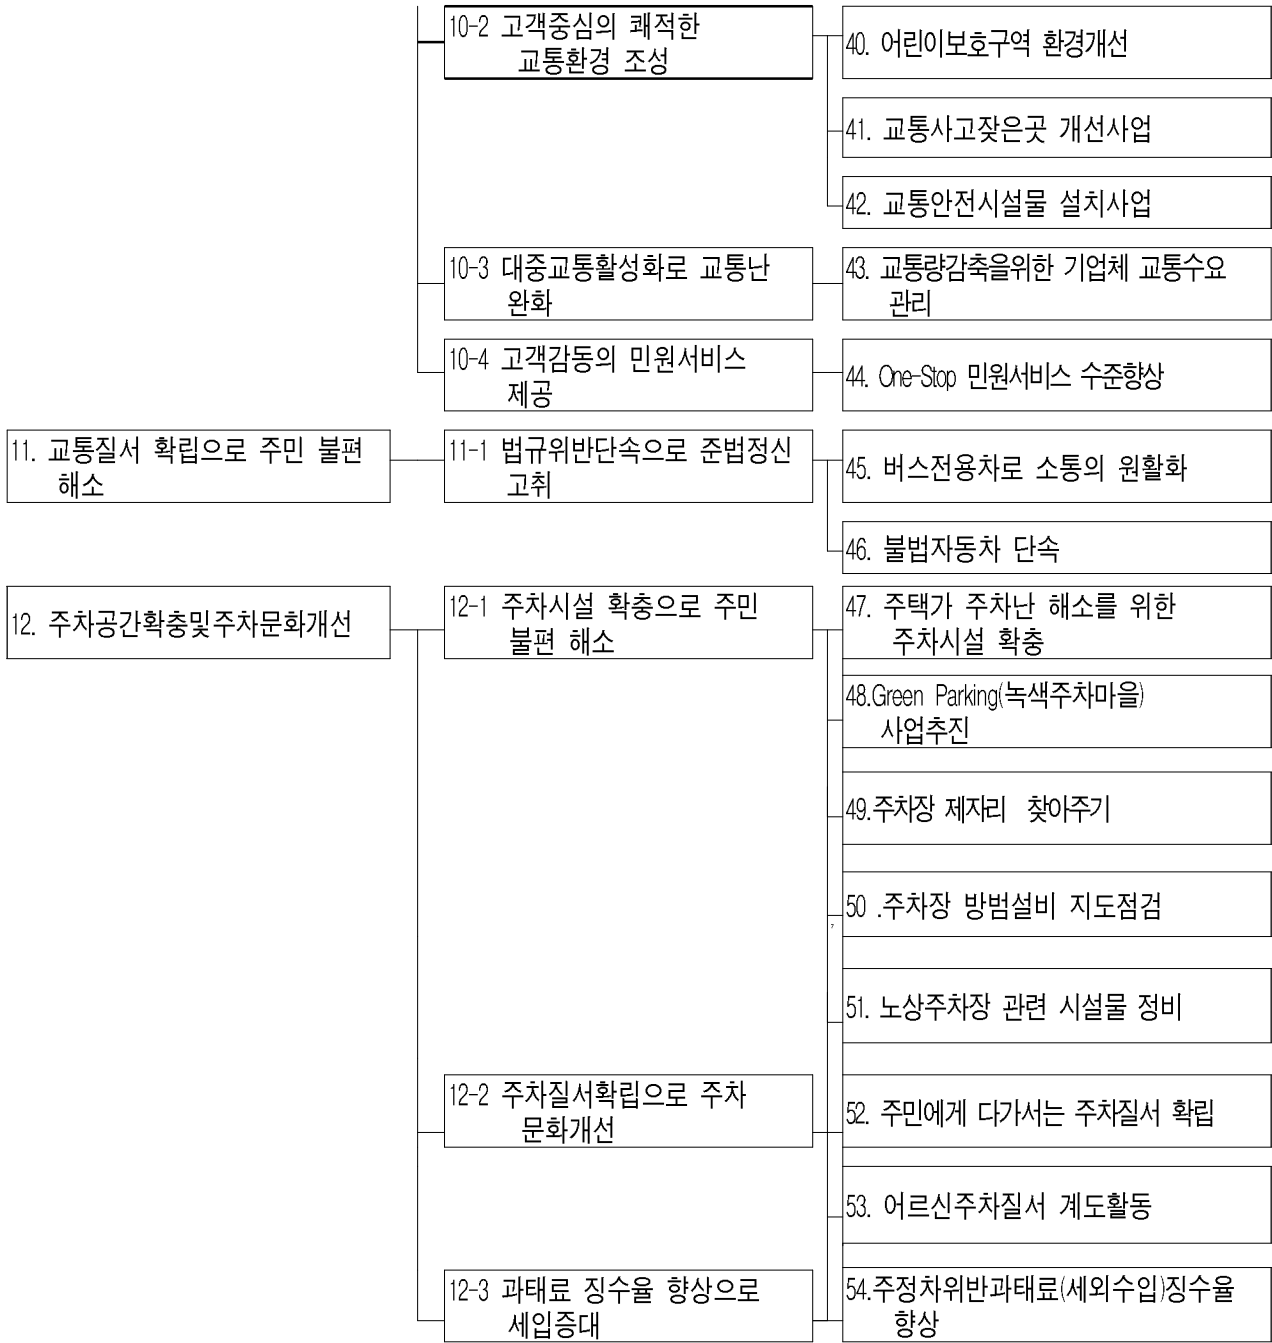

주요사업 추진 총괄

(단위 : 건)

구분	대상사업			추진 실적					
	당초사업	2006년 이월사업	2007년 추가사업	계	완료 사업	추진중 사업	2008년 이월사업	취소 및 불가사업	기타
105	83	7	15	105	36	67	2		

Ⅲ. 2007 사업추진 실적

추진 현황

구분	계	완료사업	추진중인 사업	2008년 이월대상	취소(불가) 사업
계	104	36	66	2	-
가로경관과	7	-	6	1	-
도 로 과	34	10	24		
치수방재과	39	22	17	-	-
교통행정과	11	2	9	-	-
주차문화과	13	2	10	1	

완료사업 : 36건

연번	과 별	사 업 명	예산액	집행액	비 고
1	도 로 과	06/07제설작업용역	82,472	65,230	구비
2		장애인편의시설공사	150,000	127,500	구비
3		대림3동 681~679-9칸 도로정비공사	140,000	128,709	구비
4		대림3동 754-7~754-26칸 도로정비공사	120,000	100,000	구비
5		신길동 120-46~1212칸 보도정비공사	120,000	113,708	구비
6		신길동 970~123-7칸 보도정비공사	180,000	170,562	구비

연번	과 별	사 업 명	예산액	집행액	비고
7	도 로 과	양평1동 38-1 오목교진입 도로변 방음벽개량공사	350,000	324,772	시비
8		신길문래길가로등개량	534,000	482,977	시비
9		가마산길가로등개량	390,000	335,651	시비
10		대신시장주변가로등설치	80,000	66,942	구비
11	치수방재과	영등포동4가 414~818간 외 1개소 하수관 개량공사	495,000	357,947	시비 165 구비 330
12		양평동5가 117주변 하수 관 개량공사	510,000	467,000	시비 170 구비 340
13		영등포동 618주변 하수관 개량공사	300,000	266,000	시비
14		영등포·문래동 하수암거 보수보강공사	900,000	780,000	시비
15		신길·대림동 하수암거 보수보강공사	900,000	785,000	시비
16		여의도지역 하수관거 준설 공사	300,000	258,665	구비
17		여의도동 11주변 하수관 개량공사	400,000	345,255	시비
18		하천시설물 보수공사	200,000	183,011	구비
19		빗물펌프장 준설 및 개선공 사	500,000	421,630	시기금
20		유수지내 체육시설 정비공 사	300,000	263,673	구비
21		노후밸브 개량	1,160,000	1,100,000	시기금
22		운영감시제어설비 개량	850,000	780,000	시기금

연번	과 별	사 업 명	예 산 액	집 행 액	비고
23	치수방재과	수문개량	340,000	309,000	시기금
24		영상감시장치 개량	450,000	276,000	시비
25		모터펌프 보수공사	60,000	52,000	구비
26		빗물펌프장 및 수문 도장 공사	50,000	44,000	구비
27		펌프장 사무실 및 관사 보수 공사	40,000	34,000	구비
28		수문 정밀안전진단 용역	50,000	44,000	구비
29		수문 정밀점검 용역	40,000	35,000	구비
30		모터펌프 안전진단 용역	28,000	25,000	구비
31		재난안전관리 종합계획	18,621	15,420	구비
32		국가재난대응 종합훈련	1,000	1,000	구비
33	교통행정과	자전거 도로정비	11,000	10,750	시비
34		어린이 보호구역 개선사업	999,650	955,873	시비
35	주차문화과	주차실태전수조사	100,117	85,506	구비
36		영등포여고지하 공영주차장건설	3,500,000	3,500,000	시·구비

추진중인 주요사업

연번	과 별	사 업 명	예산액	집행액	비 고
1	가로경관과	노점 시범가로 조성	-	-	
2		영일시장 기업형 노점정비 및 쾌적한 가로환경 조성	223,745	223,745	
3	도 로 과	5호선 신길역 동선개선 사업 타당성조사 및 기본계획 용역	40,000	-	
4		신도림역~영등포역간 도로확장공사(3차)	400,545	239,896	
5		신길로~도림로간 도로확장공사	12,563,750	6,001,712	
6	치수방재과	여의도동13~23간 하수관 개량공사	1,700,000	416,000	
7		양평동 하수암거 보수보강공사	1,500,000	1,096,000	
8		신길 빗물펌프장 증설공사	5,807,000	1,836,144	
9	교통행정과	자전거도로개설	150,800	135,800	
10		교통사고잦은곳 개선사업	174,433	발 주 중	
11	주차문화과	당산근린공원 지하 주차장 건설공사	9,250	5,390	
12		GreenParking 사업추진 활성화	3,198	2,116	

추진중인 주요사업 내역

1. 노점 시범가로 조성

단속과 재발생의 악순환으로 인하여 단순 정비로는 효과를 거둘 수 없는 노점 밀집 지역의 장기간 고착화된 노점상을 『시간제·규격화』를 통해 주민 보행권 확보와 도시미관을 개선코자 함.

추진개요

- 조성구간 : 영등포역 주변
 - 삼보부페 건너편 ~ 영등포역 앞
 - 신세계백화점 건너편 버스정류장 ~ 영등포시장 사거리
- 유형별 노점현황 : 62개(손수레52, 좌판9, 기타1)
- 추진사항
 - 규 모 : 규격화 (2.0m×1.5m)
 - 운 영 : 시간제 (교통혼잡 시간 운영금지)

추진경위

- 정확한 실태조사 실시
- 노점 재배치, 실명제, 지정시간제 운영·규격화 등 협의
- 협의기구 설치운영 : 노점 개선자율 위원회
- 노점 및 가로 디자인안 선정 및 노점 재배치 시행

추진실적

- 노점개선 자율위원회 구성 : '07.4월
 - 위촉직 9명, 당연직 3명(위원장-부구청장 ,건설교통국장)
- 노점개선 자율위원회 위촉장 수여 : '07.5.25
 - 노점 시범가로 운영에 대한 전반적인 사항 토의
- 노점 실태조사 완료 : '07.5월
- 노점 연합회 임원 간담회 개최 : 5회

향후 추진사항

- 노점 및 가로 디자인안 상정 및 선정 : '07.11월
- 시범가로 노점 설치 : '07.12월

2. 영일시장 기업형 노점정비 및 쾌적한 가로환경 조성

- 불법으로 점유된 영일시장 주변의 보·차도 기능 회복
- 통행주민과 차량의 소통 원활화로 주민의 오랜 민원해소
- 방림부지 도시계획 사업의 기한내 준공

사업개요

- 위 치 : 문래동 3가 10, 14, 15-1,26,54-7,8
- 실 태 : 보도상 차광막 설치와 상품 등 적치로 보도 기능 상실
- 점 포 수
 - 1차 정비 지역 : 146개 점포 (문래동 3가 54-7,8)
 - 2차 정비 지역 : 120개 점포 (문래동 3가 10, 14, 15-1)
 - 3차 정비 지역 : 35개 점포 (문래동 3가 26)
- 규 모 : 점포당 4~20m²
- 형 태 : 목조(천막), 판넬, 뒤쪽 블록담
- 취급품목 : 야채, 청과 등

추진경위

- 불법으로 점유된 영일시장 주변 보·차도 기능 회복
- 통행 주민과 차량의 소통 원활화로 주민의 오랜 민원 해소
- 상가앞 상품 적치물을 정비하여 아름다운 신 시가지 조성

추진실적

- 1차 정비 : 행정대집행 완료('07.3.14)
 - 불법점유 가설점포 146개 점포 철거완료
 - 보·차도 정비 : 신시가지 조성
- 2차 정비 : 자진정비 완료('07.6.16)
 - 보도 점유 불법확장 점포 정비 : 109개 점포
 - 도로 무단점유 기업형 노점 철거 : 11개 점포
- 명품거리 조성 자율정비 협약 체결 : 구청 ⇔ 영일실업(주) ('07.9.20)

향후 계획

- 간판 및 차광막 정비 : 색채 및 규격 통일
- 노후 건물의 도색 및 보수 실시 : 상인회 시행
- 기동 단속반 및 용역을 고정 배치하여 지속 계도단속

3. 지하철 5호선(신길역) 동선개선사업 기본계획 및 타당성용역

지하철 1호선 및 국철(경부선)에 의해 단절된 신길동 이남지역 주민의 지하철 이용 동선이 매우 불편하여 신길2동에서 국철을 횡단하는 지하보도를 설치하여 지하철 5호선(신길역)으로 바로 탑승토록 하여 우회통행 불편을 해소하고자 함

사업개요

- 위 치 : 신길2동 ~신길역 (지하철 5호선)
- 규 모 : 연장 104.7m(특수구간 32m, 개착구간 72.7m,
지하보도 ■6.6×5.5m)
- 용역비 : 40백만원
- 도급자 : (주)삼보기술단 대표 오세준

추진경위

- 계약일 : '07. 10. 4
- 착공일 : '07. 10. 8

예산액 및 집행액

- 예산액 : 40,000천원
- 집행액 : 없음

향후 추진계획

- 타당성조사용역 과업수행에 따른 기술자문 실시

4. 신도림역~영등포역간 도로확장공사 3차 (시비사업)

경인로 교통량 증대에 따른 지역간 연결도로 확보 및 교통량을 분산하여 교통소통 원활 및 지역발전에 기여코자 함.

사업개요

- 위 치 : 도림동 265-6~162-70간
- 규 모 : B=12→20m, L=575m
- 공사기간 : '01 ~ '07년
- 총사업비 : 17,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자 ('05년 이전)	'06년	비 고
계	17,900	17,300	600	
공 사 비	2,600	2,000	600	
보 상 비	15,200	15,200		
실시설계비	100	100		

추진경위

- '00. 10. 12 : 도시계획시설(도로)결정(서고시 제283호)
- '04. 8. 20 : 1차공사 완료(L=135m)
- '07. 4. 20 : 2차공사 완료(L=300m)
- '06. 5. 17 : 3차공사 시행(L=140m)

추진실적

- 건물철거 7개동
- 아스팔트포장 23a 점토브릭포장 2.7a 흙관부설 100m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 400,545천원 (사고이월)
- 집행액 : 239,896천원

향후 추진계획 등

- 서울지방경찰청 교통규제 심의 완료 후, 차선도색 및 공사 준공예정

5. 신길로~도림로간 도로확장공사 (시비사업)

신길로~도림로간 단절된 도로연계구축 및 하수암거 확대·개량으로 상습 침수지역 해소 및 개발 활성화 기여

사업개요

- 위 치 : 신길동 254-1(신길로)~347-40(도림로)
- 규 모 : 도로확장 B=15m → 30m , L=780m
- 기개설 : 420m, 미개설 : 360m
- 기 간 : '97년 ~ '09년
- 총사업비 : 52,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	'06년	'07년	'08년	비 고
계	52,800	32,630	8,000	6,000	6,170	
공 사 비	7,020	3,650	1,000		2,370	
보 상 비	45,700	28,900	7,000	6,000	3,800	
설 계 비	80	80				

추진경위

- '78. 12. 17 : 도시계획시설(도로)결정(건고시 제393호)
- '02. 4. 28 : 1단계 공사완료(L=420m)
- '04. 4. 21 : 5차 실시계획인가(서고시 제2005-100호)
- '06. 11. 6 : 공사착공

추진실적

- 보상 : 토지보상 3건, 건물(무허가) 87동, 영업권보상 142건
- 공사 : 건물철거 34동, 흙관부설 : L = 374m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 12,563,748천원('07예산 6,000,000천원+사고6,563,748천원)
- 집행액 : 6,001,712천원(보상비 5,593,641천원, 공사 408,070)
- 집행잔액 : 6,562,036천원(보상비 6,023,191천원, 공사 538,845)

향후 추진계획

- '07년 12월까지 토지 3필지(785㎡, 5,397,018천원) 보상완료
- 보도조성 완료 후 공사준공

6. 여의도동 13~23간 하수관 개량공사

공동구를 관통하여 횡단하는 하수관의 이설 및 노후관로를 개량하여 여의동 일대 하수소통의 원활을 기하고 재해예방과 주민생활의 편의 제공

사업개요

- 위 치 : 여의도동13-31호 ~ 23번지간
- 규 모 : 총연장 496m
 흡관부설 D900~D1100mm, L = 946m
 강관추진 4D800~D1650mm, L = 314m
 PC 암거 ■2.0×1.5m, L = 106m

추진경위

- '07. 08. 09 : 공사발주
- '07. 08. 28 : 착공

추진실적

- 유관부서 협의 및 현장사무실 설치 완료
- 추진기지 설치중 : 3개소
- ※ 현공정 : 8%

예산액 및 집행액

- 예 산 액 : 1,700,000천원 (시비)
- 집 행 액 : 416,000천원

향후 추진계획

- '08. 02. 28 : 준공

7. 양평동 하수암거 보수보강공사

하수암거(BOX)에 대한 안전점검 및 진단결과 결손부분에 대한 보수·보강을 적기에 실시하여, 하수관거의 기능유지 및 안전사고 예방과 주민생활의 편의 제공

사업개요

- 위 치 : 양평동 및 문래동 일대
- 규 모 : 하수암거 보수·보강 □1.2×1.2 ~ □5.0×2.0m
 - 단면보수 L = 1,500m A = 2,360m²
 - 전면보강 L = 90m A = 1,240m²

추진경위

- '07. 02. 06 : 공사발주
- '07. 03. 27 : 착공

추진실적

- 암거 보수보강에 대한 주 공종 완료
- ※ 현공정 : 98%

예산액 및 집행액

- 예 산 액 : 1,500,000천원 (시비)
- 집 행 액 : 1,096,000천원

연차별 투자계획

구 분	연차별 투자계획(천원)				비 고
	계	2006년	2007년	2008년	
공 사 비	4,300,000	1,100,000	1,500,000	1,700,000	전액 시비
규 모	L = 6,190m A = 12,270m ²	L = 2,400m A = 4,360m ²	L = 1,590m A = 3,600m ²	L = 2,200m A = 4,310m ²	

향후 추진계획

- '07. 12. 26 : 준공

8. 신길빛물펌프장 증설공사

집중호우에 대비 신길1·2동 저지대지역의 침수해소를 위한 펌프장 용량을 증대하여 재해예방에 만전을 기하고자 함

사업개요

- 펌프장 증설
 - 펌프용량 증대 : 620HP × 2대

추진경위

- '04. 10. : 신길빛물펌프장 증설 추진검토
- '05.10.11 : 서울시 투·융자 심사 실시
- '06.3~10 : 신길빛물펌프장 증설공사 기본 및 실시설계용역 시행

추진실적

- '06.11.20 : 공사발주
- '06.12.11 : 공사착공
- '07.10. : 증설펌프동, 전기 및 관리실동 구조물 설치
- ※ 현공정 : 67%

예산액 및 집행액

- 예산액 : 5,807,000천원(시비)
- 집행액 : 1,836,144천원

향후 추진계획

- '07.11.30 : 1차공사(토목) 준공예정
- '08. 3. : 공사 준공예정

9. 어린이보호구역 개선사업

초등학교 및 유치원을 중심으로 주변지역에 국비,시비를 활용하여 통학로 개선사업을 추진함으로써 어린이교통안전사고 감소에 만전을 기하고자 함

사업개요

- 어린이보호구역 개선공사 : 총 6개교
 - 대상학교 : 문래, 신영, 대영, 대길, 대동, 도림, 영원초등학교
- 어린이보호구역 개선사업 기본 및 실시설계 용역 : 총 6개교
 - 대상학교 : 영림, 윤중, 여의도, 우신, 선유초등학교, 성모유치원

추진경위

- 국비, 시비를 활용하여 어린이보호구역 개선공사, 기본 및 실시설계 용역 사업 추진
- 2006년도 설계된 문래초교 외 6개교 어린이보호구역 개선공사를 금년도에 공사추진
- 주민설명회를 통한 의견수렴 및 관련기관 협의를 거쳐 영림초교 외 5개교 어린이보호구역 개선사업 기본 및 실시설계 용역 추진

추진실적

- '07년 7월 : 문래초교 외 6개교 어린이보호구역 개선공사 완료
- '07년 6월 : 영림초교 외 5개교 어린이보호구역 개선사업 기본 및 실시설계 용역 완료

예산액 및 집행액

- 예산액 : 999,650천원
- 집행액 : 955,873천원

10. 자전거도로 개설사업

자전거 이용 활성화를 위해 지원된 시비를 활용하여 Road-Diet(차로 축소 및 보도확폭)를 통한 자전거 도로를 개설하여 자전거 이용자의 편의를 도모함 함

사업개요

- 대상구간 : 별말길(양평4가 16번지 롯데제과~101-10번지 양평사거리)
 - 도로현황 : 차로폭 18.5m 연장 320m
- 자전거도로 개설형태 : 편측 Road-Diet를 통한 보도확폭 1.5m

추진경위

- '07. 5월 : 서울지방경찰청 협의추진
- '07. 7월 : 서울지방경찰청 교통규제 협의 완료
- '07. 9월 : 공사발주

추진실적

- 기존보도 정비 : 5.66@
- 보도확장 후 투수콘 포장 : 2.8@
- 가로변 가드웬스 설치 : 139m

예산액 및 집행액

- 예산액 : 150,800천원
- 집행액 : 135,800천원

향후추진계획 등 : 07.11월 완료예정

- 자전거 도로개설 관련 교통안전 시설물(표지판 및 노면표시)설치 예정
- 집행예정액 : 15,000천원

11. 교통사고 잦은곳 개선사업

불합리한 도로 및 교차로 구조와 안전시설 등의 부적절한 위치에 따라 교통사고가 빈번하고 있는 교통사고 잦은곳에 대한 사고의 유형을 분석하여 도로의 안전시설의 적절한 배치 등을 통해 사고 위험성을 저감시키고, 시민의 안전과 재산을 보호코자 함

사업개요

- 사업주관 : 서울시 교통운영과
- 대상지점 : 3개소
 - 여의도 서울(아)앞 교차로, 여의도 성모병원앞 교차로, 대방역 북단

추진경위

- 서울특별시 실시설계 용역시행 완료: '06.11.29
- 교통사고 잦은곳 개선지점 확정 및 예산배정 통보: '07.07.19

추진실적

- '07.8월 : 대상지점 현장조사 실시
- 서울아파트 입구 교차로 개선사업 관련 민원처리
 - '07.08.21 : 최병호외 54명 횡단보도 이전 반대 진정서 제출
 - '07.08.24 : 교통사고 잦은곳 개선공사 민원사항 알림(구→서울시)
 - '07.10.15 : 민원사항 조치계획 통보(서울시→구)

예산액 및 집행액

- 예산액 : 174,433,000원
- 집행액 : 발주 준비중

향후 추진계획 등 : 07.12월 완료예정

12. 당산근린공원 지하주차장 건설공사

주택가 공동주차장 건설사업을 적극적으로 추진하여 주택가의 심각한 주차난을 해소시키고 주차문제로 인한 주민불편이나 화재 등 재난 발생시 인적·재산적 피해를 최소화하고자 함.

사업개요

- 사업규모
 - 부지면적 : 11,124.70m²
 - 연 면 적 : 6,241.76m²
 - 주차규모 : 지하2층, 철근콘크리트조
 - 주차면수 : 자주식 190면(지하1층 92면, 지하2층 98면)
- 사업기간 : 2006.10.11 ~ 2007.11.30(예정)

추진실적(공정율 90%)

- 2006.09.11 : 전면책임감리용역 계약(청석엔지니어링외 1개사)
- 2006.10.11 : 공사 계약(보훈종합건설)
- 2007.03.26 : 전기 · 통신공사 착공
- 2007.06.15 : 지하2층 콘크리트 타설완료
- 2007.09.15 : 지하1층 철근콘크리트 타설 완료
- 2007.10.13 : 구조물 되메우기 실시 및 램프공사 시공 중

예산액 및 집행액

- 예산액 : 9,250백만원
- 집행액 : 5,390백만원

향후 추진계획 등

- 2007.11월중 : 외부램프공사 및 부대시설공사, 전기 및 통신공사
- 2007.11.30 : 준공
- 2007.12월중 : 시운전 및 운영관리(영등포구도시시설관리공단)

13. Green Parking 사업추진 활성화

주택가 담장과 대문을 허물어 여유 공간에 부족한 주차장과 녹지를 조성하고 안전하고 쾌적하게 보행할 수 있는 생활도로를 조성함으로써 주차질서 확립과 자연 친화적인 주거환경 조성

사업개요

- 담장허물기 : 주택내 여유공간에 주차장과 녹지를 조성하여 녹색주차마을 조성
- 생활도로 : 담장허물기 밀집골목내 보행자 안전과 쾌적한 골목길 조성
- CCTV 설치 : 담장 허물기 밀집골목내 불법주차 방지, 방법보완

추진방향

- 담장을 허물어 주차장 및 조경시설 설치 지원 강화
 - 설계·시공 전 과정에 주민들의 의견 수렴 반영
 - 1가구 1면당 600만원, 1면 추가시 100만원→ 최고 1,550만원까지 지원
- 노약자·어린이·장애우 등이 안전 보행을 위한 쾌적한 생활도로 조성

추진실적 및 예산액

구분	담장허물기	생활도로	CCTV	예산(백만원)	비고
계	1,037동 1,828면	4,748m	56대	12,803 (시비5,615, 구비7,188)	
2004년	209동 413면	673m	13대	2,855 (시비1,955, 구비900)	
2005년	234동 434면	1,170m	16대	3,515 (시비1,150, 구비 2,365)	
2006년	291동 379면	1,440m	12대	3,318 (시비 953, 구비2,365)	
2007년	333동 602면	1,465m	15대	3,115 (시비1,557, 구비 1,558)	

향후계획

- 서울시 인센티브 평가 대비 마무리 및 내년도 사업 계획수립

14. 견인차량보관소 이전 및 운영

현재 우리구가 위탁 사용하고 있는 여의도 견인차량보관소가 향후 폐쇄 예정 및 이전요구 민원 등의 여건변화로 인하여 보관소 이전의 필요성이 대두됨에 따라, 자체 견인차량보관소를 확보하여 이전 운영함으로써 안정적인 견인업무 추진에 만전을 기하고자 함.

대상지 현황

- 위 치 : 영등포동1가 35번지의외 13 (5호선 신길역환승주차장 내)
- 면 적 : 5,032㎡ (소유자 : 구·시·국유지)
- 부지여건 :
 - 환승역 주차장 면적 확장(3,557 → 5,032㎡)으로 보관소 활용가능
 - 주변이 주택가가 아닌 업무시설 밀집지역으로 민원발생 소지가 적음
 - 노량진로, 경인로, 노들길 등 주요도로와 1·5호선 지하철역이 위치하고 있어 내·외부 접근성이 양호한 지역임

운영계획

- 활용계획 : 주차장을 재정비하여 주차장과 견인보관소로 활용
 - 환승주차장 : 2,691㎡(96면), 견인보관소 : 2,341㎡(84면)
- 운영방법 : 우리구 도시시설관리공단에 위탁하여 운영

추진일정

- 토목공사 및 주차구획선 정비 : 10. 1 ~ 10. 20
- 사무실 설치 및 인력충원(공단) 등 : 10. 1 ~ 10. 25
- 시범운영 및 미비점 보완 : 10.22 ~ 10. 31
- 운영업무 개시 : 2007. 11. 1부터

기대효과

- 자체 보관소 확보로 장기 집단 민원해소 및 이용자 서비스 증대
- 보관소 위탁관리비 분담금 증가 해소로 예산절감 (년 450백만원)

2008년 이월대상 사업 내역

1. 공공 디자인거리 시범사업

쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성을 위하여 우리 지역 특성에 맞는 시범가로를 선정하여 공공시설물의 개선을 통한 도시경관 향상과 주민들의 편익을 도모하고 삶의 질 향상에 기여 하고자 함.

사업개요

- 당초사업기간 : '06. 7. ~ '07. 4.
- 변경사업기간 : '06. 7. ~ '08. 6.
- 사업내용
 - 대상지역의 공공시설물의 디자인 작품 설치
 - 전선지중화 등 불필요한 가로시설물 통합 및 제거로 보행환경 개선
- 대상지역 : 구청 앞 당산로 일부(현대해상 ~ 친수공간)
 - 규 모 : 연장 400m, 폭 30m(도로 양측)

추진실적

- 추진위원회 구성 및 사업 기본계획(마스터플랜) 수립
- 마스터플랜 서울시 도시디자인 심의 승인
- 기본 계획에 따른 실시 설계

예산액 및 집행액

- 예 산 액 : 1,600백만원 (국 800, 시 200, 구 600)
- 집 행 액 : 800백만원 (국비)

이월사유 및 대책

- 이 월 사 유 : 사업 소요예산 대비 확보 예산의 부족
 - 확보 예산 : 1,600백만원 - 소요예산 : 2,940백만원
 - 추진 상황 : 기본계획에 의한 사업비 부족예산(1,340백만원)에 대하여 서울시에 '07년 추경예산 반영 요청하여 부족 예산의 25%인 335백만원 확보
 - 문 제 점 : 추가예산에 대한 문광부의 예산확보 미흡 (국비 670백만원)
- 대 책 : 문화관광부 및 서울시와 협의하여 사업범위 및 예산 확정후 추진
 - 가공선로 지중화 사업 우선 추진 : 한전과 협의 중
 - 기본계획 중 예산 및 관리 등 효율성을 제고하여 보차도 통합 제외

2. 대림운동장 지하공영주차장 건설공사

대림운동장에 지하공영주차장을 건설하여 주택가의 주차난 해소와 토지 이용의 효율성을 높이고 소방도로의 기능 회복 및 이면도로의 통행권을 확보시켜 지역 주민들에게 생활 편의를 제공하고자 함.

사업개요

- 사업위치 : 영등포구 대림3동 780번지 대림운동장
- 사업규모
 - 부지면적 : 16,498m²
 - 연 면 적 : 6,640m²
 - 주차규모 : 지하2층, 철근콘크리트조
 - 주차면수 : 자주식 190면(지하1층 95면, 지하2층 95면)
- 사업기간 : 2007.12~ 2008.11
- 소요예산 : 9,073백만원(구비, 시비 각 50%)

추진실적

- 2007.02.09 : 대림운동장 지하공영주차장 건설계획(안)
- 2007.05.25 : 서울시 투자심사 결과 조건부 가결
- 2007.08.10 : 실시설계용역 계약 및 착수
- 2007.10.04 : 도시계획시설(주차장) 결정(서울시)

예산액 및 집행액

- 예산액 : 9,073백만원(구비 4,537백만원, 시비 4,536백만원)
- 집행액 : 1,000백만원

이월사유 및 대책

- 2007년 12월 공사 발주함에 따라 절대공기 부족
- 2008 서울시 예산 지원 요청(시비 4,536백만원)
