



2007. 제1차 구의회 정례회

2007. 7. 2. ~ 7. 12





2007년도

주요업무추진현황

2007. 7.

건설교통국

순 서


 일반 현황	1
 업무추진 목표와 방향	3
 주요업무계획 및 추진실적	4
 특수사업	30

I. 일 반 현 황

1 인 력

구 분	계	건설관리과	토 목 과	치수방재과	교통행정과	교통지도과
정 원	238	47	40	44	52	55
현 원	250	54	37	44	50	65
증 감	+12	+7	△3		△2	+10

2 조 직 — 1국 5과 23팀



3**주요시설 및 장비현황**

- 가로시설물 현황 -----**(건설관리과)**
 - 가로판매대 85, 교통카드판매대 39, 구두수선대 111,
노점상 단속초소 2, 하천감시초소 1
- 현수막 지정 게시대 : 39개소 178면(공공용 6, 상업용 33)
- 도로시설물 현황 -----**(토 목 과)**
 - 도 로 : 387km [(도로율 23.16% 서울시 21.68%),포장율 100%]
 - 간선도로 : 75.66km(경인로 외 27개소)
 - 시 설 물 : 48개소 (교량12 고가차도6 보도육교11 지하차도8 지하보도3 입체교차로8)
 - 가 로 등 : 7,100등
 - 보 안 등 : 9,158등
- 하수도시설 현황 -----**(치수방재과)**
 - 하수관거 452,519m 맨홀 8,775개소 빗물받이 21,206개소
- 빗물펌프장 : 8개소 펌프 49대(영등포 양평1·2 문래 도림2 신길 대림2·3)
- 간이펌프장 : 6개소 펌프14대
- 하 천 현황 : 4개소 16.94km (한강,안양천,도림천,대방천)
- 지하수 관정 : 362개소(생활용수 323 농업용수 13 공업용수 23 음용수 3)
- 주차장 현황 : 7,918개소 160,850면-----**(교통지도과)**

Ⅱ. 업무추진 목표와 방향

목 표

편리하고 쾌적한
도시공간 구축

방 향

깨끗하고 아름다운 가로환경 조성

고객 행복을 위한 쾌적한 도로환경 조성

자연 재해 걱정없는 영등포 건설

쾌적한 교통환경 조성으로 삶의 질 향상

주차 공간 확충 및 주차 문화 개선

Ⅲ. 주요 업무계획 및 추진실적

편안하고 쾌적한 가로환경 조성

1 노점 시범가로 조성

단속과 재발생의 악순환으로 인하여 단순 정비로는 효과를 거둘 수 없는 노점 밀집 지역의 장기간 고착화된 노점상을 『시간제·규격화』를 통해 주민 보행권 확보와 도시미관을 개선코자 함.

□ 추진개요

- 추진기간 : '07. 4. ~ '07. 10
- 조성구간 : 영등포역 주변
 - 삼보부페 건너편 ~ 영등포역 앞
 - 신세계백화점 건너편 버스정류장 ~ 영등포시장 사거리
- 유형별 노점현황 : 62개(손수레52, 좌판9, 기타1)
- 추진사항
 - 규 모 : 규격화 (2.0m×1.5m)
 - 운 영 : 시간제 (교통혼잡 시간 운영금지)

□ 추진방법

- 정확한 실태조사 실시
- 노점 재배치, 실명제, 지정시간제 운영·규격화 등 협의
- 협의기구 설치운영 : 노점 개선자율 위원회
- 노점 및 가로 디자인안 선정 및 노점 재배치 시행

□ 추진실적

- 노점개선 자율위원회 구성 : '07.4월
 - 위촉직 9명, 당연직 3명(부구청장 위원장, 건설교통국장)
- 노점개선 자율위원회 위촉장 수여 및 간담회 개최 : '07.5.25
- 노점 실태조사 완료 : '07.6월

□ 향후 추진사항

- 노점 및 가로 디자인안 확정 : '07.7월

2

영일시장 기업형 노점 정비시행 및 쾌적한 가로환경 조성

- 불법으로 점유된 영일시장 주변의 보·차도 기능 회복
- 통행주인과 차량의 소통 원활화로 주민의 오랜 민원해소
- 방림부지 도시계획 사업의 기한내 준공

□ 현 황

- 위 치 : 문래동 3가 10, 14, 15-1,26,54-7,8
- 실 태 : 보도상 차광막 설치와 상품 등 적치로 보도 기능 상실
- 점 포 수 : 301개 점포
 - 1차 정비 지역 : 146개 점포 (문래동 3가 54-7,8)
 - 2차 정비 지역 : 120개 점포 (문래동 3가 10, 14, 15-1)
 - 3차 정비 지역 : 35개 점포 (문래동 3가 26)
- 규 모 : 점포당 4~20㎡ (2~6평)
- 형 태 : 목조(천막), 판넬, 뒤쪽 블록담
- 취급품목 : 야채, 청과 등

□ 정비실적

- 1차 정비 : 행정대집행 완료('07.3.14)
 - 불법점유 가설점포 146개 점포 철거완료
 - 보·차도 정비 : 신시가지 조성
- 2차 정비 : 자진정비 완료('07.6.16)
 - 보도 점유 불법확장 점포 정비 : 109개 점포
 - 도로 무단점유 기업형 노점 철거 : 11개 점포

□ 향후 계획

- 간판 및 차광막 정비 : 색채 및 규격 통일
- 노후 건물의 도색 및 보수 실시 : 상인회 시행
- 3 차 정 비 : 자진정비 유도
 - 위 치 : 문래동 3가 26
 - 규 모 : 35개 점포 (보도완전 점유)
 - 정비기한 : '07.7.30

보도상 영업시설물(가로판매대, 교통카드판매대, 구두수선대)에 대한 철저한 관리와 정비로 도로기능을 회복하여 시민들의 보행권을 확보하고 도시환경을 깨끗하고 쾌적하게 개선하고자함

□ 추진근거 : 서울시 보도상영업시설물 등 에 관한 조례

□ 시설물 현황 : 235개소

○ 가로판매대 85, 교통카드판매대 39, 구두수선대 111

□ 추진사항

○ 보도상 영업 시설물 정비·점검 - 년 2회(반기 1회)

- 전대전매, 허가장소 임의변경, 시설물 구조변경, 음식물 조리행위여부
- 허가면적 이외 장소에 상품 및 기타 물건적차·금지품목 판매행위 등

○ 가로판매대 전기안전점검 실시

○ 가로판매대 환경정비 실시 : 외부 도색

□ 추진실적

○ 가로판매대 전기안전점검 실시

- 점검기간 : '07. 5. 23 ~ 6.11,
- 점검기관 : 한국전기안전공사
- 점검결과 : 접지불량 65개소 적발
- 소요예산 : 3,645천원

○ 위치 부적합 시설물 이전 : 3개소 (가로판매대 2· 구두수선대1)

○ 보도상 영업 시설물 점검 : 235개소

- 허가취소 : 5개소, 고발 : 1개(시설물외 영업행위), 1차시정명령 : 2개소,

□ 향후계획

○ 가로판매대 도색 실시 : 7월 예정 (40개소 '06년 미 실시분)

○ 하반기 보도상 영업 시설물 정비·점검 : 8월 ~9월

○ 접지불량 가로판매대 시정조치 : 7월중

아름다운 거리문화 창출

4

공공디자인 거리 시범 사업추진

문화관광부와 우리구가 공동으로 추진중인 『공공디자인 거리 시범 사업』을 통하여 아름다운 도시환경을 조성하여 공공디자인의 필요성 및 중요성에 대한 국민공감대를 형성코자함.

□ 추진개요

- 사업기간 : '06. 7. ~ '07. 12.
- 주 관 : 문화관광부, 영등포구(공동주관)
- 시범지역 : 영등포구청 앞(현대해상~당산공원~친수공간)도로양측
※ 총길이 400m / 폭 30m
- 소요예산 : 1,600백만원(국 800, 시 200, 구 600)
- 사업내용
 - 시범사업 대상지의 보·차도 통합
 - 가로 시설물 통합 설치
 - 조명 및 사인의 종합계획
 - 주변에 어우러지는 가로 시설물의 친환경 조형화

□ 주요 추진일정

- 1단계 : 사업기본계획(마스터플랜)수립 ('06.11)
- 2단계 : 기본계획 홍보 및 실시설계 ('06.12 ~ '07.6)
- 3단계 : 설치완료/개막식 및 책자발간,보고서작성 등 ('07.12)

□ 주요추진 사항

- 기본계획 서울시 도시디자인심의 승인 : '07. 2.28
- 실시설계 납품 및 부서 협의 : '07. 6.13

□ 기대효과

- 공공시설물의 개선을 통하여 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성
- 지역 명소화로 인한 살기좋은 영등포 이미지 각인

5

불법 광고물 정비

도시미관을 저해하고 주민생활에 불편을 주는 불법 옥외 광고물의 정비를 추진하여 엄정한 법 집행을 통한 위법 행위를 예방하고 쾌적한 도시환경을 조성코자 함.

□ 정비목표

(단위 : 건/천원)

구 분	정비물량	정비대상	용역비
고정 광고물	5,000	무허가 (신고), 표시위반 광고물	74,873
유동 광고물	1,500	불법현수막, 벽보, 에어라이트 등	14,893

□ 정비방향 및 방법

- 전수조사 결과 불법 광고물이 다수인 가로 선정 우선정비
- 사전 충분한 안내를 통해 자율 정비유도
- 위반사항은 사전 시정지시 후 미 이행시 이행강제금 등 행정처분
 - 1차 : 자율정비 유도 (사전 시정지시)
 - 2차 : 행정처분 및 무상정비 병행 실시
 - 정비 미이행 업소 : 이행강제금 부과 - 50건 61,945천원
 - 정비 동의업소 : 구 기동반과 용역인력 활용 무상정비 - '07. 7~12월

□ 주요추진실적

- 정비대상 지역 사전조사
 - 정비노선 : 당산로외 13개노선
 - 조사기간 : '07.1 ~ 3월
 - 조사방법 : 현장 출장 전수 조사후 위법사항 확인
- 사전 시정 안내문 발송
 - 대 상 : 5,070 업소 8,171건
 - 실 적 : 3,121 업소 5,033건 자율정비 동의서 접수 및 자진정비
- 대 시민 홍보실시 : 지역언론 보도 및 전단지 12,000매 제작 배부

□ 향후추진계획

- 자율정비 동의업소 무상정비 지원
- 미 이행업소 : 이행 강제금 부과 등 행정처분

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

6 신길로~도림로간 도로확장공사

신길로와 도림로를 연계하는 도시계획시설(도로) 사업의 적극적인 사업시행으로 단절된 도로 연계구축 도모 및 하수암거 확대·개량으로 상습 침수지역 해소에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 347-40~254-1 간
- 규 모 : 도로개설 B=15m→30m L=780m
 - 기개설 : 420m('97~'03년), - 미개설 : 360m('04~'09년)
- 사업기간 : '97~'09년
- 총사업비 : 52,800백만원(시비)

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		계	'06이전	'07	'08	장래계획
추진 내용	도로개설	780m	420m	-	360m	
	보상추진	780m	480m	260m	100m	-
총사업비		52,800	40,630	5,000	7,170	
		공 7,020	공4,650	공	공 2,370	
		보 45,700	보35,900	보 5,000	보 4,800	
		설 80	설 80			

□ 추진실적

- 보 상(5차구간)
 - 대 상 : 토지 7건, 건물 79건, 영업권 142건
 - 보상완료 : 토지 3건, 건물 79건, 영업권 142건
 - 지 출 액 : 5,602백만원('06년 사고이월 예산)

□ 향후계획

- '07. 8월 : 토지 2필지 보상완료
- '08. 9월 : 토지 2필지 보상완료
- '08.10월 : 도로공사 착공

7

영진시장~대신시장간 도로개설공사

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 적극 추진으로 도로연계구축 및 주민통행불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 2365(영진시장)~신길1동 136(대신시장)간
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(잔여 450m)
 - 기개설 : 820m(구청개설 520m, 해군본부사업 300m)
 - 미개설 : 450m('07~'09년)
- 사업기간 : '94~'09년
- 총사업비 : 20,820백만원(특별교부금 17,120· 구비 3,700)

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분	계	'06 이전	'07	'08	장래계획
계	20,820	10,590	2,580	2,750	4,900
공 사 비	3,650	1,250		2,000	400
보 상 비	17,055	9,225	2,580	750	4,500
기타 및 설계비	115	115			

□ 추진실적

- 보 상
 - 대 상 : 토지 10건, 지장물및건물 16건
 - 보상완료 : 토지 3건, 지장물및건물 10건
 - 지 출 액 : 8,121천원('06년 사고이월 예산)
- '07. 3.29 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가고시

□ 향후계획

- '07.12월 : 토지 3필지, 지장물및건물 5건(1구간 보상 예정)
- '08. 3월 : 공사(1구간) 착공예정

8

영등포역(남측)~대우아파트간 도로확장공사

지역주민의 통행불편 해소 및 보행환경을 개선함으로 주민 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

 사업개요

- 위 치 : 영등포1동 618-209~618-265간
- 규 모 : 도로개설 B=4.5~8m → 8m, L=170m
- 사업기간 : '06~'08년
- 총사업비 : 1,120백만원(구비)

 세부 추진계획

- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분	계	'06	'07	비고
계	1,120	50	1,070	
공사비	272		272	
보상비	798		798	
기타 및 설계비	50	50		

 추진실적

- '07. 3.29. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가를 위한 열람공고
- '07. 4.26. : 실시계획용역 완료
- '07. 5. 3. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가고시

 향후계획

- '07. 6월 : 보상계획열람공고
- '07. 7월 : 감정평가
- '07. 8월 : 보상실시

9

대림2동 1051-9 ~ 810-56간 도로개설공사

대림2생활권 지구단위계획구역내 토지이용 활성화로 주민 통행불편 해소 및 낙후된 도시환경을 개선하고자 함.

 사업개요

- 위 치 : 대림2동 1051-9~810-56간
- 규 모 : B=6m, L=153m
- 사업기간 : '06~'09년
- 총사업비 : 2,970백만원(시비 1,485 · 구비 1,485)

 세부 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분	계	'05 이전	'06	'07	'08	비고
계	2,970	-	200 구비 : 100 시비 : 100	1,400 구비 : 700 시비 : 700	1,370 구비 : 685 시비 : 685	
공 사 비	237	-			237	시비 : 50% 구비 : 50%
보 상 비	2,683	-	150	1,400	1,133	
기타 및 설계비	50		50			

 추진실적

- '07. 4.26 : 실시설계용역 완료

 향후계획

- '07. 7월 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시
- '07. 8월 : 보상계획 열람공고
- '07. 8월 : 감정평가
- '07. 9월 : 보상실시

밝고 안전한 도시를 위한 도로조명 관리

10 노후 조명시설 연차적 개선추진

□ 도로조명 현황

- 가로등 : 62개노선 7,100등(가로등 6,917 육교등 97 하부등 86)
- 보안등 : 22개동 9,158등(전용주 2,548 한전주 4,845등 건축물 1,765)

□ 추진방향

- 가로등 조도는 현행 15룩스(Lx) → 30룩스(Lx)로 상향
- 보안등 적소설치로 민원해소 및 밝은 보행환경 조성
- 노후 조명시설 개선을 위해 연차적 예산투입

□ 세부 추진계획

- 연차별 사업계획 (단위 : 백만원)

구 분		사업비 (등수)	연 도 별			
			'06	'07	'08	'09(장래)
가로등	계	6,285 (925)	1,312 (158)	1,274 (217)	1,649 (246)	2,050 (304)
	시비	4,070 (585)	1,312 (158)	924 (168)	914 (129)	920 (130)
	구비	2,215 (340)		350 (49)	735 (117)	1,130 (174)
보안등 (설치개량/보수)	구비	2,256 (1,955/19,009)	456 (310/4,420)	400 (265/4,589)	700 (690/5,000)	700 (690/5,000)

□ 추진실적

- 가로등 : 2개 노선 【대방천길,가마산길】 (시비 924백만원)
 - 추진내용 : 가로등 설치완료 168본
- 보안등 : 22개 동 【영등포1동 외 21】 (구비 400백만원)
 - 추진내용 : 보안등설치 133등 보안등보수 2,100개소

□ 향후계획

- 가로등 : 3개 노선 【대신시장주변, 문래중앙길, KBS별관주변】 (구비350백만원)
 - 추진계획 : 가로등설치 49본
- 보안등 : 22개 동 【영등포1동 외 21】
 - 추진계획 : 보안등설치 132등 보안등보수 2,489개소

11 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선

□ 추진방향

- 노후훼손 및 노면상태가 불량한 도로를 신속히 보수정비하여 주민불편해소
- 지속적인 도로 관리로 도로의 기능성 유지 및 안전사고 사전예방

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업규모 :
 - 보도정비 : A= 50a, 아스팔트정비 : A=180a, 콘크리트포장 : A= 20a
- 사업기간 : '07.3 ~ 12월
- 총사업비 : 1,800백만원 (구비)

□ 추진실적

- '07. 3.14 : 공사착공
- '07. 5월현재(공정44%) 대림3동1052-1등 42개소 보수완료

□ 향후계획

- '07.12월 공사완료

12 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리

□ 추진방향

- 시설물의 구조적인 취약개소를 조기 발견하여 안전사고 미연방지

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 시설물
- 사업규모 : - 지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
 - 난간 · 과속 방지턱 및 볼라드 설치 등 도로시설물
- 사업기간 : '07. 3 ~ 12월
- 총사업비 : 1,000백만원(구비)

□ 추진실적

- '07. 3. 9 : 공사착공
- '07. 5월현재(공정45%) 영등포동7가 29-41호앞외 120건 보수완료

□ 향후계획

- '07.12월 공사완료

재해 없는 안전한 도시 관리

13 수해 사전준비 대책

최근 급변하는 기상이변에 효율적으로 대처하고 지역주민이 스스로 재해예방에 대비할 수 있도록 우기 전 수방대책 사전 준비코자 함.

□ 사전준비

- 수방시설물 점검 : 제작사 합동(2월중 1회), 자체 정기(월1회 이상)
- 수방자재 배치 : 4월중(모래주머니 50,000매, 묶음줄 70타래 등)
- 준설시행 : 하수관거는 저지대 및 취약지역 중심으로 우기전 완료, 빗물받이(21,206개소)는 우기전 1회 이상 완료
- 주민 자발적 침수피해예방 지원
: 역류방지기기 및 자동펌프설치지원, 침수자동경보기 및 방수비닐팩 지원
- 수방교육 실시(5.8) : 재난안전대책요원, 동수방(담당)단, 유관기관담당
- 상황유지 : 비 수방기간(3~4월) 2명, 수방기간(5~10월) 단계별 근무

14 신길 빗물펌프장 증설 및 개량

□ 사업개요

- 사업규모 : 펌프용량 증설 (620HP×2대), 토출관 개량 (■2.3×2.3m, L=135m)
기존펌프 개량 (350HP×5대→430HP×5대)
- 사업기간 : '06. 12 ~ '08. 3
- 총사업비 : 7,747백만원('06년 2,807백만원 '07년 4,940백만원)
- 실시설계비 207백만원, 시설비 7,540백만원

□ 추진실적 (현공정 : 55%)

- 증설 펌프장1층 콘크리트 타설 완료, 기존 변전실 철거 및 기초작업 중

□ 향후계획

- '07. 9. 6 : 토목 1차공사 준공
- '08. 3. : 공사준공 예정

15

노후·불량 하수관거 개량

저지대 주택지 이면·간선도로에 매설된 불량 하수관을 개량하여 하수소통의 원활을 기하고 재해예방과 주민 일상생활의 편의를 제공하고자 함.

□ 목 표

- 하수 배제의 원활화로 침수 우려지역 해소 및 안정된 주민생활 도모
- 합리적인 배수체계 정비로 배수처리의 적정성 확보

□ 하수관개량 추진현황

(단위:백만원)

사 업 명	규 모	사업비	현 황	비 고
계 : 7 건	하수관개량 : 4,029m (D450~1600mm)	4,205	◦ 구비 670백만원 ◦ 시비 3,535백만원	
영등포동4가414 주변	관개량 D600~800mm, 661m	495	경인국도 관경협소	시·구비
양평동5가117 주변	관개량 D600~800mm, 946m	510	관경협소	
여의도동13~23 주변	관개량 D900~1600mm, 500m	1,700	하수관 이설 및 용량 확대	시비
여의도동11 주변	관개량 D700~1100mm, 251m	400	관경 노후·협소	
영등포동618 주변	관개량 D450~1200mm, 356m	300		
한국증권거래소 주변	관개량 D600mm, 795m	400		
당산동3가306 주변	관개량 D450~600mm, 520m	400		

□ 추진실적 (현공정 : 65%)

- 총연장 4,029m 중 2,600m 완료
- 빗물받이·맨홀 개량 및 설치 280개소

□ 향후 추진계획

- '07. 12. : 공사 준공

16

하수암거(BOX) 보수·보강

주요 하수시설물인 암거(BOX)에 대해 점검 및 안전진단 등을 시행하여 발견된 결손부분을 연차적으로 보수·보강하여 안정성을 확보코자 함.

□ 목 표

- 하수암거(BOX) 보수·보강으로 시설물의 안정성 및 사용성 확보
- 적기에 보수·보강하여 안전사고예방 및 효율적인 하수관거 관리

□ 사업경위

- '05. 4~10 : 관내 하수암거 정밀점검 및 실시설계 용역시행
- '06.12 : 여의도 하수암거 보수·보강 공사완료

□ 연차별 사업(시비)계획

사 업 명	규 모	사 업 비 (백만원)			
		계	기 투 자	2007년	2008년이후
계 : 4 건	L=27,843m A=32,004㎡	11,500	5,200	3,300	3,000
여의도 하수암거	L=11,324m A=5,403㎡	2,500	2,500 L=11,324m A=5,403㎡	-	-
양평동 하수암거	L=5,989m A=11,371㎡	4,200	1,100 L=2,400m A=4,360㎡	1,500 L=2,158 m A=3,741㎡	1,600 L=1,431m A=3,270㎡
영등포, 문래동 하수암거	L=5,780m A=9,990㎡	3,200	900 L=2,900m A=3,300㎡	900 L=1,210m A=3,290㎡	1,400 L=1,670m A=3,400㎡
신길, 대림동 하수암거	L= 4,750m A= 5,240㎡	1,600	700 L=1,520m A=1,890㎡	900 L=3,230m A=3,350㎡	-

□ 추진실적 (현공정 : 67%)

- 단면보수·보강 10,381㎡ 중 6,990㎡ 완료

□ 향후 추진계획

- '07. 12. : 공사 준공

□ 목 표

- 잔류수 배제방안 등 체계적인 관리 및 시설보완하여 이용주민의 안전성 및 편의성 확보
- 체육시설 청소 및 관리용역 시행으로 신속처리

□ 시설현황

- 위 치 : 도림2동, 대림3동, 신길유수지
- 시설개요
 - 도림 2동 : 조깅트랙 304m 인라인트랙 297m 농구장 1면 배드맨턴장 2면 등
 - 대림 3동 : 조깅트랙 234m 인라인트랙 209m 농구장 2면 배드맨턴장 2면 등
 - 신 길 동 : 조깅트랙 142m 배드맨턴장 2면 등

□ 사업개요

- 내 용
 - 도림2동 유수지 담장 정비 : 89m
 - 대림3동 유수지 스탠드 설치 : 45m
 - 체육시설 청소용역 : 3개 유수지
 - 기타 수목식재 등 : 2개 유수지
- 사 업 비 : 350백만원(체육시설 확충 및 환경정비 300, 청소용역 50)
- 사업기간 : '07. 3 ~ 10

□ 추진실적 (현공정 : 65%)

- 스탠드 설치 45m, 담장정비 89m, 유입 및 방류암거 설치 52m

□ 향후 추진계획

- '07. 10 : 공사 준공

18

빗물 펌프장 시설물 정비

시설물 정비

- 내 용 : 주요 수방시설물인 빗물펌프장 및 수문을 사전 정비하여 유사시 대비
- 대 상 : 빗물펌프장 8개소, 수문 8개소
- 총사업비 : 6,596백만원
 - 구 비 : 3건 150백만원(모터펌프보수, 수문도색, 관사 보수)
 - 시 비 : 5건 6,446백만원

(펌프장 운영감시제어설비 교체, 영상장비·노후밸브·수문개량, 수전설비 이중화)

추진실적 (현공정 : 50%)

- 모터펌프보수 외 2건(구비), 펌프장 운영감시제어 설치교체 외 3건(시비)

향후계획

- '07.11.15 : 수전설비 이중화 준공예정

19

재난 안전관리 종합계획

재난관리 사업개요

- 2007년도 안전관리 계획 수립 및 발간 : 150부
- 양평동 수해백서 발간 : 500부
- 재난대비 주민행동 매뉴얼 발간 : 1,000부(통·반장 등)
- 자연·인적재난 대응 매뉴얼 제작 : 150부
- 재난 동원자원 관리 : 년 4회 (분기별 1회)

추진실적

- '07.안전관리 계획 발간(150부), 양평동 수해백서 발간(500부)
- 자연·인적재난 대응매뉴얼 제작배부(150부)
- 재난대비 주민행동매뉴얼 발간배부(1,500부)
- 동원자원 현황 ('07. 4.1 현재)

기관수	인 력	장 비 [종류/수량 (점)]						
		계	차량	인명구조	응급의료	구호물자	복구장비	기 타
50	38,458	337/ 35,042	69/ 290	161/ 1,339	40/ 1,713	25/ 30,877	17/ 669	25/ 154

향후추진계획

- 동원자원 관리 철저 : 분기별 관리

구민과 함께하는 선진 교통문화 정착

20 교통 안전시설물 설치 사업

주민요구에 따른 이면도로 일방통행 시행 및 폐지, 기타 주민불편 해소를 위해 추진되는 교통개선사업 추진 시 경찰서(청) 협의에 의한 교통안전 시설물 설치 사업을 추진 하고자 함

□ 사업개요

- 소요예산 : 70,000천원
- 사업기간 : 2007년 03월 ~ 2007년 12월
- 사업내용 : 일방통행 신설·폐지, 기타 교통개선사업 추진

□ 추진현황

위 치	건의내용	주민 설문조사 결과	영등포경찰서	
			의뢰일	규제심의회
신길시범길(677-3~680-14)	일방폐지	찬 성	07.04.04	
영8가 62-2(롯데마트) ~ 8가 67	일방폐지	찬 성	07.01.12	07.3.20
봄꽃길	일방신설	찬 성	07.06.08	
아파트~농산물검사소 사이도로	일방폐지	찬 성	07.04.09	
대3 성락빌딩~기림약국	일방폐지	찬 성	07.05.18	
코스트코~E&C사이 이면도로	일방폐지	찬 성	경찰서(07.7) 심의예정	
신대청주유소 ~ 668-10번지	일방폐지	찬 성	07.06.14	
당산3가 385 ~ 당산3가 379	일방폐지	찬 성 (일방통행 설문조사 제외)	07.01.12	07.3.20
파란어린이집앞	일방폐지	찬 성 (일방통행 설문조사 제외)	07.01.12	07.3.20
신길5동 신길시범길~대림3동	일방폐지	설문조사 진행중		

□ 추진실적

- 일방통행 사업 : 대림3동 신길시범길외 9개구간
 - 경찰청 규제협의 진행 : 3개구간 - 당산3가 385 남단 외 2개구간
 - 경찰서 규제심의 진행 : 6개구간 - 대림3동 신길시범길 외 5개구간
 - 주민 설문 조사중 : 1개구간 - 신길5동 시범길
- 기타 교통개선사업 : 대방초교앞 노면시설 개선완료

□ 향후추진계획

- 2007년 6월 : 6개구간 영등포경찰서 교통규제심의 위원회 개최
- 2007년 8월 : 3개구간 경찰청 교통규제 결과 통보후 공사시

경부선철도 터널화(데크화)로 인해 단절된 도시공간구조의 연속성을 확보하고 지역 중심의 무 단절 구간 통행 흐름의 원활 및 철도 부지를 활용하는 미래지향적인 견지에서 중·장기적으로 경부선철도 데크화 사업을 추진 하고자 함

□ 추진방향

- 경부선철도 데크화를 위한 국내외 관련자료 수집
- 철도관련 유관기관 방문, 사업이 추진 될수 있도록 적극 설득 노력
- 도시관리과 지구단위계획 용역사업('06.6.19~07.6.18)타당성검토

□ 사업개요

- 우리구 경부선철도 운행구간(L=3.3Km , B=35m ~ 93m)
 - 경유역 : 대방역 ~ 신길역 ~ 영등포역 ~ 신도림역
- 운영주체 : 한국철도공사
- 데크화 관련 협의기관 : 건설교통부, 한국철도공사, 한국철도시설공단

□ 추진실적

- 07.6월 : 도시관리과 용역에 포함 경부선철도 데크화 검토보고

□ 향후추진계획

- 추진일정
 - '07.7월 : 도시관리과 부도심권 지구단위계획 용역사업 검토안 제시
 - '07.8월~10월 : 학술용역 발주 여부 검토
 - '07.11월 : 2008년도 학술용역사업 예산 확보
- 검토과제
 - 구청 건의안 구체화 및 전문가 초빙 자문회의 개최

초등학교 주변의 차량 속도를 인위적으로 저하시키고, 각종 교통 안전시설물을 설치하여 안전하고 편리한 통학로를 조성 교통사고 위험으로부터 어린이 보호에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 소요예산 : 966백만원(국비 483백만원, 시비 483백만원)
- 사업기간 : 2007년 03월 ~ 2007년 12월
- 사업내용
 - 도로시설 : 보도설치, 컬러포장, 고원식교차로, 과속방지턱, 방호울타리 등
 - 교통시설 : 횡단보도설치, 통합교통안전표지, 일방통행, 노면 및 차선도색

□ 추진실적

- 연차별 초등학교 개선실적

(단위:백만원)

구 분	계	'03	'04	'05	'06	'07(상반기)	'07(하반기)
학교수	22	1	2	3	5	7	6 (유치원 1개 포함)
사업비	3,312	322	553	556	915	966	미확정

- 2007년 03월 ~ 06월 추진실적(개선공사 완료)

학 교	추진실적
문래초등학교	▶ 보도포장:2.19@ ▶ 칼라아스콘포장:6.89@ ▶ 횡스설치:90m
영원초등학교	▶ 칼라아스콘포장 : 4.78@ ▶ 횡스설치 : 190m ▶ 미끄럼방지포장 : 285m ²
대영초등학교	▶ 보도포장 : 3.9@
도림초등학교	▶ 보도포장:2.9@ ▶ 칼라아스콘포장:3.73@ ▶ 미끄럼방지포장:484m ²
대동초등학교	▶ 보도포장:3.8@ ▶ 칼라아스콘포장:13@ ▶ 미끄럼방지포장:544m ²
신영초등학교	▶ 횡스설치:150m
대길초등학교	▶ 칼라아스콘포장:10@ ▶ 미끄럼방지포장:249m ²

□ 향후추진계획

- 2007년 6월 : 어린이보호구역 개선공사 실시설계 용역 준공
 - 사업대상 : 영림, 윤중, 여의도, 우신, 선유초교 및 성모유치원
- 2007년 7월 : 어린이보호구역 개선사업 서울시 평가
- 2007년7~8월 : 서울시 사업비 배정요청 및 하반기 공사 발주

매년 개최되는 벚꽃행사와 여의도를 관광 명소화 하는 미래지향적인 견지에서 차 없는 거리를 조성하여 쾌적한 보행 환경을 조성하고 보행자들의 유입을 유도함으로써 여의도의 새로운 브랜드 사업으로 정착될 수 있도록 함

□ 사업개요

- 소요예산 : 70,000천원 (전액시비)
- 사업기간 : 2007년 03월 ~ 2007년 12월
- 대상구간 : 국회 뒤편 여의서로 한강 하부도로 진입로 ~ 의원회관(770m)
- 운영기간 : 매년 3월~11월 기간 중
(매주 토요일 14:00 ~ 일요일 22:00 까지)
- 주요시설물 설치 : 바리게이트(10개), 통제·우회표지판 다수설치

□ 추진실적

- 07.1월 : 교통량조사 실시 및 교통통제계획 수립, 경찰서(청)협의
- 07.3월 : 국회사무처 업무협의
- 07.6월 : 3월부터 6월까지 국회사무처 5회 방문 및 협의

□ 향후추진계획

- 2007년 7월 : 국회사무처 협의완료 및 경찰청 규제결과 확보
- 2007년 9월 : 차없는거리 사업시행

자전거 이용을 레저, 여가목적, 통학등 생활교통수단으로 활용 할 수 있도록 자전거도로, 보관대등 시설확충 및 관리를 통해 자전거이용을 활성화 하고자 함

□ 추진근거 : 영등포구생활권 자전거이용 활성화 종합대책(07.4)

□ 사업개요

구 분		총 계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
자 전 거 도 로	구간수	21	1	5	5	5	5
	연 장	26,870m	730m	8,020m	4,400m	7,700m	6,020m
자전거무료 대 여 소	개 소	16	2	6	3	5	-
	운영대수	740	100	240	240	160	-
기 계 식 주 차 장 건 설	개 소	4	1	-	2	1	-
	설치대수	480	150	-	240	120	-
종합서비스센터		4 개소	1 개소	-	2 개소	1 개소	-

□ 추진실적

- 07.4월 : 영등포구 생활권 자전거 이용 활성화 종합대책 수립
- 07.5월 : 첨단 기계식 자전거 주차장 건설 계획수립 및 시비요청
- 07.5월 : 07년 자전거도로 시범구간 기본계획 수립 및 경찰서(청) 협의

□ 향후추진계획

- 자전거도로 개설 : 양평2 보행육교 ~ 선유도 진입육교(L=730m)
- 자전거 무료대여소 : 2개소
 - 자전거도로 시범구간 주변 1개소 및 영등포구청내 (주차타워 공간 할애)
- 기계식 자전거주차장 건설 : 영등포구청내 첨단 무인 기계식 주차장건설
- 종합서비스센터 운영 : 영등포구청내 기계식 주차장 옆

< 2007년 자전거도로 시범구간 위치도 >



< 영등포구청내 첨단 기계식 자전거 주차장 건설 조감도 >



주차 공간 확충 및 관리 강화

25 주민편익 증진을 위한 주차시설 확충

주택가 공영주차장 및 학교·공원 지하주차장 건설을 통하여 주택가 부족한 주차시설을 확충하여 주민불편을 해소하고자 함.

□ 추진기간 : '97 ~ 계속

□ 추진방향

- 주차수요보다 공급이 부족한 지역 위주로 공영주차장 건설
- 공공용지(학교·공원지하 등)를 활용한 주차장 건설을 통해 토지이용의 효율성 제고 및 주택가 주차난 완화
- 주차수급율이 낮은 지역 위주 공급하되 **그린파킹 사업** 연계추진

□ 그동안 추진현황

구 분	계		2004년 이전		2005년		2006년		
	개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수	
계	23	2,070	19	1,502	2	338	2	230	
주택가 공동	19	1,502	19	1,502	-	-	-	-	
공공 용지 활용	소계	4	568	-	-	2	338	2	230
	학교지하	2	240	-	-	1	140	1	100
	공원지하	2	328	-	-	1	198	1	130

□ 추진계획 및 실적

(단위:백만원)

사 업 명	규 모 (면수)	사 업 비			사업기간	추진실적
		계	구 비	시 비		
당산근린공원 지하주차장	190면 (지하2층)	9,250	5,114	4,136	2006.10 ~ 2007.11	-토목, 전기, 통신 공사진행 중 - 진도율 : 64%
대림운동장 지하주차장	190면 (지하2층)	9,073	4,537	4,536	2007.2 ~ 2008. 11	-'07.5 투자심사 통과 -'07.8 설계용역 -'07.11 착공예정
신길근린공원 지하주차장	146면 (지하2층)	6,300	3,150	3,150	2007.2 ~ 2008. 7	-'07.2 투자심사요구 -'07.4 투자심사 부결

주택가 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장과 녹지를 확보하고 구민이 안전하고 쾌적하게 보행할 수 있는 생활도로를 조성하여 주차질서 확립과 자연친화적인 주거환경을 조성하고자 함

□ 추진목표

- 대문과 담장을 허물어 주차장과 조경을 설치하여 주거환경개선과 마을공동체의식 회복 도모
- 저렴한 비용으로 주차시설 확충 연차별 지속추진
- 차고지 확보의식 정착 및 주민자율관리체계 구축

□ 추진방향

- 담장을 허물어 주차장 및 조경시설 설치 지원 강화
 - 설계·시공 전 과정에 주민들의 의견 수렴 반영
 - 1가구 1면당 600만원, 1면 추가시 100만원→ 최고 1,550만원까지 지원
- 노약자·어린이·장애우 등이 안전 보행을 위한 쾌적한 생활도로 조성

□ 추진현황('04 ~ '06)

(단위:백만원)

구 분	담 장 허 물 기		생활도로	CCTV	사 업 비
	주 택 수	주차면수			
계	720동	1,207면	3,283m	41개소	9,688(시비 4,058, 구비 5,630)
2004	209동	413면	673m	13개소	2,855(시비 1,955, 구비 900)
2005	234동	434면	1,170m	16개소	3,515(시비 1,150, 구비 2,365)
2006	291동	379면	1,440m	12개소	3,318(시비 953, 구비2,365)

□ 추진계획 및 실적

(단위:백만원)

구 분	담장허물기			생활도로	CCTV	사업비	사업기간
	골목수	주택수	주차면수				
목 표	10	300동	336면	1,400m	15개소	3,115	2007.1 ~ 12
실 적	7	184동	263면	452m	준비중		

건축물 부설주차장을 전수 조사하여 불법용도변경 등으로 본래의 용도로 활용되지 못하고 있는 주차장을 주차장 본래 기능으로 회복토록 하여 주차난 해소에 기여코자 함.

□ 추진목표

○ 추진기간 : '04년 ~ 계속

○ 점검목표 (단위 : 개소)

합 계	'04	'05	'06	'07	'08
15,031	304	4,408	2,911	3,436	3,972

□ 추진방향

- 부설주차장 불법 용도변경에 대한 지속적 단속강화
- 각종 매체를 통하여 자진 시정토록 적극 홍보실시
- 불법용도변경에 대한 시정조치 및 위반자에 대한 강력한 벌칙 적용

□ 추진계획

- 점검대상 : 3,436개소 ('95~'06 건물 준공 분)
- 점검기간 : '07. 03. 01 ~ '07. 12. 31.
- 점검내용
 - 부설주차장 용도변경 및 기능유지 여부
 - 인근설치 부설주차장의 적정 유지관리 여부
 - 기계식주차장 정기검사 시행여부 및 유지관리 상태

□ 추진실적

점검건수	위반건수	위 반 내 역			행정조치 계획
		계	불법용도변경	기능미유지	
1,356	373	373	118	255	시정명령 후 미시정시 이행강제금부과, 고발 등

관내 거주하는 어르신의 주차질서 계도활동을 통하여 어르신 사회 참여 지원 및 지역사회 유대감을 형성하고 주차질서를 개선함으로써 주민편의를 증진코자 함

□ 추진기간 : '07. 3 ~ 11 (9개월)

□ 사업개요

- 사업내용 : 관내 22개동별 이면도로 등에 대한 주차질서 계도
- 소요예산 : 56,100천원(임금 및 운영비)
- 참여인원 : 연인원 5,400명 (1일 50명)
 대림1,3동 및 신길1동(그린파킹지역)은 동별 4명 배치
- 사업수행 : (사)대한노인회영등포구지회 협약서에 의거 위탁

□ 추진계획

- 근무방법 : 각 동별 2인1조 편성 (1일 2시간, 주3회, 월12회)
- 계도활동 방법
 - 관할 지역(동)의 이면도로 중점 순찰 및 계도
 - 차량운전자에게 주차 공간 이용토록 인근주차장 등 안내
 - 지역주민과 함께 주차문화 선도 및 계몽
- 주요 계도활동 지역 및 대상
 - 이면도로 및 주택가 골목, 마을버스 통행로
 - 학교주변 어린이보호구역, 그린파킹사업지구 내
 - 주차장 입구, 점포 앞, 대문을 막은 차량
 - 이중 및 직각주차 차량, 소통장애를 초래하는 차량 등

□ 추진실적

- 계도 및 이동조치 : 37,420건
- 경고장 부착 : 340건

IV.2007 특수사업

1 신길 ~ 여의도간 샛강 문화인도교 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도 샛강 일원(신길역~여의도 광장아파트간)
- 규 모 : 폭 4.5m, 연장 360.5m
- 사업기간 : '07~'10년
- 총사업비 : 14,548백만원(공사비 12,825 감리비 1,223 설계비 500)

□ 추진경위

- '04. 7.31 : 구청장 방침(보행 문화인도교 설치)
- '04.11.26 ~ '05. 4.30 : 여의도 샛강 인도교설치 타당성조사
- '05. 6. 3 ~ '05. 8. 1 : 인도교 설계 현상공모
- '05. 9.26 : 인도교설계 현상공모 당선작 발표

□ 세부 추진계획

① 연차별 사업계획 (단위:백만원)

구 분	계	'06	'07(추경)	'08	'09	'10	비고
계	14,548		500	4,700	4,700	4,648	
공사비	12,825			4,300	4,300	4,225	
감리비	1,223			400	400	423	
실시설계비	500		500				

□ 추진실적

- '07. 4.19. : 투·용자심사 통과(시비) - 조건부추진(샛강생태공원과 연계추진)
- '07. 5. 8. : 2007년 추경반영 요청(우리구 → 도로계획과)

□ 향후계획

- '07. 8월 : 실시설계 심사요청(우리구→계약심사담당관)
- '07.10 ~ '08. 6월 : 실시설계 용역시행
- '08.10 ~ '10. 6월 : 공사시행

□ 사업효과

- 신길역(1,5호선)~문화다리~여의도(여의동·서로)간 걷고싶은 보행공간 조성으로 동선체계 구축
- 시민· 학생들의 출·퇴근시간 단축(30~40분)으로 민원불편 해소
- 여의샛강 생태공원과 『한강르네상스』 프로젝트 계획과 함께하는 볼거리 제공

2

친 환경적인 도림천 만들기

현재 자연하천으로서의 기능이 상실된 도림천을 정화하고 항상 물이 흐르는 친환경적 하천으로 조성하여 자연생태계 복원 및 친수공간을 만들어 주민에게 휴식공간을 제공코자 함.

□ 목 표

- 건천화 방지로 자연 생태계 복원 및 주민 친수공간 조성
- 유지용수 증가로 안양천 수질개선, 휴식공간 제공으로 하천이용 증대

□ 현 황

- 하천개요 : 도림천(지방2급하천) 11km(관악구 신림동~영등포구 문래동)
 - 우리구 연장 : 4.04km (구로교~신정교)
- 지천 및 행정구역 : 대방, 봉천천 및 4개 자치단체(영등포, 구로, 동작, 관악)
- 건천일수 및 이용실태 : 약 206일, 일부 자전거도로 및 산책로
- 총사업비 : 152억원
 - 영등포 : 45억원(구비33,시비12), 구로 : 43억원(구비14,시비29), 관악 : 64억원(구비14,시비50)
 - ※ 시비지원은 '06.자치구별 재정수요 충족도 기준

□ 사업경위

- '04.6.~'05.8. : 안양천 외 17개 하천정비기본설계용역(서울시)
- '05. 12. : 도림천내 매설된 공업용수 활용방안 검토
- '06. 4.11 : 서울시 상반기 투자심사
 - 연차별 자원배분, 시·구간 비용분담문제 등 종합계획수립 및 유지용수
- '06.10.18 : 서울시 하반기 투자심사 완료
- '06. 11. : 실시설계용역 발주

□ 향후 추진계획


- 사업 시행에 따른 연차별 구비 (33억원) 확보 필요
- '06.12.~'07.10. : 도림천 하천정비 실시설계용역 시행
(서울시건설안전본부)
- '07. ~ '09. : 연차별 투자사업 시행

3

횡단빗물받이 휠체어 통행로 개선

횡단빗물받이 그레이팅의 보강살이 넓어 휠체어나 유모차의 바퀴가 빠져 통행불편을 초래하므로 그레이팅 보강살 간격을 조정 설치하여 장애인 등 휠체어 이용 주민들의 불편해소

□ 현황 및 개선방안

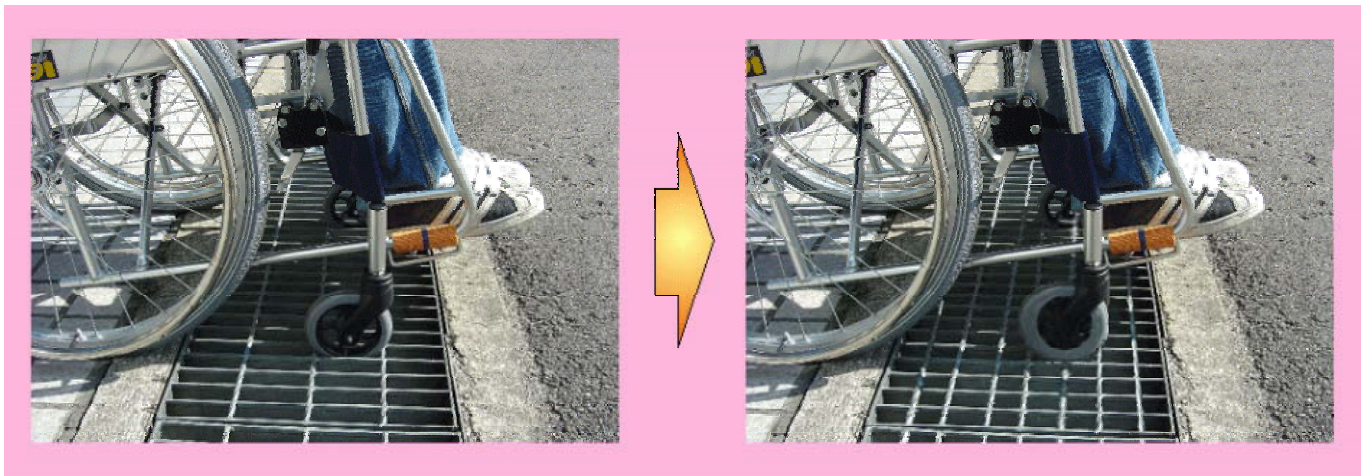

■ 현황및문제점

- 현재 설치된 수도의 그레이팅은 대부분 상기와 같은 형태로 절묘하게도 휠체어의 조정용 앞바퀴가 걸리는 쪽으로 되어 있음 (보강살 간격 : 7~8cm)

■ 개선내용

- 측구용이 아닌, 상기와 같이 횡단용 수도의 그레이팅에는 보강살 간격을 줄여 설치 (보강살 간격 : 7~8cm ⇒ 3~4cm)
- 휠체어 이용시민 불편해소

□ 추진계획

- 관내 횡단빗물받이 현황 : 130개소, 470m
- 추진계획
 - 총소요예산 : 300백만원
 - '07.추진 : 그레이팅 상태가 불량한 32개소(약100m) 대상 우선시행
 - 소요예산 : 70백만원
 - 관내 하수시설물 보수 단가계약공사에서 시행 (금년 시행 결과에 따라 향후 확대시행)

□ 기대효과

- 휠체어나 유모차를 이용하는 장애인 등의 통행불편 해소
