

제201회 구의회 제1차 정례회

2017. 6. 15. ~ 6. 27.

청림 영등포

2017년 주요업무 보고



푸른도시과

보고 순서

I . 일반 현황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 3
III . 중점사업 추진실적	· · · 26

1

조 직

푸른도시과

- 6개 팀

공 원 팀	조 경 팀	자 연 생 태 팀	안 양 천 관 리 팀	영 등 포 공 원 관 리 팀	메 낙 골 공 원 조 성 및 공 원 기 획 팀
<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원조성계획 입안 - 공원 종장기 개발 계획 수립 - 공원 점·사용 허가 - 어린이공원조성·유지관리 - 근린공원 조성·유지관리 - 마을마당 조성·유지관리 - 공원세외수입·변상금 관리 - 공유재산관리(공원) - 시설이적대상지 공원화사업 	<ul style="list-style-type: none"> - 가로녹지대조성·유지관리 - 수림대·시설녹지 조성 - 꽃길조성 및 화분 관리 - 공유재산관리(녹지) - 가로수 식재·유지 관리 - 푸른서울가꾸기 - 학교공원화 유지관리 - 옥상 및 벽면녹화 - 자투리땅 녹지조성 - 공동주택 조경협의 - 아파트 열린녹지 조성 	<ul style="list-style-type: none"> - 자연환경·생태 복원사업 - 우수지 생태복원 및 관리 - 하천생태복원 녹화사업 - 안양천그린웨이 조성(생태복원) - 야생동·식물 수출입허가 - 야생동물 구조시설 지정 - 수목 병·해충방제(공원 및 녹지대 가로수등) - 야외체육시설 설치, 유지관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 안양천·도림천 특화사업 - 안양천 철새 보호 구역 관리 - 안양·도림천 생태 조성 및 편익시설 설치 관리 - 자연하천 조성 및 관리 - 안양천 방문자 안내센터 및 생태 프로그램 운영 - 안양·도림천 통합 관리사무소 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 시 공원 유지관리(영등포공원, 중마루공원) - 영등포공원 조성계획 - 공원 수목관리 - 체육시설 설치 및 관리 - 시설물 설치 및 유지관리 - 수목식재 및 꽃밭 조성 - 공원 내 자연학습장 조성 - 공원 점용 및 사용허가 - 유아숲 체험장 조성 및 관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 메낙골공원 조성 - 메낙골공원 조성 관련 법령 개정 - 메낙골공원 매수 청구에 관한 사항 - 시설물 등 유지관리 - 공원 점용허가 및 사용허가 - 공원·마을마당, 녹지대 등 전가시설 유지관리

2

인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	30	0	1	6	8	6	7	0	1	1	0	0	0	0	0
현 원	29	0	1	6	11	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0
과부족	△ 1	0	0	0	3	△ 1	△ 3	0	1	△ 1	0	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속
시설	근린공원	10개소/549,377㎡ (구공원 6개소/141,431㎡, 시공원 4개소/407,946㎡)	공원팀
	어린이공원	18개소/54,637㎡	공원팀
	소공원	11개소/14,074㎡	공원팀
	마을마당	31개소/18,011㎡	공원팀
	녹지대	350개소/726,244㎡	조경팀
	가로수	109개노선 18,329주	조경팀
	보호수	은행나무 1종 1주	자연생태팀
	체육시설	72개소 22종 792점	자연생태팀
장비	화물차	마이티(2.5t) 80모 5681(2005년)	조경팀
	화물차	마이티(2.5t) 80모 5698(2005년)	조경팀
	승합차	스타렉스(9인승) 03모 9050(2005년)	공원팀
	중형승용	쏘울EV(5인승) 65로0530(2016년)	공원팀
	소형화물	포터2(1.0t) 86우 4171(2011년)	안양천관리팀
	소형화물	포터2(1.0t) 80모 7630(2005년)	공원팀
	소형화물	포터2(1.0t) 80모 7614(2005년)	자연생태팀

4

예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	12,762,463	3,978,288	31%
공원관리 수준향상	5,543,428	773,775	14%
가로녹지 수준향상	4,871,610	2,231,521	46%
자연생태 수준향상	1,311,088	485,346	37%
안양·도림천 특화	496,947	138,982	28%
인력운영비	287,116	234,812	82%
기본경비	213,172	74,750	35%
보전지출	-		
내부거래지출	39,102	39,102	100%

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연 번	사 업 명	쪽
①	공원 노후시설 정비 및 개선	4
②	테마가 있는 다양한 녹색 공간 확충	7
③	거리의 품격을 높이는 가로환경 관리	9
④	가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선	13
⑤	하천변 녹지 확충 및 정비	16
⑥	가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성	19
⑦	공원내 위험요소 사전 정비	21
⑧	주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비	23

의자, 목재 데크, 산책로 탄성포장 등 노후시설을 교체하고 창의놀이터를 조성하여 쾌적하고 특색 있는 공원 환경을 조성함으로써 주민 만족도 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 영등포공원 보수정비사업
 - 위 치 : (영등포본동)신길로 275 영등포공원
 - 규 모 : 10,000 m^2
 - 예 산 : 1,040,000천원(시비)
 - 내 용 : 음악분수 및 주변 데크, 탄성포장 정비, 담장 등 경관저해요소 정비, 공중화장실 리모델링, 수목 및 초화류 식재, 잔디광장 유지관리 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 3. ~ 6. 30. : 실시설계용역 시행
 - 2017. 7. ~ 10. : 공사 시행 및 준공
 - 2017. 2. 9. : 잔디광장 유지관리공사 착공
 - 2017. 9. 30. : 잔디광장 유지관리공사 준공
- 문래근린공원 창의놀이터 재조성사업(명시·사고이월)
 - 위 치 : (문래동)문래동3가 66 문래근린공원 어린이놀이터
 - 규 모 : 500 m^2
 - 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 실집행액 35,227천원
 - 내 용 : 주민과 전문가가 협업하여 주민참여형 커뮤니티 창의놀이터 조성
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 2. 28. : 설계용역 완료
 - 2017. 2. 27. : 공사발주
 - 2017. 3. 20. : 공사착공(공정 90%)
 - 2017. 6. 20. : 공사준공 예정
- 노후 마을마당 보수정비사업(완료)
 - 위 치 : (신길4동)신길로40길 5 덕천길마을마당
 - 규 모 : 2,251 m^2
 - 예 산 : 60,000천원(시비) ※ 실집행액 58,632천원
 - 내 용 : 산책로 및 운동시설 포장 정비, 조합놀이대 보수, 수목식재 등

- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 31. : 도면작성용역 완료
 - 2017. 4. 12. : 공사발주
 - 2017. 4. 19. : 공사착공
 - 2017. 6. 7. : 공사준공

○ 공원 시설물 정비사업(완료)

- 위 치 : (문래동)문래근린공원, (당산1동)당산근린공원, (당산2동)새말소공원, (신길5동)신길근린공원, (신길1동)메낙골근린공원
- 규 모 : 66,465 m^2
- 예 산 : 300,000천원(구비) ※ 실집행액 265,359천원
- 내 용 : (문래)막구조 파고라 3동 설치, 목교 교체, 목재 화단 정비 등, (당산)목재 무대 및 의자 교체, (새말)무대 설치, (신길)바닥 포장 및 정자 1동 교체, (메낙골)수목 전지, 정자 물받이 설치 등
- 추진실적
 - 2017. 2. 18. : 설계용역 완료
 - 2017. 2. 27. : 공사 발주
 - 2017. 3. 20. : 공사 착공
 - 2017. 5. 25. : 공사 준공

○ 어린이공원 정비사업(완료)

- 위 치 : (대림3동)원지, 동심 / (영등포본동)영일/ (영등포동)서강, 중앙/ (여의도동)자유, 평화 / (도림동)고추말
- 규 모 : 800 m^2
- 예 산 : 235,400천원(구비) ※ 실집행액 193,222천원
- 내 용
 - 원지 : 어린이놀이터 바닥재 교체(모래→고무칩), 초화류 식재 등
 - 자유 : 흙막이 정비
 - 평화 : 농구대함 교체
 - 서강 : 흙막이 정비, 초화류 식재 등
 - 중앙 : 앉음벽 설치, 초화류 식재 등
 - 고추말 : 정자설치 등 시설물 정비
 - 영일 : 노후 조합놀이대 철거
 - 동심 : 장미식재 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 7. : 설계용역 완료
 - 2017. 3. 20. : 공사발주
 - 2017. 4. 5. : 공사착공
 - 2017. 5. 25. : 공사준공

○ 공원 시설 확충 및 개선사업

- 위 치 : 관내 근린공원, 소공원, 마을마당 등 68개소
- 규 모 : 10개소
- 예 산 : 50,000천원(구비) ※ 실집행액 8,332천원
- 내 용 : 주민 요구 및 긴급 보수정비 사항 처리
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 4. 26. : 영일어린이공원 탄성볼라드 설치
 - 2017. 5. 12.~5. 25. : 대림어린이공원 조롱박터널 설치
 - 2017. 7. ~ 12. : 보수 정비 수시 시행

○ 공원 소나무 생육환경개선사업(완료)

- 위 치 : (당산1동)당산공원, (문래동)문래공원
- 규 모 : 170주(당산 92주, 문래 78주)
- 예 산 : 25,000천원(구비) ※ 실집행액 21,430천원
- 내 용 : 소나무 전정(131주), 영양공급(26주), 병해충방제(78주)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 13. : 공사발주
 - 2017. 3. 20. : 공사착공
 - 2017. 6. 15. : 공사준공

□ 소요예산 : 총1,910,400천원(시 1,300,000 / 구 610,400)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,910,400 (시 1,300,000 / 구 610,400)	588,407 (시 93,859 / 구 494,548)	30.8

□ 현황사진(어린이공원 정비사업) - 바닥재 교체



관내 학교, 아파트, 가로변 등 이용자가 많은 곳에 다양한 테마가 있는 특색 있는 녹색공간을 확충하여 도시경관을 향상하고 볼거리가 있는 휴식 공간 제공

□ 사업개요

○ 에코스쿨 조성사업(완료)

- 위치 : 당산2동 당서초(1,200 m^2), 문래동 문래중(900 m^2),
문래동 영등포초(1,200 m^2)
- 규모 : 총3,300 m^2
- 예산 : 370,000천원(시비) ※ 실집행액 339,051천원
 - 당서초 70백만원, 문래중 150백만원, 영등포초 150백만원
- 내용 : 학습 및 휴식시설 설치, 수목 및 초화류 식재 등
 - 당 서 초 : 플랜터 2개, 원주목경계 48m, 등반보조재(벽면녹화) 9개소, 이팝나무 등 6종 31주, 덩굴장미 등 20종 4,500본 식재 등
 - 문 래 중 : 앓음벽 5m, 산석붙임 81m, 산수유 등 10종 2,028주, 할미꽃 등 8종 2,190본 식재 등
 - 영등포초 : 학습연못 1개소, 파고라 1개소, 물레방아 1개소, 영산홍 등 14종 2,155주, 애기부들 등 16종 4,510본 식재 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 13. : 설계용역 완료
 - 2017. 4. 5. : 공사발주
 - 2017. 4. 24. : 공사착공
 - 2017. 5. 28. : 공사준공

○ 가로정원 조성사업(완료)

- 위치 : 여의도역(5호선) 6번 출구 미성아파트 D동 앞
- 규모 : 1,000 m^2
- 예산 : 194,000천원(시비) ※ 실집행액 185,426천원

- 내 용 : 포켓정원, 초화원, 그늘목 식재, 띠녹지 조성 등
- 추진실적

- 2017. 2. 21. : 설계용역 완료
- 2017. 3. 16. : 공사발주
- 2017. 4. 6. : 공사착공
- 2017. 6. 3. : 공사준공

○ 아파트 열린녹지 조성사업

- 위 치 : (양평2동)현대6차/(양평1동)오목교벽산블루밍
- 규 모 : 약1,500 m^2
- 예 산 : 269,000천원(시비 134,000, 구비 135,000)
 - 현대6차 : 169백만원, 오목교벽산블루밍 100백만원
- ※ 실집행액 13,150천원
- 내 용 : 담장 342m(현대6차 220m, 오목교벽산블루밍 122m)철거, 수목이식 및 식재, 편익시설 설치 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 14. : 설계용역 완료
 - 2017. 4. 25. : 공사발주
 - 2017. 5. 22. : 공사착공
 - 2017. 7. 10. : 공사준공 예정

□ **소요예산 : 총833,000천원(시 698,000 / 구 135,000)**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
833,000 (시 698,000 / 구 135,000)	537,627 (시 531,052 / 구 6,575)	64.5

관내 가로수를 비롯한 주요 수목 및 시설에 대한 생육환경/시설개선 사업을 통해 수목의 건전한 생육을 도모하고 아름답고 쾌적한 가로환경을 조성하여 보다 품격있는 가로경관 제공

□ 사업개요

○ 가로수 생육환경 개선사업(완료)

- 위 치 : (양평2동)영등포로, (문래동)도림로, 선유로 등
- 규 모 : 가로수 메위심기 27주, 보호판 정비 158조, 떠너지 조성 100m 등
- 예 산 : 195,000천원(시비) ※ 실집행액 189,000천원
- 내 용 : 떠너지 조성(식재기반, 수목/초화류식재), 가로수보식 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 14. : 설계용역 완료
 - 2017. 3. 20. : 공사발주
 - 2017. 4. 12. : 공사착공
 - 2017. 6. 11. : 공사준공

○ 디지털로 가로수 바꿔심기사업

- 위 치 : (대림2동)디지털로(구로경계~대림로)
- 규 모 : 양방향 1,000m 가로수 116주
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 실집행액 10,450천원
- 내 용 : 가로수 바꿔심기(양버즘 -> 이팝나무) 116주 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 22. : 설계용역 완료
 - 2017. 5. 11. : 서울시 도시공원위원회 심의(조건부가결)
 - 2017. 5. 25. : 계약심사 및 일상감사
 - 2017. 6. 20. : 공사발주(~9월)

○ 고추말삼거리 생활권 공원녹지 조성사업(사고이월 - 완료)

- 위 치 : (영등포본동)620-195 고추말 삼거리 일대
- 규 모 : 300㎡
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 실집행액 199,216천원

- 내 용 : 식재기반조성, 장대석쌓기 57m, 등의자 2개, 대왕참나무 등 13종 5,742주, 맥문동 등 18종 4,970본 식재 등
- 추진실적
 - 2016. 11. 2.~11. 16. : 실시설계 시행
 - 2016. 11. 25. : 공사발주
 - 2016. 12. 12. : 공사착공
 - 2017. 4. 10. : 공사준공
- 자원순환센터 힐링숲 조성사업 (사고이월 - 완료)
 - 위 치 : (양평2동)1-7 자원순환센터 일대
 - 규 모 : 2,000m²
 - 예 산 : 240,000천원(시비) ※ 실집행액 237,320천원
 - 내 용 : 소나무 130주, 영산홍 1,650주, 맥문동 등 6종 22,100본 식재, 산책로 조성 등
 - 추진실적
 - 2016. 11. 24. : 공사발주
 - 2017. 3. 10. : 공사착공
 - 2017. 5. 5. : 공사준공
- 도영로 가로수 보호관 정비사업(완료)
 - 위 치 : (영등포본동) 도영로(푸르지오A 철로변 측)
 - 규 모 : 400m, 가로수 보호관 교체정비 53조 등
 - 예 산 : 80,000천원(시비-주민참여예산) ※ 실집행액 79,202천원
 - 내 용 : 불량 가로수 보호관 정비, 보도정비 등
 - 추진실적
 - 2017. 3. 12. : 설계용역 완료
 - 2017. 3. 13. : 공사발주
 - 2017. 3. 23. : 공사착공
 - 2017. 4. 14. : 공사준공
- 왕벚나무 수세회복사업 / 보호수 생육환경개선 사업
 - 위 치 : (여의도동)여의도 벚꽃길 / (당산2동)강마을어린이공원 보호수 등
 - 규 모 : 왕벚나무 100주, 보호수 1주
 - 예 산 : 14,000천원(시비4,000, 구비10,000) ※실집행액 8,800천원
 - 내 용 : 수간주사, 외과수술, 해충방제, 생리증진제 처리 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 2. 23. : 공사발주(왕벚나무 수세회복)

- 2017. 3. 2. : 공사착공(왕벚나무 수세회복)
- 2017. 3. 16. : 공사준공(왕벚나무 수세회복)
- 2017. 2. 16. : 공사발주(보호수 생육환경개선)
- 2017. 2. 24. : 공사착공(보호수 생육환경개선)
- 2017. 7. 23. : 공사준공(보호수 생육환경개선)

○ 가로수 식재 및 은행나무 바꿔심기사업(완료)

- 위 치 : (양평2동)양평로, (여의동)국제금융로, 의사당대로 등
- 규 모 : 가로수 식재(교체) 56주, 보호관 정비교체 47조 등
- 예 산 : 120,000천원(구비) ※ 실집행액 97,578천원
- 내 용 : 가로수 메워심기 10주, 보호관 정비교체 9조
은행나무 암수교체 46주, 보호관 정비 38조 등

- 추진실적

- 2017. 2. 15. : 가로수 식재공사 발주
- 2017. 2. 27. : 가로수 식재공사 착공
- 2017. 3. 21. : 가로수 식재공사 준공
- 2017. 3. 8. : 은행나무 바꿔심기 공사발주
- 2017. 3. 30. : 은행나무 바꿔심기 공사착공
- 2017. 5. 28. : 은행나무 바꿔심기 공사준공

○ 공원녹지 친수공간 수경시설 정비사업(완료)

- 위 치 : (신길6동)여의대방로, (대림3동)원지어린이공원 물놀이장 등
- 규 모 : 수경시설 10개소(조경팀 6개소, 공원팀 4개소)
- 예 산 : 35,000천원(구비) ※ 실집행액 23,621천원
- 내 용 : 원지물놀이장 수도인입관 확대(15mm → 50mm), 밸브 9개,
노즐 5개, 타이머 2개 교체, 펌프 1대 설치, 방수작업 등

- 추진실적

- 2017. 5. 29. : 공사발주
- 2017. 5. 31. : 공사착공
- 2017. 6. 18. : 공사준공

□ 소요예산 : 총1,084,000천원(시 919,000 / 구 165,000)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,084,000 (시 919,000 / 구 165,000)	845,187 (시 715,188 / 구 129,999)	77.9

□ 현황사진



고추말삼거리 생활권 공원녹지 조성사업



자원순환센터 힐링숲 조성사업



도영로 가로수 보호판 정비사업

주요 가로변 유휴공간에 아름다운 꽃길 및 녹지조성을 통해 쾌적하고 아름다운 가로경관을 조성하여 주민들의 정서함양 및 볼거리 제공을 통한 명품녹화 도시 영등포 이미지 향상

□ 사업개요

○ 양평가로녹지 정비사업

- 위 치 : 양화동 124-3 양평가로녹지(양평2동)
- 규 모 : 15,000 m^2
- 예 산 : 500,000천원(시비) ※ 실집행액 11,700천원
- 내 용 : 수종갱신 및 배수로 384m 설치, 노후 시설물 교체 정비 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 14. : 도면작성용역 완료
 - 2017. 3. 28. : 공사발주
 - 2017. 4. 24. : 공사착공
 - 2017. 7. 12. : 공사준공 예정

○ 가로변 녹지량 확충사업

- 위 치 : 여의동 84 여의대로 마포대교 남단 외 1개소(서강대교 남단)
- 규 모 : 1,000 m^2
- 예 산 : 200,000천원(시비) ※ 실집행액 22,250천원
- 내 용 : 녹지대 조성(식재기반조성, 수목식재 등) 및 기존녹지 정비(시설물 및 수목 정비, 교통섬 녹화 등)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 13. : 도면작성용역 완료
 - 2017. 3. 13. : 공사발주
 - 2017. 4. 10. : 공사착공
 - 2017. 6. 29. : 공사준공 예정

○ 도시구조물 벽면녹화사업

- 위 치 : 해군회관 및 한성아파트 103동 석축 220m(가마산로 543), 문래삼환아파트 앞 진입램프 옹벽 70m(문래동5가 50)
- 규 모 : 220m
- 예 산 : 87,000천원(시비) ※ 실집행액 4,300천원
- 내 용 : 식생기반조성, 환토, 등반보조재설치, 수목 및 만경류식재 등

- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 14. : 도면작성용역 완료
 - 2017. 4. 17. : 공사발주
 - 2017. 5. 22. : 공사착공
 - 2017. 6. 18. : 공사준공
- 사계절 꽃길 조성사업(완료)
 - 위 치 : 국회의사당 앞 중앙 녹지 등 4개소
(LG트윈타워 앞 녹지, 신길지하차도, 여의도 환승센터)
 - 규 모 : 400m²
 - 예 산 : 30,000천원(시비) ※ 실집행액 30,000천원
 - 내 용 : 꽃길조성, 장식화단 조성, 걸이화분설치 등
 - 추진실적
 - 2017. 3. 16. : 테마화단 조성
 - 2017. 5. 6. : 걸이화분 설치
- 영등포 꽃으로 피다 사업(완료)
 - 위 치 : 당산동5가 11-37(당산2동) 당산중학교 앞 교통섬
 - 규 모 : 500m²
 - 예 산 : 40,000천원(구비) ※ 실집행액 34,885천원
 - 내 용 : 가로변 사계절 장식화단 조성, 자투리땅 꽃·나무 식재 등
 - 추진실적
 - 2017. 2. 22. : 설계용역 완료
 - 2017. 2. 22. : 공사발주
 - 2017. 2. 28. : 공사착공
 - 2017. 3. 15. : 공사준공
- 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비사업(포괄비)
 - 위 치 : 관내 가로녹지대 등
 - 규 모 : 600m²
 - 예 산 : 50,000천원(구비) ※ 실집행액 13,165천원
 - 내 용 : 노후 시설물(등의자 등)정비, 수목 보식 등
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 8.~3. 10. : 도시재생활보관 주변 녹지정비 및 조경공사 시행
 - 2017. 6. ~ 12. : 녹지대 시설물 정비, 수목보식 등

○ 선유로 가로녹지 조성사업(구 주민참여 - 완료)

- 위치 : 선유로 207 양평현대6차 앞(양평2동)

- 규모 : 80m

- 예산 : 50,000천원(구비-주민참여예산) ※ 실집행액 43,720천원

- 내용 : 가로변 띠녹지 조성, 식재기반, 아교목/관목류/초화류 등 식재

- 추진실적

· 2017. 2. 22. : 설계용역 완료

· 2017. 3. 3. : 공사발주

· 2017. 3. 10. : 공사착공

· 2017. 4. 3. : 공사준공


□ 소요예산 : 총957,000천원(시 817,000 / 구 140,000)

예산액	집행액	집행율(%)
957,000 (시 817,000 / 구 140,000)	160,020 (시 68,250 / 구 91,770)	16.7

□ 현황사진



영등포꽃으로피다 사업

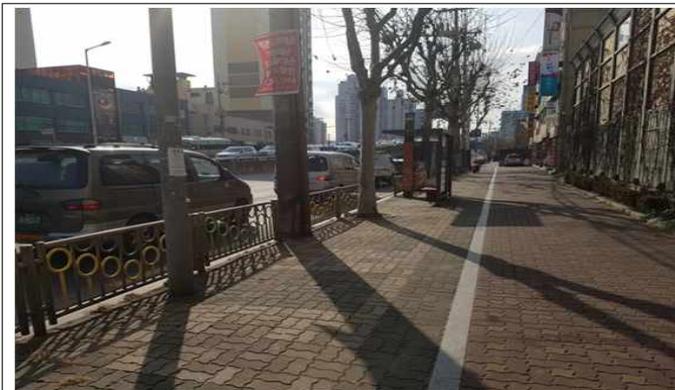

선유로 가로녹지 조성사업

안양천, 우수지 등에 수목식재 및 시설물을 정비하여 경관향상 및 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 조성하고 이용 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 안양천 야생초화 식재사업

- 위 치 : (문래동~양평1동)안양천 서울둘레길 일대(신정교~목동교)
- 규 모 : 4,000 m^2
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 실집행액 15,620천원
- 내 용 : 안양천 사면 및 산책로변 식재기반 조성, 야생초화 원추리, 금계국 등 256,000본 식재 등
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 27. : 설계용역 완료
 - 2017. 4. 20. : 공사발주
 - 2017. 5. 8. : 공사착공
 - 2017. 6. 26. : 공사준공

○ 안양천 그늘목 조성사업(완료)

- 위 치 : (양평1동~양평2동)안양천 산책로 주변(오목교~양평교)
- 규 모 : 2km
- 예 산 : 300,000천원(시비) ※ 실집행액 299,011천원
- 내 용 : 산책로 주변 그늘목 168주 식재, 수변공간 데크 285 m^2 정비 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 27. : 설계용역 완료
 - 2017. 3. 31. : 공사발주
 - 2017. 4. 25. : 공사착공
 - 2017. 6. 13. : 공사준공

○ 안양천 서울둘레길 휴게공간 조성사업(완료)

- 위 치 : (문래동~양평1동)안양천 서울둘레길 일대(신정교~목동교)
- 규 모 : 2개소
- 예 산 : 180,000천원(시비) ※ 실집행액 176,333천원
- 내 용 : 포토아일랜드, 휴게시설 등 조성

- 추진실적
 - 2017. 4. 4. : 설계용역 완료
 - 2017. 4. 14. : 공사발주
 - 2017. 4. 28. : 공사착공
 - 2017. 6. 11. : 공사준공
- 안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비사업(완료)
 - 위 치 : (문래동~양평1동~양평2동)안양천 제방 산책로(신정교~양화교)
 - 규 모 : 4km
 - 예 산 : 10,000천원(구비) ※ 실집행액 9,000천원
 - 내 용 : 왕벚나무 3주 등 83주 보식
 - 추진실적
 - 2017. 3. 3. : 공사발주
 - 2017. 3. 7. : 공사착공
 - 2017. 3. 28. : 공사준공
- 안양 · 도림천 수목 가지치기사업(완료)
 - 위 치 : 안양천 갈대구장 자전거도로 주변(양평2동)
 - 규 모 : 양버즘나무 20주
 - 예 산 : 5,000천원(구비) ※ 실집행액 4,054천원
 - 내 용 : 하천변 양버즘나무 20주 가지치기
 - 추진실적
 - 2017. 3. 3. : 공사발주
 - 2017. 3. 7. : 공사착공
 - 2017. 3. 28. : 공사준공
- 셋강생태공원 친환경 문화프로그램 운영사업(공약사업)
 - 위 치 : 여의도동 4-5일대 셋강생태공원 내
 - 규 모 : 프로그램 운영 110회
 - 예 산 : 13,000천원(구비) ※ 실집행액 4,800천원
 - 내 용 : 생태교육(100회) 및 소규모 문화행사(10회) 진행
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 4.~ 5. : 잠자리 생태문화학교 생태프로그램(60회)
 - 2017. 6.~11. : 잠자리 생태문화학교 생태프로그램

□ **소요예산 : 총808,000천원(시 780,000 / 구 28,000)**

예산액	집행액	집행율(%)
808,000 (시 780,000 / 구 28,000)	508,818 (시 490,964 / 구 17,854)	63.0

□ **현황사진**



안양천 제방 산책로 수목보식 및 시설물 정비



안양 · 도림천 수목 가지치기



셋강생태공원 친환경 문화프로그램

관내 가로수 및 녹지대, 학교공원화 사업지 등에 생육중인 수목의 수형조절 가지치기 및 위험수목 제거, 각종 교통표지판 저해 수목전지를 실시하여 안전 사고 예방 및 가로경관을 향상시켜 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 겨울철 및 배전선로 하부 가로수 가지치기사업(완료)

- 위치 : 당산로 등 시도로 9개노선, 배전선로 노선 38개 노선
- 규모 : 겨울철 990주, 배전선로 3,848주
- 예산 : 511,840천원(시비 132,980, 한전 378,860)

※ 실집행액 : 시비 132,040천원, 한전 361,000천원

- 내용 : 시도로 및 한전 고압선 하부 가로수 가지치기 수형조절
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 1. 17. : 겨울철가로수 가지치기 공사발주
 - 2017. 2. 8. : 겨울철가로수 가지치기 공사착공
 - 2017. 3. 2. : 겨울철가로수 가지치기 공사준공
 - 2017. 2. 17. : 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사발주
 - 2017. 3. 7. : 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사착공
 - 2017. 4. 21. : 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사준공

○ 가로수 및 녹지대 수목 가지치기 사업(연간단가)

- 위치 : 문래로 등 관내 103개 노선, 양평가로 녹지대 등 300개소
- 규모 : 위험수목 가지치기 및 제거 600주
- 예산 : 100,000천원(구비) ※ 실집행액 20,000천원
- 내용 : 위험목, 민원 및 가로수 등 / 녹지대 수목제거 및 수형조절
- 추진실적 및 향후계획

· 2017. 1. 16. : 가로수 가지치기(연간단가) 공사발주

※ 6월 현재 도림유수지, 노들길, 신길역 녹지대 등 30개소 120주 제거 및 전지 시행

○ 열린학교(학교공원) 수목정비사업(완료)

- 위 치 : 영원초교 등 관내 초중고 학교공원화 사업지 11개소
- 규 모 : 은행나무 등 155주
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 실집행액 17,256천원
- 내 용 : 위험수목 155주 가지치기

위 치	학 교 명	정비 수량(주)	비 고
계		155	
영등포본동	영원초	15	
영등포동	영중초	15	
여의도동	여의도여고	10	
	윤중초	15	
	윤중중	10	
문래동	영문초	15	
양평1동	관악고	15	
	당중초	15	
양평2동	선유초	15	
대림1동	대림중	15	
대림3동	영남중	15	

- 추진실적

- 2017. 2. 6. : 공사발주
- 2017. 2. 7. : 공사착공
- 2017. 2. 21. : 공사준공

□ 소요예산 : 총631,840천원(시 132,980 / 구 120,000 / 한전 378,860)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
631,840 (시 132,980 / 구 120,000 / 한전 378,860)	530,296 (시 132,040 / 구 37,256 / 한전 361,000)	83.9

□ 현황사진



열린학교수목정비 사업

공원 내 공원등, CCTV, 전기시설, 위험수목 등을 정비하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성

□ 사업개요

- 전기시설물 유지관리사업(연간단가)
 - 위 치 : 관내 공원, 마을마당, 녹지대 등
 - 규 모 : 공원등 752본 966등, 분전함 63면, 기타 전기시설 정비
 - 예 산 : 27,000천원(구비)
 - 내 용 : 공원등, 분전함 등 전기시설에 대한 연중 정비
 - 6월 현재 램프 93개, 안정기 67개, 점멸기 2개, 글러브 2개 등 교체 시행
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 2. 2. : 공사발주
 - 2017. 2. 8. : 공사착공
 - 2017. 12. 31. : 공사준공
- 녹지초소 전기시설 보수사업
 - 위 치 : 양평동4가 323-1 (녹지반 초소)
 - 규 모 : 1개소
 - 예 산 : 10,000천원(구비)
 - 내 용 : 계약전력 증, 전력케이블교체, 조명등 교체, 기타 1식
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 6. 01. : 공사발주
 - 2017. 6. 08. : 공사착공
 - 2017. 6. 27. : 공사준공
- 공원내 수목 가지치기 및 식재사업(완료)
 - 위 치 : 문래근린공원 등 6개소
 - 규 모 : 265주
 - 예 산 : 30,000천원(구비) ※ 실집행액 26,400천원
 - 내 용 : 수목 가지치기 265주
 - 추진실적
 - 2017. 3. 08. : 공사발주
 - 2017. 3. 10. : 공사착공
 - 2017. 3. 20. : 공사준공

- 대방천변 녹지내 산책로 조명등 설치사업(구 주민참여 - 완료)
 - 위 치 : 도림동 263 도림배드민턴장~도림게이트볼장
 - 규 모 : 조명등 설치 13본
 - 예 산 : 45,000천원(구비) ※실집행액 39,992천원
 - 내 용 : 조명등 설치 13본, 분전함 설치 2면, 기타(배관, 배선 등) 1식
 - 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 3. 15. : 공사발주
 - 2017. 3. 21. : 공사착공
 - 2017. 4. 14. : 공사준공

□ **소요예산 : 총112,000천원(구 112,000)**

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
112,000 (구 112,000)	66,392 (구 66,392)	59.3

□ **현황사진**



대방천 녹지내 산책로 조명등 설치 사업

주민 생활에 불편을 초래하는 공원 노후 시설물, 가로수, 체육시설을 정비하여 주민 요구에 부응하는 안전하고 쾌적한 녹색복지 실현

□ 사업개요

○ 공중화장실 개선사업(시 주민참여)

- 위 치 : (양평1동)양남어린이공원, (대림3동)동삼어린이공원, (대림1동)대림어린이공원
- 규 모 : 3개소
- 예 산 : 170,000천원(시비) ※ 실집행액 19,720천원
- 내 용 : 남녀화장실 구분(양남·동삼), 리모델링 및 주변환경정비(대림)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 4. 17.~5. 8. : 공사착공 및 준공(대림)
 - 2017. 4. 20.~6. 30 : 설계용역 시행 및 준공(양남·동삼)
 - ※ 서울시 기술용역타당성심사시 설계금액을 지나치게 감액함에 따라 적합한 건축설계업체를 선정하지 못하였기에, 재심사를 요청하여 설계금액을 증액시키는데 시일이 많이 소요됨
 - 2017. 7. ~ 8. : 공사 시행 및 준공(양남·동삼)

○ 신우어린이공원 산책로 정비사업(완료)

- 위 치 : (대림3동)가마산로47길 13 신우어린이공원
- 규 모 : 300m²
- 예 산 : 40,000천원(구비) ※ 실집행액 35,350천원
- 내 용 : 산책로 170m 고무칩 포장, 화살나무 등 3종 630주 식재 등
- 추진실적
 - 2017. 2. 23. : 공사발주
 - 2017. 3. 2. : 공사착공
 - 2017. 4. 15. : 공사준공

○ 한마음마을마당 조성사업(완료)

- 위 치 : 도림동 182-5 등 5필지 한마음마을마당
- 규 모 : 100m²
- 예 산 : 30,000천원(구비) ※ 실집행액 26,278천원
- 내 용 : 퍼걸러 1동 교체, 수목 453주 식재, 건물 40m² 철거 등
- 추진실적
 - 2017. 2. 22. : 공사발주
 - 2017. 2. 23. : 공사착공
 - 2017. 3. 24. : 공사준공

○ 도리미소공원 내 놀이시설 설치사업(완료)

- 위 치 : 도림동 821-3 도리미소공원(도림동 영등포아트자이아파트 104동 앞)
- 규 모 : 30 m^2
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 실집행액 17,629천원
- 내 용 : 시소 1개, 흔들말 2개, 자기발전자전거 1개 설치, 고무칩 26 m^2 포장 등
- 추진실적
 - 2017. 2. 24. : 공사발주
 - 2017. 3. 21. : 공사착공
 - 2017. 4. 28. : 공사준공

○ 공중화장실 환경개선사업(완료)

- 위 치 : 문래동3가 66 문래근린공원
- 규 모 : 1개소
- 예 산 : 20,000천원(구비) ※ 실집행액 17,450천원
- 내 용 : 장애인 화장실 자동문 설치 2개소, 양변기 3개, 세면기 2개, 환풍기 4개, 타일 35 m^2 교체 등
- 추진실적
 - 2017. 3. 8. : 공사발주
 - 2017. 3. 15. : 공사착공
 - 2017. 3. 29. : 공사준공

○ 마을단위 야외체육시설 설치

- 위 치 : (도림동)도림게이트볼장 등 6개소
- 규 모 : 도림게이트볼장 바닥정비, 운동기구 30점 설치 및 시설물 정비 등
- 예 산 : 100,000천원(구비) ※ 실집행액 73,008천원
- 내 용 : 운동기구 설치, 게이트볼장, 체육시설 정비
- 추진실적 및 향후계획
 - 2017. 2. 27. : 공사 발주(도림게이트볼장 바닥정비)
 - 2017. 3. 2. : 공사 착공(도림게이트볼장 바닥정비)
 - 2017. 3. 23. : 공사 준공(도림게이트볼장 바닥정비)
 - 2017. 5. 12. : 공사 발주(전철아파트 주변 야외체육시설물 정비)
 - 2017. 5. 16. : 공사 착공(전철아파트 주변 야외체육시설물 정비)
 - 2017. 6. 14. : 공사 준공(전철아파트 주변 야외체육시설물 정비)
 - 2017. 7 ~ 11. : 노후체육시설물 조달구매 교체 설치 예정(잔액 사용)

○ 공원녹지포지 폐기물처리사업(완료)

- 위 치 : 양평2동 1-29(아리수정수센터 옆)
- 규 모 : 608ton
- 예 산 : 50,000천원(구비) ※ 실집행액 44,500천원
- 내 용 : 공원녹지 발생 각종 혼합폐기물 반출처리
- 추진실적
 - 2017. 3. 17. : 용역 시행
 - 2017. 3. 24. : 용역 착수
 - 2017. 4. 21. : 용역 준공

□ 소요예산 : 총430,000천원(시 170,000 / 구 260,000)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
430,000 (시 170,000 / 구 260,000)	233,935 (시 19,720 / 구 214,215)	54.4

□ 현황사진



신우어린이공원 산책로 정비사업



한마음마을마당 조성사업

Ⅲ . 중점사업 추진실적

1 생활권 공원녹지 조성사업

공원팀

이면도로 폐쇄지역과 도로변 유휴공지를 활용하여 숲길 및 쉼터를 조성함으로써 지역 주민이 소통하고 화합할 수 있는 공간을 제공하고, 녹지량 확충을 통한 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 선유로43나길 일대, 거성과스텔 주변 이면도로(양평2동)
- 규 모 : 6,000 m^2 (길이 380m, 폭 6~30m)
- 예 산 : 1,700,000천원(시비)
- 내 용 : 이면도로 폐쇄지역 철거 및 숲길 조성

□ 주요 추진실적

- 2017. 2. 10. : 생활권 공원녹지 조성사업 추진계획 시달(서울시 → 자치구)
- 2017. 2. 13. : 유관부서 업무 협의(도시계획과, 도로과 등 12개 부서)
- 2017. 2. 13. : 기술용역타당성심사 요청(서울시 기술심사담당관)
- 2017. 2. 21. : 실시설계용역 발주 및 용역비 재배정 요청
- 2017. 2. 28. : 주민협의체 구성 요청(양평2동)
- 2017. 3. 17. : 실시설계용역 계약
- 2017. 3. 20. : 실시설계용역 착수
- 2017. 4. 25. : 주민설명회(1차) 실시
- 2017. 5. 15. : 주민설명회(2차) 실시
- 2017. 6. 08. : 서울특별시 설계심의(공원녹지정책과)

□ 향후계획

- 2017. 6. : 서울특별시 건설기술심의(기술심사담당관)
- 2017. 7. : 계약심사 및 공사 발주
- 2017. 8. : 공사 계약 및 착공
- 2017. 11. : 공사 준공

□ 소요예산 : 총1,700,000천원(시 1,700,000)
