

제170회 구의회 임시회

2012.09.07 ~ 00.00



2012년 주요업무 보고



푸른도시과

보 고 순 서


I. 일 반 현 황	1
II. 2012 주요업무 추진실적	6
III. 신규·주요투자사업	38

I . 일반현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직(계약직 포함)						기 능 직				대체 인력
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	29		1	5	4	4	6		2	3	4	
현 원	29		1	5	4	8	1		3	7		
과부족						4	-5		1	4	-4	

2 조 직

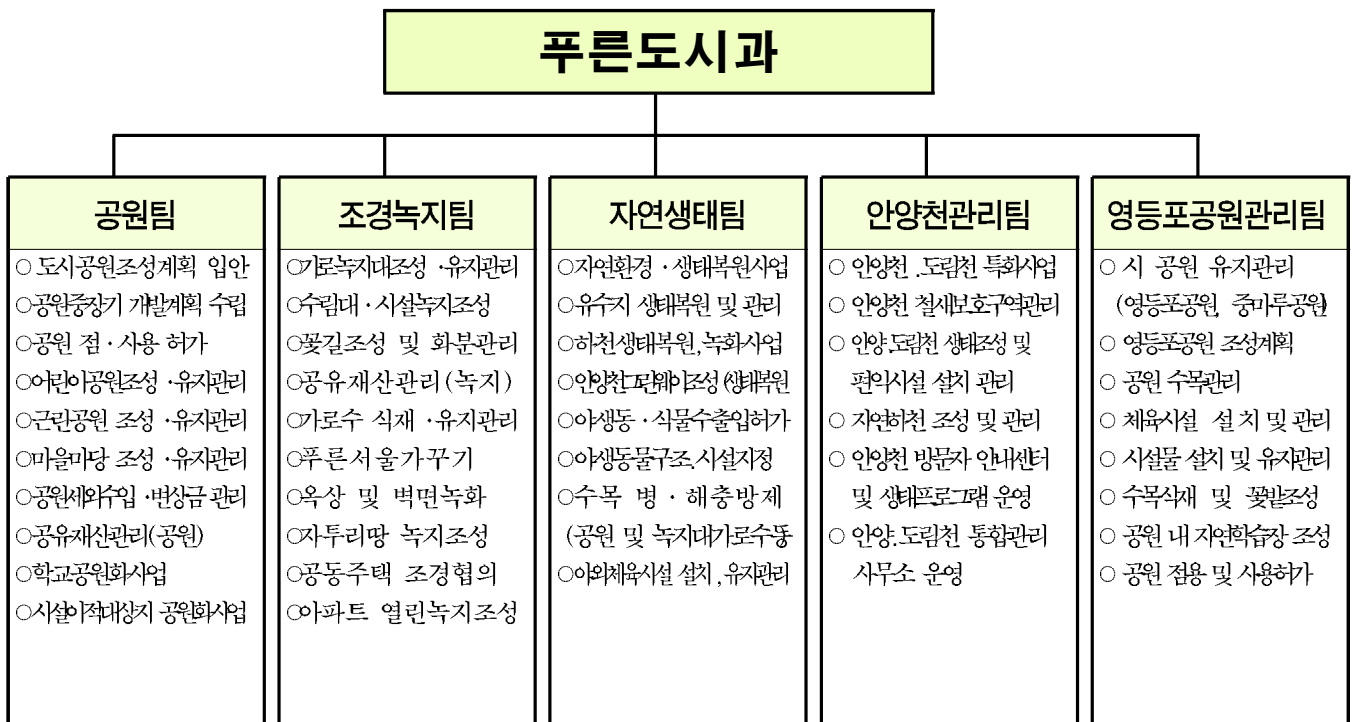

3

주요시설 및 장비

구 분	도 시 공 원						마을 마당	녹지대	가로수	보호수	체육 시설
	총계	근린공원			어린이	소공원					
		계	구공원	시공원							
개소수	34	10	6	4	19	5	29	143	54개 노선	2종	23개소
면 적 (㎡)	606,711	543,463	135,517	407,946	55,702	7,545	15,151	581,482	15,976주	2주	16종 171점

4

예산 현황

□ 사 업 별

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
계	12,061,083	4,245,947	35.2%
공원녹지관리수준향상	3,198,551	1,325,739	41.4%
아름다운 환경 및 편리한 시설만들기	3,473,696	1,663,775	47.9%
안양·도림천 특화	520,753	226,241	43.4%
푸른공간 늘리기	4,201,630	643,631	15.3%
행정운영 경비	666,453	386,551	58%

목 차

〈2012년도 주요업무추진 실적〉

1. 현대 1·2차아파트 차없는거리 조성	6
2. 영등포 올레길 조성	7
3. 영등포 친환경 물놀이장 조성	8
4. 어린이공원 정비	9
5. 공원 내 무장애 편의시설 확충	10
6. 공원 내 수목 정비	11
7. 열린학교(학교공원화) 유지관리	12
8. 양평동 불량주택 밀집지역 공원화	13
9. 공원 내 친환경화장실 설치	14
10. 공중화장실 환경개선	15
11. 공원시설물 정비	16
12. 공원시설물 유지관리(연간단가)	17
13. 전기시설물 유지관리(연간단가)	18
14. 공원등 개선공사	19
15. 공원내 CCTV 구축	20
16. 녹지대 위험수목 정비	21

목 차

17. 녹지초소 이전 및 녹지복원	22
18. 경부제3녹지 조성사업(보상)	23
19. 가로변 녹지량 확충	24
20. 가로수 보식 및 식재	25
21. 가로수 생육환경 개선	26
22. 왕벚나무 수세회복	27
23. 가로수 가지치기	28
24. 아파트 열린녹지 조성	29
25. 신길5동 주민센터 옥상녹화	30
26. 도시구조물 벽면녹화	31
27. 친수공간 수경시설 유지관리	32
28. 생활주변 자투리땅 녹화	33
29. 안양천 그린웨이 4차 조성	34
30. 2012 마을단위 야외체육시설 설치	35
31. 공원내 청소년 문화마당 조성	36
32. 영등포공원내 게이트볼장 조성	37

목 차

〈신규·주요투자사업〉

- | | |
|----------------------------|----|
| 1. 대림 우수지 생태공원 조성 | 38 |
| 2. 메낙골근린공원 조성 기본설계용역 | 39 |
| 3. 대림로 가로수 바꿔심기 | 40 |
| 4. 양평우수지 생태습지특화 | 41 |
| 5. 안양천·목동교인근 화장실 신설 | 42 |
| 6. 영등포공원내 북카페 설치 | 43 |

II. 주요 업무추진 실적

1 현대1·2차아파트 차없는거리 조성 - 시비 50%, 구비 50%

아파트 담장 철거 및 차량통행이 적은 도로 폐쇄 후 열린숲길을 조성하여 쾌적한 환경 조성, 인근 지역주민의 문화의 거리 및 소통의 공간, 생활권 녹지확충, 도시 생태기능 강화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위치 : 문래동 6가 45-1(도)외 3필지(45-2도, 45, 46번지)
(문래동 현대1,2차 아파트 열린녹지조성 - 글마당길 차없는 거리)
- 규모 : 1,200㎡
- 사업기간 : 2011. 1 ~ 2012. 7
- 내용
 - 도로폐쇄 120m×8m=960㎡, 담장철거 100m, 교통규제표지판 5개소 등
 - 기반조성 1,200㎡, 수목식재공사(소나무 등 11종), 편의시설 설치(정자, 의자, 운동기구 등), 공원등(7등), CCTV설치(1개소), 포장공사, 생태연못 및 습지조성(71㎡) 등

□ 추진실적

- 2011. 01 ~ 06 : 추진계획수립 및 실시설계용역 시행
- 2012. 03. 21 : 설계심의(서울시 조경과)
- 2012. 04. 02 : 계약심사(서울시 계약심사과)
- 2012. 04. 17 : 공사 발주 및 계약(2012.05.04)
- 2012. 05. 07 : 공사 착공
- 2012. 07. 31 : 공사 준공

□ 향후 추진계획

- 2012. 08. 03 : 준공검사 및 유지관리

□ 기대효과

- 아파트내 녹지와 이면도로를 오픈스페이스 및 녹지공간으로 재조성하여 지역주민들의 소통과 화합의 장으로 조성
- 토지보상이 수반되지 않는 공원녹지 확충사업을 통한 도심경관 향상
- 주민의 휴식처 제공 및 녹지량 확충으로 도시생태기능 강화

□ 예산현황

- 예산액 : 600,000천원(시비50%, 구비50%)
- 집행액 : 514,587천원

2 영등포 올레길 조성 - 구비 100%

안양천, 한강, 샛강 등 기 조성된 하천의 산책로 활용 및 구민건강 걷기코스로 재조성하고 기존의 공원, 하천, 산책로 등을 연계하여 걷기코스 발굴 및 테마가 있는 도심속 올레길 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천, 도림천, 한강, 샛강, 여의도공원, 선유도공원
- 규 모 : 8.2km(안양천 5.2km, 도림천 3km)
- 사업기간 : 2012년 1월 ~ 2012년 12월
- 내 용
 - 기 조성된 산책로, 편의시설 이용 및 편의시설 설치
 - 특화된 안내체계 도입, 단절된 산책로 연결, 노면불량구간 재정비, 탐방 및 표지판 설치, 쉼터 및 전망대 조성

□ 추진실적

- 2012. 02. 14 : 계약심사(실시설계용역)
- 2012. 02. 15 : 실시설계용역 발주/착수
- 2012. 05. 21 : 용역보고회
- 2012. 06. 08 : 실시설계용역 준공

□ 향후 추진계획

- 2012. 08 ~ 09 : 국토관리청 하천점용허가
- 2012. 09. 15 : 공사발주 및 계약
- 2012. 10 ~ 11 : 공사착공 및 준공
- 연차별 시행계획

구분	소요예산	위치(구간)	거리(km)	비고
계	1,525	2개소	24.9	
2011년	35	-	-	기본설계용역
2012년	670	안양천그린웨이(5.2km)~도림천생태하천(3.0km)	8.2	영등포 수변둘레길 8.2km
2013년	820	한강여의도지구(4.0km)~샛강생태공원(3.7km)~여의도공원(2.4km)~한강양화지구(3.6km)~선유도공원(3.0km)	16.7	여의도생태순환길 10.1km 영등포 수변둘레길 6.6km

□ 기대효과

- 한강, 안양천, 도림천의 하천녹지와 도심 외곽의 단절된 산책로를 연결하여 녹지가 풍부한 생태도시 조성
- 아름답고 쾌적한 테마거리 조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 예산현황(2012년도)

- 예산액 : 670,000천원(구비)
- 집행액 : 19,000천원

도심내 접근이 편리하고 다양한 계층이 이용 가능한 친수시설을 도입함으로써 열섬화 현상 저감 등 가족과 함께 여가를 즐기고 사계절 활용이 가능한 물놀이장을 조성하여 주민들 간의 관심과 소통, 화합하는 커뮤니티 공동체 형성

□ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 431-28번지 일대 (꽃섬길 마을마당)
- 규 모 : 430 m^2
- 사업기간 : 2011. 9 ~ 2012. 7
- 내 용
 - 벽천폭포(H3.5×L7.2), 앉음벽, 목계단, 음수전, 수목식재 및 이식
 - 기반조성공사(구체, 마감, 포장), 바닥포장 철거, 포장공사 등
 - 물놀이장 : 226.8 m^2 , 물놀이시설(코끼리 물총 등 5종), 펌프 4대
 - 물놀이장 기계설비(배관, 수질여과장치, 오버플로우, 점검구)

□ 추진실적

- 2011. 09 ~ 11 : 추진계획수립 및 실시시설계약역 시행
- 2012. 02. 10 : 영등포 도시디자인위원회 심의
- 2012. 03. 07 : 계약심사(감사담당관)
- 2012. 03. 09 : 공사 발주 및 계약(2012. 03. 30)
- 2012. 04. 02 : 공사 착공
- 2012. 06. 30 : 공사 준공
- 2012. 07. 10 : 물놀이장 준공식

□ 향후 추진계획

- 2012. 07. 10 ~ 08.31 : 물놀이장 개장 및 운영

□ 기대효과

- 도심내 접근이 편리하고 다양한 계층이 이용 가능한 친수시설을 도입함으로써 지역주민들의 소통과 화합의 장으로 조성
- 가족친지 등 다양한 계층이 생활의 쉼터로 찾아 이용 할 수 있는 테마공원으로 조성

□ 예산현황

- 예산액 : 500,000천원(구비)
- 집행액 : 470,546천원

4 어린이공원 정비 - 구비 100%

어린이공원 내 노후 및 파손 편익시설물(파고라, 포장 등)을 정비하여 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공하여 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 활성화에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 평화어린이공원 외 3개소
(자유어린이공원, 다사랑어린이공원, 대림어린이공원)
- 규 모 : 어린이공원 4개소
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 6월
- 내 용 : 노후 및 파손 편익시설물 정비

□ 추진실적

- 2012. 01. 16 ~ 03. 26 : 실시설계용역 시행
- 2012. 03. 30 : 일상감사
- 2012. 04. 04 : 계약심사
- 2012. 04. 05 : 공사발주
- 2012. 04. 23 ~ 06. 22 : 공사 시행 및 완료

□ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 공원 환경을 제공으로 지역 주민의 공원 이용 만족도 향상 및 공원 이용 활성화 도모
- 공원 환경 개선으로 지역 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 예산현황

- 예산액 : 200,000천원 (구비)
- 집행액 : 169,509천원 (구비)

5

공원 내 무장애 편의시설 확충 - 구비 100%

공원 통행에 지장이 없는 사람 중심의 무장애 공원으로 정비하여 장애인 등 사회적 약자의 공원 접근·이용 및 이동권을 보장하여 공원 이용 활성화 및 이용자 만족도 향상에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신우어린이공원 외 11개소
- 규 모 : 도시공원 12개소
- 사업기간 : 2012. 2월 ~ 5월
- 내 용 : 무장애시범공원 1개소 조성, 도시공원 12개소 정비

□ 추진실적

- 2012. 02. 06 ~ 03. 06 : 실시설계용역 시행
- 2012. 02. 28 : 계약심사
- 2012. 03. 20 : 공사발주
- 2012. 03. 30 ~ 05. 13 : 공사시행 및 완료

□ 기대효과

- 통행에 지장이 없는 사람 중심의 산책길을 조성하여 다양한 계층의 주민들의 이동권 보장
- 교통약자의 이동편의 증진 및 장애물 없는 공원 환경 조성
- 장애인 · 노인 · 임산부 · 어린이 등의 통행 편익증진

□ 예산현황

- 예산액 : 107,000천원 (구비)
- 집행액 : 80,511천원 (구비)

공원 내 수목 중 무성한 수관 형성으로 공원 인접 주택에 민원을 야기 및 공원 이용에 위해가 되는 수목에 대하여 정비공사를 시행하여 안전사고 예방 및 쾌적한 공원 환경 제공코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 문래근린공원 외 10개소
- 규 모 : 버즘나무 외 3종 292주 정비
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 9월
- 내 용 : 고사지, 도장지, 도복수목, 위험수목, 병해충 피해목 제거

□ 추진실적

- 2012. 02. 06 : 계약심사
- 2012. 02. 09 : 1차 정비공사 발주
- 2012. 02. 15 ~ 03. 05 : 1차 정비공사 시행
- 2012. 05. 15 : 계약심사
- 2012. 05. 16 : 2차 정비공사 발주
- 2012. 05. 18 ~ 06. 06 : 2차 정비공사 시행
- 2012. 09. 30 : 2차 정비공사 준공

□ 기대효과

- 공원 내 주택가 인접 대형 및 위험 수목을 전지하여 안전사고 예방
- 수목의 불필요한 가지 전지로 수목생리 활성화를 통한 공원경관 향상

□ 예산현황

- 예산액 : 45,000천원 (구비)
- 집행액 : 35,404천원 (구비)

열린학교 조성사업 대상 학교 내 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생의 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지 환경 제공코자 함.

사업개요

- 위 치 : 영림초교 외 26개교
- 규 모 : 27개교(학교공원화사업 시행학교)
- 사업기간 : 2012. 9월 ~ 11월
- 내 용 : 학교공원화사업 노후·파손시설 정비, 보식 등 사후관리

추진방향

- 노후화로 파손된 시설물 정비 및 수목 보식으로 이용 학생 및 지역 주민의 안전사고 예방
- 아름답고 쾌적한 녹지 환경 제공으로 주민 삶의 질 향상에 기여

향후계획

- 2012. 09. 01 ~ 09. 10 : 학교공원화사업 시행학교 27개교 현황 조사
- 2012. 09. 12 : 계약심사
- 2012. 09. 20 : 공사발주
- 2012. 09. 25 ~ 10. 24 : 공사 시행

기대효과

- 녹지 및 휴식공간 관리로 쾌적한 교육 환경 제공으로 학생들의 정서 함양에 기여
- 열린 녹지 및 휴식공간 제공으로 지역 환경 개선에 기여

예산현황 : 30,000천원 (구비)

양평동 2가 41-5일대는 노후불량주택 밀집지역으로 도시경관을 해치고 있어 이곳에 마을마당을 조성함으로써 주민에게 쾌적한 녹지환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동2가 41-5번지 외 31필지
- 규 모 : 1,109.5 m^2
(구유지 : 28.6 m^2 , 사유지 : 287.3 m^2 , 사유지 : 793.6 m^2)
- 사업기간 : 2009. 4월 ~ 2013. 12월
- 내 용 : 토지보상 및 마을마당조성

□ 추진실적

- 2009. 04. 29 : 영등포구 투자사업 결정
- 2009. 09. 07 : 도시계획시설(공공공지)결정 및 지적고시
- 2011. 04. 04 : 특별교부금 확보(교부액 20억원)
- 2011. 10. 06 : 도시계획(공공공지)사업 실시계획 인가고시
- 2011. 12. 27 : 보상계획 수립(건설관리과)
- 2012. 07. 02 : 수용재결신청 열람공고

□ 향후 추진계획

- 2012. 8 ~ 12 : 보상절차 이행
- 2013. 1 ~ 12 : 마을마당 조성

□ 기대효과

- 공원·녹지가 부족한 불량주택(판자촌) 밀집지역에 주민들의 숙원사업인 공원을 조성하여 시민의 여가 및 휴식 공간 제공
- 주거환경을 개선하여 주민들의 정서함양 및 삶의 질 향상에 기여
- 공원면적이 절대적으로 부족한 영등포에 공원을 조성함으로써 지역간 불균형 해소에 기여

□ 예산현황

- 예 산 액 : 3,790,000천원(시비3,700,000, 구비90,000)
- 집 행 액 : 173,089천원

9**공원 내 친환경화장실 설치 - 구비 100%**

공원 이용객 증가에 따른 공중화장실 수요 급증으로 도시공원 내 공중화장실을 추가로 설치하여 주민의 여가생활 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치(3개소) : 문래근린공원(문래동 3가 66)
 - 다사랑어린이공원(대림2동 703-6)
 - 양평가로녹지(양평동 5가 121-1)
- 규 모 : 3개소
- 사업기간 : 2012. 2월 ~ 7월
- 내 용 : 이동식 공중화장실 설치

□ 추진실적

- 2012. 01. 25 : 실시설계용역 시행
- 2012. 04. 27 : 공사 발주
- 2012. 05. 16 : 공사 착공
- 2012. 07. 21 : 공사 준공

□ 기대효과

- 도시공원내 공중화장실 설치로 이용주민 편익증진
- 주민숙원사업 해결 및 여가생활 증진에 기여

□ 예산현황

- 예 산 액 : 262,000천원(구비)
- 집 행 액 : 214,592천원

노후된 공중화장실 시설을 개선하여 이용주민에게 편안하고 쾌적한 공원 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신길근린공원(신길5동 341-3일대) 등 3개소
 - 원지어린이공원(대림3동 690)
 - 신우어린이공원(대림3동 657)
- 규 모 : 공중화장실 내·외부 도색, 전기시설 개선 및 노후시설 보수 등
- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 5월
- 내 용 : 노후 공중화장실 정비

□ 추진실적

- 2012. 01. 30 : 실시설계용역 시행
- 2012. 04. 03 : 공사 발주
- 2012. 04. 18 : 공사 착공
- 2012. 05. 16 : 공사 준공

□ 기대효과

- 도시공원내 공중화장실 개선으로 공원 이용주민 편익증진
- 아름답고 쾌적한 공원 조성으로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 예산현황

- 예 산 액 : 85,000천원(구비)
- 집 행 액 : 58,704천원

11 **공원시설물 정비** - 구비 100%

파손된 공원시설물을 교체·정비하여 안전사고를 예방하고 편의시설을 확충하여 공원환경 개선에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 당산근린공원 외 57개소
- 규 모 : 도시공원 및 마을마당 시설정비
- 사업기간 : 2012. 2월 ~ 12월
- 내 용 : 노후시설 교체 및 보수, 바닥포장, 체력단련시설 설치 등

추진실적

- 2012. 01. 25 : 실시설계용역 시행
- 2012. 03. 19 : 공사 발주
- 2012. 04. 03 : 공사 착공
- 2012. 05. 22 : 공사 준공

기대효과

- 도시공원 내 노후시설 정비로 공원을 이용하는 이용주민 편익증진
- 노후되고 파손되어 위험한 공원시설물을 정비하여 각종 안전사고 예방

예산현황

- 예 산 액 : 211,000천원(구비)
- 집 행 액 : 151,920천원

도시공원 내 어린이놀이시설, 체육시설 등 즉각적인 보수가 필요한 시설에 대하여 유지관리사업을 시행하여 이용객 안전확보 및 시설물 유지관리에 기여코자 함

사업개요

- 위 치 : 당산근린공원 외 57개소
- 규 모 : 관내 도시공원 및 마을마당
- 사업기간 : 2012. 3월 ~ 12월
- 내 용 : 노후시설 교체 및 보수, 어린이놀이시설, 체육시설 등 공원 이용 주민 불편사항의 긴급보수 시행

추진실적

- 2012. 03. 09 : 사업추진계획 수립
- 2012. 03. 15 : 사업 시행

세부 추진계획

- 2012. 12. 31 : 사업 종료

기대효과

- 파손된 시설물을 즉시 정비하여 안전사고 예방 및 이용주민 편익증진
- 아름답고 쾌적한 공원 조성으로 주민 삶의 질 향상

예산현황

- 예 산 액 : 20,000천원(구비)
- 집 행 액 : 없음

공원 및 녹지대에 설치되어 있는 전기시설물(공원등, 전력시설)의 유지관리를 위해 전기공사 연간단가를 시행함으로써 민원발생시 장비 및 인력부족을 해소하여 신속한 민원처리에 만전을 기하고자 하며 전기시설물 사전점검을 통하여 전기안전사고를 미연에 방지하여 효율적인 전기시설물 유지관리를 하고자 함

사업개요

- 위 치 : 관내 공원 및 녹지대
- 기 간 : 2012. 1월 ~ 12월
- 규 모 : 공원등 500여등, 전기시설물 정비
- 내 용 : 공원및녹지대의 전기시설물 이상발생시 즉각조치

추진실적

- 2012. 1. 18 : 공사발주
- 2012. 2. 1 ~ 12. 31 : 공사시행

향후 추진계획

- 2012. 12. 31 : 공사준공

기대효과

- 즉각적인 보수와 사전 점검으로 인하여 민원 만족도 향상 및 안전사고 미연방지

예산현황

- 예산액 : 40,000천원
- 집행액 : 25,793천원

14 **공원등 개선공사** - 구비 100%

관내 공원 내 노후된 공원등을 개선하여 전기 안전사고 등을 사전 예방하고 공원환경 개선에 기여코자 함

사업개요

- 위 치 : 자유어린이공원 등 3개소
- 기 간 : 2012. 3월 ~ 5월
- 규 모 : 공원등 및 배관배선 1식
- 내 용 : 노후된 전기시설 배관·배선 교체사업

추진실적

- 2012. 03. 20 : 공사 발주
- 2012. 04. 10 : 공사 착수
- 2012. 05. 04 : 공사 준공

기대효과

- 노후된 공원등을 정비함으로써 이용시민 안전확보 및 전기재해 예방

예산현황

- 예산액 : 20,000천원
- 집행액 : 19,000천원

관내 공원 내 방범용 CCTV를 설치하여 각종 범죄 및 시설물 파손을 사전예방하고자 함

사업개요

- 위 치 : 영등포근린공원 등 8개소
- 기 간 : 2012. 4월 ~ 10월
- 규 모 : 공원 8개소 20대설치
- 내 용 : 통합관제센터와 연동하여 CCTV 설치 20대 구축

추진실적

- 2012. 4. 27 ~ 5. 1 : 사업발주 및 조달청의뢰
- 2012. 8. 7 : 낙찰자 선정
- 2012. 8. 7 ~ 10. 6 : 공사시행

향후 추진계획

- 2012. 10. 6 : 공사준공

기대효과

- 각종 강력범죄 등을 사전에 예방하고 공원이용 주민에게 심리적 안정감 제공
- 시설물 파손을 사전 예방하여 쾌적한 공원환경 제공

예산현황

- 예산액 : 326,000천원(시 176,000, 구비 150,000)

- 집행액 : 없음

16 녹지대 위험수목 정비 - 구비 100%

녹지대 및 IC 주변의 위험수목을 사전에 정비하여 태풍, 폭우 등 기상이변으로 인한 녹지대 수목의 쓰러짐을 예방함으로써 안전하고 쾌적한 녹지대 환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 성산IC, 양화IC, 양평가로녹지, 대방천 가로녹지 등
- 규 모 : 500주
- 기 간 : 2012. 1 ~ 11월
- 내 용 : 위험수목 제거 및 전지

□ 추진방향

- 녹지대 내 수목으로 인한 위험요소 사전 해소
- 안전하고 쾌적한 녹지 환경 조성

□ 추진실적

- 2012. 2. 29 : 공사 발주(1차)
- 2012. 3. 17 ~ 4. 10 : 공사 시행 및 준공
- 2012. 6. 25 : 공사 발주(태풍 대비 연간단가)
- 2012. 7. 05 : 공사 착공

□ 향후계획

- 2012. 11. 01 : 공사 준공

□ 기대효과

- 태풍, 폭우 등 기상이변시 안전사고 예방
- 쾌적한 녹지환경 조성으로 주민 만족도 향상

□ 예산현황

- 예산액 : 130,000천원(구비)
- 집행액 : 69,058천원(구비)

녹지대 근로자 초소를 이전하여 기간제근로자 근무환경을 개선하고 녹지로 복원함으로써 가로미관을 향상하고자 함.

사업개요

- 위 치 : 여의도동 1-6(산업은행 앞), 2-9번지(윤중초등학교 옆)
- 규 모 : 200 m^2
- 기 간 : 2012. 1 ~ 3월
- 내 용 : 녹지관리초소 이전 및 후생복리시설 설치

추진방향

- 초소 이전 : 여의도 산업은행 앞 → 윤중초등학교 옆
- 화장실·샤워실 등 후생복리시설 설치, 수목식재 등

추진실적

- 2012. 2. 13 : 공사 발주
- 2012. 2. 17 ~ 2. 26 : 공사 시행
- 2012. 2. 26 : 공사 준공

기대효과

- 기간제근로자 근무 환경개선으로 만족도 향상
- 가로경관 향상

예산현황

- 예산액 : 30,000천원(구비)
- 집행액 : 22,250천원

장기미집행 도시계획시설인 경부제3녹지에 대해 연차별 보상 후 녹화하여 녹지 기능을 회복시킴으로써 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신길동 68-3번지 일대(대방역 ~ 신길역 구간)
- 규 모 : 7,912 m^2
- 기 간 : 2012. 1 ~ 12월
- 내 용 : 토지 보상 7필지 430 m^2

□ 추진방향

- 미보상 토지 7필지 430 m^2 감정평가 및 보상
- 미철거 건물 3동 철거 및 폐기물처리, 녹지조성 7,912 m^2

□ 추진실적

- 2012. 1 ~ 2월 : 보상계획 수립, 감정평가 시행 및 완료
- 2012. 8월 현재 : 4필지 394 m^2 보상(2필지 36 m^2 미보상)

□ 향후계획

- 2012. 9 ~ 10월 : 잔여 토지(2필지 36 m^2) 보상 완료
- 2012. 9 ~ 12월 : 잔여 건물 3동 철거 및 폐기물 처리,
녹지조성을 위한 실시설계용역 시행
- 2012. 11 ~ 12월 : 잔여 건물 철거 및 폐기물 처리
- 2013. 1 ~ 12월 : 녹지조성 완료

□ 기대효과

- 소음, 진동 등 각종 공해 차단 및 완화로 쾌적한 생활환경조성

□ 예산현황

- 예산액 : 2,600,000천원(시비 도시개발특별회계)
- 집행액 : 2,201,956천원(시비 도시개발특별회계)

단풍과 열매, 꽃이 아름다운 수종과 초화류를 식재하여 녹지량을 확충하고 주민이 만족하는 쾌적한 녹지공간을 조성하고자 함.

사업개요

- 위 치 : 도림2동 263번지 일대 대방천길
- 규 모 : 3,000 m^2
- 기 간 : 2012. 2 ~ 10월
- 내 용 : 수목 및 초화류 식재, 급수시설 설치 등

추진방향

- 다양한 수목, 초화류 식재를 통한 가로변 녹지량 확충
- 보행환경 개선 및 쾌적한 녹지공간 조성

추진실적

- 2012. 6. 07 : 공사 발주
- 2012. 7. 10 : 공사 착공

향후계획

- 2012. 10. 07 : 공사 준공

기대효과

- 교목, 관목, 초화류 등 다층구조 녹지조성으로 생태적 안정성 증진
- 쾌적한 보행환경 및 풍요롭고 아름다운 도시경관 조성

예산현황

- 예산액 : 210,000천원(시비)
- 집행액 : 2,800천원(시비)

관내 가로수 중 교통사고, 신설도로, 자연고사 등으로 가로수가 없는 지역, 가로수 식재 민원요청지 등에 수목을 식재하여 가로변 녹지량 확충 및 쾌적한 가로경관을 조성코자 함

사업개요

- 위 치 : 여의동·서로 등 25개노선
- 기 간 : 2012. 1 ~ 6월
- 규 모 : 은행나무 등 가로수 보식 68주 및 회양목 560주 식재
- 내 용 : 교통사고 및 고사 등으로 인한 가로수 등 공분 지역에 수목 식재

추진실적

- 2012. 2. 21 ~ 3. 21 : 실시설계용역 시행
- 2012. 4. 5 : 계약심사 및 일상감사 시행
- 2012. 4. 10 : 공사발주
- 2012. 6. 28 : 공사준공

기대효과

- 가로녹지량 확충 및 녹음제공 등 쾌적한 가로환경 제공

예산현황

- 예산액 : 131,043천원(구비)
- 집행액 : 86,255천원

도시경관의 주요 요소인 가로수 하부공간에 선형의 띠녹지를 보식 및 가로수 보호판을 정비하여 쾌적한 보행환경 및 풍요롭고 아름다운 도시경관 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여의서로, 국회대로, 의사당대로
- 기 간 : 2012. 1 ~ 12월
- 규 모 : 가로수 보호판 정비 및 띠녹지 보식 2,563m²
- 내 용 : 가로수 보호판 정비(여의서로) 및 띠녹지 내 수목보식

□ 추진실적

- 2012. 1. 25 : 가로수 생육환경 개선사업 추진계획 수립
- 2012. 2. 21 ~ 3. 21 : 실시설계 시행
- 2012. 4. 18 : 설계심의 시행(서울시 조경과)
- 2012. 7. 11 : 서울시 가로수 생육환경 개선 사업계획 변경 통보
 ※ 당초 설계심의된 띠녹지 보식 및 가로수 보호판 정비를 새로운 빗물관리 개념이 도입된 서울시 레인가든 조성 지침에 맞게 사업 변경 설계요청

□ 향후 추진계획

- 2012. 9월 : 서울시 설계심의 재시행 및 계약심사 시행
- 2012. 10월 ~ 12월 : 공사시행

□ 기대효과

- 가로녹지량 확충 및 쾌적한 가로환경 제공

□ 예산현황

- 예산액 : 450,000천원(시비)
- 집행액 : 4,400천원

노쇠한 왕벚나무를 병해충방제 및 외과수술 등을 통하여 건강한 생육여건을 조성하고 여의도 한강 봄꽃축제의 장 기반을 마련하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 여의동·서로 등 관내 4개소
- 기 간 : 2012. 1월 ~ 8월
- 규 모 : 왕벚나무 3,731주
- 내 용 : 왕벚나무 외과수술 및 병해충 방제

□ 추진실적

- 2012. 2. 29 ~ 3. 29 : 왕벚나무 외과수술 공사 시행
- 2012. 5. 2 : 왕벚나무 수세회복 공사 발주
- 2012. 5. 7 ~ 8. 31 : 왕벚나무 수세회복 공사 시행

□ 향후 추진계획

- 2012. 8. 31 : 공사 준공

□ 기대효과

- 왕벚나무의 건강한 생육여건 조성으로 아름다운 봄꽃 축제의 장 기반 마련

□ 예산현황

- 예산액 : 50,450천원(구비)
- 집행액 : 19,300천원

체계적인 가로수 수형관리 및 태풍 등 재난에 대한 예방으로 안전하고 쾌적한 가로경관 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여의나루로2길 등 관내 5개 노선
- 기 간 : 2012. 1월 ~ 8월
- 규 모 : 381주
- 내 용 : 버즘나무 등 가로수 381주에 대하여 약전지 시행

□ 추진실적

- 2012. 1. 16 : 동절기 가로수 가지치기 공사 발주
- 2012. 2. 1 ~ 2. 16 : 동절기 가로수 가지치기 공사 시행
- 2012. 8. 7 : 가로수 위험수목 정비 공사 발주
- 2012. 8. 17 ~ 8. 26 : 가로수 위험수목 정비 공사 시행

□ 향후 추진계획

- 2012. 8. 26 : 공사 준공

□ 기대효과

- 체계적인 가로수 수형관리로 재난예방 및 쾌적한 가로환경 제공

□ 예산현황

- 예산액 : 80,000천원(구비)
- 집행액 : 39,546천원

아파트 담장을 허문 후 단지 내 녹지를 개방하여 인근 주민에게 휴식처를 제공 및 가로 녹시율을 높이고 부족한 생활권 녹지를 확충함으로써 쾌적한 환경을 조성하여 삶의 질 향상을 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동4가 12번지 성원아파트
- 규 모 : 담장철거 260m, 녹지조성 260 m^2
- 기 간 : 2012. 1. ~ 11.
- 내 용 : 아파트 담장 철거 후 녹지조성

□ 추진실적

- 2012. 3. 27. : 실시설계용역 완료

□ 향후 추진계획

- 2012. 9월 : 서울시 계약심사 및 발주
- 2012. 10월 ~ 11월 : 공사시행 및 준공

□ 기대효과

- 공원녹지의 확보가 어려운 도심생활권에 사유지를 활용한 준 공개녹지 확보
- 가로변 녹시율 증진과 쾌적한 주거환경 조성

□ 예산현황

- 예산액 : 210,000천원(시비100,000천원, 구비 110,000천원)
- 집행액 : 9,620천원(구비)

도심권 녹지부족 지역으로 집중녹화가 필요한 공공기관 옥상에 옥상녹화 사업을 추진하여 도심 녹화량 확충 및 대기질 개선 등 쾌적한 도심환경에 기여코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신길5동 422 (신길5동 주민센터)
- 규 모 : 300 m^2
- 기 간 : 2012. 1. ~ 11.
- 내 용 : 옥상 방수·방근 공사 후 수목식재 및 조정시설 설치

□ 추진실적

- 2012. 2. 2 : 신길5동 주민자치센터 구조안전진단용역 계약심사 요청
- 2012. 2. 13 : 2012년 공공건물 옥상녹화사업 대상지 변경(우리구→서울시)
※ 신길5동 주민자치센터 → 자원순환센터
- 2012. 2. 13 : 자원순환센터 구조안전진단용역 계약심사 요청
- 2012. 7. : 구청장 지시사항
(자원순환센터 옥상녹화 대신 옥상 배드민턴장 설치)
- 2012. 8. : 영등포구청 본관 옥상녹화 추진 협의 중(총무과)

□ 향후 추진계획

- 2012. 9월 : 구조안전진단용역 시행
- 2012. 10월 ~ 11월 : 실시설계용역 및 설계심의, 공사시행

□ 기대효과

- 냉난방 에너지 절약, 대기질 개선 등 환경개선에 기여
- 소규모 생물서식공간 확보

□ 예산현황

- 예산액 : 105,000천원(시비 52,000천원, 구비 53,000천원)
- 집행액 : 없음

차량유동이 많고 도시미관을 저해하는 지하철로 주변 콘크리트 구조물(당산역 방음벽)에 녹화사업을 시행하여 도시미관 향상과 쾌적한 가로경관을 도모코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 당산동4가 80-2일대(당산역 2호선 방음벽)
- 규 모 : 180㎡(연장 304m)
- 기 간 : 2012. 1. ~ 6.
- 내 용 : 방음벽 주변 녹지에 기반조성 후 관목류 및 덩굴식물 식재

□ 추진실적

- 2012. 2. ~ 3. : 자체설계 시행
- 2012. 3. 21. : 서울시 설계심의(우리구 → 조경과)
- 2012. 4. 2. ~ 4. 8. : 교통소통대책수립용역 시행
- 2012. 5. 4. ~ 6. 2. : 공사시행 및 준공

□ 기대효과

- 도심미관 향상 및 쾌적한 가로경관 조성

□ 예산현황

- 예산액 : 110,000천원(시비)
- 집행액 : 93,032천원(시비)

도심 내 볼거리를 넘어 시민들의 휴식공간으로 자리잡고 있는 수경시설을 유지 관리하여 안전하고 쾌적한 천수공간을 제공하고자 함

사업개요

- 위 치 : 당산근린공원 바닥분수 등 16개소
- 규 모 : 2,018 m^2
- 기 간 : 2012. 4. ~ 10.
- 내 용 : 관내 수경시설 유지관리

추진실적

- 2012. 4. 17. : 수경시설 관리계획 수립
- 2012. 4. ~ 5. : 자체설계 시행
- 2012. 5. 25. ~ 6. 3. : 수경시설 정비공사 시행 및 준공

향후 추진계획

- 2012. 10. : 수경시설 내 우기감지시스템 구축

기대효과

- 여름철 청량감 제공 및 안전사고 미연 방지

예산현황

- 예산액 : 30,000천원(구비)
- 집행액 : 9,355천원(구비)

한정된 토지와 높은 지가(地價)로 공원녹지의 추가 확보가 어려운 도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 꾸미고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른 도시를 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 1532-4 등 6개소
- 규 모 : 390㎡
- 기 간 : 2012. 1 ~ 5월
- 내 용 : 기반시설 조성 및 수목식재 등

□ 추진방향

- 생활주변 나대지 및 도로변 유휴공지 녹지조성으로 생활환경 개선
- 지속적인 자투리땅 발굴로 도심 내 녹지량 확충

□ 추진실적

- 2012. 2. 3 ~ 3. 3 : 실시설계용역 시행
- 2012. 3. 8 : 추진계획 수립
- 2012. 3.22 : 계약심사 및 일상감사 시행
- 2012. 3.30 : 공사 발주
- 2012. 5.29 : 공사 준공

□ 기대효과

- 생활주변 녹지량 확충 및 민원해소
- 생활주변 녹지조성으로 주민의 삶의 질 향상

□ 예산현황

- 예산액 : 150,000천원 (구비)
- 집행액 : 111,210천원

환상덩굴, 쇠뜨기, 가시박 등 하천경관을 저해하는 유해식물 등이 자라고 있는 안양천 제방사면을 다양한 화목류와 초종이 생육할 수 있도록 생태복원 사업을 시행하여 사람과 자연이 어우러지는 생태경관 지역으로 조성코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 안양천 우안(목동교 ~ 양평교) 제방사면
- 기 간 : 2012. 1 ~ 12
- 규 모 : 15,682 m^2 (L=1,075m)
- 내 용 : 안양천 제방 사면 산책로 탄성포장 및 수크렁, 산조풀 등 식생매트 식재 등으로 생태하천으로 복원

□ 추진실적

- 2012. 1. 10 : 안양천 그린웨이 4차 조성사업 계획 수립(방침)
- 2012. 1. 30 : 기술용역타당성 심사 요청(기술심사담당관)
- 2012. 2. 15 : 기술용역타당성 심사 결과 통보(적정)
- 2012. 3. 05 : 안양천 그린웨이 4차 조성사업 기본 및 실시설계용역 시행
- 2012. 3. 07 : 기본 및 실시설계용역 계약
- 2012. 5. 31 : 용역보고 및 전문가 자문회의 개최
- 2012. 6. 28 : 주민설명회 및 의견수렴
- 2012. 7. 31 : 서울시 설계심의
- 2012. 8. 14 : 서울시 계약심사 요청 ※ 하천점용허가 협의(8~9월)

□ 향후 추진계획

- 2012. 9월 ~ 12월 : 공사발주 및 시행

□ 기대효과

- 하천제방 환경개선 및 녹지량 확충으로 계절별 꽃이 피는 하천 경관 조성
- 다양한 식생으로 하천생태계 보전 및 청소년들의 자연학습장 제공

□ 예산현황

- 예산액 : 930,000천원(시비)
- 집행액 : 14,140천원(시비)

늘어나는 웰빙인구 수요를 충족시키고자 주민이용 빈도가 높은 생활권 녹지대, 근린공원, 어린이공원 등에 야외체육시설을 설치하고 배드민턴장, 게이트볼장 등의 노후화된 시설물을 새롭게 정비하여 구민건강 증진 및 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동 배드민턴장 외 9개소
- 기 간 : 2012. 1 ~ 7
- 규 모 : 7,000 m^2
- 내 용 : 배드민턴장 및 게이트볼장 정비,
공원 및 체련장 등에 야외운동기구 설치 및 정비

□ 추진실적

- 2012. 1월 : 사업추진 계획 수립(방침)
- 2012. 3월 : 실시설계 용역 시행
- 2012. 5월 : 계약 심사 및 공사발주
- 2012. 7월 : 사업완료

□ 향후 추진계획 : 완료(※ 7.30자 공사준공)

□ 기대효과

- 건전한 여가선용 및 생활체육을 통한 삶의 질 향상
- 구민 건강 증진 및 체육인구 저변 확대

□ 예산현황

- 예산액 : 196,475천원(구비)
- 집행액 : 126,734천원

영등포 공원의 이용객 증가 및 공원 이용의 활성화에 따라 문화 충족 욕구가 많으나 청소년이 이용할 문화 공간이 부족하므로 청소년 문화마당을 조성하여 소규모 공연 등을 할 수 있는 문화 공간으로 활용, 주민의 여가 생활 증진에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동 582-3(영등포공원 내)
- 규 모 : 무대설치1개소(12m×4m), 탁구조파고라 1개소
- 사업기간 : 2012. 3월 ~ 6월

추진방향

- 영등포공원 청소년의 문화 욕구를 충족 할 수 문화마당 조성
- 이용이 편리하고 아름답고 쾌적한 공원으로 조성

추진 실적

- 2012. 03~04 : 실시설계용역 시행 및 계약심사
- 2012. 05. 02 : 공사발주
- 2012. 06. 11 : 공사준공

기대효과

- 절대적으로 부족한 청소년문화 공간 확보
- 공원이용 활성화로 지역 주민 삶의 질 향상

예산 현황

- 예산액 : 60,000천원(구비)
- 집행액 : 47,612원

영등포 공원 이용객의 다수를 차지하고 있는 노년층을 배려한 게이트볼장을 조성하여 이용시민 편의제공 및 공원이용 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동 582-3(영등포공원 내)
- 기 간 : 2012. 3월 ~ 11월
- 규 모 : 게이트볼장 조성 1면(20m×15m)
- 내 용 : 게이트볼장을 조성하여 노년층 공원이용활성화 기여

□ 추진실적

- 2012. 3~4 : 서울시 기술용역 타당성 심사
- 2012. 5. 7 : 영등포공원 조성계획변경(안) 열람공고
- 2012. 6. 1 : 서울시 도시공원위원회 심의 요청
- 2012. 6. 29 : 서울시 도시공원위원회 심의결과 통보
- 2012. 7. 17 : 서울시 도시공원위원회 소위원회 재심의(현장방문)
- 2012. 8. 7 : 서울시 도시공원위원회 소위원회 심의결과 통보
- ※ 위치변경 권고(뚝살경기장 옆→배드민턴장 옆)
- 2012. 8. 10 : 서울시 도시공원위원회 소위원회 심의결과 조치사항 제출
- 2012. 8. 17 : 영등포공원 조성계획 변경 및 지형도면 고시 요청

□ 향후 추진계획

- 2012. 9월 : 서울시(공원조성과) 설계심의 의뢰 및 계약심사 시행
- 2012. 10월 ~ 11월 : 공사시행

□ 기대효과

- 공원 내 체육 시설 확충으로 이용객의 건강 및 여가생활 공간 확보
- 공원이용 활성화로 지역 주민 삶의 질 향상

□ 예산 현황

- 예산액 : 60,000천원(시비)
- 집행액 : 0원(시비)

Ⅲ. 신규·주요투자사업

1 대림유수지 생태공원 조성 - 시비 100%

대림유수지내 청소차고지로 사용되었던 부지를 인접아파트 녹지 및 산책로와 연결하고 생태관찰학습장 조성, 편익시설 설치 등 사람과 자연이 공생하는 친환경 휴식공간을 확충하여 주민들의 소통과 화합의 장소 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 대림3동 611번지(대림유수지)
- 규 모 : 3,840 m^2
- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 12
- 내 용
 - 기반시설 : 성토 및 토양개량, 흙콘크리트포장(782 m^2), 우배수시설 등
 - 시설공사 : 데크로드 34.5M, 공원등, CCTV설치, 운동시설물8종, 파고라 2개소, 등의자, 장미아치, 안내판 등
 - 수목 및 초화식재 : 장미원, 철쭉동산, 피톤치드 숲, 녹지정비 등

□ 추진실적

- 2012. 01. 31 : 현장조사 및 추진계획 수립
- 2012. 02. 27 : 기술용역 타당성심의(서울시 기술심사담당관)
- 2012. 04. 02 : 실시설계용역 발주
- 2012. 04. 05 : 실시설계용역 시행(2012. 08. 02)
- 2012. 07. 20 : 설계심의(서울시 자연생태과)

□ 향후 추진계획

- 2012. 08. 13 : 계약심사(서울시 계약심사과)
- 2012. 08. 27 : 시설공사 발주
- 2012. 09. 10 : 공사착공
- 2012. 12. 10 : 공사준공

□ 기대효과

- 아파트 등이 밀집한 공원소외지역의 단절된 산책로 및 녹지를 연결하고 공원녹지가 풍부한 생태도시를 조성하여 주민의 삶의 질 향상
- 2009년도 청소차고지 이전 이후 방치되어 있는 콘크리트 나대지를 생태공원으로 조성함으로써 주민숙원사업 해결 및 신뢰행정 구현

□ 예산현황

- 예산액 : 1,000,000천원(시비)
- 집행액 : 16,000천원

2

메낙골근린공원 조성 기본설계용역 - 구비 100%

1940. 3. 12 도시계획(공원)으로 결정된 메낙골근린공원은 1960년 이후 해군본부, 서울지방병무청이 점유하여 공원기능을 못하고 있는 실정으로 서울시에서 추진하고 있는 일부 공원 해제(병무청 청사신축 부지) 및 대체공원 지정 등 시설을 이전하고 병무청 잔여부지의 공원 조성을 위한 기본설계용역 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 신길7동 894번지 일대(병무청 부지)
- 규 모 : 20,303.5㎡
- 사업기간 : 2012. 4 ~ 2014. 12
- 내 용
 - 기본설계용역 : 서울시 계획에 따라 2012년도 시행 예정
 - 시설공사 시행 : 2013 ~ 2014(시예산 확보 후 공사추진)
 - 공원기능 원상회복을 요구하는 지역주민의 집단민원을 해결하고, 산이 없고 녹지가 절대 부족한 영포포구(신길7동)지역의 녹지 확충을 위한 공원기능 회복
 - 서울지방병무청 등 공원 내 부적합한 건물을 이전하고, 도시 숲 및 산책로, 수경시설 등의 공원조성 사업을 추진하여 도시경관 향상 등 쾌적한 도시환경 조성

□ 추진실적

- 2012. 03. 23 : 메낙골근린공원 조성사업 관련 주민의견 제출 요청 (서울시 공원녹지 정책과)
- 2012. 04. 24 : 메낙골근린공원 조성사업 관련 주민설문조사 결과 제출
 - 기 간 : 2012. 04. 09(월) ~ 23(월)
 - 대 상 : 병무청 주변 주민 및 이해관계인 342명
 - 방 법 : 해당동(신길7동) 통장을 통한 서면조사
 - 결 과 : 찬성 338명, 반대 4명

□ 향후 추진계획

- 서울시 사업추진 보류
- 향후 서울시 계획에 의거 용역추진 및 사업시행

□ 기대효과

- 녹지가 부족한 도심 내에 아름다운 숲과 시민이 즐겨 찾는 쾌적한 생태문화공간 조성으로 생태도시 조성 및 주민 건강 증진
- 공원녹지 확충을 통하여 도시경관을 향상 및 도보로 이용 가능한 생활권 공원 확충 및 주민의 휴식처 제공으로 삶의 질 향상

□ 예산현황

- 예산액 : 50,000천원(구비)
- 집행액 : 없음

3

대림로 가로수 바꿔심기 - 시비 100%

대림로의 가로수를 왕벚나무로 식재하는 등 문화의 거리로 조성하여 지역 환경을 개선코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 대림로(대림3동 빗물펌프장 앞 ~ 대림삼거리 앞)
- 기 간 : 2011. 11월 ~ 2012. 6월
- 규 모 : 연장 1.9km
- 내 용 : 기존 버즘나무 가로수를 왕벚나무 및 이팝나무로 수종갱신

□ 추진실적

- 2011. 12. 23 ~ 2012. 2. 17 : 실시설계 시행
- 2012. 4. 3 : 공사 발주
- 2012. 6.28 : 공사 준공

□ 기대효과

- 아름답고 쾌적한 가로환경 제공

□ 예산현황

- 예산액 : 400,000천원(시비)
- 집행액 : 298,813천원(시비)

유수지 생태복원으로 재조성된(2007.12준공) 양평1 유수지내 연못 및 습지를 새롭게 재조성하여 토양개량 및 정화식물 등을 식재하고, 목재 산책로 안전시설을 보강하며, CCTV를 설치하여 특화된 생태습지를 조성코자 함

사업개요

- 위 치 : 양평동 3가 57번지
- 기 간 : 2012. 1 ~ 12
- 규 모 : 30,240 m^2 (유수지내 녹지면적)
- 내 용 : 유수지내 정화식물 식재 및 목재 산책로 정비 등

추진실적

- 2012. 1 : 사업추진 계획 방침
- 2012. 2 : 서울시 기술용역타당성 심사
- 2012. 3 : 실시설계용역 계약
- 2012. 5 : 용역보고회 및 전문가 자문회의
- 2012. 6 ~ 7 : 주민설명회(1차, 2차)
- 2012. 8 ~ 9 : 서울시 설계심의 및 계약심사

향후 추진계획

- 2012. 9 ~ 12 : 공사시행 및 완료

기대효과

- 목재 관찰데크 안전시설 보강으로 안전하고 쾌적한 주민 휴식공간 확보

예산현황

- 예산액 : 630,000천원(시비)
- 집행액 : 10,708천원(시비)

5

안양천 목동교 인근 화장실 신설 - 구비 100%

안양천내 각종 시설 이용시민은 날로 증가하나, 목동교를 중심으로 약 2.5km 구간에 화장실이 없어 불편하다는 민원이 지속 제기되어 이용주민의 불편해소 및 편의증진을 위하여 화장실 신설하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 목동교 하류 주변 제방소단
- 규 모 : 화장실 1개소(조달청 관급자재 구매설치)
- 사업기간 : 2012. 9~ 11월
- 총사업비 : 80,000천원(구비)

□ 추진방향

- 양평보행육교~양평교 사이 약 2.5km 구간 화장실 없으므로 목동교 하부 승터 이용자 및 산책로·자전거도로 이용자가 쉽게 접근 할 수 있도록 신설위치 선정
- 안양천 둔치 자전거도로와 산책로상의 기존램프를 이용하여 별도의 계단 신설없이 화장실 접근이 용이하게 설치

□ 세부 추진계획

- 2012. 08 ~ 09 : 계획수립 및 실시설계, 설치공사 발주
- 2012. 10 ~ 11 : 공사착공 및 완료

□ 기대효과

- 화장실 신설로 안양천 이용주민 불편을 해소
- 아름답고 쾌적한 하천 조성으로 안양천 이용 주민 만족도 향상

□ 예산현황

- 예산액 : 8000천원(구비)
- 집행액 : 0원

6

영등포공원 내 북 카페 설치 - 구비 100%

영등포공원 관리사무소 내 유휴공간을 활용하여 북 카페를 설치함으로써 이용주민의 정서함양 및 청소년의 문화공간으로 이용하고자 함

사업개요

- 위 치 : 영등포구 영등포동 582-3(영등포공원 내)
- 기 간 : 2012. 6월 ~ 10월
- 규 모 : 북 카페 조성 37.8㎡
- 내 용 : 관리사무소 내 유휴공간을 활용하여 북 카페 조성

추진실적

- 2012. 6. 4 : 영등포 공원 내 북 카페 설치계획 수립
- 2012. 7. 17 : 추가 경정 예산 확보

향후 추진계획

- 2012. 8월 : 계약심사 시행
- 2012. 9월 ~ 10월 : 공사시행

기대효과

- 공원 이용객에게 대화 및 문화활동의 공간 제공
- 주민에게 이용이 편리하고 아름답고 아늑한 휴게공간 제공

예산현황

- 예산액 : 18,000천원(구비)
- 집행액 : 0원
